T96
406
653

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO
Alcaldía Local de Los Mártires

CONTRATO DE OBRA CO-137-2019

INFORME TECNICO N° 01

CONTRATISTA

CONSULTORÍA Y CONSTRUCCION SAS - CON & CON SAS

INTERVENTORÍA

MIRS LATINOAMERICA S.A.S

ELABORO:	REVISO:	APROBO:
ING. DIEGO RENE PÉREZ GONZALEZ	**ING. JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA**	**ING. SANDRA MONICA CARDOZO ROJAS**
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
Diego Perez.		
CARGO:	CARGO:	CARGO:
RESIDENTE TÉCNICO DE OBRA	**DIRECTOR DE OBRA**	**DIRECTORA DE INTERVENTORÍA**

TABLA DE CONTENIDO

Contenido

INTRODUCCIÓN 3
GLOSARIO 4
1. INFORME BÁSICO 6
1.1. PERSONAL CONTRACTUAL 6
1.2. PÓLIZAS 7
2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 9
3. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 11
3.1 ANTICIPO 11
3.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS 13
4. CONCLUSIONES 29

INTRODUCCIÓN

Con el objeto de "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES", la Alcaldía Local de Los Mártires a través de licitación pública FDLM-LP-134-2019 adjudicó a Consultoría y Construcción S.A.S, el contrato de obra CO-137-2019.

El valor inicial del contrato corresponde a CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/C ($5.437.884.572,00) MONEDA LEGAL, con un plazo de ejecución inicial de SIETE (7) MESES y con fecha de inicio del 25 de febrero del 2020.

En el presente informe se incluyen las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 25 de febrero de 2020 y el 24 de marzo de 2020.

GLOSARIO

DEMOLICIONES Y PRELIMINARES: Se refiere al desmonte de mobiliarios y demoliciones necesarias para iniciar los trabajos de excavaciones, rellenos y construcción de zonas duras o elementos de concreto o adoquín.

EXCAVACIONES Y RELLENOS: Se refiere al retiro de material necesario para conformar las bases y rellenos de contra elementos de concreto o adoquín.

ESTRUCTURA: Se refiere a la construcción de concretos o morteros, muros de concreto, bases para andenes en adoquín o concreto que se requieran en la consecución del proyecto.

REDES HIDRÁULICAS: Incluye el suministro e instalación de tuberías de drenaje de aguas lluvias, acometidas, cajas de inspección y cunetas.

CICLORUTA: Calzada destinada de manera permanente a la circulación de bicicletas, ubicada en el andén, el separador o segregada de la calzada vehicular o en otros lugares autorizados, debidamente señalizada y delimitada.

ESPACIO PÚBLICO: El conjunto de espacios urbanos conformados por plazas, las vías peatonales y andenes, los controles ambientales de las vías arterias, las alamedas y ciclo rutas delimitadas.

ESPECIFICACIONES: Procesos y procedimientos técnicos generales o particulares, según el caso a los que se debe ceñir el Contratista durante la ejecución de las obras, para obtener los resultados objeto del contrato.

ADITIVO: Es un material distinto del agua, agregados y cemento hidráulico usado como ingrediente en concretos y morteros añadido a la mezcla inmediatamente antes o durante su mezclado. Hoy en Día, los aditivos se consideran un ingrediente más del concreto y se emplean para modificar las propiedades de modo que lo hagan más adecuado para condiciones de trabajo.

CURADO: Es el proceso con el cual se mantienen una temperatura y un contenido de humedad adecuados, durante los primeros días después del vaciado, para que se puedan desarrollar en él las propiedades de resistencia y durabilidad.

SELLO DE JUNTA: Sellos de grietas en pavimentos en un programa de mantenimiento que reduce el deterioro y ayuda a conservar el estado de este. La vida útil de un pavimento

puede prolongarse al menos en 2 años realizando el sellado en el momento adecuado, permitiendo mantener la utilidad del pavimento.

PAVIMENTO. Conjunto de capas superpuestas, relativamente horizontales, que se diseñan y construyen técnicamente con materiales apropiados y adecuadamente compactados. Estas estructuras estratificadas se apoyan sobre la subrasante de una vía y deben resistir adecuadamente los esfuerzos que las cargas repetidas del tránsito le transmiten durante el período para el cual fue diseñado la estructura y el efecto degradante de los agentes climáticos.

PAVIMENTO FLEXIBLE. Tipo de pavimento constituido por una capa de rodadura bituminosa apoyada generalmente sobre capas de material no ligado.

PAVIMENTO RÍGIDO. Es aquel que fundamentalmente está constituido por una losa de concreto hidráulico, apoyada sobre la subrasante o sobre una capa de material seleccionado, la cual se denomina sub base del pavimento rígido

RASANTE. Es la proyección vertical del desarrollo del eje de la superficie de rodadura de la vía.

REPLANTEO. Actividades topográficas encaminadas a localizar un proyecto vial en el terreno para su posterior construcción. Se apoya en los planos de diseño y en las bases de topografía empleadas previamente en el levantamiento del corredor vial.

CIV: Código de Identificación Vial

SDM: Secretaria Distrital de Movilidad

PMT: Plan de Manejo de Trafico

1. INFORME BÁSICO

CUADRO 1: INFORMACIÓN CONTRATO

CONTRATISTA	**CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.**
INTERVENTORIA	**MIRS LATINOAMERICA S.A.S**
CONTRATO No.	**CO-137-2019**
VALOR INICIAL DE LA OBRA	**$ 5.437.884.572**
ANTICIPO	**$ 1.631.365.372**
PLAZO DE EJECUCIÓN	**Siete (7) meses**
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	**25 de febrero de 2020**
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	**24 de septiembre de 2020**
ADICIONES	**N/A**
PRORROGAS	**N/A**
SUSPENSIONES	**Suspensión No.1 de fecha 24 de marzo de 2020**
FECHA DE REINICIO No.01	**21 de julio de 2020**
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL INCLUIDA SUSPENSIÓN	**20 de enero de 2021**

FUENTE: CON & CON SAS / CO-137-2018

1.1. PERSONAL CONTRACTUAL

CUADRO 2: PERSONAL

CARGO	NOMBRE	[redacted]
DIRECTOR DE OBRA	JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA	50%
RESIDENTE DE OBRA	DIEGO RENE PÉREZ GONZALEZ	100%
RESIDENTE AMBIENTAL	MAYERLY MARIN MATEUS	60%
RESIDENTE SST	SANDRA MILENA GIL	100%
RESIDENTE SOCIAL	RUTH ZORAIDA LARRAHONDO RICO	60%

ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	JUAN DANIEL MOYA	10%
ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	JORGE GOMEZ	10%
ESPECIALISTA EN REDES HIDROSANITARIAS	GERMAN GABRIEL RODRIGUEZ	30%
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN	HERNAN RICCI RUIZ	20%
ESPECIALISTA EN TRÁNSITO Y TRANSPORTE	MARTHA ROCIO CASTILLO	30%
TOPÓGRAFO	JUAN CARLOS PARRA	50%

FUENTE: CON & CON SAS / CO-137-2019

1.2. PÓLIZAS

CUADRO 3: RELACION DE POLIZAS

POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA No. FDLM-137-2019			
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**EQUIDAD SEGUROS O.C.**		
POLIZA DE CUMPLIMIENTO ESTATAL No.	**AA007885**		
OBJETO DE LA POLIZA: **GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EL BUEN MANEJO CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO, PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIÓN LABORAL Y LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CO-137-2019 CELEBRADO EN LA PLATAFORMA SECOP II CUYO OBJETO ES CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES.**			
FECHA DE EXPEDICIÓN	**05/03/2020**		
COBERTURAS	**INICIAL**	**FINAL**	**VALOR ASEGURADO**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25/02/2020	24/02/2021	$1,631,365,371.60
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	25/02/2020	24/02/2021	$1,631,365,371.60
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIÓN LABORAL	25/02/2020	24/09/2023	$543,788,457.20
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	24/09/2020	24/09/2025	$1,631,365,371.60

COMPAÑÍA ASEGURADORA	**EQUIDAD SEGUROS O.C.**
POLIZA R.C.E ENTIDAD ESTATAL No.	**AA007887**

OBJETO DE LA POLIZA:

GARANTIZAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CO-137-2019 CELEBRADO EN LA PLATAFORMA SECOP II CUYO OBJETO ES CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES.


FECHA DE EXPEDICIÓN	05/03/2020		
COBERTURAS	**INICIAL**	**FINAL**	**VALOR ASEGURADO**
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	25/02/2020	24/09/2020	$414.058,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	25/02/2020	24/09/2020	$41,405,800.00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	25/02/2020	24/09/2020	$41.405,800.00
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	25/02/2020	24/09/2020	$41,405,800.00

FUENTE: CON&CON SAS / CO-137-2019

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Los Mártires es la localidad número 14 del Distrito Capital de Bogotá. Se encuentra ubicada en la parte centro-sur de la ciudad. Entre sus residentes predomina la clase media baja, el estrato socioeconómico 3. El nombre se debe a que en el parque de su zona oriental fueron fusiladas varias figuras notables de la independencia de Colombia. La localidad se encuentra completamente urbanizada, salvo por parques y rondas de los ríos. Junto a las localidades de La Candelaria, Santa Fe y Teusaquillo conforma El Centro de la ciudad. Pese a albergar varios monumentos arquitectónicos e históricos, desde mediados del siglo XX sus zonas oriental y norte han sufrido un proceso de deterioro presentando algunos de sus barrios graves problemas de delincuencia y criminalidad.


IMAGEN 1: LOCALIDAD 14 LOS MARTIRES

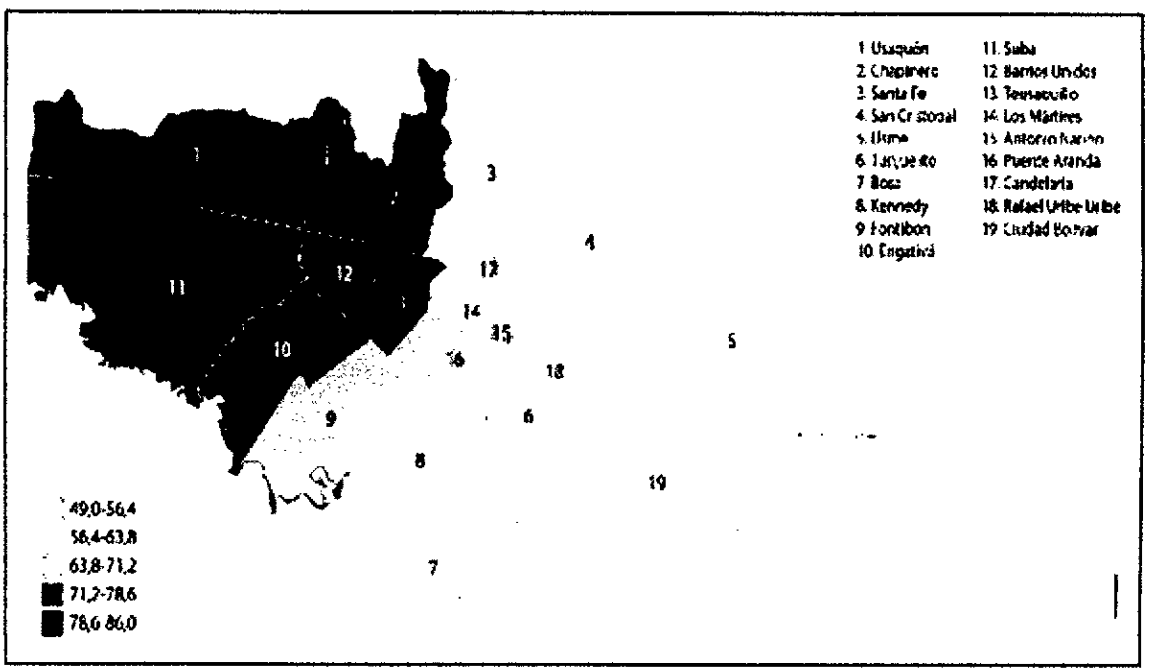

FUENTE: GOOGLE MAPS

PUNTO CARDINAL	LOCALIDAD	LIMITE
NORTE	TEUSAQUILLO	DIAGONAL 22 Y AVENIDA EL DORADO
SUR	ANTONIO NARIÑO	CALLE OCTAVA SUR Y AVENIDA PRIMERA
ORIENTE	SANTA FE	AVENIDA CARACAS
OCCIDENTE	PUENTE ARANDA	AVENIDA NORTE-QUITO-SUR

IMAGEN 2: LOCALIDAD 14 LOS MARTIRES

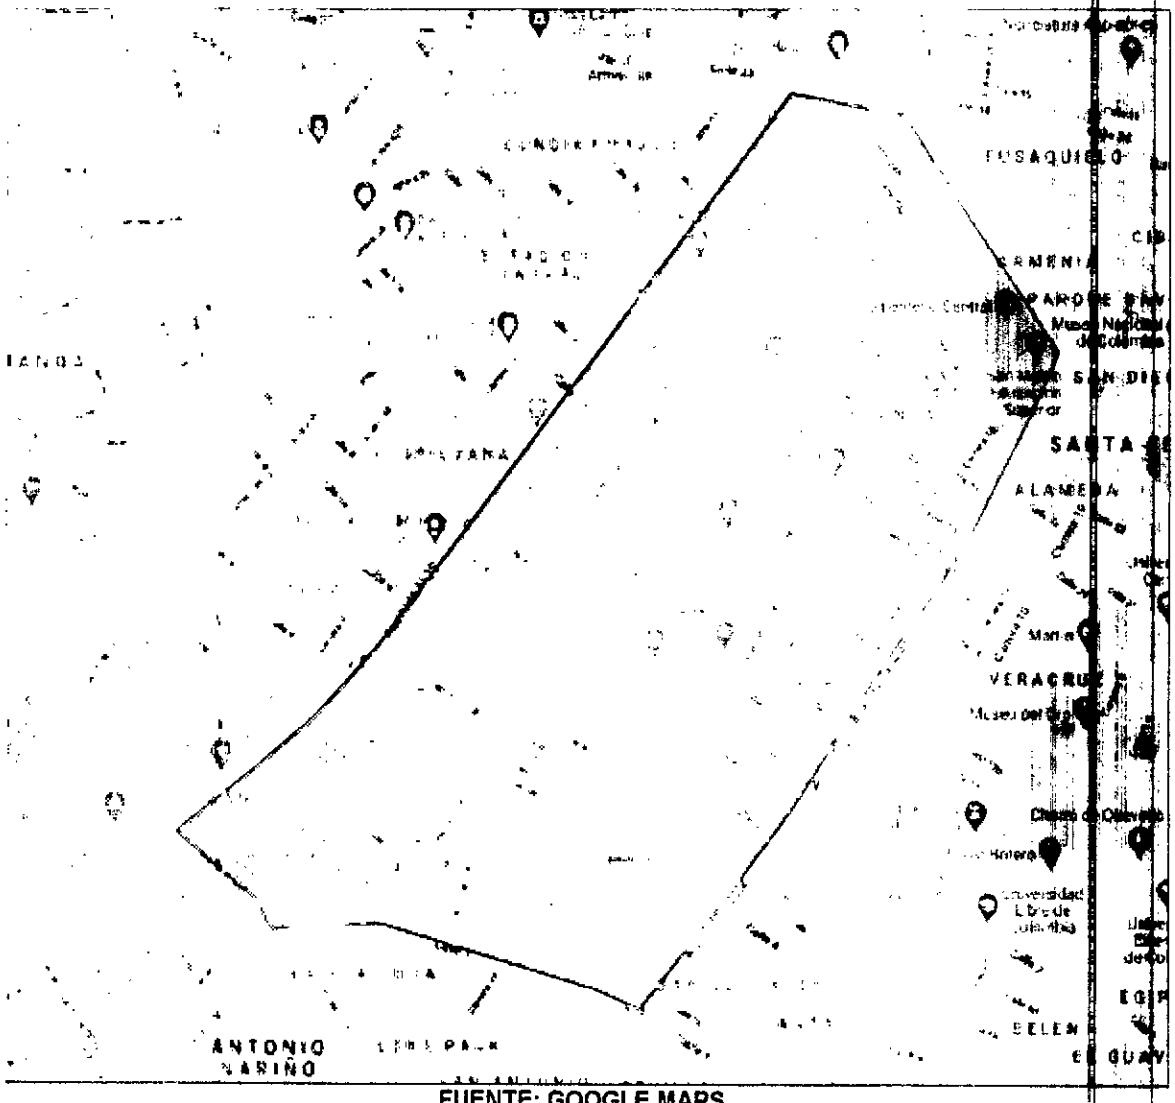

FUENTE: GOOGLE MAPS

De acuerdo con los documentos del contrato y mediante la visita técnica de campo, se establecen los segmentos de calzada y espacio público objeto de estudio, los cuales se listan a continuación:

CUADRO 4: SEGMENTOS OBJETO DE ESTUDIO PARA INTERVENCIÓN

Nº	CIV	EJE	DESDE	HASTA	ELEMENTO	UPZ	BARRIO
1	14000772	KR 25A	AC 6	CL 6BIS	CALZADA	LA SABANA	RICAURTE
2	14000741	KR 25A	CL 6BIS	CL 6A	CALZADA	LA SABANA	RICAURTE
3	14000718	KR 25A	CL 6A	CL 7	CALZADA	LA SABANA	RICAURTE
4	14001678	KR 25A	CL 7	CL 7BIS	CALZADA	LA SABANA	RICAURTE
5	14001545	CL 1ABIS	AC 1	KR 26	CALZADA	SANTA ISABEL	SANTA ISABEL SUR
6	14001619	CL 1C	KR 19A	KR 19BBIS	CALZADA	SANTA ISABEL	EDUARDO SANTOS
7	14001616	CL 1C	KR 19BBIS	KR 19C	CALZADA	SANTA ISABEL	EDUARDO SANTOS
8	14001469	CL 1F	KR 24A	KR 24B	CALZADA	SANTA ISABEL	EL VERGEL
9	14001481	CL 1F	KR 24	KR 24A	CALZADA	SANTA ISABEL	EL VERGEL
10	14001156	CL 2B	KR 25A	KR 26	CALZADA	SANTA ISABEL	SANTA ISABEL
11	14001517	KR 26	CL 1ABIS	CL 1B	CALZADA	SANTA ISABEL	SANTA ISABEL SUR
12	14001506	KR 18	CL 2A	CL 3	CALZADA	SANTA ISABEL	EDUARDO SANTOS
13	14001265	KR 25	CL 2	CL 2A	CALZADA	SANTA ISABEL	EL VERGEL
14	14000126	KR 24	CL 22A	DG 22B BIS	CALZADA	LA SABANA	SAMPER MENDOZA
15	14001058	KR 26	CL 2C	CL 3	CALZADA	SANTA ISABEL	SANTA ISABEL
16	14000565	CL 12	KR 20A	KR 21	CALZADA	LA SABANA	LA SABANA
17	14000573	CL 12	KR 20	KR 20A	CALZADA	LA SABANA	LA SABANA
18	14000282	CL 15	KR 27	KR 28A	CALZADA	LA SABANA	PALOQUEMAO
19	14000205	CL 17	KR 28A	KR 30	CALZADA	LA SABANA	PALOQUEMAO
20	14001367	CL 1B	KR 27A	KR 28	CALZADA	LA SABANA	SANTA ISABEL
21	14000550	CL 12A	KR 20	KR 21	CALZADA	LA SABANA	LA SABANA

FUENTE: CON & CON SAS / CO-137-2019

3. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

3.1 ANTICIPO

En el cuadro 5 se muestra el plan detallado de la inversión del anticipo que fue aprobado por parte de la interventoría, en donde se observa que corresponde al 30% del valor total del contrato, es decir $ 1.631.365.371,60.

El día 16 de Enero del 2020 se celebró el contrato de fiducia mercantil irrevocable para la administración de los recursos recibidos a título de anticipo, entre Consultoría y Construcción Con&Con S.A.S y Alianza Fiduciaria S.A., denominado FIDEICOMISO CON

& CON – MARTIRES 2, el cual para efectos legales se identificará con el Nit. 830.053.812-2.

La finalidad del contrato de fiducia mercantil se describe en los siguientes literales:

A. La transferencia del Fideicomitente a la Fiduciaria de los recursos recibidos por concepto de anticipo, a titulo de fiducia mercantil. Estos recursos son girados directamente por parte de la entidad estatal a la fiduciaria.
B. La administración de los recursos recibidos de acuerdo a los términos y condiciones establecidos en el contrato.
C. La realización de los giros ordenados por el Fideicomitente con la aprobación del Interventor y/o Supervisor del Contrato Estatal, siempre y cuando tales giros correspondan exclusivamente a los rubros previstos en el Plan de Utilización o de Inversión del Anticipo.
D. La transferencia a la Entidad Estatal por parte de la Fiduciaria de los recursos entregados por concepto de Anticipo así como sus remanentes cuando la Entidad Estatal le notifiquen el acto administrativo en que se declare la terminación unilateral o anticipada del Contrato Estatal, la caducidad administrativa o la nulidad del Contrato Estatal.

CUADRO 5: PLAN DETALLADO INVERSIÓN DEL ANTICIPO

VALOR DEL CONTRATO:			$ 5.437.884.572,00
ANTICIPO:	30 % Del Valor del Contrato .		$ 1.631.365.371,60
(-)TOTAL DESCUENTOS			-$ 133.608.824,00
	VALOR NETO A GIRAR DEL ANTICIPO		**$ 1.497.756.547,60**
1 ESTUDIOS Y DISEÑOS		8,8132%	$ 132.000.000,00
	Subtotal	8,8132%	$ 132.000.000,00
2 MATERIALES GRANULARES		12,7524%	$ 191.000.000,00
	Subtotal	12,7524%	$ 191.000.000,00
3 ASFALTO		35,8536%	$ 537.000.000,00
	Subtotal	35,8536%	$ 537.000.000,00
4 CONCRETOS		17,3593%	$ 260.000.000,00
	Subtotal	17,3593%	$ 260.000.000,00
5 EQUIPO Y TRANSPORTE		15,8742%	$ 237.756.547,60
	Subtotal	15,8742%	$ 237.756.547,60
6 DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES		9,3473%	$ 140.000.000,00
	Subtotal	9,3473%	$ 140.000.000,00
	Total	**100,00%**	**$ 1.497.756.547,60**

FUENTE: CON & CON SAS / CO-137-2019

3.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

Este informe corresponde al periodo comprendido entre el 25 de febrero y el 24 de marzo 2020, donde se realizaron las siguientes actividades:

REGISTRO FOTOGRAFICO INICIAL DE LOS SEGMENTOS VIALES PRIORIZADOS

A continuación, se muestran las fotos iniciales de cada CIV:

REGISTRO FOTOGRAFICO INICIAL - SEGMENTOS A INTERVENIR

CIV	14000772
DIRECCIÓN:	KR 25A ENTRE AC 6 Y CL 6BIS
UPZ:	LA SABANA
BARRIO:	RICAURTE
FECHA:	20-mar.-20

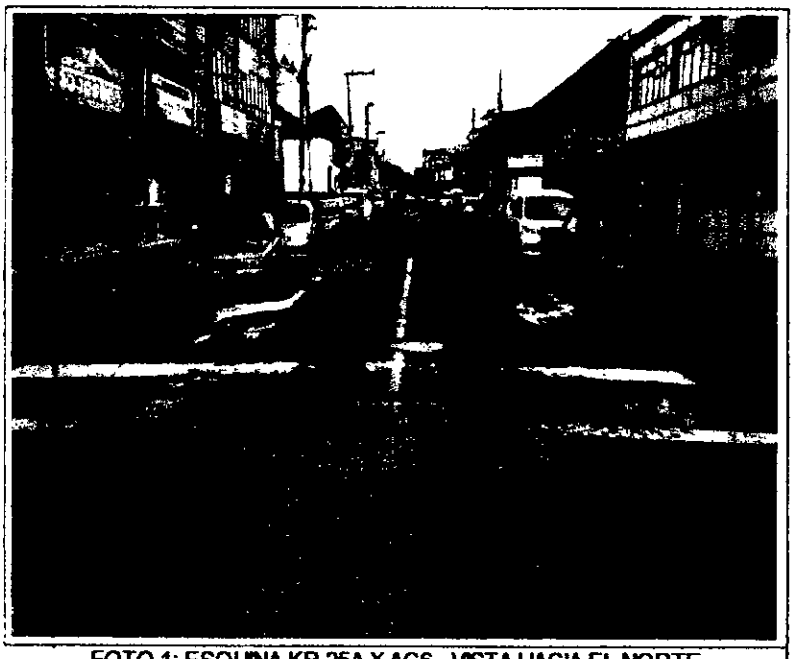


FOTO 1: ESQUINA KR 25A X AC6 - VISTA HACIA EL NORTE



FOTO 2: ESQUINA KR 25A X CL 6BIS - VISTA HACIA EL SUR

REGISTRO FOTOGRAFICO INICIAL - SEGMENTOS A INTERVENIR

CIV	14000741
DIRECCIÓN:	KR 25A ENTRE CL 6BIS Y CL 6A
UPZ:	LA SABANA
BARRIO:	RICAURTE
FECHA:	20-mar.-20



FOTO 1: ESQUINA KR 25A X CL 6 BIS - VISTA HACIA EL NORTE

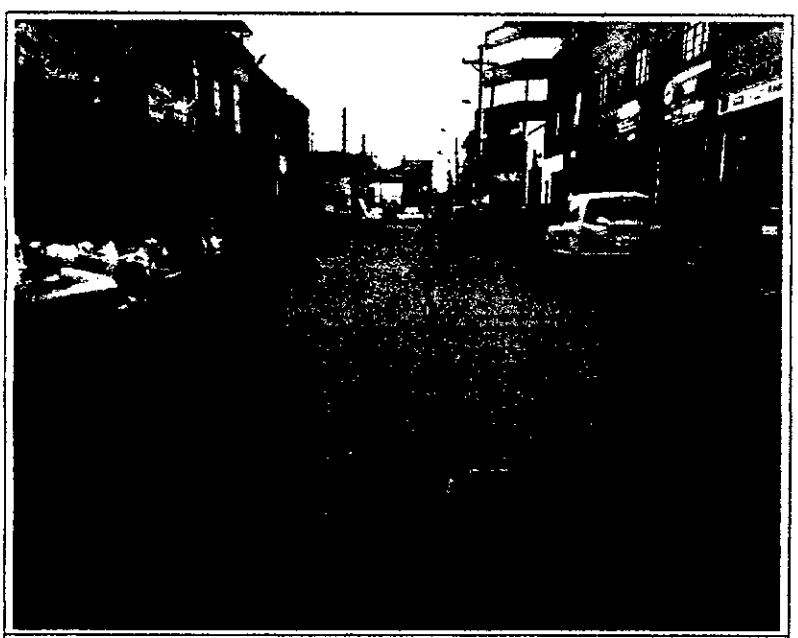


FOTO 2: ESQUINA KR 25A X CL 6A - VISTA HACIA EL SUR

REGISTRO FOTOGRAFICO INICIAL - SEGMENTOS A INTERVENIR

CIV	14000718
DIRECCIÓN:	KR 25A ENTRE CL 6A Y CL 7
UPZ:	LA SABANA
BARRIO:	RICAURTE
FECHA:	20-mar.-20



FOTO 1: ESQUINA KR 25A X CL 6A - VISTA HACIA EL NORTE



FOTO 2: ESQUINA KR 25A X CL 7 - VISTA HACIA EL SUR

9 494 661

REGISTRO FOTOGRAFICO INICIAL - SEGMENTOS A INTERVENIR

CIV	14001678
DIRECCIÓN:	KR 25A ENTRE CL 7 Y CL 7BIS
UPZ:	LA SABANA
BARRIO:	RICAURTE
FECHA:	20-mar.-20

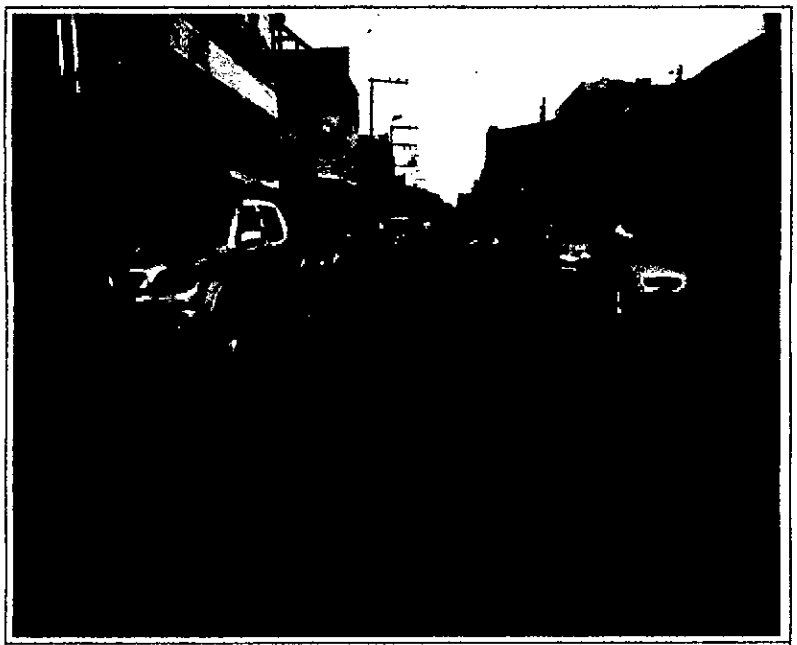


FOTO 1: ESQUINA KR 25A X CL 7 - VISTA HACIA EL NORTE



FOTO 2: ESQUINA KR 25A X CL 7BIS - VISTA HACIA EL SUR

REGISTRO FOTOGRAFICO INICIAL - SEGMENTOS A INTERVENIR

CIV	14001545
DIRECCIÓN:	CL 1ABIS ENTRE AC 1 Y KR 26
UPZ:	SANTA ISABEL
BARRIO:	SANTA ISABEL SUR
FECHA:	20-mar.-20

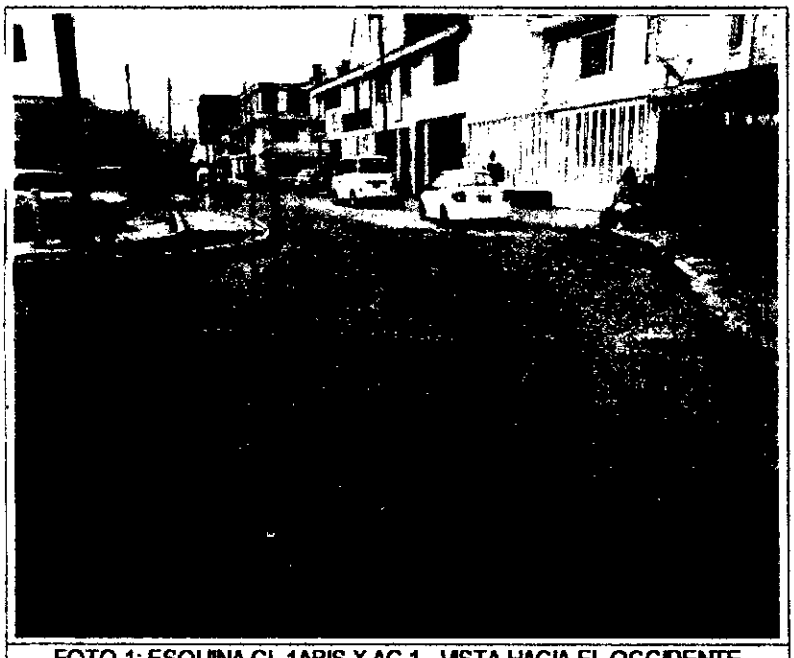


FOTO 1: ESQUINA CL 1ABIS X AC 1 - VISTA HACIA EL OCCIDENTE



FOTO 2: ESQUINA CL 1ABIS X KR 26 - VISTA HACIA EL ORIENTE

REGISTRO FOTOGRAFICO INICIAL - SEGMENTOS A INTERVENIR

CIV	14001619
DIRECCIÓN:	CL 1C ENTRE KR 19A Y KR 19BBIS
UPZ:	SANTA ISABEL
BARRIO:	EDUARDO SANTOS
FECHA:	20-mar.-20

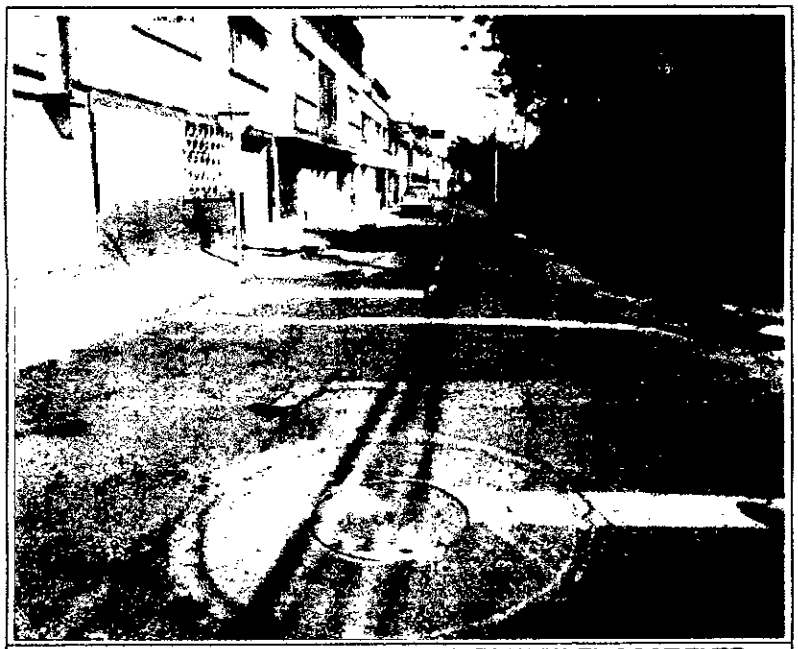


FOTO 1: ESQUINA CL 1C X KR 19A - VISTA HACIA EL OCCIDENTE

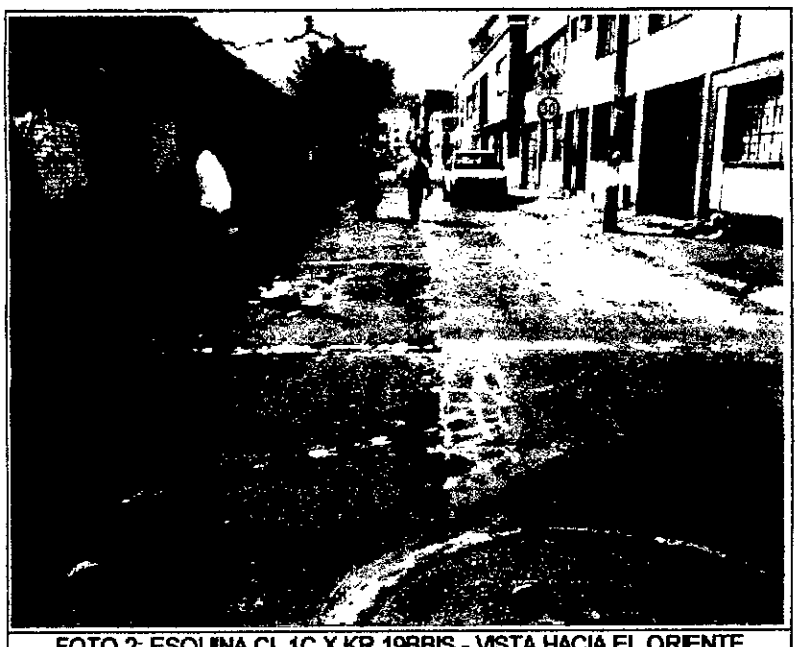


FOTO 2: ESQUINA CL 1C X KR 19BBIS - VISTA HACIA EL ORIENTE

REGISTRO FOTOGRAFICO INICIAL - SEGMENTOS A INTERVENIR

CIV	14001616
DIRECCIÓN:	CL 1C ENTRE KR 19BBIS Y KR 19C
UPZ:	SANTA ISABEL
BARRIO:	EDUARDO SANTOS
FECHA:	20-mar.-20



FOTO 1: ESQUINA CL 1C X KR 19C - VISTA HACIA EL ORIENTE



FOTO 2: ESQUINA CL 1C X KR 19BBIS - VISTA HACIA EL OCCIDENTE

4 496 663

REGISTRO FOTOGRAFICO INICIAL - SEGMENTOS A INTERVENIR

CIV	14001469
DIRECCIÓN:	CL 1F ENTRE KR 24A Y KR 24B
UPZ:	SANTA ISABEL
BARRIO:	EL VERGEL
FECHA:	20-mar.-20



FOTO 1: ESQUINA CL 1F X KR 24B - VISTA HACIA EL ORIENTE

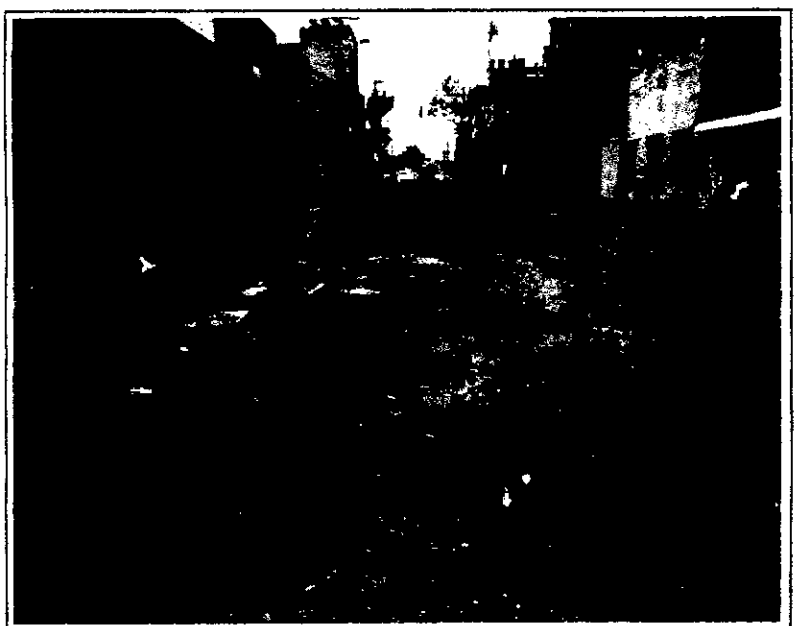


FOTO 2: ESQUINA CL 1F X KR 24A - VISTA HACIA EL OCCIDENTE

REGISTRO FOTOGRAFICO INICIAL - SEGMENTOS A INTERVENIR

CIV	14001481
DIRECCIÓN:	CL 1F ENTRE KR 24 Y KR 24A
UPZ:	SANTA ISABEL
BARRIO:	EL VERGEL
FECHA:	20-mar.-20



FOTO 1: ESQUINA CL 1F X KR 24A - VISTA HACIA EL ORIENTE

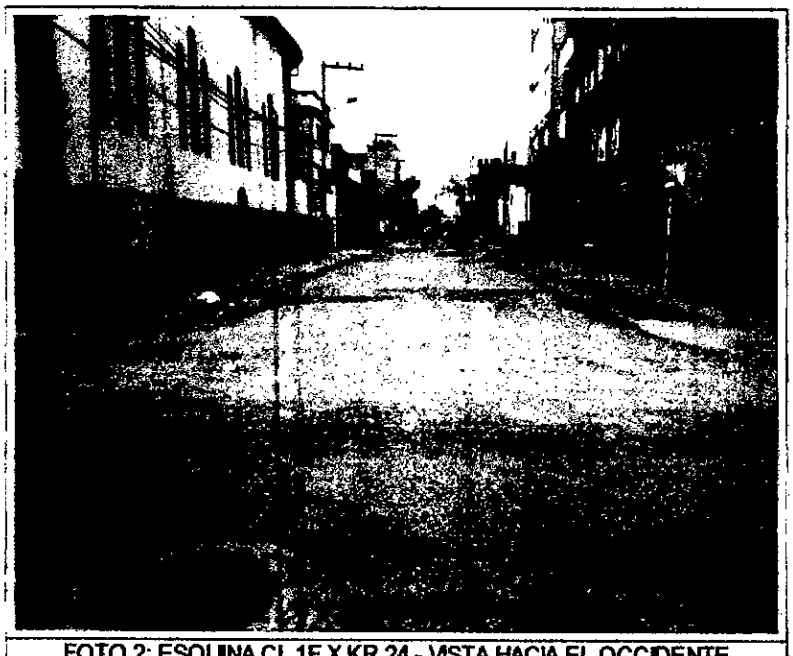


FOTO 2: ESQUINA CL 1F X KR 24 - VISTA HACIA EL OCCIDENTE

REGISTRO FOTOGRAFICO INICIAL - SEGMENTOS A INTERVENIR

CIV	14001156
DIRECCIÓN:	CL 2B ENTRE KR 25A Y KR 26
UPZ:	SANTA ISABEL
BARRIO:	SANTA ISABEL
FECHA:	20-mar.-20

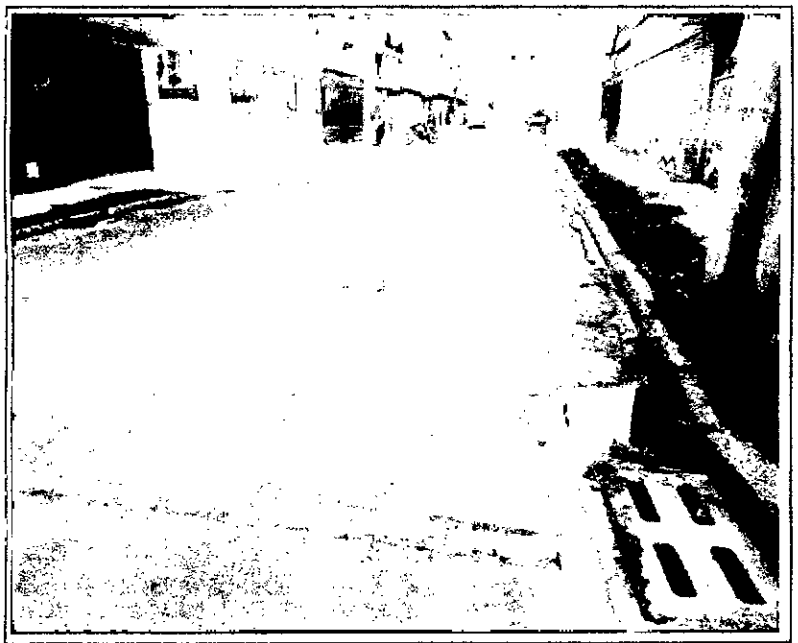


FOTO 1: ESQUINA CL 2B X KR 26 - VISTA HACIA EL ORIENTE

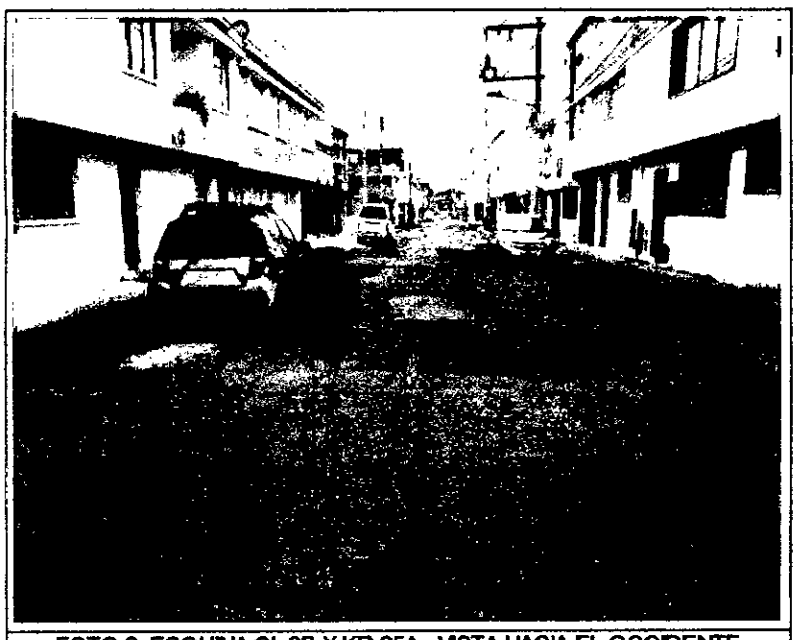


FOTO 2: ESQUINA CL 2B X KR 25A - VISTA HACIA EL OCCIDENTE

REGISTRO FOTOGRAFICO INICIAL - SEGMENTOS A INTERVENIR

CIV	14001517
DIRECCIÓN:	KR 26 ENTRE CL 1ABIS Y CL 1B
UPZ:	SANTA ISABEL
BARRIO:	SANTA ISABEL SUR
FECHA:	20-mar.-20

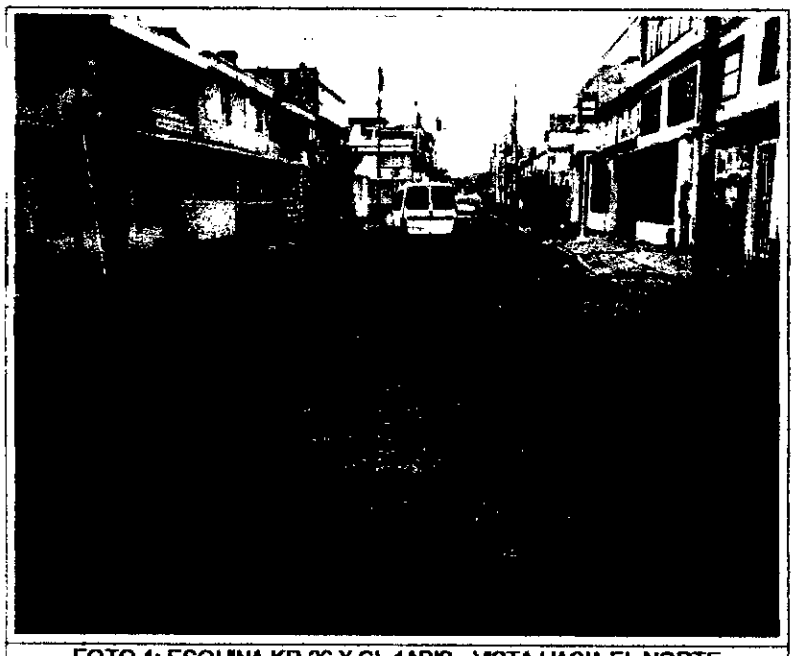


FOTO 1: ESQUINA KR 26 X CL 1ABIS - VISTA HACIA EL NORTE

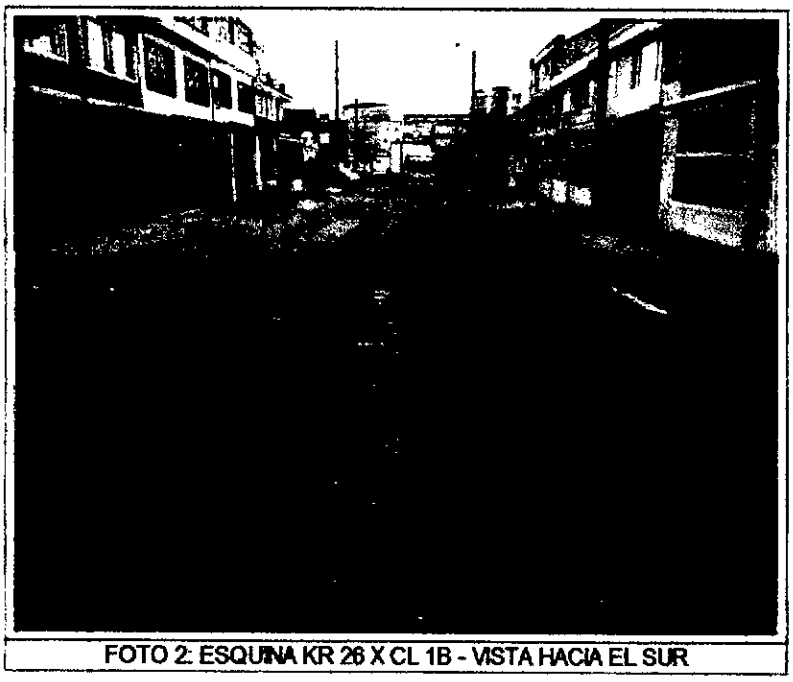


FOTO 2: ESQUINA KR 26 X CL 1B - VISTA HACIA EL SUR

REGISTRO FOTOGRAFICO INICIAL - SEGMENTOS A INTERVENIR

CIV	14001506
DIRECCIÓN:	KR 18 ENTRE CL 2A Y CL 3
UPZ:	SANTA ISABEL
BARRIO:	EDUARDO SANTOS
FECHA:	20-mar.-20



FOTO 1: ESQUINA KR 18 X CL 2A - VISTA HACIA EL NORTE

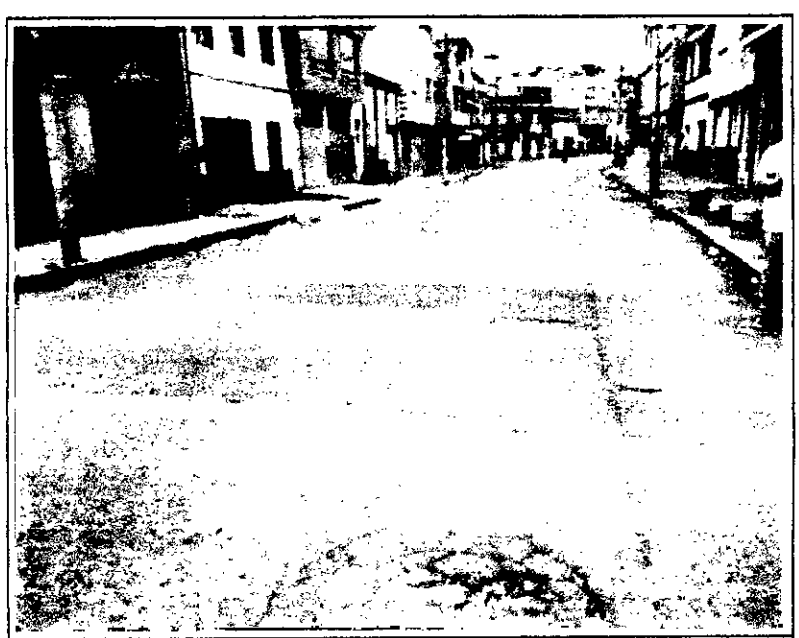


FOTO 2: ESQUINA KR 18 X CL 3 - VISTA HACIA EL SUR

REGISTRO FOTOGRAFICO INICIAL - SEGMENTOS A INTERVENIR

CIV	14001265
DIRECCIÓN:	KR 25 ENTRE CL 2 Y CL 2A
UPZ:	SANTA ISABEL
BARRIO:	EL VERGEL
FECHA:	20-mar.-20

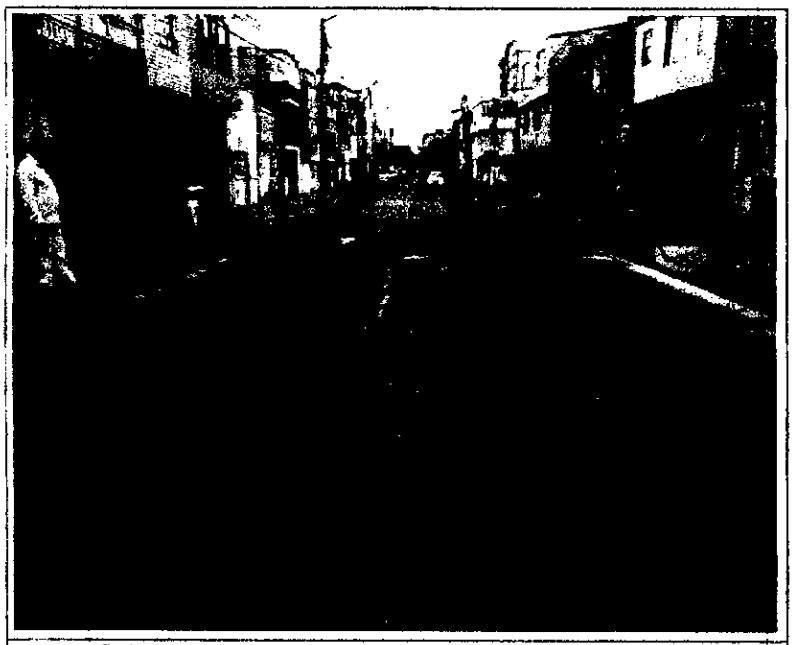


FOTO 1: ESQUINA KR 25 X CL 2 - VISTA HACIA EL NORTE

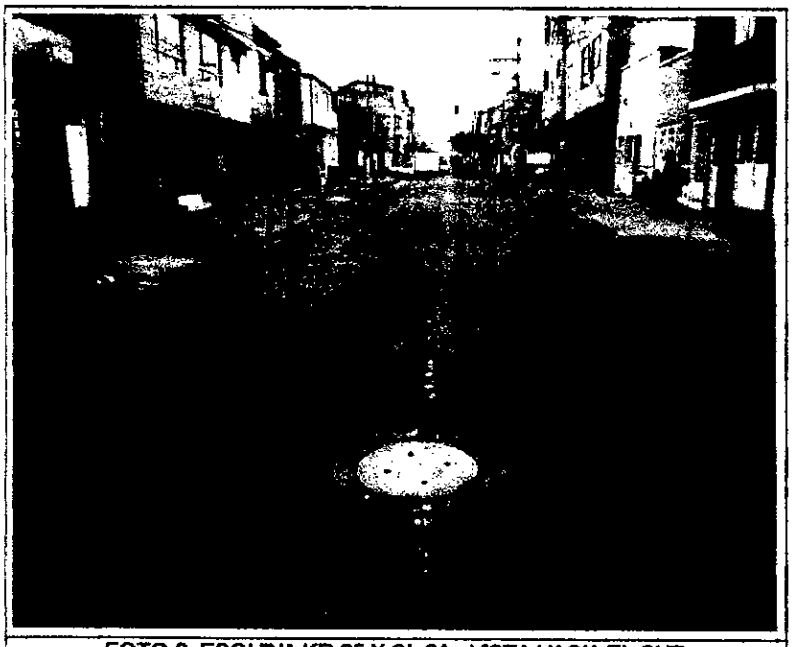


FOTO 2: ESQUINA KR 25 X CL 2A - VISTA HACIA EL SUR

666

REGISTRO FOTOGRAFICO INICIAL - SEGMENTOS A INTERVENIR

CIV	14000126
DIRECCIÓN:	KR 24 ENTRE CL 22A Y DG 22B BIS
UPZ:	LA SABANA
BARRIO:	SAMPER MENDOZA
FECHA:	20-mar.-20



FOTO 1: ESQUINA KR 24 X CL 22A - VISTA HACIA EL NORTE



FOTO 2: ESQUINA KR 24 X DG 22B BIS - VISTA HACIA EL SUR

REGISTRO FOTOGRAFICO INICIAL - SEGMENTOS A INTERVENIR

CIV	14001058
DIRECCIÓN:	KR 26 ENTRE CL 2C Y CL 3
UPZ:	SANTA ISABEL
BARRIO:	SANTA ISABEL
FECHA:	20-mar.-20

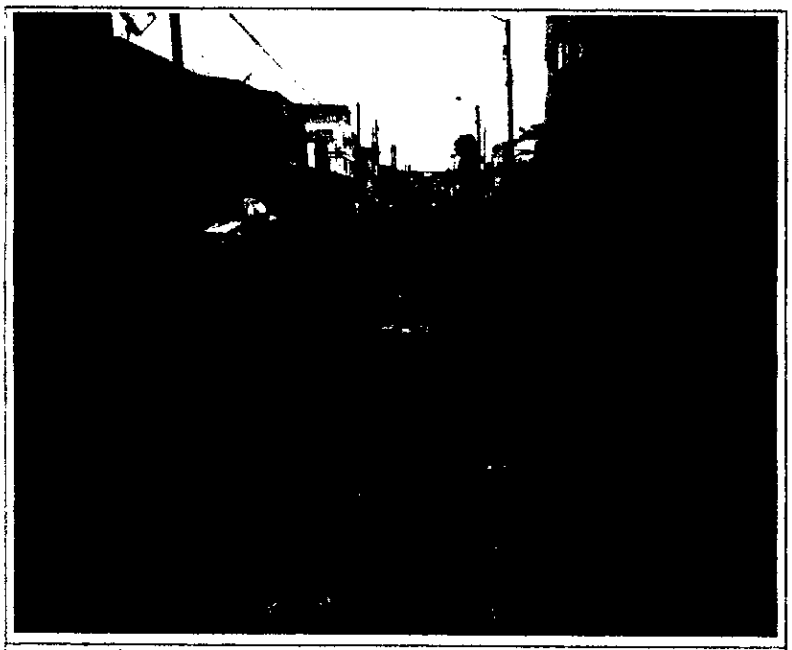


FOTO 1: ESQUINA KR 26 X CL 3 - VISTA HACIA EL SUR



FOTO 2: ESQUINA KR 26 X CL 2C - VISTA HACIA EL NORTE

18 800 667

REGISTRO FOTOGRAFICO INICIAL - SEGMENTOS A INTERVENIR

CIV	14000282
DIRECCIÓN:	CL 15 ENTRE KR 27 Y KR 28A
UPZ:	LA SABANA
BARRIO:	PALOQUEMAO
FECHA:	20-mar.-20

INDUA)



FOTO 1: ESQUINA CL 15 X KR 28A - VISTA HACIA EL ORIENTE



FOTO 2: ESQUINA CL 15 X KR 27 - VISTA HACIA EL OCCIDENTE

REGISTRO FOTOGRAFICO INICIAL - SEGMENTOS A INTERVENIR

CIV	14000205
DIRECCIÓN:	CL 17 ENTRE KR 28A Y KR 30
UPZ:	LA SABANA
BARRIO:	PALOQUEMAO
FECHA:	20-mar.-20



FOTO 1: ESQUINA CL 17 X KR 28A - VISTA HACIA EL OCCIDENTE



FOTO 2: ESQUINA CL 17 X KR 30 - VISTA HACIA EL ORIENTE

16 504 668

REGISTRO FOTOGRAFICO INICIAL - SEGMENTOS A INTERVENIR

CIV	14001367
DIRECCIÓN:	CL 1B ENTRE KR 27A Y KR 28
UPZ:	LA SABANA
BARRIO:	SANTA ISABEL
FECHA:	20-mar.-20



FOTO 1: ESQUINA CL 1B X KR 27A - VISTA HACIA EL OCCIDENTE

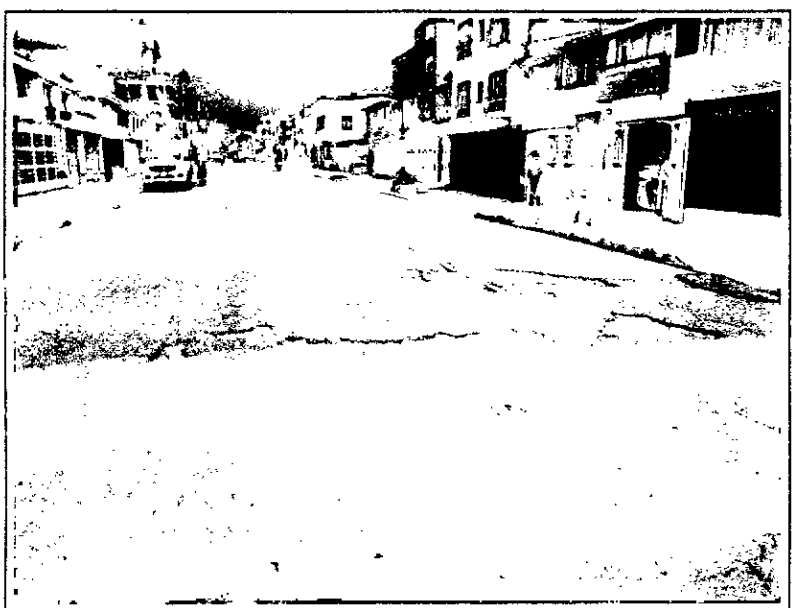


FOTO 2: ESQUINA CL 1B X KR 28 - VISTA HACIA EL ORIENTE

REGISTRO FOTOGRAFICO INICIAL - SEGMENTOS A INTERVENIR

CIV	14000550
DIRECCIÓN:	CL 12A ENTRE KR 20 Y KR 21
UPZ:	LA SABANA
BARRIO:	LA SABANA
FECHA:	20-mar.-20

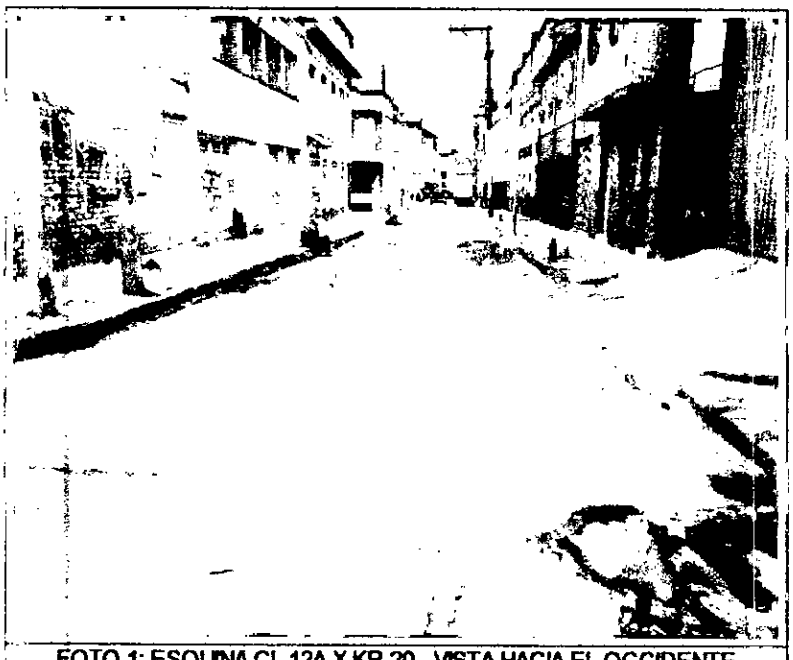


FOTO 1: ESQUINA CL 12A X KR 20 - VISTA HACIA EL OCCIDENTE



FOTO 2: ESQUINA CL 12A X KR 21 - VISTA HACIA EL ORIENTE


17, 80, 669

REGISTRO FOTOGRAFICO SOBRE EL INICIO DE LOS DIAGNOSTICOS


A continuación, se muestran las fotos de los apiques que se tomaron en cada uno de los segmentos viales:



CIV 14000772 – KR 25A entre AC 6 y CL 6Bis

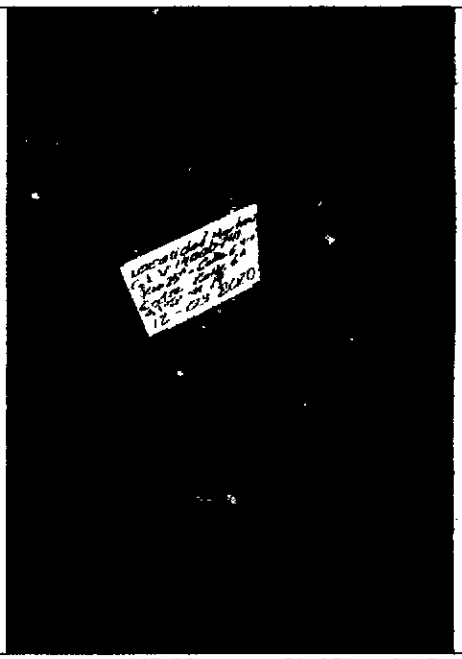

CIV 14000741 – KR 25A entre CL 6Bis y CL 6A

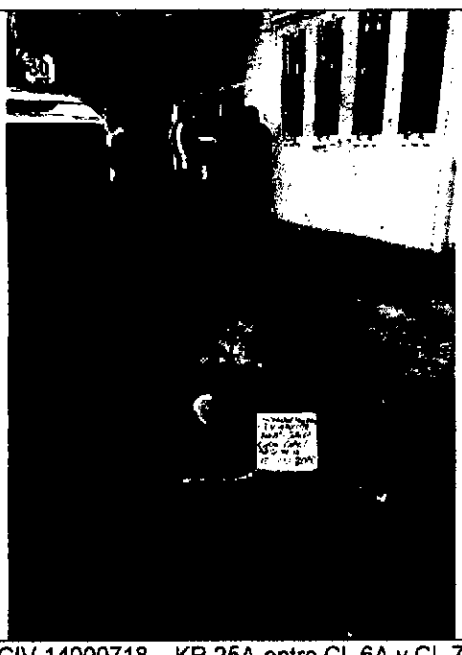


CIV 14000718 – KR 25A entre CL 6A y CL 7




CIV 14001545 – CL 1A Bis entre AC 1 y KR 26



CIV 14001619 – CL 1C entre KR 19A y KR 19B Bis

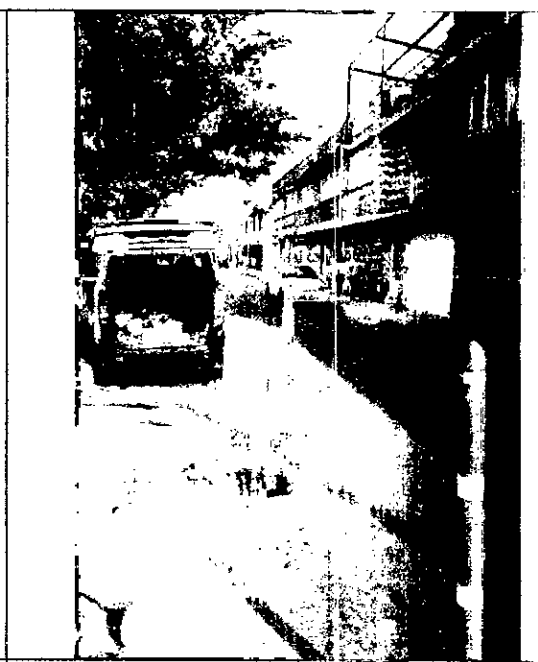




CIV 14001616 – CL 1C entre KR 19B Bis y KR 19C

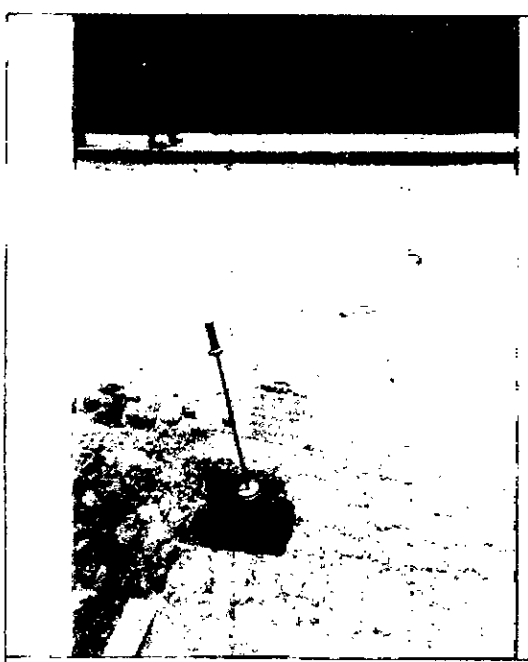


CIV 14001469 – CL 1F entre KR 24A y KR 24B



CIV 14001481 – CL 1F entre KR 24 y KR 24A

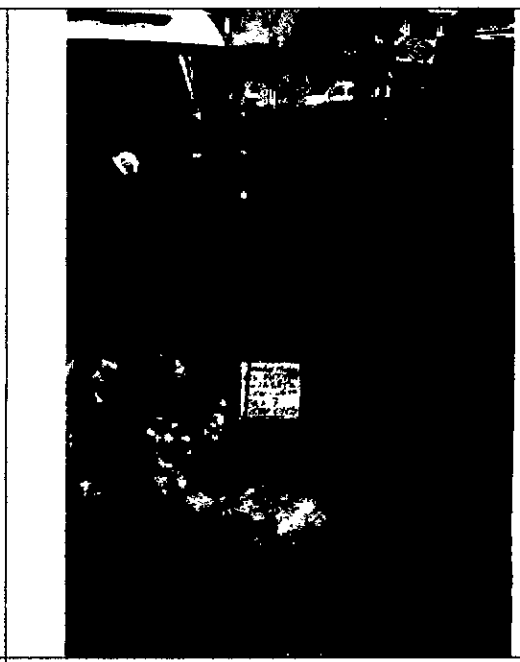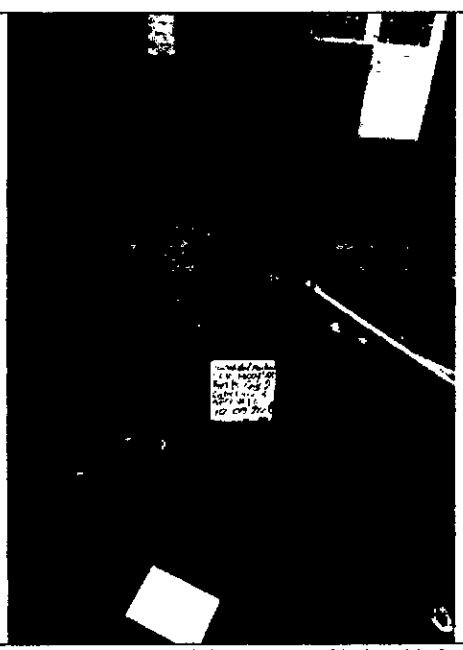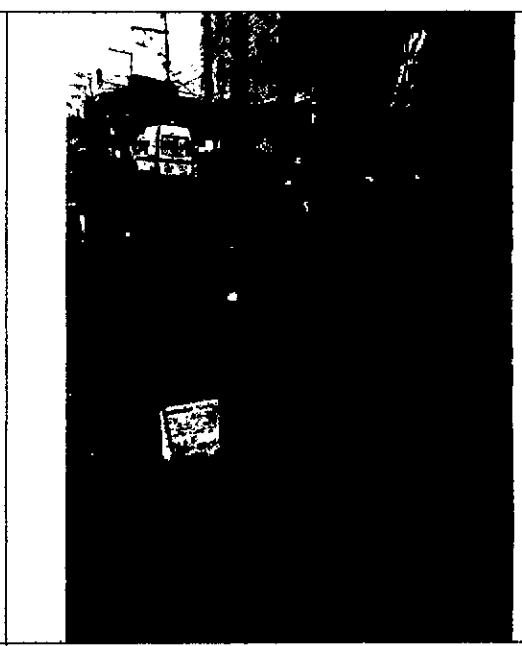	
CIV 14001156 – CL 2B entre KR 25A y KR 26	CIV 14001517 – KR 26 entre CL 1A Bis y CL 1B
	
CIV 14001506 – KR 18 entre CL 2 y CL 3	CIV 14001265 – KR 25 entre CL 2 y CL 2A

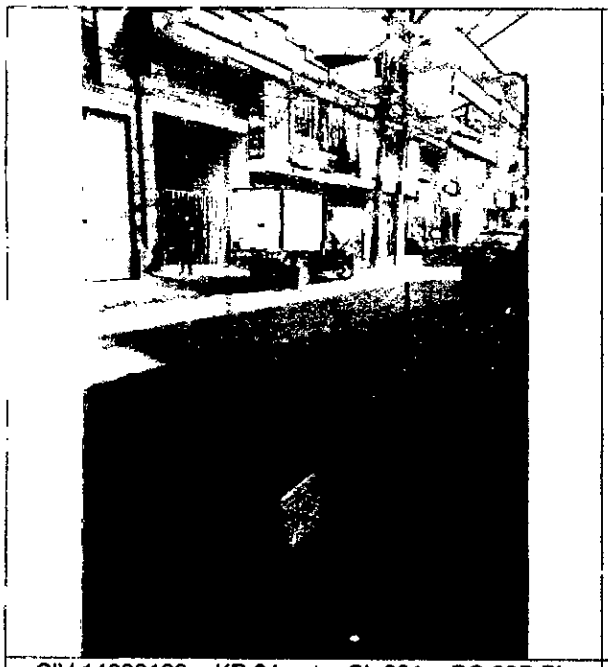

CIV 14000126 – KR 24 entre CL 22A y DG 22B Bis



CIV 14001058 – KR 26 entre CL 2C y CL 3





CIV 14000282 – CL 15 entre KR 27 y KR 28A



CIV 14000205 – CL 17 entre KR 28A y KR 30

19
504
671

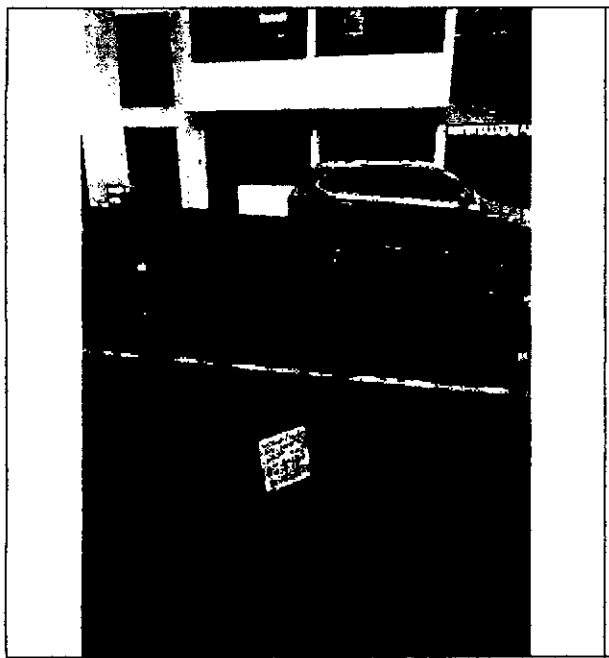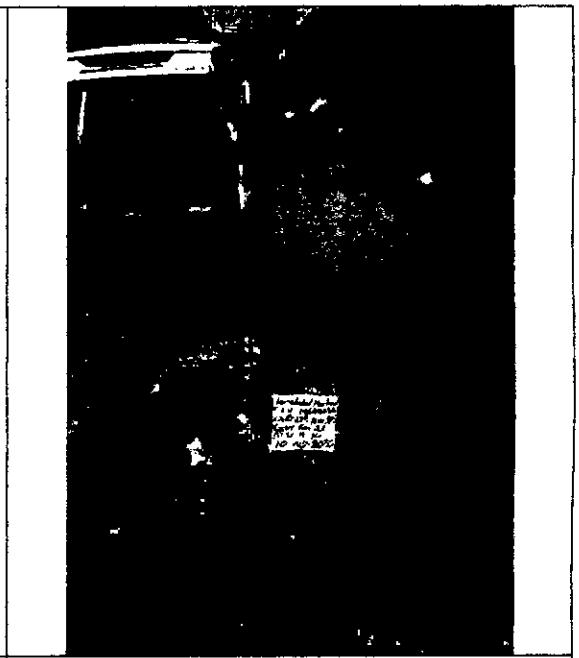	
CIV 14001367 – CL 1B entre KR 27A y KR 28	CIV 14000550 – CL 12A entre KR 20 y KR 21

4. CONCLUSIONES

- El registro fotográfico de los 21 CIV muestra es estado actual de los segmentos viales, observándose que 15 de estos son de pavimento flexible y los 6 restantes de pavimento rígido; además de esto también se puede analizar que 5 segmentos pertenecen a rutas SITP, los cuales tienen los códigos: 14001469, 14001481, 14001517, 14001545 y 14001058.

- A través del Decreto 090 de 2020 se limitó totalmente la libre circulación de personas y vehículos en el territorio del Distrito desde el día 19 de marzo del presente año, lo cual motivó la suspensión de actividades del contrato desde ese mismo 19 de marzo y que a su vez, el día 24 de marzo de 2020, a través de la plataforma SECOP II, se suspendiera el contrato de obra pública 137 de 2019 por un (1) mes a partir del 24 de marzo de 2020, para un posible reinicio a partir del 24 de abril de 2020, dependiendo de la duración del estado de emergencia económica, social y ecológica derivada de la pandemia covid-19.

- Se llevó a cabo la primera entrega formal de las hojas de vida del personal de la plantilla mínima requerida a la interventoría para su respectiva revisión, la cuales fueron devueltas con observaciones, que en este momento se están subsanando.

- El informe de inventario y diagnóstico superficial del pavimento para el listado inicial de CIV´s se encuentra en proceso de elaboración.

- El recorrido inicial del contrato con el delegado de la EAAB Luis Francisco Rodríguez quedo aplazado de manera temporal debido a que tuvo problemas de salud, y por otro lado se han tenido inconvenientes para reprogramarlo por temas de la cuarentena generada por el covid-19.

POLIZAS ACTUALIZADAS AL 05 DE MARZO DEL 2020

SEGURO
CUMPLIMIENTO ESTATAL

equidad seguros

CODIGO DE RECAUDO 111071020451

PÓLIZA AA07805

FACTURA AA023451

N.I.T 860028415

INFORMACIÓN GENERAL

COD. PRODUCTO [illegible] PRODUCTO CUMPLIMIENTO ESTATAL

COD. AGENCIA [illegible] CERTIFICADO AA021162 DOCUMENTO [illegible] TEL [illegible]

AGENCIA [illegible] DIRECCIÓN [illegible]

FECHA DE EXPEDICIÓN			VIGENCIA DE LA PÓLIZA					FECHA DE IMPRESIÓN
28	02	2020	DESDE	25	02	2020	HORA 00:00	03 2020
			HASTA	24	03	2025	HORA 12:00	

DATOS GENERALES

TOMADOR	[illegible]			NIT/CC	830041411
DIRECCIÓN	[illegible]	E-MAIL	CONTABILIDAD@CONYCON.COM.CO	TEL/MOVIL	4821681
ASEGURADO	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES			NIT/CC	899999061
DIRECCIÓN	AV CALLE 26 # 9-78 ESPACIO ELEMENTO TORRE 1 P3	E-MAIL	WWW.BOGOTA.GOV.CO	TEL/MOVIL	3759535
BENEFICIARIO	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES			NIT/CC	899999061
DIRECCIÓN	AV CALLE 26 # 9-78 ESPACIO ELEMENTO TORRE 1 P3	E-MAIL	WWW.BOGOTA.GOV.CO	TEL/MOVIL	3759535
AFIANZADO	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS			NIT/CC	830041411
DIRECCIÓN	[illegible]	E-MAIL	CONTABILIDAD@CONYCON.COM.CO	TEL/MOVIL	4821681

INFORMACIÓN RIESGO ASEGURADO

DESCRIPCIÓN	DETALLE
CIUDAD	BOGOTA D.C.
DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA
LOCALIDAD	MARTIRES
BARRIO	MARTIRES
OBJETO DEL CONTRATO	EJECUCIÓN OBRAS Y REPARACIONES

INFORMACIÓN RIESGO ASEGURADO

GARANTÍAS OTORGADAS	VALOR AFIANZADO
[illegible]	$1,631,[illegible],371.65
[illegible]	$1,631,[illegible],371.65
[illegible]	$948,[illegible],477.23
[illegible]	$1,631,[illegible],371.65

VIGENCIAS GARANTÍA

FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	DIAS DE VIGENCIA
[illegible]	[illegible]	365
[illegible]	[illegible]	365
[illegible]	[illegible]	1337
[illegible]	[illegible]	1826

VALOR ASEGURADO TOTAL [illegible]

NUMERO DE RIESGOS

PRIMA NETA	GASTOS	IVA	TOTAL POR PAGAR
$	$	$	

FORMA DE PAGO [illegible]

ENTIDAD BANCARIA

COASEGURO

COMPAÑIA	PARTICIPACIÓN
	%

INTERMEDIARIO Y/O FUERZA COMERCIAL DIRECTA

CÓDIGO	NOMBRE	PARTICIPACIÓN
[illegible]	[illegible]	%

[illegible] el pago de la prima o certificados que se expidan con fundamento en ella producirá la terminación automática de los [illegible] derecho a La Equidad Seguros O.C. para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato. El [illegible] eventual de la prima, no dará derecho para reactivar la póliza terminada automáticamente, caso en el cual se devolverá la prima que haya lugar.

Con la firma del presente documento certifico que he leído de manera anticipada en la página web de La Equidad [illegible] el clausulado aplicable a la póliza contratada, el cual acepto plenamente y me fue explicado por la compañía de seguros [illegible] información que es todo cierto, fiel y que conozco y entiendo, dando cumplimiento a lo establecido en especial lo relacionado con las condiciones generales, el contenido de la cobertura, sus exclusiones y las garantías del contrato de seguro. De igual forma en el evento que con posterioridad certifico que me fue entregada la [illegible] de esta misma y yo cerré con anterioridad a la póliza.

CLAUSULADO Y

FIRMA AUTORIZADA
LA EQUIDAD SEGUROS O.C.

FIRMA TOMADOR

APROBADO CLAUSULADO PARA COMERCIALIZACIÓN [illegible] PRODUCTO CONTRATADO CONSULTE NUESTRA PÁGINA [illegible] WWW.EQUIDADSEGUROS.COOP

VIGILADO [illegible]

506
673

SEGURO
CUMPLIMIENTO ESTATAL

CODIGO DE RECAUDO
111071020451

PÓLIZA
AA007885

FACTURA
AA020451

equidad seguros

INFORMACIÓN GENERAL

COD. PRODUCTO 0403 PRODUCTO CUMPLIMIENTO ESTATAL
COD. AGENCIA 80371 CERTIFICADO AA021182 DOCUMENTO Modificación TEL: 7039828
AGENCIA FRANQUICIA AGENCIA DE SEGUROS BERACA Y CIA LTDA DIRECCIÓN CRA 28 NRO 62-69 PISO TERCERO

FECHA DE EXPEDICIÓN			VIGENCIA DE LA PÓLIZA							FECHA DE IMPRESIÓN		
05	03	2020	DESDE	25	02	2020	HORA	00:00		05	03	2020
			HASTA	24	09	2025	HORA	12:00				

DATOS GENERALES

TOMADOR CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS
DIRECCIÓN AK 7 NO. 127-46 OFC 1008 E-MAIL CONTABILIDAD@CONYCON.COM.CO NIT/CC #30041411 TEL/MOVIL 4821581

TEXTOS Y/O OBSERVACIONES DE LA PÓLIZA

ESTA PÓLIZA SE RIGE POR LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA FORMA1408201 8-1501-P-05-00000000000000403-D100, EL CUAL SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE REGISTRADO POR LA EQUIDAD SEGUROS O.C ANTE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA, PARA SU CONSULTA FAVOR INGRESAR A www.lasequidadseguros.coop.

EL PRESENTE SEGURO Y LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ÉL, NO EXPIRARÁN POR MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA, NI PODRÁN
SER REVOCADOS UNILATERAL POR EL TOMADOR O AFIANZADO DE LA PÓLIZA O DE LA ASEGURADORA.

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, ARTÍCULO 2.2.1.2.3.2.5.

OBJETO:
GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EL BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO, PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIÓN
LABORAL Y LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CO- 137-2019 CELEBRADO EN LA PLATAFORMA SECOP II CUYO OBJETO ES CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA
VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES.

NOTA: LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA ES DE 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO
DEFINITIVO A SATISFACCIÓN DE LAS OBRAS POR PARTE DE LA ENTIDAD .

ASEGURADO/BENEFICIARIO. FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES NIT MIT 899.999.061 - 9

***MODIFICACIÓN ***
POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO Y SEGÚN ACTA DE INICIO DEL 25 DE FEBRERO DE 2020, SE MODIFICA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS ARRIBA CITADOS.

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINÚAN VIGENTES.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FIRMA AUTORIZADA
LA EQUIDAD SEGUROS O.C.

FIRMA TOMADOR

APRECIADO CLIENTE PARA MAYOR INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CONTRATADO CONSULTE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.LASEQUIDADSEGUROS.COOP
Línea Segura 018000419030
#824

SEGURO
R.C.E. ENTIDAD ESTATAL

equidad seguros

PÓLIZA AA007637

FACTURA AA020455

NIT 860028415

INFORMACIÓN GENERAL
DOCUMENTO
CERTIFICADO
AGENCIA
PRODUCTO R.C.E. ENTIDAD ESTATAL
FORMA DE PAGO Contado
TELEFONO
DIRECCIÓN CRA 28 NRO 63-B-1 PISO TERCERO
ORDEN
USUARIO

FECHA DE EXPEDICIÓN			VIGENCIA DE LA POLIZA					FECHA DE IMPRESIÓN		
25	03	2020	DESDE	25	03	2020	HORA	00:00	03	2020
			HASTA	24	09	2020	HORA	12:00		

DATOS GENERALES
TOMADOR
DIRECCION
ASEGURADO
DIRECCIÓN
BENEFICIARIO
DIRECCIÓN
EMAIL
EMAIL WWW.BOGOTA.GOV.CO
EMAIL
NIT/CC
TELMOVIL
NIT/CC
TELMOVIL
NIT/CC
TELMOVIL

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

DETALLE	DESCRIPCIÓN
	BOGOTA D.C. CUNDINAMARCA MARTIRES MARTIRES FRANQUICIA

COBERTURAS Y VALOR ASEGURADO

DESCRIPCIÓN	VALOR ASEGURADO	DEDUCIBLE %	DEDUCIBLE VALOR	PRIMA
				$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

VALOR ASEGURADO TOTAL	PRIMA NETA	GASTOS	IVA	TOTAL POR PAGAR
	$			$ 0

COASEGURO

COMPAÑIA	PARTICIPACIÓN %

INTERMEDIARIO Y/O FUERZA COMERCIAL DIRECTA

CÓDIGO	NOMBRE	PARTICIPACIÓN %
111534		

La mora en el pago de la prima o cuotas que se expidan con fundamento en esta propuesta la terminación automática del contrato, con derecho a La Equidad Seguros O.C. para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato. El pago efectuado con posterioridad a la fecha de la mora no revalida la mora ni revalida la póliza terminada unilateralmente, caso en el cual se devolverá la prima no devengada. Con la firma del presente documento certifico que he leído de manera anticipada en la página web de La Equidad https://www.laequidadseguros.coop/, el clausulado anexo a la póliza contratada, el cual acepto en su totalidad. Así mismo, manifiesto que he sido asesorado por la compañía de seguros, información que en todo caso declaro conocer y entender, declaro suficiente y expresamente que el presente seguro fue contratado con las condiciones pactadas, el cubrimiento de la cobertura, las exclusiones y las garantías del contrato de seguro. De igual forma, en el evento que corresponda, certifico que me fue entregada la póliza de manera física y/o certificado digital de la misma.

DEL ASEGURADO

VIGILADO

FIRMA AUTORIZADA
LA EQUIDAD SEGUROS O.C.

FIRMA TOMADOR

SEGURO
R.C.E. ENTIDAD ESTATAL

equidad seguros

NIT 860028415

PÓLIZA
AA007887

FACTURA
AA020455

INFORMACIÓN GENERAL

DOCUMENTO Modificacion — PRODUCTO R.C.E. ENTIDAD ESTATAL — ORDEN 1
CERTICADO AA021153 — FORMA DE PAGO Contado — TELEFONO 7039628 — USUARIO LMORGAN71
AGENCIA LEONARDO JOSE MUNCIA RAMIREZ — DIRECCIÓN CRA 30 NRO 83-60 PISO TERCERO

FECHA DE EXPEDICIÓN			VIGENCIA DE LA POLIZA						FECHA DE IMPRESIÓN		
05	03	2020	DESDE	25	02	2020	HORA	00:00	05	03	2020
			HASTA	24	03	2020	HORA	12:00			

DATOS GENERALES

TOMADOR CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS — NIT/CC 830041411
DIRECCIÓN AK 7 NO. 127-48 OFC 1006 — EMAIL CONTABILIDAD@CONYCON.COM.CO — TEL/ MOVIL 4021581

TEXTOS Y/O OBSERVACIONES DE LA ORDEN

ESTA PÓLIZA SE RIGE POR LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA FORMA 25-03-2315-1501-P-08-80000000001007. EL CUAL SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE REGISTRADO POR LA EQUIDAD SEGUROS O.C ANTE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. PARA SU CONSULTA FAVOR INGRESAR A www.laequidadseguros.coop.

OBJETO:
GARANTIZAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CO- 137-2019 CELEBRADO EN LA PLATAFORMA SECOP II CUYO OBJETO ES CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

ASEGURADO: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES NIT NIT 899.999.061 - 9 Y/O CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S. NIT 830041411 - 0

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS Y/O FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES NIT NIT 899.999.061 - 9

LA PRESENTE PÓLIZA AMPARO LO DESCRITOS EN EL NUMERAL 3º DEL ARTÍCULO 2.2.1.2.3.2.9 DEL DECRETO 1082 DE 2015.

- COBERTURA EXPRESA DE PERJUICIOS POR DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE.
- COBERTURA EXPRESA DE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.
- COBERTURA EXPRESA DE LA RESPONSABILIDAD SURGIDA POR ACTOS DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS, SALVO QUE EL SUBCONTRATISTA TENGA SU PROPIO SEGURO DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL, CON LOS MISMOS AMPAROS AQUÍ REQUERIDOS.
- COBERTURA EXPRESA DE AMPARO PATRONAL.
- COBERTURA EXPRESA DE VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS.

***MODIFICACIÓN ***
POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO Y SEGÚN ACTA DE INICIO DEL 25 DE FEBRERO DE 2020, SE MODIFICA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS ARRIBA CITADOS

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINÚAN VIGENTES.

FIRMA AUTORIZADA
LA EQUIDAD SEGUROS O.C.

FIRMA TOMADOR

APRECIADO CLIENTE PARA MAYOR INFORMACION DEL PRODUCTO CONTRATADO CONSULTE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.LAEQUIDADSEGUROS.COOP

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA — SOMOS SEGUROS Y NO PODEMOS DAR LA GARANTIA CONTENIDA EN LA PRESENTE POLIZA Y LA COMPAÑIA NO CUBRE EL VALOR DE LA MISMA

CORRESPONDENCIA ENVIADA

CONTRATO DE OBRA CO-137-2019					
CORRESPONDENCIA ENVIADA					
FECHA DE ELABORACIÓN	CONSECUTIVO	DESTINATARIO	ASUNTO	ELABORADO POR	FECHA DE RECIBIDO
6-feb.-20	C&C-CO137-2019-001	MIRS LATINOAMERICA S.A.S.	Respuesta comunicación MIRS-MAR 005-2019 Entrega hojas de vida	Milena Gil Baquero	7-feb.-20
12-feb -20	C&C-CO137-2019-002	MIRS LATINOAMERICA S.A.S.	Respuesta comunicación MIRS-MAR 006-2019 Entrega hojas de vida	Milena Gil Baquero	14-feb -20
21-feb -20	C&C-CO137-2019-003	MIRS LATINOAMERICA S.A.S.	Respuesta comunicación MIRS-MAR 012-2019. Entrega hojas de vida	Milena Gil Baquero	24-feb -20
9-mar.-20	C&C-CO137-2019-004	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DEL RIESGO Y CAMBIO CLIMATICO	DERECHO DE PETICION SOLICITUD DE INFORMACION Y/O POSIBLES AMPLIACIONES O RENOVACIONES	Juan Pablo Ricci Ruiz	16-mar.-20
9-mar.-20	C&C-CO137-2019-005	INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPECIALES DEL DISTRITO CAPITAL - IDECA	DERECHO DE PETICION SOLICITUD DE INFORMACION Y/O POSIBLES AMPLIACIONES O RENOVACIONES	Juan Pablo Ricci Ruiz	11-mar.-20
9-mar.-20	C&C-CO137-2019-006	CLARO	DERECHO DE PETICION SOLICITUD DE INFORMACION Y/O POSIBLES AMPLIACIONES O RENOVACIONES.	Juan Pablo Ricci Ruiz	16-mar.-20
9-mar.-20	C&C-CO137-2019-007	CODENSA S.A.	DERECHO DE PETICION SOLICITUD DE INFORMACION Y/O POSIBLES AMPLIACIONES O RENOVACIONES	Juan Pablo Ricci Ruiz	11-mar.-20
9-mar.-20	C&C-CO137-2019-008	EMPRESA DE ACUEDUCTO DE BOGOTA – ZONA 3	DERECHO DE PETICION SOLICITUD DE INFORMACION Y/O POSIBLES AMPLIACIONES O RENOVACIONES	Juan Pablo Ricci Ruiz	11-mar.-20
9-mar.-20	C&C-CO137-2019-009	GAS NATURAL FENOSA	DERECHO DE PETICION SOLICITUD DE INFORMACION Y/O POSIBLES AMPLIACIONES O RENOVACIONES.	Juan Pablo Ricci Ruiz	11-mar.-20
9-mar.-20	C&C-CO137-2019-010	MOVISTAR	DERECHO DE PETICION SOLICITUD DE INFORMACION Y/O POSIBLES AMPLIACIONES O RENOVACIONES.	Juan Pablo Ricci Ruiz	11-mar.-20
9-mar.-20	C&C-CO137-2019-011	EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA - ETB	DERECHO DE PETICION SOLICITUD DE INFORMACION Y/O POSIBLES AMPLIACIONES O RENOVACIONES.	Juan Pablo Ricci Ruiz	11-mar.-20
9-mar.-20	C&C-CO137-2019-012	UNE EPM TELECOMUNICACIONES	DERECHO DE PETICION SOLICITUD DE INFORMACION Y/O POSIBLES AMPLIACIONES O RENOVACIONES.	Juan Pablo Ricci Ruiz	16-mar.-20
9-mar.-20	C&C-CO137-2019-013	SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION - SDP	DERECHO DE PETICION SOLICITUD DE INFORMACION Y/O POSIBLES AMPLIACIONES O RENOVACIONES.	Juan Pablo Ricci Ruiz	11-mar.-20
9-mar.-20	C&C-CO137-2019-014	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA	DERECHO DE PETICION SOLICITUD DE INFORMACION Y/O POSIBLES AMPLIACIONES O RENOVACIONES	Juan Pablo Ricci Ruiz	11-mar.-20
	C&C-CO137-2019-015	ANULADO			
11-mar.-20	C&C-CO137-2019-016	MIRS LATINOAMERICA S.A.S.	Hoja de vida director de obra	Juan Pablo Ricci Ruiz	11-mar.-20
13-mar.-20	C&C-CO137-2019-017	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	SOLICITUD DE DISEÑOS DE SEÑALIZACIÓN DE SEGMENTOS VIALES	Javier Hernando Perilla Vacca	16-mar.-20
11-mar.-20	C&C-CO137-2019-018	MIRS LATINOAMERICA S.A.S.	COPIA RADICADOS OFICIOS ESP - SDM	Javier Hernando Perilla Vacca	11-mar.-20
18-mar.-20	C&C-CO137-2019-019	MIRS LATINOAMERICA S.A.S.	ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL Y SIMULACRO DISTRITAL	Juan Pablo Ricci Ruiz	18 de marzo - por correo electrónico
19-mar.-20	N/A	ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES	CONTRATO DE OBRA No 137 DE 2019	Juan Pablo Ricci Ruiz	19-mar.-20
20-mar.-20	C&C-CO137-2019-020	MIRS LATINOAMERICA S.A.S.	SOLICITUD SUSPENSIÓN CONTRATO CO-137-2019	Javier Hernando Perilla Vacca	24 de marzo - por correo electrónico

NIT 830.041.411-0

C&C-CO137-2019-020

Bogotá, 20 de marzo de 2020

Señores:
MIRS LATINOAMERICA S.A.S.
Atn. Ing. Nick Randy Almeida Gamarra
Calle 23F No. 85ª-31
Interventor
Ciudad

REFERENCIA: **CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CO 137-2019 cuyo objeto es "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALUDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES"**

ASUNTO: **SOLICITUD SUSPENSION CONTRATO CO 137-2019**

Cordial saludo,

Debido a inconvenientes por la emergencia sanitaria que presenta por la pandemia causada por el COVID-19, que afecta de manera directa la ejecución del contrato de la referencia, toda vez que por iniciativa del Gobierno Nacional y Distrital se requiere efectuar una cuarentena preventiva, solicitamos se suspenda el contrato de la referencia a partir del día de hoy 20 de marzo de 2020 hasta que las circunstancias descritas se superen y poder continuar la ejecución.

Atentamente

JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA
DIRECTOR DE OBRA - FDLM-137-2019

Gmail

Redactar

Recibidos

Destacados

Pospuestos

Enviados

Borradores

Más

Meet

Iniciar una reunión

Unirse a una reunión

Hangouts

conycon

SOLICITUD SUSPENSION 137-2019

conycon martires

Buenos días adjunto al presente los estudios efectuados por parte del Arquitecto Juan Pablo Ricci representante legal de CON&CON S.A.S para ser tramitadas ante el Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires

Cordialmente

JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA
CON&CON S.A.S

2 archivos adjuntos

Responder

Responder a todos

CON & CON
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION
NIT 830.041.411-0

Bogotá D.C, 18 de Marzo de 2020

C&C-CO137-2019-019

Señores:

MIRS LATINOAMERICA S.A.S.
Atn. Ing. Nick Randy Almeida Gamarra
Calle 23F No. 85ª-31
Interventor
Ciudad

Ref: CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CO 137-2019 cuyo objeto es "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALUDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES"

Asunto: Estado de Emergencia Nacional y Simulacro Distrital.

Apreciados Señores:

El gobierno nacional en cabeza del presidente Iván Duque, decretó el día de ayer el estado de emergencia económica y social a nivel nacional, así mismo la alcaldesa Claudia López, anuncio un simulacro de aislamiento obligatorio el cual se realizará desde el viernes 20 de marzo a las 00:00 a.m. hasta el lunes 23 de marzo a las 12:00 p.m.

Teniendo en cuenta el Estado de Emergencia Nacional y de Calamidad Publica decretada en la Ciudad de Bogotá, CON & CON SAS acoge las medidas y protocolos sugeridos por las autoridades Nacionales y Distritales, por lo cuakl sugerimos lo siguiente:

1. No abrir nuevos frentes de obra ya que, si se decretan medidas adicionales o continua el aislamiento preventivo, estos frentes quedarían expuestos a la temporada invernal que viene ocurriendo en todo el país y por otro lado incrementando la inseguridad en el sector, ya que la delincuencia puede aprovechar el cerramiento de obra para acometer sus fechorías.

2. Concentrarnos en acelerar las actividades en los frentes que tenemos en ejecución.

3. Suspender las actividades de levantamiento de las actas de vecindad, Socializaciones de PMT, talleres de sostenibilidad y reuniones de inicio y fin de los frentes de obra; esto teniendo en cuenta el aislamiento preventivo para mayores de setenta (70) años y el simulacro distrital de aislamiento, ya que consideramos que aumentaríamos el riesgo de contagio para nuestros colaboradores y para los habitantes vecinos a las obras que adelantamos.

Carrera 7 No. 127-48 Oficina 1006 Teléfonos 482 16 81 - 520 12 47 - 313 431 89 70
conycon.kenedy314@gmail.com

18/03/20 DF

4. Acatar inmediatamente las nuevas disposiciones nacionales y distritales que puedan surgir en los siguientes días, teniendo como prioridad la seguridad de nuestros colaboradores, de los vecinos de nuestras obras y en general de los ciudadanos de nuestro país.

Por último informamos que estas medidas, afecta directamente los cronogramas aprobados, por lo que solicitamos estos sean reprogramados una vez se normalice la situación nacional y se supere la emergencia por la que atraviesa nuestro país.

Quedamos a la espera de su pronunciamiento al respecto.

Cordialmente,

JUAN PABLO RICCI RUIZ
Representante Legal
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS - CON&CON SAS

C C Archivo

CON & CON
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION

NIT 830.041.411-0

6-78

Bogotá, Marzo 19 de 2020

19/3/2020 Sticker web
Alcaldia Local de Martires
R No. 2020-641-001652-2
2020-03-19 15:22 - Folios: 1 Anexos: 1
Destino: Area de Gestion de Desarr
Rem/D: CON & CON - CONSULTORIA Y

Señores:
ALCALDIA LOCAL DE LOS MARTIRES
ATN. TESORERIA
Ciudad

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No.137 DE 2019

Respetados señores:

Por medio del presente me permito solicitar que a partir de la fecha los pagos relacionados con el contrato citado en la referencia se realicen en la cuenta corriente No.3354884703-7 de Bancolombia a nombre de CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S. NIT: 830.041.411-0.

Cordialmente,

JUAN PABLO RICCI RUIZ.
Representante Legal
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS

Anexo copia Certificación Bancaría

NIT 830.041.411-0

27
54
679

C&C-137-2019-018

Bogotá, 11 de marzo de 2020

Señores:
MIRS LATINOAMERICA S.A.S.
Atn. Ing. Nick Randy Almeida Gamarra
Calle 23F No. 85a-31
Interventor
Ciudad

Referencia: **CONTRATO DE OBRA FDLM-137-2019 – CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE POR MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO Y LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE LA MALLA VIAL Y DEL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES**

Asunto: **COPIA RADICADOS OFICIOS ESP - SDM**

Cordial Saludo.

Por medio de la presente envío copia de los radicados de los oficios enviados a las empresas de servicios públicos y a la Secretaría Distrital de Movilidad de la siguiente manera:


C&C-137-2019-004	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DEL RIESGO Y CAMBIO CLIMATICO
C&C-137-2019-005	INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPECIALES DEL DISTRITO CAPITAL - IDECA
C&C-137-2019-006	CLARO
C&C-137-2019-007	CODENSA S.A.
C&C-137-2019-008	EMPRESA DE ACUEDUCTO DE BOGOTA – ZONA 3
C&C-137-2019-009	GAS NATURAL FENOSA
C&C-137-2019-010	MOVISTAR
C&C-137-2019-011	EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA - ETB
C&C-137-2019-012	UNE EPM TELECOMUNICACIONES
C&C-137-2019-013	SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION - SDP
C&C-137-2019-014	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA
C&C-137-2019-017	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD - SDM

18/03/20
no. 40 am

NIT 830.041.411-0

Lo anterior, para su conocimiento y fines pertinentes

Atentamente,



JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA
CON&CON S.A.S.

Anexos: Trece (13) folios

NIT 830.041.411-0

Rad. SDM : 60119
Fecha : 2020-03-18 12:08:33
Destino : SUBDIRECCION DE SEÑALIZACION
Asunto : 302 - TRASLADO POR COMPETENC
Nro Folios : 1 Anexos: 0
Origen : CON & CON
Modo : 1

680

C&C-137-2019-017

Bogotá D.C., marzo 13 de 2020

Señores
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
Ac.13 No. 37-35

Referencia: **CONTRATO DE OBRA FDLM-137-2019 – CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE POR MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO Y LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE LA MALLA VIAL Y DEL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES**

Asunto: **SOLICITUD DE DISEÑOS DE SEÑALIZACION DE SEGMENTOS VIALES**

Cordial Saludo.

Teniendo en cuenta la ejecución del contrato de la referencia con el Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires, solicitamos amablemente la entrega de los diseños de la señalización horizontal de las vías que se describen en el siguiente cuadro:

Nº	CIV	EJE	DESDE	HASTA	ELEMENTO	UPZ	BARRIO
1	14000772	KR 25A	AC 6	CL 6BIS	CALZADA	CIUDAD MONTES	RICAURTE
2	14000741	KR 25A	CL 6BIS	CL 6A	CALZADA	CIUDAD MONTES	RICAURTE
3	14000718	KR 25A	CL 6A	CL 7	CALZADA	CIUDAD MONTES	RICAURTE
4	14001678	KR 25A	CL 7	CL 7BIS	CALZADA	CIUDAD MONTES	RICAURTE
5	14001545	CL 1ABIS	AC 1	KR 26	CALZADA	SAN BLAS	RAMIREZ
6	14001619	CL 1C	KR 19A	KR 19BBIS	CALZADA	SABANA	EDUARDO SANTOS
7	14001616	CL 1C	KR 19BBIS	KR 19C	CALZADA	SABANA	EDUARDO SANTOS
8	14001469	CL 1F	KR 24A	KR 24B	CALZADA	RESTREPO	EL VERGEL
9	14001481	CL 1F	KR 24	KR 24A	CALZADA	RESTREPO	EL VERGEL
10	14001156	CL 2B	KR 25A	KR 26	CALZADA	CIUDAD MONTES	SANTA ISABEL
11	14001517	KR 26	CL 1ABIS	CL 1B	CALZADA	CIUDAD MONTES	SANTA ISABEL SUR
12	14001506	KR 18	CL 2	CL 3	CALZADA	SABANA	EDUARDO SANTOS
13	14001265	KR 25	CL 2	CL 2A	CALZADA	RESTREPO	EL VERGEL
14	14000126	KR 24	CL 22A	DG 22B BIS	CALZADA	LA SABANA	SAMPER MENDOZA
15	14001058	KR 26	CL 2C	CL 3	CALZADA	LA SABANA	PALOQUEMAO
16	14000565	CL 12	KR 20A	KR 21	CALZADA	LA SABANA	LA SABANA
17	14000573	CL 12	KR 20	KR 20A	CALZADA	LA SABANA	LA SABANA
18	14000282	CL 15	KR 27	KR 28A	CALZADA	LA SABANA	PALOQUEMAO
19	14000205	CL 17	KR 28A	KR 30	CALZADA	LA SABANA	PALOQUEMAO
20	14001367	CL 1B	KR 27A	KR 28	CALZADA	CIUDAD MONTES	SANTA ISABEL SUR
21	14000550	CL 12A	KR 20	KR 21	CALZADA	LA SABANA	LA SABANA

Lo anterior, debido a que en nuestro presupuesto contamos con ítems que corresponden a demarcación horizontal y se hace necesaria realizar tal actividad.

Atentamente,

JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA
Director de Obra – Contrato FDLM-137-2019

NIT 830.041.411-0

C&C-CO137-2019- 16

Bogotá, 11 de marzo de 2020

Señores:
MIRS LATINOAMERICA S.A.S.
Atn. Ing. Nick Randy Almeida Gamarra
Calle 23F No. 85ª-31
Interventor
Ciudad

Ref: CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CO 137-2019 cuyo objeto es "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALUDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES"

ASUNTO: Hoja De Vida Director De Obra

Cordial saludo,

Atentamente nos permitimos remitir para su revisión y aprobación la hoja de vida del ingeniero Javier Perilla como Director de obra, para el desarrollo del proyecto en referencia,

Amablemente solicitamos; que para la evaluación de la hoja de vida del director de obra, Javier Hernando Perilla, sea tenido en cuenta el cuadro de equivalencias descrito en el literal f del anexo técnico del contrato.

f) En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así:

Postgrado con título	Requisitos de Experiencia General	Requisitos de Experiencia Específica
Especialización	Veinticuatro (24) meses	Doce (12) meses
Maestría	Treinta y seis (36) meses	Dieciocho (18) meses
Doctorado	Cuarenta y ocho (48) meses	Veinticuatro (24) meses

Atentamente,

JUAN PABLO RICCI RUIZ
Representante Legal

Dirección: Av. Cr 7 No.127-48 Oficina 1006 Teléfono: 4 821681- 5203971 Bogotá D.C.
E-mail: conycon.martires137@gmail.com

NIT 830.041.411-0

30
45
632

C&C-CO137-2019-014

Bogotá D.C., marzo 9 de 2020

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

Señores
SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA
Carrera 30 N° 25 - 90
Bogotá D.C.

Referencia: **CONTRATO DE OBRA N° CO-137-2019 cuyo objeto es "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y DEL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"**

Asunto: **DERECHO DE PETICION SOLICITUD DE INFORMACION Y/O POSIBLES AMPLIACIONES O RENOVACIONES.**

Cordial Saludo.

Haciendo uso de las facultades otorgadas por el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, se solicita amablemente información sobre redes existentes y posibles ampliaciones o renovaciones para el proyecto de la referencia, de acuerdo con los tramos a intervenir así:

N°	CIV	EJE	DESDE	HASTA	ELEMENTO	UPZ	BARRIO
1	14000772	KR 25A	AC 6	CL 6BIS	CALZADA	CIUDAD MONTES	RICAURTE
2	14000741	KR 25A	CL 6BIS	CL 6A	CALZADA	CIUDAD MONTES	RICAURTE
3	14000718	KR 25A	CL 6A	CL 7	CALZADA	CIUDAD MONTES	RICAURTE
4	14001678	KR 25A	CL 7	CL 7BIS	CALZADA	CIUDAD MONTES	RICAURTE
5	14001545	CL 1ABIS	AC 1	KR 26	CALZADA	SAN BLAS	RAMIREZ
6	14001619	CL 1C	KR 19A	KR 19BBIS	CALZADA	SABANA	EDUARDO SANTOS
7	14001616	CL 1C	KR 19BBIS	KR 19C	CALZADA	SABANA	EDUARDO SANTOS
8	14001469	CL 1F	KR 24A	KR 24B	CALZADA	RESTREPO	EL VERGEL
9	14001481	CL 1F	KR 24	KR 24A	CALZADA	RESTREPO	EL VERGEL
10	14001156	CL 2B	KR 25A	KR 26	CALZADA	CIUDAD MONTES	SANTA ISABEL
11	14001517	KR 26	CL 1ABIS	CL 1B	CALZADA	CIUDAD MONTES	SANTA ISABEL SUR
12	14001506	KR 18	CL 2	CL 3	CALZADA	SABANA	EDUARDO SANTOS
13	14001265	KR 25	CL 2	CL 2A	CALZADA	RESTREPO	EL VERGEL
14	14000126	KR 24	CL 22A	DG 22B BIS	CALZADA	LA SABANA	SAMPER MENDOZA
15	14001058	KR 26	CL 2C	CL 3	CALZADA	LA SABANA	PALOQUEMAO
16	14000565	CL 12	KR 20A	KR 21	CALZADA	LA SABANA	LA SABANA
17	14000573	CL 12	KR 20	KR 20A	CALZADA	LA SABANA	LA SABANA
18	14000282	CL 15	KR 27	KR 28A	CALZADA	LA SABANA	PALOQUEMAO
19	14000205	CL 17	KR 28A	KR 30	CALZADA	LA SABANA	PALOQUEMAO
20	14001367	CL 1B	KR 27A	KR 28	CALZADA	CIUDAD MONTES	SANTA ISABEL SUR
21	14000550	CL 12A	KR 20	KR 21	CALZADA	LA SABANA	LA SABANA

NIT 830.041.411-0

Agradecemos su colaboración con la pronta entrega de esta información a la dirección Av. Cr. 7 N° 127 – 48 oficina 1006 de Bogotá D.C. con el objeto de determinar la existencia en las zonas de trabajo descritas y así evitar daños en las mismas.

Atentamente,

JUAN PABLO RICCI RUIZ
R.L. CON&CON S.A.S.

NIT 830.041.411-0

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION 383
RADICACION: 1-2020-14326
AL RESPONDER CITE ESTE NUMERO
FECHA: 2020-03-11 09:52 PRO 1573915
RAD INICIAL:
FOLIOS: 1
DESTINO Dirección de Vías, Transporte y Servicios
TRAMITE: Conceptos sobre Vías, Transpo
CLASIFICACION:Derecho de petición
ANEXOS: No
REMITENTE :

Bogotá D.C., marzo 9 de 2020

Señores:
SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION - SDP
Carrera 30 N° 25 - 90
Bogotá D.C.

Referencia: **CONTRATO DE OBRA N° CO-137-2019 cuyo objeto es "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y DEL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"**

Asunto: **DERECHO DE PETICION SOLICITUD DE INFORMACION Y/O POSIBLES AMPLIACIONES O RENOVACIONES.**

Cordial Saludo.

Haciendo uso de las facultades otorgadas por el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, se solicita amablemente información sobre redes existentes y posibles ampliaciones o renovaciones para el proyecto de la referencia, de acuerdo con los tramos a intervenir así:

Nº	CIV	EJE	DESDE	HASTA	ELEMENTO	UPZ	BARRIO
1	14000772	KR 25A	AC 6	CL 6BIS	CALZADA	CIUDAD MONTES	RICAURTE
2	14000741	KR 25A	CL 6BIS	CL 6A	CALZADA	CIUDAD MONTES	RICAURTE
3	14000718	KR 25A	CL 6A	CL 7	CALZADA	CIUDAD MONTES	RICAURTE
4	14001678	KR 25A	CL 7	CL 7BIS	CALZADA	CIUDAD MONTES	RICAURTE
5	14001545	CL 1ABIS	AC 1	KR 26	CALZADA	SAN BLAS	RAMIREZ
6	14001619	CL 1C	KR 19A	KR 19BBIS	CALZADA	SABANA	EDUARDO SANTOS
7	14001616	CL 1C	KR 19BBIS	KR 19C	CALZADA	SABANA	EDUARDO SANTOS
8	14001469	CL 1F	KR 24A	KR 24B	CALZADA	RESTREPO	EL VERGEL
9	14001481	CL 1F	KR 24	KR 24A	CALZADA	RESTREPO	EL VERGEL
10	14001156	CL 2B	KR 25A	KR 26	CALZADA	CIUDAD MONTES	SANTA ISABEL
11	14001517	KR 26	CL 1ABIS	CL 1B	CALZADA	CIUDAD MONTES	SANTA ISABEL SUR
12	14001506	KR 18	CL 2	CL 3	CALZADA	SABANA	EDUARDO SANTOS
13	14001265	KR 25	CL 2	CL 2A	CALZADA	RESTREPO	EL VERGEL
14	14000126	KR 24	CL 22A	DG 22B BIS	CALZADA	LA SABANA	SAMPER MENDOZA
15	14001058	KR 26	CL 2C	CL 3	CALZADA	LA SABANA	PALOQUEMAO
16	14000565	CL 12	KR 20A	KR 21	CALZADA	LA SABANA	LA SABANA
17	14000573	CL 12	KR 20	KR 20A	CALZADA	LA SABANA	LA SABANA
18	14000282	CL 15	KR 27	KR 28A	CALZADA	LA SABANA	PALOQUEMAO
19	14000205	CL 17	KR 28A	KR 30	CALZADA	LA SABANA	PALOQUEMAO
20	14001367	CL 1B	KR 27A	KR 28	CALZADA	CIUDAD MONTES	SANTA ISABEL SUR
21	14000550	CL 12A	KR 20	KR 21	CALZADA	LA SABANA	LA SABANA

NIT 830.041.411-0

Agradecemos su colaboración con la pronta entrega de esta información a la dirección Av. Cr. 7 N° 127 – 48 oficina 1006 de Bogotá D.C. con el objeto de determinar la existencia en las zonas de trabajo descritas y así evitar daños en las mismas.

Atentamente,

JUAN PABLO RICCI RUIZ
R.L. CON&CON S.A.S.

CON & CON
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION

NIT 830.041.411-0

C&C-CO137-2019-012

Bogotá D.C., marzo 9 de 2020

COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.
RADICADO ENTRADA
16 MAR 2020
HORA FIRMA
RECIBIDO SIN VERIFICAR CONTENIDO
GENERAL

Señores:
UNE EPM TELECOMUNICACIONES
Calle 41 F Sur N° 79 - 05
Bogotá D.C.

Referencia: **CONTRATO DE OBRA N° CO-137-2019 cuyo objeto es "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y DEL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"**

Asunto: **DERECHO DE PETICION SOLICITUD DE INFORMACION Y/O POSIBLES AMPLIACIONES O RENOVACIONES.**

Cordial Saludo.

Haciendo uso de las facultades otorgadas por el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, se solicita amablemente información sobre redes existentes y posibles ampliaciones o renovaciones para el proyecto de la referencia, de acuerdo con los tramos a intervenir así:

Nº	CIV	EJE	DESDE	HASTA	ELEMENTO	UPZ	BARRIO
1	14000772	KR 25A	AC 6	CL 6BIS	CALZADA	CIUDAD MONTES	RICAURTE
2	14000741	KR 25A	CL 6BIS	CL 6A	CALZADA	CIUDAD MONTES	RICAURTE
3	14000718	KR 25A	CL 6A	CL 7	CALZADA	CIUDAD MONTES	RICAURTE
4	14001678	KR 25A	CL 7	CL 7BIS	CALZADA	CIUDAD MONTES	RICAURTE
5	14001545	CL 1ABIS	AC 1	KR 26	CALZADA	SAN BLAS	RAMIREZ
6	14001619	CL 1C	KR 19A	KR 19BBIS	CALZADA	SABANA	EDUARDO SANTOS
7	14001616	CL 1C	KR 19BBIS	KR 19C	CALZADA	SABANA	EDUARDO SANTOS
8	14001469	CL 1F	KR 24A	KR 24B	CALZADA	RESTREPO	EL VERGEL
9	14001481	CL 1F	KR 24	KR 24A	CALZADA	RESTREPO	EL VERGEL
10	14001156	CL 2B	KR 25A	KR 26	CALZADA	CIUDAD MONTES	SANTA ISABEL
11	14001517	KR 26	CL 1ABIS	CL 1B	CALZADA	CIUDAD MONTES	SANTA ISABEL SUR
12	14001506	KR 18	CL 2	CL 3	CALZADA	SABANA	EDUARDO SANTOS
13	14001265	KR 25	CL 2	CL 2A	CALZADA	RESTREPO	EL VERGEL
14	14000126	KR 24	CL 22A	DG 22B BIS	CALZADA	LA SABANA	SAMPER MENDOZA
15	14001058	KR 26	CL 2C	CL 3	CALZADA	LA SABANA	PALOQUEMAO
16	14000565	CL 12	KR 20A	KR 21	CALZADA	LA SABANA	LA SABANA
17	14000573	CL 12	KR 20	KR 20A	CALZADA	LA SABANA	LA SABANA
18	14000282	CL 15	KR 27	KR 28A	CALZADA	LA SABANA	PALOQUEMAO
19	14000205	CL 17	KR 28A	KR 30	CALZADA	LA SABANA	PALOQUEMAO
20	14001367	CL 1B	KR 27A	KR 28	CALZADA	CIUDAD MONTES	SANTA ISABEL SUR
21	14000550	CL 12A	KR 20	KR 21	CALZADA	LA SABANA	LA SABANA

NIT 830.041.411-0

Agradecemos su colaboración con la pronta entrega de esta información a la dirección Av. Cr. 7 N° 127 – 48 oficina 1006 de Bogotá D.C. con el objeto de determinar la existencia en las zonas de trabajo descritas y así evitar daños en las mismas.

Atentamente,

JUAN PABLO RICCI RUIZ
R.L. CON&CON S.A.S.

Dirección: Av. Cr 7 No.127-48 Oficina 1006 Teléfono: 4 821681- 5203971 Bogotá D.C.
E-mail: martiresconycon.2018@gmail.com

NIT 830.041.411-0

C&C-CO137-2019-011

Bogotá D.C., marzo 9 de 2020

eTb
Para seguimiento utilice este N° 32020005783
Fecha: 11/03/2020 Hora: 10:34:27a. m. Folios: 1 Anexo: 0
Asunto: DERECHO DE PETICION SOLICITUD DE INFORMACION Y POSIBLES AMPLIACIONES O RENOVACIONES CTO CO 137 2019
Se recibe para verificacion no implica aceptacion

Señores:
EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA - ETB
Carrera 7 N° 20 – 90 Piso 1
Bogotá D.C.

Referencia: **CONTRATO DE OBRA N° CO-137-2019 cuyo objeto es "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y DEL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"**

Asunto: **DERECHO DE PETICION SOLICITUD DE INFORMACION Y/O POSIBLES AMPLIACIONES O RENOVACIONES.**

Cordial Saludo.

Haciendo uso de las facultades otorgadas por el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, se solicita amablemente información sobre redes existentes y posibles ampliaciones o renovaciones para el proyecto de la referencia, de acuerdo con los tramos a intervenir así:

Nº	CIV	EJE	DESDE	HASTA	ELEMENTO	UPZ	BARRIO
1	14000772	KR 25A	AC 6	CL 6BIS	CALZADA	CIUDAD MONTES	RICAURTE
2	14000741	KR 25A	CL 6BIS	CL 6A	CALZADA	CIUDAD MONTES	RICAURTE
3	14000718	KR 25A	CL 6A	CL 7	CALZADA	CIUDAD MONTES	RICAURTE
4	14001678	KR 25A	CL 7	CL 7BIS	CALZADA	CIUDAD MONTES	RICAURTE
5	14001545	CL 1ABIS	AC 1	KR 26	CALZADA	SAN BLAS	RAMIREZ
6	14001619	CL 1C	KR 19A	KR 19BBIS	CALZADA	SABANA	EDUARDO SANTOS
7	14001616	CL 1C	KR 19BBIS	KR 19C	CALZADA	SABANA	EDUARDO SANTOS
8	14001469	CL 1F	KR 24A	KR 24B	CALZADA	RESTREPO	EL VERGEL
9	14001481	CL 1F	KR 24	KR 24A	CALZADA	RESTREPO	EL VERGEL
10	14001156	CL 2B	KR 25A	KR 26	CALZADA	CIUDAD MONTES	SANTA ISABEL
11	14001517	KR 26	CL 1ABIS	CL 1B	CALZADA	CIUDAD MONTES	SANTA ISABEL SUR
12	14001506	KR 18	CL 2	CL 3	CALZADA	SABANA	EDUARDO SANTOS
13	14001265	KR 25	CL 2	CL 2A	CALZADA	RESTREPO	EL VERGEL
14	14000126	KR 24	CL 22A	DG 22B BIS	CALZADA	LA SABANA	SAMPER MENDOZA
15	14001058	KR 26	CL 2C	CL 3	CALZADA	LA SABANA	PALOQUEMAO
16	14000565	CL 12	KR 20A	KR 21	CALZADA	LA SABANA	LA SABANA
17	14000573	CL 12	KR 20	KR 20A	CALZADA	LA SABANA	LA SABANA
18	14000282	CL 15	KR 27	KR 28A	CALZADA	LA SABANA	PALOQUEMAO
19	14000205	CL 17	KR 28A	KR 30	CALZADA	LA SABANA	PALOQUEMAO
20	14001367	CL 1B	KR 27A	KR 28	CALZADA	CIUDAD MONTES	SANTA ISABEL SUR
21	14000550	CL 12A	KR 20	KR 21	CALZADA	LA SABANA	LA SABANA

NIT 830.041.411-0

Agradecemos su colaboración con la pronta entrega de esta información a la dirección Av. Cr. 7 N° 127 – 48 oficina 1006 de Bogotá D.C. con el objeto de determinar la existencia en las zonas de trabajo descritas y así evitar daños en las mismas.

Atentamente,

JUAN PABLO RICCI RUIZ
R.L. CON&CON S.A.S.

Dirección: Av. Cr 7 No.127-48 Oficina 1006 Teléfono: 4 821681- 5203971 Bogotá D.C.
E-mail: martiresconycon.2018@gmail.com

NIT 830.041.411-0

C&C-CO137-2019-010

Bogotá D.C., marzo 9 de 2020

movistar 20200000059904

11 MAR 2020 MORATO

Fecha de Recepción:_____ CUN:_____

Nombre Asesor:_____ Centro de Experiencia:_____

Su petición o queja/reclamo será contestada a más tardar el día( ) a través del mismo medio de atención por el que la presentó o por el medio de su elección. Si su petición o queja/reclamo no es atendida en la fecha indicada, se entenderá que ha sido resuelta a su favor. (Esto se llama Silencio Administrativo Positivo)

Señores:
MOVISTAR
Transversal 60 N° 114 A - 55
Bogotá D.C.

Referencia: **CONTRATO DE OBRA N° CO-137-2019 cuyo objeto es "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y DEL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"**

Asunto: **DERECHO DE PETICION SOLICITUD DE INFORMACION Y/O POSIBLES AMPLIACIONES O RENOVACIONES.**

Cordial Saludo.

Haciendo uso de las facultades otorgadas por el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, se solicita amablemente información sobre redes existentes y posibles ampliaciones o renovaciones para el proyecto de la referencia, de acuerdo con los tramos a intervenir así:

Nº	CIV	EJE	DESDE	HASTA	ELEMENTO	UPZ	BARRIO
1	14000772	KR 25A	AC 6	CL 6BIS	CALZADA	CIUDAD MONTES	RICAURTE
2	14000741	KR 25A	CL 6BIS	CL 6A	CALZADA	CIUDAD MONTES	RICAURTE
3	14000718	KR 25A	CL 6A	CL 7	CALZADA	CIUDAD MONTES	RICAURTE
4	14001678	KR 25A	CL 7	CL 7BIS	CALZADA	CIUDAD MONTES	RICAURTE
5	14001545	CL 1ABIS	AC 1	KR 26	CALZADA	SAN BLAS	RAMIREZ
6	14001619	CL 1C	KR 19A	KR 19BBIS	CALZADA	SABANA	EDUARDO SANTOS
7	14001616	CL 1C	KR 19BBIS	KR 19C	CALZADA	SABANA	EDUARDO SANTOS
8	14001469	CL 1F	KR 24A	KR 24B	CALZADA	RESTREPO	EL VERGEL
9	14001481	CL 1F	KR 24	KR 24A	CALZADA	RESTREPO	EL VERGEL
10	14001156	CL 2B	KR 25A	KR 26	CALZADA	CIUDAD MONTES	SANTA ISABEL
11	14001517	KR 26	CL 1ABIS	CL 1B	CALZADA	CIUDAD MONTES	SANTA ISABEL SUR
12	14001506	KR 18	CL 2	CL 3	CALZADA	SABANA	EDUARDO SANTOS
13	14001265	KR 25	CL 2	CL 2A	CALZADA	RESTREPO	EL VERGEL
14	14000126	KR 24	CL 22A	DG 22B BIS	CALZADA	LA SABANA	SAMPER MENDOZA
15	14001058	KR 26	CL 2C	CL 3	CALZADA	LA SABANA	PALOQUEMAO
16	14000565	CL 12	KR 20A	KR 21	CALZADA	LA SABANA	LA SABANA
17	14000573	CL 12	KR 20	KR 20A	CALZADA	LA SABANA	LA SABANA
18	14000282	CL 15	KR 27	KR 28A	CALZADA	LA SABANA	PALOQUEMAO
19	14000205	CL 17	KR 28A	KR 30	CALZADA	LA SABANA	PALOQUEMAO
20	14001367	CL 1B	KR 27A	KR 28	CALZADA	CIUDAD MONTES	SANTA ISABEL SUR
21	14000550	CL 12A	KR 20	KR 21	CALZADA	LA SABANA	LA SABANA

NIT 830.041.411-0

Agradecemos su colaboración con la pronta entrega de esta información a la dirección **Av. Cr. 7 N° 127** – 48 oficina 1006 de Bogotá D.C. con el objeto de determinar la existencia en las **zonas de trabajo** descritas y así evitar daños en las mismas.

Atentamente,

JUAN PABLO RICCI RUIZ
R.L. CON&CON S.A.S.

Dirección: Av. Cr 7 No.127-48 Oficina 1006 Teléfono: 4 821681- 5203971 Bogotá D.C.
E-mail: martiresconycon.2018@gmail.com

CON CON
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION

NIT 830.041.411-0

687

C&C-CO137-2019-009

Bogotá D.C., marzo 9 de 2020

GAS NATURAL SA ESP
0100054904
Rad. Entrada - Correspondencia

Señores:
GAS NATURAL FENOSA
Calle 71 A N° 5 - 38
Bogotá D.C.

Referencia: **CONTRATO DE OBRA N° CO-137-2019 cuyo objeto es "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y DEL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"**

Asunto: **DERECHO DE PETICION SOLICITUD DE INFORMACION Y/O POSIBLES AMPLIACIONES O RENOVACIONES.**

Cordial Saludo.

Haciendo uso de las facultades otorgadas por el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, se solicita amablemente información sobre redes existentes y posibles ampliaciones o renovaciones para el proyecto de la referencia, de acuerdo con los tramos a intervenir así:

Nº	CIV	EJE	DESDE	HASTA	ELEMENTO	UPZ	BARRIO
1	14000772	KR 25A	AC 6	CL 6BIS	CALZADA	CIUDAD MONTES	RICAURTE
2	14000741	KR 25A	CL 6BIS	CL 6A	CALZADA	CIUDAD MONTES	RICAURTE
3	14000718	KR 25A	CL 6A	CL 7	CALZADA	CIUDAD MONTES	RICAURTE
4	14001678	KR 25A	CL 7	CL 7BIS	CALZADA	CIUDAD MONTES	RICAURTE
5	14001545	CL 1ABIS	AC 1	KR 26	CALZADA	SAN BLAS	RAMIREZ
6	14001619	CL 1C	KR 19A	KR 19BBIS	CALZADA	SABANA	EDUARDO SANTOS
7	14001616	CL 1C	KR 19BBIS	KR 19C	CALZADA	SABANA	EDUARDO SANTOS
8	14001469	CL 1F	KR 24A	KR 24B	CALZADA	RESTREPO	EL VERGEL
9	14001481	CL 1F	KR 24	KR 24A	CALZADA	RESTREPO	EL VERGEL
10	14001156	CL 2B	KR 25A	KR 26	CALZADA	CIUDAD MONTES	SANTA ISABEL
11	14001517	KR 26	CL 1ABIS	CL 1B	CALZADA	CIUDAD MONTES	SANTA ISABEL SUR
12	14001506	KR 18	CL 2	CL 3	CALZADA	SABANA	EDUARDO SANTOS
13	14001265	KR 25	CL 2	CL 2A	CALZADA	RESTREPO	EL VERGEL
14	14000126	KR 24	CL 22A	DG 22B BIS	CALZADA	LA SABANA	SAMPER MENDOZA
15	14001058	KR 26	CL 2C	CL 3	CALZADA	LA SABANA	PALOQUEMAO
16	14000565	CL 12	KR 20A	KR 21	CALZADA	LA SABANA	LA SABANA
17	14000573	CL 12	KR 20	KR 20A	CALZADA	LA SABANA	LA SABANA
18	14000282	CL 15	KR 27	KR 28A	CALZADA	LA SABANA	PALOQUEMAO
19	14000205	CL 17	KR 28A	KR 30	CALZADA	LA SABANA	PALOQUEMAO
20	14001367	CL 1B	KR 27A	KR 28	CALZADA	CIUDAD MONTES	SANTA ISABEL SUR
21	14000550	CL 12A	KR 20	KR 21	CALZADA	LA SABANA	LA SABANA

Dirección: Av. Cr 7 No.127-48 Oficina 1006 Teléfono: 4 821681- 5203971 Bogotá D.C.
E-mail: martiresconycon.2018@gmail.com

NIT 830.041.411-0

Agradecemos su colaboración con la pronta entrega de esta información a la dirección **Av. Cr. 7 N° 127 – 48 oficina 1006 de Bogotá D.C.** con el objeto de determinar la existencia en las **zonas de trabajo** descritas y así evitar daños en las mismas.

Atentamente,

JUAN PABLO RICCI RUIZ
R.L. CON&CON S.A.S.

Dirección: Av. Cr 7 No.127-48 Oficina 1006 Teléfono: 4 821681- 5203971 Bogotá D.C.
E-mail: martiresconycon.2018@gmail.com

NIT 830.041.411-0

688

C&C-CO137-2019-008

Bogotá D.C., marzo 9 de 2020

Señores:
EMPRESA DE ACUEDUCTO DE BOGOTA – ZONA 3
Av. Calle 24 N° 37 - 15
Bogotá D.C.

Referencia: **CONTRATO DE OBRA N° CO-137-2019 cuyo objeto es "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y DEL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"**

Asunto: **DERECHO DE PETICION SOLICITUD DE INFORMACION Y/O POSIBLES AMPLIACIONES O RENOVACIONES.**

Cordial Saludo.

Haciendo uso de las facultades otorgadas por el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, se solicita amablemente información sobre redes existentes y posibles ampliaciones o renovaciones para el proyecto de la referencia, de acuerdo con los tramos a intervenir así:

Nº	CIV	EJE	DESDE	HASTA	ELEMENTO	UPZ	BARRIO
1	14000772	KR 25A	AC 6	CL 6BIS	CALZADA	CIUDAD MONTES	RICAURTE
2	14000741	KR 25A	CL 6BIS	CL 6A	CALZADA	CIUDAD MONTES	RICAURTE
3	14000718	KR 25A	CL 6A	CL 7	CALZADA	CIUDAD MONTES	RICAURTE
4	14001678	KR 25A	CL 7	CL 7BIS	CALZADA	CIUDAD MONTES	RICAURTE
5	14001545	CL 1ABIS	AC 1	KR 26	CALZADA	SAN BLAS	RAMIREZ
6	14001619	CL 1C	KR 19A	KR 19BBIS	CALZADA	SABANA	EDUARDO SANTOS
7	14001616	CL 1C	KR 19BBIS	KR 19C	CALZADA	SABANA	EDUARDO SANTOS
8	14001469	CL 1F	KR 24A	KR 24B	CALZADA	RESTREPO	EL VERGEL
9	14001481	CL 1F	KR 24	KR 24A	CALZADA	RESTREPO	EL VERGEL
10	14001156	CL 2B	KR 25A	KR 26	CALZADA	CIUDAD MONTES	SANTA ISABEL
11	14001517	KR 26	CL 1ABIS	CL 1B	CALZADA	CIUDAD MONTES	SANTA ISABEL SUR
12	14001506	KR 18	CL 2	CL 3	CALZADA	SABANA	EDUARDO SANTOS
13	14001265	KR 25	CL 2	CL 2A	CALZADA	RESTREPO	EL VERGEL
14	14000126	KR 24	CL 22A	DG 22B BIS	CALZADA	LA SABANA	SAMPER MENDOZA
15	14001058	KR 26	CL 2C	CL 3	CALZADA	LA SABANA	PALOQUEMAO
16	14000565	CL 12	KR 20A	KR 21	CALZADA	LA SABANA	LA SABANA
17	14000573	CL 12	KR 20	KR 20A	CALZADA	LA SABANA	LA SABANA
18	14000282	CL 15	KR 27	KR 28A	CALZADA	LA SABANA	PALOQUEMAO
19	14000205	CL 17	KR 28A	KR 30	CALZADA	LA SABANA	PALOQUEMAO
20	14001367	CL 1B	KR 27A	KR 28	CALZADA	CIUDAD MONTES	SANTA ISABEL SUR
21	14000550	CL 12A	KR 20	KR 21	CALZADA	LA SABANA	LA SABANA

NIT 830.041.411-0

Agradecemos su colaboración con la pronta entrega de esta información a la dirección **Av. Cr. 7 N° 127 – 48 oficina 1006 de Bogotá D.C.** con el objeto de determinar la existencia en las **zonas de trabajo** descritas y así evitar daños en las mismas.

Atentamente,

JUAN PABLO RICCI RUIZ
R.L. CON&CON S.A.S.

Dirección: Av. Cr 7 No.127-48 Oficina 1006 Teléfono: 4 821681- 5203971 Bogotá D.C.
E-mail: martiresconycon.2018@gmail.com

689

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

CORRESPONDENCIA DOCUMENTO DE ENTRADA

RADICACION
E-2020-026124
11/03/2020 08:53 a.m.
Radicación

Información de Radicacion

Nombre del Remitente:	CON & CON		
Dirección de correspondencia:	AV CRA 7 No 127-48 OF 1006		
PQR:	○ Si ● No		
Correo Electronico:			
Tipo Servicio		Cuenta Contrato SAP:	
Telefono:	4821681		
Asunto:	CONTRATO No CO-137-2019		
Centro Gestor:	3331001	Area:	Dirección Servicio Acueducto y Alcantarillado Zona 3
Tipo de solicitud	S: Solicitud	Tipo de Flujo:	● Normal
Consecutivo Externo:	C&C-CO137-2019-008	Documento referenciado:	
Número de Folios:	1		
Contiene Anexos Fisicos	○ SI ● NO	Es una Tutela?	○ SI ● NO
Zona SAP		Contactos en SAP:	

Acepto que la Empresa de Acueducto, Alcantarillado de Bogotá realice la notificación de todos los actos administrativos que se produzcan dentro de la actuación administrativa, así como la citación a que haya lugar al correo electrónico citado y/o a la página web de la Empresa

CON & CON

FIRMA _____

Radico: Angela Matilde Bueno Amortegui

COM & COM
INGENIERIA Y CONSTRUCCION

NIT 830.041.411-0

690

C&C-CO137-2019-007

Bogotá D.C., marzo 9 de 2020

CORRESPONDENCIA RECIBIDA enel codensa
YO,
AUTORIZO PARA QUE SE ME NOTIFIQUE O COMUNIQUE CUALQUIER DECISIÓN O REQUERIMIENTO POR MEDIO DEL SIGUIENTE CORREO ELECTRÓNICO:
0265847 11 MAR 2020
No. DE RADICADO FECHA HORA CODIGO

Señores:
CODENSA S.A.
Carrera 13 A N° 93 - 66
Bogotá D.C.

Referencia: **CONTRATO DE OBRA N° CO-137-2019 cuyo objeto es "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y DEL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"**

Asunto: **DERECHO DE PETICION SOLICITUD DE INFORMACION Y/O POSIBLES AMPLIACIONES O RENOVACIONES.**

Cordial Saludo.

Haciendo uso de las facultades otorgadas por el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, se solicita amablemente información sobre redes existentes y posibles ampliaciones o renovaciones para el proyecto de la referencia, de acuerdo con los tramos a intervenir así:

Nº	CIV	EJE	DESDE	HASTA	ELEMENTO	UPZ	BARRIO
1	14000772	KR 25A	AC 6	CL 6BIS	CALZADA	CIUDAD MONTES	RICAURTE
2	14000741	KR 25A	CL 6BIS	CL 6A	CALZADA	CIUDAD MONTES	RICAURTE
3	14000718	KR 25A	CL 6A	CL 7	CALZADA	CIUDAD MONTES	RICAURTE
4	14001678	KR 25A	CL 7	CL 7BIS	CALZADA	CIUDAD MONTES	RICAURTE
5	14001545	CL 1ABIS	AC 1	KR 26	CALZADA	SAN BLAS	RAMIREZ
6	14001619	CL 1C	KR 19A	KR 19BBIS	CALZADA	SABANA	EDUARDO SANTOS
7	14001616	CL 1C	KR 19BBIS	KR 19C	CALZADA	SABANA	EDUARDO SANTOS
8	14001469	CL 1F	KR 24A	KR 24B	CALZADA	RESTREPO	EL VERGEL
9	14001481	CL 1F	KR 24	KR 24A	CALZADA	RESTREPO	EL VERGEL
10	14001156	CL 2B	KR 25A	KR 26	CALZADA	CIUDAD MONTES	SANTA ISABEL
11	14001517	KR 26	CL 1ABIS	CL 1B	CALZADA	CIUDAD MONTES	SANTA ISABEL SUR
12	14001506	KR 18	CL 2	CL 3	CALZADA	SABANA	EDUARDO SANTOS
13	14001265	KR 25	CL 2	CL 2A	CALZADA	RESTREPO	EL VERGEL
14	14000126	KR 24	CL 22A	DG 22B BIS	CALZADA	LA SABANA	SAMPER MENDOZA
15	14001058	KR 26	CL 2C	CL 3	CALZADA	LA SABANA	PALOQUEMAO
16	14000565	CL 12	KR 20A	KR 21	CALZADA	LA SABANA	LA SABANA
17	14000573	CL 12	KR 20	KR 20A	CALZADA	LA SABANA	LA SABANA
18	14000282	CL 15	KR 27	KR 28A	CALZADA	LA SABANA	PALOQUEMAO
19	14000205	CL 17	KR 28A	KR 30	CALZADA	LA SABANA	PALOQUEMAO
20	14001367	CL 1B	KR 27A	KR 28	CALZADA	CIUDAD MONTES	SANTA ISABEL SUR
21	14000550	CL 12A	KR 20	KR 21	CALZADA	LA SABANA	LA SABANA

NIT 830.041.411-0

Agradecemos su colaboración con la pronta entrega de esta información a la dirección Av. Cr. 7 N° 127 – 48 oficina 1006 de Bogotá D.C. con el objeto de determinar la existencia en las zonas de trabajo descritas y así evitar daños en las mismas.

Atentamente,

JUAN PABLO RICCI RUIZ
R.L. CON&CON S.A.S.

NIT 830.041.411-0

2020-N001-E074791
Fecha y hora de radicación: 16/03/2020 11:07:35
Dependencia: DIRECCION CORPORATIVA INGENIERIA Y OPERACIC
Folios: 1
Entrega física: SI
Recibido sin aceptación - Sujeto a verificación

I&C-CO137-2019-006

Bogotá D.C., marzo 9 de 2020

Señores:
CLARO
Carrera 68A N° 24B – 10 Barrio Salitre
Bogotá D.C.

Referencia: **CONTRATO DE OBRA N° CO-137-2019 cuyo objeto es "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y DEL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"**

Asunto: **DERECHO DE PETICION SOLICITUD DE INFORMACION Y/O POSIBLES AMPLIACIONES O RENOVACIONES.**

Cordial Saludo.

Haciendo uso de las facultades otorgadas por el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, se solicita amablemente información sobre redes existentes y posibles ampliaciones o renovaciones para el proyecto de la referencia, de acuerdo con los tramos a intervenir así:

N°	CIV	EJE	DESDE	HASTA	ELEMENTO	UPZ	BARRIO
1	14000772	KR 25A	AC 6	CL 6BIS	CALZADA	CIUDAD MONTES	RICAURTE
2	14000741	KR 25A	CL 6BIS	CL 6A	CALZADA	CIUDAD MONTES	RICAURTE
3	14000718	KR 25A	CL 6A	CL 7	CALZADA	CIUDAD MONTES	RICAURTE
4	14001678	KR 25A	CL 7	CL 7BIS	CALZADA	CIUDAD MONTES	RICAURTE
5	14001545	CL 1ABIS	AC 1	KR 26	CALZADA	SAN BLAS	RAMIREZ
6	14001619	CL 1C	KR 19A	KR 19BBIS	CALZADA	SABANA	EDUARDO SANTOS
7	14001616	CL 1C	KR 19BBIS	KR 19C	CALZADA	SABANA	EDUARDO SANTOS
8	14001469	CL 1F	KR 24A	KR 24B	CALZADA	RESTREPO	EL VERGEL
9	14001481	CL 1F	KR 24	KR 24A	CALZADA	RESTREPO	EL VERGEL
10	14001156	CL 2B	KR 25A	KR 26	CALZADA	CIUDAD MONTES	SANTA ISABEL
11	14001517	KR 26	CL 1ABIS	CL 1B	CALZADA	CIUDAD MONTES	SANTA ISABEL SUR
12	14001506	KR 18	CL 2	CL 3	CALZADA	SABANA	EDUARDO SANTOS
13	14001265	KR 25	CL 2	CL 2A	CALZADA	RESTREPO	EL VERGEL
14	14000126	KR 24	CL 22A	DG 22B BIS	CALZADA	LA SABANA	SAMPER MENDOZA
15	14001058	KR 26	CL 2C	CL 3	CALZADA	LA SABANA	PALOQUEMAO
16	14000565	CL 12	KR 20A	KR 21	CALZADA	LA SABANA	LA SABANA
17	14000573	CL 12	KR 20	KR 20A	CALZADA	LA SABANA	LA SABANA
18	14000282	CL 15	KR 27	KR 28A	CALZADA	LA SABANA	PALOQUEMAO
19	14000205	CL 17	KR 28A	KR 30	CALZADA	LA SABANA	PALOQUEMAO
20	14001367	CL 1B	KR 27A	KR 28	CALZADA	CIUDAD MONTES	SANTA ISABEL SUR
21	14000550	CL 12A	KR 20	KR 21	CALZADA	LA SABANA	LA SABANA

NIT 830.041.411-0

Agradecemos su colaboración con la pronta entrega de esta información a la dirección Av. Cr. 7 N° 127 – 48 oficina 1006 de Bogotá D.C. con el objeto de determinar la existencia en las zonas de trabajo descritas y así evitar daños en las mismas.

Atentamente,

JUAN PABLO RICCI RUIZ
R.L. CON&CON S.A.S.

Dirección: Av. Cr 7 No.127-48 Oficina 1006 Teléfono: 4 821681- 5203971 Bogotá D.C.
E-mail: martiresconycon.2018@gmail.com

NIT 830.041.411-0

tr 6807
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL CENTRO DE DOCUMENTACION CORRESPONDENCIA
RECIBIDO
Hora: 10:06

40
692

C&C-CO137-2019-005

Bogotá D.C., marzo 9 de 2020

Señores:
INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPECIALES DEL DISTRITO CAPITAL - IDECA
Carrera 30 N° 25 - 90
Bogotá D.C.

Referencia: **CONTRATO DE OBRA N° CO-137-2019 cuyo objeto es "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y DEL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"**

Asunto: **DERECHO DE PETICION SOLICITUD DE INFORMACION Y/O POSIBLES AMPLIACIONES O RENOVACIONES.**

Cordial Saludo.

Haciendo uso de las facultades otorgadas por el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, se solicita amablemente información sobre redes existentes y posibles ampliaciones o renovaciones para el proyecto de la referencia, de acuerdo con los tramos a intervenir así:

Nº	CIV	EJE	DESDE	HASTA	ELEMENTO	UPZ	BARRIO
1	14000772	KR 25A	AC 6	CL 6BIS	CALZADA	CIUDAD MONTES	RICAURTE
2	14000741	KR 25A	CL 6BIS	CL 6A	CALZADA	CIUDAD MONTES	RICAURTE
3	14000718	KR 25A	CL 6A	CL 7	CALZADA	CIUDAD MONTES	RICAURTE
4	14001678	KR 25A	CL 7	CL 7BIS	CALZADA	CIUDAD MONTES	RICAURTE
5	14001545	CL 1ABIS	AC 1	KR 26	CALZADA	SAN BLAS	RAMIREZ
6	14001619	CL 1C	KR 19A	KR 19BBIS	CALZADA	SABANA	EDUARDO SANTOS
7	14001616	CL 1C	KR 19BBIS	KR 19C	CALZADA	SABANA	EDUARDO SANTOS
8	14001469	CL 1F	KR 24A	KR 24B	CALZADA	RESTREPO	EL VERGEL
9	14001481	CL 1F	KR 24	KR 24A	CALZADA	RESTREPO	EL VERGEL
10	14001156	CL 2B	KR 25A	KR 26	CALZADA	CIUDAD MONTES	SANTA ISABEL
11	14001517	KR 26	CL 1ABIS	CL 1B	CALZADA	CIUDAD MONTES	SANTA ISABEL SUR
12	14001506	KR 18	CL 2	CL 3	CALZADA	SABANA	EDUARDO SANTOS
13	14001265	KR 25	CL 2	CL 2A	CALZADA	RESTREPO	EL VERGEL
14	14000126	KR 24	CL 22A	DG 22B BIS	CALZADA	LA SABANA	SAMPER MENDOZA
15	14001058	KR 26	CL 2C	CL 3	CALZADA	LA SABANA	PALOQUEMAO
16	14000565	CL 12	KR 20A	KR 21	CALZADA	LA SABANA	LA SABANA
17	14000573	CL 12	KR 20	KR 20A	CALZADA	LA SABANA	LA SABANA
18	14000282	CL 15	KR 27	KR 28A	CALZADA	LA SABANA	PALOQUEMAO
19	14000205	CL 17	KR 28A	KR 30	CALZADA	LA SABANA	PALOQUEMAO
20	14001367	CL 1B	KR 27A	KR 28	CALZADA	CIUDAD MONTES	SANTA ISABEL SUR
21	14000550	CL 12A	KR 20	KR 21	CALZADA	LA SABANA	LA SABANA

CON & CON
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION

NIT 830.041.411-0

Agradecemos su colaboración con la pronta entrega de esta información a la dirección Av. Cr. 7 N° 127 – 48 oficina 1006 de Bogotá D.C. con el objeto de determinar la existencia en las zonas de trabajo descritas y así evitar daños en las mismas.

Atentamente,

JUAN PABLO RICCI RUIZ
R.L. CON&CON S.A.S.

NIT 830.041.411-0

41

693

INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO 16-03-2020 10:
2020ER47420 1 Fol:1 Anex:0
Origen : CON Y CON CONSULTORIA Y CONSTRUCCION/JUAN PABLO RICCI RUIZ
Destino: OBRAS DE MITIGACION/ADONAI TORO VALERO
Asunto: REMITE OBSERVACIONES HOJAS DE VIDA CONTRATO DE OBRA 490-2019
Observ
Para consultar el estado de su tramite ingresa: www.idiger.gov.co/correspondencia

C&C-CO137-2019-004

Bogotá DC. marzo 9 de 2020

Señores
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DEL RIESGO Y CAMBIO CLIMATICO
Subdirectora para reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático.
Diagonal 47 # 77ª-09 Int. 11.
Bogotá D.C.

Referencia: **CONTRATO DE OBRA N° CO-137-2019 cuyo objeto es "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y DEL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"**

Asunto: **DERECHO DE PETICION SOLICITUD DE INFORMACION Y/O POSIBLES AMPLIACIONES O RENOVACIONES.**

Cordial Saludo.

Haciendo uso de las facultades otorgadas por el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, se solicita amablemente información sobre redes existentes y posibles ampliaciones o renovaciones para el proyecto de la referencia, de acuerdo con los tramos a intervenir así:

Nº	CIV	EJE	DESDE	HASTA	ELEMENTO	UPZ	BARRIO
1	14000772	KR 25A	AC 6	CL 6BIS	CALZADA	CIUDAD MONTES	RICAURTE
2	14000741	KR 25A	CL 6BIS	CL 6A	CALZADA	CIUDAD MONTES	RICAURTE
3	14000718	KR 25A	CL 6A	CL 7	CALZADA	CIUDAD MONTES	RICAURTE
4	14001678	KR 25A	CL 7	CL 7BIS	CALZADA	CIUDAD MONTES	RICAURTE
5	14001545	CL 1ABIS	AC 1	KR 26	CALZADA	SAN BLAS	RAMIREZ
6	14001619	CL 1C	KR 19A	KR 19BBIS	CALZADA	SABANA	EDUARDO SANTOS
7	14001616	CL 1C	KR 19BBIS	KR 19C	CALZADA	SABANA	EDUARDO SANTOS
8	14001469	CL 1F	KR 24A	KR 24B	CALZADA	RESTREPO	EL VERGEL
9	14001481	CL 1F	KR 24	KR 24A	CALZADA	RESTREPO	EL VERGEL
10	14001156	CL 2B	KR 25A	KR 26	CALZADA	CIUDAD MONTES	SANTA ISABEL
11	14001517	KR 26	CL 1ABIS	CL 1B	CALZADA	CIUDAD MONTES	SANTA ISABEL SUR
12	14001506	KR 18	CL 2	CL 3	CALZADA	SABANA	EDUARDO SANTOS
13	14001265	KR 25	CL 2	CL 2A	CALZADA	RESTREPO	EL VERGEL
14	14000126	KR 24	CL 22A	DG 22B BIS	CALZADA	LA SABANA	SAMPER MENDOZA
15	14001058	KR 26	CL 2C	CL 3	CALZADA	LA SABANA	PALOQUEMAO
16	14000565	CL 12	KR 20A	KR 21	CALZADA	LA SABANA	LA SABANA
17	14000573	CL 12	KR 20	KR 20A	CALZADA	LA SABANA	LA SABANA
18	14000282	CL 15	KR 27	KR 28A	CALZADA	LA SABANA	PALOQUEMAO
19	14000205	CL 17	KR 28A	KR 30	CALZADA	LA SABANA	PALOQUEMAO
20	14001367	CL 1B	KR 27A	KR 28	CALZADA	CIUDAD MONTES	SANTA ISABEL SUR
21	14000550	CL 12A	KR 20	KR 21	CALZADA	LA SABANA	LA SABANA

CON & CON
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION

NIT 830.041.411-0

Agradecemos su colaboración con la pronta entrega de esta información a la dirección Av. Cr. 7 N° 127 – 48 oficina 1006 de Bogotá D.C. con el objeto de determinar la existencia en las zonas de trabajo descritas y así evitar daños en las mismas.

Atentamente,

JUAN PABLO RICCI RUIZ
R.L. CON&CON S.A.S.

CON & CON
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION

NIT 830.041.411-0

694

C&C-CO137-2019-003

Bogotá, 21 de febrero de 2020

24/02/20
9:00 am
21
Fanny Forero

Señores:
MIRS LATINOAMERICA S.A.S.
Atn. Ing. Nick Randy Almeida Gamarra
Calle 23F No. 85ª-31
Interventor
Ciudad

Ref: CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CO 137-2019 cuyo objeto es "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALUDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES"

ASUNTO: Respuesta comunicación MIRS-MAR 012-2019.Entrega hojas de vida

Cordial saludo,

En atención a su comunicación en referencia, nos permitimos remitir las hojas de vida faltantes, para sí completar el trámite de aprobación de hojas de vida del equipo profesional para la ejecución del contrato 137-.2019.

Remitimos las hojas de vida de los siguientes profesionales:

- Especialista en pavimentos: Jorge Gómez Falla
- Topográfo: Juan Carlos Parra Osorio
- Residente de obra: Sandra Milena Moyano.

Amablemente solicitamos; que para la evaluación de la hoja de vida de la Residente de obra, Sandra Milena Moyano, sea tenido en cuenta el cuadro de equivalencias descrito en el literal f del anexo técnico del contrato.

f) En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así:

Postgrado con título	Requisitos de Experiencia General	Requisitos de Experiencia Específica
Especialización	Veinticuatro (24) meses	Doce (12) meses
Maestría	Treinta y seis (36) meses	Dieciocho (18) meses
Doctorado	Cuarenta y ocho (48) meses	Veinticuatro (24) meses

695

CON CON
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION

NIT 830.041.411-0

C&C-CO137-2019-002

Bogotá, 12 de febrero de 2020

14/02/20
8:34 am
24
Folios: Tres (3)

Señores:
MIRS LATINOAMERICA S.A.S.
Atn. Ing. Nick Randy Almeida Gamarra
Calle 23F No. 85ª-31
Interventor
Ciudad

Ref: CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CO 137-2019 cuyo objeto es "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALUDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES"

ASUNTO: Respuesta comunicación MIRS-MAR 006-2019.Entrega hojas de vida

Cordial saludo,

En atención a su comunicación en referencia nos permitimos remitir los siguientes documentos:

- Hoja de vida director de obra
- Certificación énfasis de la maestría del señor Juan Daniel Moya Robayo. Especialista en geotecnia
- Certificaciones laborales del ingeniero Hernán Ricci Ruiz. Especialista en presupuesto y programación
- Hoja de vida Residente Siso
- Hoja de vida Residente social

Con respecto a la solicitud de los contratos laborales para acreditar y avalar las auto certificaciones, tal como lo menciona su comunicación en referencia: "las entidades estales son autónomas para estructurar sus procesos de contratación y con el fin de aceptar la experiencia del equipo de trabajo certificada por el mismo proponente que lo postula, *puede exigir en sus pliegos de condiciones* documentos soportes como copias de contratos laborales o de prestación de servicios con el fin de constatar el vínculo laboral o contractual con los profesionales que el proponente oferta
Y si nos remitimos a lo estipulado en el pliego de condiciones: "las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de

copia 54 596

CON CON
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION

NIT 830.041.411-0

C&C-CO137-2019-001

Bogotá, 6 de febrero de 2020

Señores:
MIRS LATINOAMERICA S.A.S.
Atn. Ing. Nick Randy Almelda Gamarra
Calle 23F No. 85ª-31
Interventor
Ciudad

7/02/20
2:44 PM

Ref: CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CO 137-2019. cuyo objeto es "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALUDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES"

ASUNTO: Respuesta comunicación MIRS-MAR 005-2019.Entrega hojas de vida

Cordial saludo,

En atención a su comunicación en referencia nos permitimos remitir las siguientes hojas de vida del personal de plantilla mínima del proyecto 137-2019:

- Director de obra: Víctor Manuel Ariza
- Especialista Geotecnia: Juan Daniel Moya
- Especialista en Redes Hidrosanitarias: German Gabriel Rodríguez
- Especialista en presupuesto y programación: Hernán Ricci Ruiz
- Especialista en Transito y Transporte: Martha Rocip Castillo
- Residente Siso: Sandra Milena Gil
- Residente Social: Ruth Zoraida Larrahondo

Atentamente,

ING. Milena Gil Baquero
Coordinadora de Gestión Humana

Anexos: (28)
Elaboro: MGB
Aprobó

45 330 697

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

cambio

46
53
698

CONTRATO DE OBRA CO-137-2019					
CORRESPONDENCIA RECIBIDA					
FECHA DE ELABORACIÓN	CONSECUTIVO	FECHA DE RECIBIDO	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO
4-feb.-20	MIRS-MAR-005-2019	5-feb.-20	MIRS LATINOAMERICA S.A.S.	CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN CON&CON	Solicitud hojas de vida contrato de obra pública N° 137-2019
10-feb.-20	MIRS-MAR-006-2019	11-feb.-20	MIRS LATINOAMERICA S.A.S.	CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN CON&CON	Respuesta comunicación C&C-CO-137-2019-001
11-feb.-20	MIRS-MAR-007-2020	11-feb.-20	MIRS LATINOAMERICA S.A.S.	CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN CON&CON	Solicitud póliza de cumplimiento del contrato
11-feb.-20	MIRS-MAR-008-2020	12-feb.-20	MIRS LATINOAMERICA S.A.S.	ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES	Documentos legalización anticipo contrato de obra N° 137-2019
11-feb.-20	MIRS-MAR-009-2020	12-feb.-20	MIRS LATINOAMERICA S.A.S.	ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES	Solicitud reunión entre la entidad contratista e interventoría
18-feb.-20	MIRS-MAR-008-2021	18-feb.-20	MIRS LATINOAMERICA S.A.S.	CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN CON&CON	Observaciones plan detallado de anticipo contrato de obra pública N° 137-2019
18-feb.-20	MIRS-MAR-012-2021	17-feb.-20	MIRS LATINOAMERICA S.A.S.	CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN CON&CON	Respuesta comunicación C&C-CO-137-2019-002
27-feb.-20	MIRS-MAR-012-2021	2-mar.-20	MIRS LATINOAMERICA S.A.S.	ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES	Aclaración experiencia profesionales requeridos contrato CO-137-2019
10-mar.-20	MIRS-MAR-016-2021	10-mar.-20	MIRS LATINOAMERICA S.A.S	CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN CON&CON	Llamado de atención
16-mar.-20	MIRS-MAR-019-2021	16-mar.-20	MIRS LATINOAMERICA S.A.S.	CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN CON&CON	Entrega radicados ESP y SDM
ENTIDADES DISTRITALES Y EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS					
12-mar.-20	1015021 6-038-20	13-mar.-20	VANTI	CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN CON&CON	Nombramiento de delegado. Contrato No.137 - 2019
20-mar.-20	1015341 0-6277-2020	20-mar.-20	VANTI	CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN CON&CON	Certificación de Red
24-mar.-20	2020ER6807	24-mar.-20	INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPECIALES DEL DISTRITO CAPITAL - IDECA	CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN CON&CON	Respuesta a derecho de petición - Contrato CO-137-2019
25-mar.-20	331001-S-2020-075019	6-may.-20	EMPRESA DE ACUEDUCTO DE BOGOTA	CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN CON&CON	Oficio No.E-2020-026124 Contrato de Obra 137 de 2019
6-abr.-20	ECRGC EDI 475 - 2020	6-may.-20	EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA - ETB	CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN CON&CON	Certificación de redes - Contrato No 137 - 2019
22-abr.-20	8109170	6-may.-20	ENEL CODENSA	CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN CON&CON	Derecho de petición No 0262591 0 del 01 de Abril de 2020
6-may.-20	SDM-SS-61874-2020	6-may.-20	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN CON&CON	Solicitud de diseños de señalización vertical y horizontal existentes en la SDM , para el contrato de obra FDLM - 137-2019

46
32
699

CONTRATO DE OBRA CO-137-2019					
CORRESPONDENCIA RECIBIDA - INFORME TÉCNICO N° 03					
FECHA DE ELABORACIÓN	CONSECUTIVO	FECHA DE RECIBIDO	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO
4-feb.-20	MIRS-MAR-005-2019	5-feb.-20	MIRS LATINOAMERICA S.A.S	CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN CON&CON	Solicitud hojas de vida contrato de obra pública N° 137-2019
10-feb.-20	MIRS-MAR-006-2019	11-feb.-20	MIRS LATINOAMERICA S.A.S.	CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN CON&CON	Respuesta comunicación C&C-CO-137-2019-001
11-feb.-20	MIRS-MAR-007-2020	11-feb.-20	MIRS LATINOAMERICA S.A.S	CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN CON&CON	Solicitud póliza de cumplimiento del contrato
11-feb.-20	MIRS-MAR-008-2020	12-feb.-20	MIRS LATINOAMERICA S.A.S.	ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES	Documentos legalización anticipo contrato de obra N° 137-2019
11-feb.-20	MIRS-MAR-009-2020	12-feb.-20	MIRS LATINOAMERICA S.A.S.	ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES	Solicitud reunión entre la entidad contratista e interventoría
18-feb.-20	MIRS-MAR-010-2020	18-feb.-20	MIRS LATINOAMERICA S.A.S.	CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN CON&CON	Observaciones plan detallado de anticipo contrato de obra pública N° 137-2019
18-feb.-20	MIRS-MAR-012-2020	17-feb.-20	MIRS LATINOAMERICA S.A.S	CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN CON&CON	Respuesta comunicación C&C-CO-137-2019-002
27-feb.-20	MIRS-MAR-014-2020	2-mar.-20	MIRS LATINOAMERICA S.A.S	ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES	Aclaración experiencia profesionales requeridos contrato CO-137-2019
10-mar.-20	MIRS-MAR-018-2020	10-mar.-20	MIRS LATINOAMERICA S.A.S.	CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN CON&CON	Llamado de atención
16-mar.-20	MIRS-MAR-019-2020	16-mar.-20	MIRS LATINOAMERICA S.A.S.	CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN CON&CON	Entrega radicados ESP y SDM
ENTIDADES DISTRITALES Y EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS					
12-mar.-20	1015021 6-038-20	13-mar.-20	VANTI	CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN CON&CON	Nombramiento de delegado Contrato No.137 - 2019
20-mar.-20	1015341 0-6277-2020	20-mar.-20	VANTI	CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN CON&CON	Certificación de Red
24-mar.-20	2020ER6807	24-mar.-20	INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPECIALES DEL DISTRITO CAPITAL - IDECA	CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN CON&CON	Respuesta a derecho de petición - Contrato CO-137-2019
25-mar.-20	331001-S-2020-075019	6-may.-20	EMPRESA DE ACUEDUCTO DE BOGOTA	CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN CON&CON	Oficio No.E-2020-026124 Contrato de Obra 137 de 2019
6-abr.-20	ECRGC EOI 475 - 2020	6-may.-20	EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA - ETB	CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN CON&CON	Certificación de redes - Contrato No.137 - 2019
22-abr.-20	8109170	6-may.-20	ENEL CODENSA	CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN CON&CON	Derecho de petición No.0262591 0 del 01 de Abril de 2020
6-may.-20	SDM-SS-61874-2020	6-may.-20	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN CON&CON	Solicitud de diseños de señalización vertical y horizontal existentes en la SDM para el contrato de obra FDLM-137-2019

47
53
700

MIRS LATINOAMERICA

MIRS-MAR-005-2019

Bogotá D.C., 04 de febrero de 2020

Señores:
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION CON&CON
Cra 7 N° 127-48 - Oficina 1006
Bogota D.C.

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 137-2019 CUYO OBJETO ES CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 141-2019 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SISO LOS PROCESOS SST - MA – SO - PMT, DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE TIENE POR OBJETO: "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR MONTO AGOTABLE CON FORMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

ASUNTO: SOLICITUD HOJAS DE VIDA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 137-2019

Cordial Saludo,

Por medio del presente oficio, nos permitimos solicitar las hojas de vida de los profesionales de acuerdo a los anexos técnico del contrato de obra pública N° 137-2019, a la fecha no se ha recibido información.

Atentamente

NICK RANDY ALMEIDA GAMARRA
R.L. MIRS LATINOAMERICA S.A.S

Anexos: Folios 10

48
534
701

IRS LATINOAMERICA

MIRS-MAR-006-2019

Bogotá D.C., 10 de febrero de 2020

Señores.
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION CON&CON
Cra 7 N° 127-48 - Oficina 1006
Bogotá D.C.

1 2 folios

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 137-2019 CUYO OBJETO ES CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 141-2019 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SISO LOS PROCESOS SST - MA – SO - PMT DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TIENE POR OBJETO. "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR MONTO AGOTABLE CON FORMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

ASUNTO: RESPUESTA COMUNICACIÓN C&C-CO137-2019-001.

Cordial Saludo,

Dando respuesta al oficio del asunto nos permitimos realizar las siguientes observaciones:

CARGO	NOMBRE	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA (1) UNO Dedicación 50%	Víctor Manuel Ariza	No fue entregada la hoja de vida.
RESIDENTE DE OBRA (1) UNO Dedicación 100%	NO PRESENTA	No fue entregada la hoja de vida.
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA (1) UNO Dedicación 10%	Juan Daniel Moya	Cumple. Siempre y cuando se anexe: (Las auto certificaciones deben ir acompañadas de copia de los

		contratos laborales o de prestación de servicios). 2- se evidencia que el especialista tiene magister en ING civil de los andes pero bien ni título, ni acta de grado anuncia lo descrito en anexo 13, "énfasis en geotecnia" por favor aclarar
ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS (1) UNO Dedicación 10%	NO PRESENTA	No fue entregada la hoja de vida
ESPECIALISTA EN REDES HIDROSANITARIAS (1) UNO Dedicación 30%	German Gabriel Rodriguez	Cumple Siempre y cuando: 1- se anexe (Las auto certificaciones deben ir acompañadas de copia de los contratos laborales o de prestación de servicios).
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN (1) UNO Dedicación 20%	Hernán Ricci Ruiz	No se anexaron las certificaciones laborales que acrediten las experiencia especifica
ESPECIALISTA EN TRANSITO Y TRANSPORTE (1) UNO Dedicación 30%	Martha Rocio Castillo	Cumple. Siempre y cuando: 1-se anexe (Las auto certificaciones deben ir acompañadas de copia de los contratos laborales o de prestación de servicios).
TOPOGRAFO (1) UNO Dedicación 50%	NO PRESENTA	No fue entregada la hoja de vida
RESIDENTE SISO (1) UNO Dedicación 100%	Sandra Milena Gil	No fue entregada Hoja de Vida
RESIDENTE SOCIAL (1) UNO Dedicación 60%	Ruth Zoraida Larrahondo	No fue entregada Hoja de Vida.

La solicitud de la copia de los contratos para poder acreditar y avalar las auto-certificaciones del personal requerido para la ejecución de contrato se pasa en la respuesta dada por la entidad Colombia Compra Eficiente en comunicado a respuesta de consulta # 4201714000005270, de asunto "Acreditación personal de experiencia" tomado del siguiente enlace:

49
55
702

necesaria para poder firmar el acta de inicio del contrato.

Por lo anterior se le reitera la clausula CLÁUSULA 13. MULTAS del contrato, la cual refiere

1) **Por incumplimiento en los términos para requisitos de ejecución y demás requeridos para el inicio del contrato**: *Si el CONTRATISTA no allega en los términos establecidos en el contrato los documentos necesarios para la legalización del mismo, se causará una multa de cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por cada día calendario transcurrido a partir de la fecha para el cumplimiento de esta obligación y hasta su completa satisfacción. o hasta que el FDLM considere preciso hacer efectiva la cláusula penal por la gravedad del incumplimiento.* 2) **Por no cumplir con cualquiera de las obligaciones contenidas en el contrato o en los documentos que lo integran, o cumplirlas deficientemente o por fuera del tiempo estipulado**, se causará una multa equivalente al uno por mil (1X1000) del valor total del contrato, por cada día calendario que transcurra desde la fecha prevista para el cumplimiento de dichas obligaciones y hasta cuando estas efectivamente se cumplan. Si pasaren más de treinta días (30) calendario sin que el CONTRATISTA haya cumplido el FDLM podrá hacer efectiva la cláusula penal

Por lo anterior, se le solicita la entrega de las hojas de vida del personal que hace falta de acuerdo al anexo técnico definitivo, profesionales requeridos, en un plazo de un dia hábil para revisión por parte de la interventoría, teniendo en cuenta que es de extrema importancia contar con esta información, para la legalización e inicio de la ejecución contractual, para no generar retrasos en los tiempos estipulados en el contrato y evitar procesos sancionatorios.

Atentamente;

NICK RANDY ALMEIDA GAMARRA
R.L. MIRS LATINOAMERICA S.A.S

Anexos: Folios (0).
Proyectó: DAFC - S
CC ALCALDIA LOCAL DE MARTIRES
FONDO DE DESARROLLO LOCAL
Av Calle 19 #28-80 Centro Comercial Calima Piso 7
Bogotá D.C

50
536
703

LATINOAMERICA

MIRS-MAR-007-2019

Bogotá D.C., 11 de febrero de 2020

Señores
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION CON&CON
Cra 7 N° 127-48 - Oficina 1006
Bogotá D.C

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 137-2019 CUYO OBJETO ES CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 141-2019 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SISO LOS PROCESOS SST - MA - SO - PMT, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TIENE POR OBJETO: "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR MONTO AGOTABLE CON FORMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

ASUNTO: SOLICITUD PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Cordial Saludo.

Por medio del presente oficio, nos permitimos solicitar las pólizas de cumplimiento del contrato de obra pública de N° 137-2019.

Atentamente,

NICK RANDY ALMEIDA GAMARRA
R.L. MIRS LATINOAMERICA S.A.S

2:08pm
11 FEB
Joanna

Anexos: Folios (0).
Proyecto: DAFC - S
CC ALCALDIA LOCAL DE MARTIRES
FONDO DE DESARROLLO LOCAL
Av Calle 19 #28-80 Centro Comercial Calima Piso 7
Bogotá D.C

5F 55
Copia
→04

MIRS LATINOAMERICA

MIRS-MAR-008-2019

Bogotá D.C., 11 de febrero de 2020

Señores:
ALCALDIA LOCAL DE MARTIRES
FONDO DE DESARROLLO LOCAL
Av. Calle 19 #28-80 Centro Comercial Calima Piso 7
Bogotá D.C.

11/2/2020 Sticker web
Alcaldía Local de Mártires
R No. 2020-641-000825-2
2020-02-11 12:24 Folios 1 Anexos 23
Destino: Área de Gestión de Desarr
Rem/D: MIRS LATINOAMERICA SAS

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 137-2019 CUYO OBJETO ES CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 141-2019 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SISO LOS PROCESOS SST - MA – SO - PMT, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TIENE POR OBJETO: "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR MONTO AGOTABLE CON FORMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

ASUNTO: **"DOCUMENTOS LEGALIZACIÓN ANTICIPO CONTRATO DE OBRA N° 137-2019**

Cordial Saludo,

Por medio del presente oficio, nos permitimos hacer entrega de los documentos pertinentes para fines de la CLÁUSULA 6. ANTICIPO del contrato citado en el asunto.

1. Cuenta de Cobro
2. Certificación de Parafiscales
3. Certificación de creación de fideicomiso-Alianza fiduciaria
4. Copia del Contrato de Fiducia
5. Cámara de Comercio Vigente
6. RUT CON&CON S.A.

10+50 anx

escaneo

MIRS LATINOAMERICA

MIRS-MAR-008-2019

Respetuosamente les recordamos que el día 04/02/2020 con radicado R No. 2020-[illegible]19-2 se hizo entrega del cronograma y el plan de inversión del anticipo del contratista de obra.

Atentamente;



NICK RANDY ALMEIDA GAMARRA
R.L. MIRS LATINOAMERICA S.A.S

Anexos: Folios (23).
Proyectó: DAFC S
CC **CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN CON&CON**
Cra 7 N° 12 ' 48 Oficina 1006
Bogotá D.C.

52
530
705

MIRS LATINOAMERICA

MIRS-MAR-009-2019

Bogotá D.C., 11 de febrero de 2020

11/2/2020 Sticker web

Alcaldía Local de Mártires
R No. 2020-641-000824-2
2020-02-11 12:21 - Folios: 1 Anexos: 0
Destino: Área de Gestion de Desarr
Rem/D. MIRS LATINOAMERICA SAS

Señores:
ALCALDIA LOCAL DE MARTIRES
FONDO DE DESARROLLO LOCAL
Av. Calle 19 #28-80 Centro Comercial Calima Piso 7
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 137-2019 CUYO OBJETO ES CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 141-2019 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SISO LOS PROCESOS SST - MA – SO - PMT, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TIENE POR OBJETO: "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR MONTO AGOTABLE CON FORMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

ASUNTO: SOLICITUD REUNIÓN ENTRE LA ENTIDAD, CONTRATISTA E INTERVENTORÍA.

Por medio de la presente nos dirigimos a ustedes para solicitar reunión entre el contratista de obra y de interventoria para definir cuándo se suscribirá el acta de inicio tanto de la obra como de la interventoria; y también se nos informe quien es el supervisor de contrato delegado.

Atentamente;

NICK RANDY ALMEIDA GAMARRA
R.L. MIRS LATINOAMERICA S.A.S

Anexos: Folios (23).
Proyecto: DAFC-S
CC **CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN CON&CON**
Cra 7 N° 127-48 - Oficina 1006
Bogotá D.C.

10:60 am
Jacarro

55
55
706

MIRS LATINOAMERICA

MIRS-MAR-010-2019

Bogotá D.C., 18 de febrero de 2020

Señores:
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION CON&CON
Cra 7 N° 127-48 - Oficina 1006
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 137-2019 CUYO OBJETO ES CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 141-2019 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SISO LOS PROCESOS SST - MA – SO - PMT, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TIENE POR OBJETO: "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR MONTO AGOTABLE CON FORMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES.

ASUNTO: Observaciones plan detallado de Anticipo contrato de obras pública No 137-2019.

Cordial Saludo,

Por medio del presente oficio, nos permitimos anexar las observaciones emitidas por parte del FDLM con respecto al plan detallado de inversión del anticipo contrato de obra pública No 137-2019, con el fin de que se subsanen cada una de las observaciones presentadas y se radiquen en el menor tiempo posible ante la interventoria para su respectiva revisión y visto bueno, con el fin de continuar con el proceso correspondiente, Se anexa copia del requerimiento hecho por el FDLM, mediante oficio R No. 20206430062281, del 13 de Febrero de 2020.

Adicionalmente, según directriz de la Alcaldía Local los Mártires que, por medio de un correo electrónico, solicita:

1. **Falta incluir Factura**, no es cuenta de cobro de acuerdo a las obligaciones del Anexo tipo, Clausulado Minuta.
2. Certificación Bancaria Actualizada, a vigencia del año 2020.

Sin otro particular:

Atentamente

NICK RANDY ALMEIDA GAMARRA
R.L. MIRS LATINOAMERICA S.A.S

10 FAC Cam
11 FEB

Anexos: Folios (18).
Proyecto: DAFC-S
CC **ALCALDIA LOCAL DE MARTIRES**
FONDO DE DESARROLLO LOCAL
Av. Calle 19 #28-80 Centro Comercial Calima Piso 7
Bogotá D.C.

2020-074-295

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No. 20206430062281
Fecha: 13-02-2020

Bogotá, D.C.

643

SEÑOR
NICK RANDY ALMEIDA GAMARRA
REPRESENTANTE LEGAL MIRS LATINOAMERICA S.A.S
Calle 23 F No 85ª-31
Bogotá

ASUNTO: Observaciones Plan detallado de inversión de Anticipo contrato de obra pública No 137-2019.

Referencia: Oficio radicado ALM No 20206410007192

Reciba un cordial saludo, con el fin de emitir respuesta al documento radicado, desde la competencia local y registros a nuestra disposición de forma cordial nos permitimos dar contestación.

Según el anexo radicado 2020-641-000719-2, donde se encuentra el documento programa de inversión de obra, se puede observar las siguientes falencias a corregir:

1. De acuerdo a lo estipulado en la cláusula 7 de la minuta del contrato "Forma de pago numeral a). Un primer pago en calidad de anticipo equivalente al 30% del valor del contrato, previa constitución de la garantía de buen manejo y correcta inversión del anticipo, del cumplimiento de los requisitos señalados ***para la entrega del mismo y de la aprobación del Plan detallado de Inversión de anticipo*** ". El titulo no corresponde a lo requerido, se solicita un plan detallado de inversión de anticipo, según la minuta y los estudios previos.

2. Las actividades relacionadas en el oficio de la referencia son mínimas y deben ser detalladas, coherentemente con el presupuesto aprobado y ofertado por CON&CON, en su oferta económica, en el proceso FDLM-LP-134-2019.

3. Es indispensable que se revise y se tome con base la estructuración del presupuesto realizado por el FDLM, para el proyecto en estudios previos y anexo técnico definitivo N 1: Donde se puede evidenciar al detalle cada actividad e ítem, así mismo se debe realizar primero el diagnóstico respectivo de los CIVS a intervenir y con esta información dar inicio a las actividades de obra, estos costos de estudios y diseño se deben estimar e incluir en el anticipo que se va a presentar a la entidad.

COSTO ACTIVIDADES AMBIENTALES y SST(B)
COSTO ACTIVIDADES SOCIALES (C)
COSTO PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (D)
COSTOS ESTIMADOS PARA ENSAYOS DE LABORATORIO (G) (INCLUYE AJUSTES E IVA)
COSTO ESTIMADO DE AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (H) (INCLUYE ELEMENTOS DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO, ENSAYOS DE LABORATORIO, AJUSTES E IVA)

4. De otro lado se deben tener en cuenta cada uno del ítem de obra, ofertados y de allí estimar cantidades con su respectivo valor unitario, que lleve al valor para la respectiva amortización del anticipo.

Para resumir, la interventoría de obra debe avalar el plan detallado de inversión del anticipo, donde se observe con precisión los costos de inversión del anticipo, con una coherencia entre etapas del proyecto, como son estudios y diseños, obra con sus preliminares y así sucesivamente, se adjunta el soporte técnico del anexo técnico 1 definitivo del FDLM, donde están las actividades desarrolladas con exactitud.

Se ultima que, con la subsanación del plan detallado de inversión de anticipo y los demás documentos entregados, continuaremos con el proceso para la firma de Acta de inicio.

Cordialmente,

RAUL HERNANDO ESTEBAN GARCIA
Alcalde Local de Los Mártires
alcalde.martires@gobiernobogota.gov.co

Anexo: 17 FOLIOS
Elaboró: Ing. Diana Alexandra Jimenez Ariza

a. Principales Ítems de pago:

[Ítems de pago]

Dado que, en la ejecución del contrato derivado del presente proceso, se requiere adelantar etapa previa de consultoría, en la cual se define el tipo de intervención y presupuesto real se publica en el proceso licitatorio el ANEXO INFORMATIVO PRESUPUESTO INDICATIVO Y AIU OFICIAL, que se define como un listado de referencia con los posibles ítems y unidades de pago que serán empleados en el desarrollo de las obras y cuyos valores quedan pactados según la propuesta del oferente. Los valores unitarios oficiales de este presupuesto indicativo provienen de la canasta de precios de referencia del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU vigencia 2019. http://www.idu.gov.co/web/guest/contratacion_precios, cuyo listado general está publicado como documento de consulta en el presente proceso licitatorio: ANEXO INFORMATIVO VISOR DE PRECIOS UNITARIOS IDU 2019.

RESUMEN

ANEXO 1

OBJETO DE LA LICITACIÓN:	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE POR MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO Y LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE LA MALLA VIAL Y DEL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES
CONTRATO N.	
MODALIDAD DE PROYECTO	LICITACION PUBLICA
FECHA:	9-abr-19

Página 1

ACTIVIDADES	MESES	MONTOS
ENSAYOS DE LABORATORIO (Inc. Ajustes)		$ 197.239.232,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS (Inc. EPP y Ajustes)	7	$ 139.870.870,00
PRELIMINARES	0	$ 0,00
TOTAL ETAPA EyD	7	**$ 337.110.102,00**
EJECUCIÓN DE OBRAS		$ 3.579.579.320,00
TOTAL PROYECTO	7	**$ 3.916.689.422,00**
AIU	31,21%	$ 1.117.186.706,00
PMA (Incl. AIU)	22,69%	$ 141.327.252,00
PGS (Incl. AIU)	22,69%	$ 129.998.861,00
PMT (Incl. AIU)	22,71%	$ 58.663.420,00
AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA		$ 53.756.056,00
COMPENSACIONES SDA		$ 0,00
ENSAYOS DE LABORATORIO		$ 20.262.855,00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO		**$ 5.437.884.572,00**

FORMA DE PAGO PRODUCTOS PARA LA ETAPA DE ESTUDIOS - DISEÑOS Y ABROBACIONES

FORMA DE PAGO PRODUCTOS PARA LA ETAPA DE ESTUDIOS - DISEÑOS Y ABROBACIONES

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Instituto Desarrollo Urbano

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

ANEXO 1

No.	PRODUCTO APROBADO		VALOR A PAGAR CONTRA ENTREGA Y APROBACION DE PRODUCTOS (INCLUYE COSTOS ADMINISTRATIVOS, AJUSTES - NO INCLUYE VR. A PAGAR POR PRECIOS UNITARIOS)	RELACION DEL PRODUCTO SOBRE EL VALOR PARCIAL A PAGAR CONTRA ENTREGA DE PRODUCTOS
1	TOPOGRAFIA		$ 10.467.223	14,00%
2	ESTUDIO EN ESPACIO PUBLICO		$ -	0,00%
3	ESTUDIO DE TRÁNSITO - TRANSPORTE - SEÑALIZACION - PMT		$ 10.317.691	13,80%
4	SUELOS, GEOTÉCNIA		$ 4.261.656	5,70%
5	PAVIMENTOS		$ 4.261.655	5,70%
6	DISEÑO GEOMETRICO		$ (1)	0,00%
7	ESTUDIOS SOCIALES		$ 2.467.274	3,30%
8	ESTUDIOS AMBIENTALES - SST - FORESTAL		$ 22.429.763	30,00%
9	ARQUEOLOGIA		$ 2.616.806	3,50%
10	DISEÑOS REDES ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO	DISEÑO REDES ACUEDUCTO	$ 3.439.230	4,60%
		ALCANTARILLADO	$ 3.439.230	4,60%
11	DISEÑO DE REDES ETB, EPM, CODENSA, TELECOM Y GAS NATURAL	CODENSA	$ 2.766.337	3,70%
		ETB	$ 448.595	0,60%
		EPM	$ 448.595	0,60%
		TELECOM	$ 448.595	0,60%
		GAS NATURAL	$ 224.298	0,30%
12	ESTUDIOS - DISEÑOS ESTRUCTURALES		$ 2.242.976	3,00%
13	PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA - PRECIOS UNITARIOS - ELABORACIÓN PRESUPUESTO INTERVENTORIA		$ 3.738.294	5,00%
	ESPECIFICACIONES TECNICA DE CONSTRUCCION			
	PROGRAMACION DE OBRA			

SUMATORIA DE PRECIOS UNITARIOS PARA ETAPA DE CONSULTORÍA

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE POR MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO Y LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE LA MALLA VIAL Y DEL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES

SUMATORIA DE PRECIOS UNITARIOS PARA ETAPA DE CONSULTORÍA

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

ANEXO 1

ACTIVIDADES A PRECIO UNITARIO	UNIDAD	COSTO UNITARIO SIN IVA($)	FACTOR MULTIPLICADOR	VALOR BASICO UNITARIO OFICIAL (sin IVA) (incluye factor multiplicador)
Ensayos de Laboratorio Pavimentos				
APIQUE MANUAL HASTA 2 M DE 1.5 M X 1.5 M - RELLENO Y ADECUACIÓN DEL SITIO - INCLUYE TRANSPORTE	UN	$ 308.200,0	1,10	$ 339.020,0
ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS GRUESO Y FINO	UN	$ 62.941,0	1,10	$ 69.235,0
DETERMINACIÓN LÍMITE LÍQUIDO, LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS	UN	$ 42.000,0	1,10	$ 46.200,0
DETERMINACIÓN EN EL LABORATORIO DEL CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) DE MUESTRAS DE SUELO, ROCA Y MEZCLAS DE SUELO - AGREGADO	UN	$ 9.800,0	1,10	$ 10.780,0
CBR DE SUELOS COMPACTADOS EN EL LABORATORIO (SUELOS GRANULARES)	UN	$ 262.500,0	1,10	$ 288.750,0
CBR SOBRE MUESTRA INALTERADA (SUELOS COHESIVOS)	UN	$ 104.400,0	1,10	$ 114.840,0
DETERMINACIÓN DEL POTENCIAL DE CAMBIO VOLUMÉTRICO DE UN SUELO EMPLEANDO EL APARATO DE LAMBE	UN	$ 179.000,0	1,10	$ 196.900,0
MÓDULO RESILIENTE DE SUELOS Y AGREGADOS	UN	$ 921.324,0	1,10	$ 1.013.456,0
Ensayos de Laboratorio Geotecnia				
PERFORACIÓN MECÁNICA EN SUELO ROCA DE 10 m A 30 m	ML	$ 303.304,0	1,10	$ 333.634,0
RELACIONES HUMEDAD - PESO UNITARIO SECO EN LOS SUELOS (ENSAYO NORMAL DE COMPACTACIÓN)	UN	$ 114.286,0	1,10	$ 125.715,0
DENSIDAD BULK (PESO UNITARIO) Y PORCENTAJE DE VACÍOS DE LOS AGREGADOS EN ESTADO SUELTO Y COMPACTO				
CONSOLIDACIÓN UNIDIMENSIONAL DE SUELOS - MÉTODO A (LENTA)	UN	$ 450.000,0	1,10	$ 495.000,0
EXPANSIÓN LIBRE EN CONSOLIDÓMETRO	UN	$ 118.778,0	1,10	$ 130.656,0
COMPRESIÓN INCONFINADA EN MUESTRAS DE SUELO				
CORTE DIRECTO EN CONDICIÓN CU, CONSOLIDADA - NO DRENADA (3 PUNTOS)	UN	$ 350.000,0	1,10	$ 385.000,0
Inspección de Redes			1,10	$ 0,0
INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMA CCTV PARA DIÁMETROS ENTRE 6" Y 36". INCL MANO DE OBRA IDÓNEA, INFORME ESCRITO DE DIAGNÓSTICO Y DVD CON VIDEO. INCL IVA	ML	$ 8.500,0	1,10	$ 9.350,0
INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMA CCTV PARA DIÁMETROS MAYORES A 36". INCL MANO DE OBRA IDÓNEA,	ML	$ 8.500,0	1,10	$ 9.350,0

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

INFORME ESCRITO DE DIAGNÓSTICO Y DVD CON VIDEO. INCL IVA				
LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 6" Y 18" DE DIÁMETRO Y CON GRADO DE COLMATACIÓN MENOR DEL 30%. INCL MANO DE OBRA IDÓNEA, SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMIN DE COMBUSTIBLE Y AGUA. INCL. IVA	ML	$ 11.500,0	1,10	$ 12.650,0
LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 16" Y 36" DE DIÁMETRO Y CON GRADO DE COLMATACIÓN MENOR DEL 30%. INCLUYE MANO DE OBRA IDÓNEA, SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMIN DE COMBUSTIBLE Y AGUA. INCL IVA	ML	$ 12.500,0	1,10	$ 13.750,0
EQUIPO VACTOR - SONDEO - LIMPIEZA - RECOLECCIÓN DE LODOS NO PELIGROSOS	HR	$ 220.000,0	1,10	$ 242.000,0
TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LODOS NO PELIGROSOS PROVENIENTES DE ALCANTARILLADO	KG	$ 240,0	1,10	$ 264,0
AGUA	LT	$ 13,0	1,10	$ 14,0
SUMATORIA DE PRECIOS UNITARIOS (Incluye factor multiplicador. No inlcuye IVA)				**$ 3.836.364,0**

CÁLCULO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

FORMATO	CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
CÁLCULO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	FO-DP-01	Proyectos	2.0
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO			
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO			
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS			
OBJETO DE LA LICITACIÓN:	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE POR MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO Y LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE LA MALLA VIAL Y DEL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES		

PRESUPUESTO TOTAL (IVA INCLUIDO):	$ 337.110.102,00

DURACION (meses):	7					9-abr-19	
PERSONAL ESPECIALISTA, PROFESIONAL O DE APOYO / DESCRIPCION	CANTIDAD	CATEGORIA / UNID	COSTO ($) TOTAL HOMBRES ETAPA RECOP-ANALISIS	COSTO ($) TOTAL HOMBRES ETAPA FACTIBILIDAD	COSTO ($) TOTAL HOMBRES ETAPA EYD	COSTO ($) TOTAL HOMBRES ETAPA APROBAC	

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

ANEXO 1

DIRECTOR/COORDINACIÓN						
Director de Consultoria	1	4	$ 1.493.688,0	$ 1.493.688,0	$ 2.987.376,0	$ 2.987.376,0
Coordinador de la Consultoria	1	6	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0
ESPECIALISTAS Y/O PROFESIONALES						
TRANSITO						
Especialista en Tránsito y Transporte	1	4	$ 1.493.688,0	$ 1.493.688,0	$ 2.987.376,0	$ 1.493.688,0
Ingeniero de apoyo	1	7	$ 908.208,0	$ 908.208,0	$ 1.816.416,0	$ 908.208,0
Aforadores						
TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (No incluye Factor de Prestaciones)	30		$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0
ESPACIO PUBLICO						
Especialista en urbanismo y espacio publico	1	4	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0
Arquitecto de apoyo	1	7	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0
Arquitecto Imágenes 3D y animaciones 3D	1	6	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0
VIAS						
Especialista en Diseño Geometrico	1	4	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0
ESTRUCTURAS						
Especialista en Estructuras	1	4	$ 1.493.688,0	$ 1.493.688,0	$ 298.738,0	$ 1.493.688,0
GEOTECNIA Y PAVIMENTOS						
Especialista en Geotecnia	1	4	$ 1.493.688,0	$ 1.493.688,0	$ 1.493.688,0	$ 1.493.688,0
Especialista en Pavimentos	1	4	$ 1.493.688,0	$ 1.493.688,0	$ 1.493.688,0	$ 1.493.688,0
REDES HIDROSANITARIAS						
Especialista en redes Hidrosanitarias	1	4	$ 1.493.688,0	$ 1.493.688,0	$ 1.493.688,0	$ 1.493.688,0
Ingeniero de Diseño de Redes Hidrosanitarias	1	7	$ 908.208,0	$ 908.208,0	$ 908.208,0	$ 908.208,0
REDES SECAS						
Especialista en redes electrica, gas, telefono, fibra optica	1	4	$ 1.493.688,0	$ 1.493.688,0	$ 1.493.688,0	$ 1.493.688,0
PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION						
Ingeniero y/o Arquitecto (Costos, Presupuestos y Programación)	1	5	$ 1.347.080,0	$ 0,0	$ 1.347.080,0	$ 1.347.080,0
GESTION AMBIENTAL						
Especialista Ambiental	1	5	$ 1.347.080,0	$ 1.347.080,0	$ 1.347.080,0	$ 0,0
Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo	1	5	$ 1.347.080,0	$ 1.347.080,0	$ 1.347.080,0	$ 0,0
Especialista Forestal	1	6	$ 1.201.424,0	$ 1.201.424,0	$ 1.201.424,0	$ 12.014.240,0
ARQUEOLOGIA						
Arqueologo	1	7	$ 908.208,0	$ 908.208,0	$ 454.104,0	$ 454.104,0
Arquitecto BIC	1	7	$ 0,0	$ 908.208,0	$ 454.104,0	$ 454.104,0
GESTION SOCIAL						
Especialista Social	1	5	$ 0,0	$ 1.347.080,0	$ 0,0	$ 673.540,0
Auxiliar Social	1	6	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0
Guia civico						

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (No incluye Factor de Prestaciones)	1		$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0
SIG - CAD						
Ingeniero especialista en SIG-CAD	1	7	$ 454.104,0	$ 454.104,0	$ 454.104,0	$ 454.104,0
COMISION TOPOGRAFÍA						
Ingeniero Catastral o Topografico	1	5	$ 673.540,0	$ 673.540,0	$ 673.540,0	$ 673.540,0
TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - TOPÓGRAFO INSPECTOR (No incluye Factor de Prestaciones)	2		$ 585.718,0	$ 585.718,0	$ 585.718,0	$ 585.718,0
TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CADENERO 1 (No incluye Factor de Prestaciones)	2		$ 386.078,0	$ 386.078,0	$ 386.078,0	$ 386.078,0
TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CADENERO 2 (No incluye Factor de Prestaciones)	2		$ 336.237,0	$ 336.237,0	$ 336.237,0	$ 336.237,0
TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - DIBUJANTE 1 (No incluye Factor de Prestaciones)	1		$ 259.063,0	$ 259.063,0	$ 259.063,0	$ 259.063,0
PERSONAL AUXILIAR TECNICO						
TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - AUXILIAR DE INGENIERÍA (No incluye Factor de Prestaciones)	1		$ 247.044,0	$ 247.044,0	$ 247.044,0	$ 98.818,0
TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - LABORATORISTA INSPECTOR (No incluye Factor de Prestaciones)	1		$ 259.539,0	$ 259.539,0	$ 259.539,0	$ 108.818,0
PERSONAL ADMINISTRATIVO						
TARIFA MES - PERSONAL ADMINISTRATIVO - ADMINISTRADOR (No incluye Factor de Prestaciones)	1		$ 272.867,0	$ 272.867,0	$ 272.867,0	$ 272.867,0
TARIFA MES - PERSONAL ADMINISTRATIVO - SECRETARIA 2 (No incluye Factor de Prestaciones)	1		$ 140.036,0	$ 140.036,0	$ 140.036,0	$ 140.036,0
OTRO PERSONAL						
TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CONDUCTOR O MOTORISTA (No incluye Factor de Prestaciones)	1		$ 0,0	$ 140.036,0	$ 140.036,0	$ 140.036,0
SUBTOTAL 1			**$ 22.037.330,0**	**$ 23.085.574,0**	**$ 24.878.600,0**	**$ 32.1[illegible]**

COSTOS OPERACIONALES						
ALQUILER EQUIPO, SUMINISTROS Y OTROS ELEMENTOS	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**TOTAL ($) COSTOS OPERACIONALES ETAPA RECOP-ANALISIS**	**TOTAL ($) COSTOS OPERACIONALES FACTIBILIDAD**	**TOTAL ($) COSTOS OPERACIONALES ETAPA EYD**	**TOTAL ($) COSTOS OPERACIONALES ETAPA APROBAC**
TOPOGRAFIA						
ALQUILER MES - DISTANCIOMETRO (Incluyendo tránsito y Estación Total) - Capacidad de Lectura hasta 1500m	2	MES	$ 0,0	$ 0,0	$ 702.020,0	$ 702.020,0
ALQUILER MES - PLOTTER	1	MES	$ 0,0	$ 214.545,0	$ 21.454,0	$ 53.636,0

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

CBR SOBRE MUESTRA INALTERADA (SUELOS COHESIVOS)	21,00	UN	$ 0,0	$ 0,0	$ 2.411.640,0	$ 0,0
CBR DE SUELOS COMPACTADOS EN EL LABORATORIO (SUELOS GRANULARES)	21,00	UN	$ 0,0	$ 0,0	$ 6.063.750,0	$ 0,0
RELACIONES HUMEDAD - PESO UNITARIO SECO EN LOS SUELOS (ENSAYO MODIFICADO DE COMPACTACIÓN)	21,00	UN	$ 0,0	$ 0,0	$ 2.509.931,0	$ 0,0
DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO ORGÁNICO DE UN SUELO MEDIANTE EL ENSAYO DE PÉRDIDA POR IGNICIÓN	21,00	UN	$ 0,0	$ 0,0	$ 1.131.900,0	$ 0,0
MÓDULO RESILIENTE DE SUELOS Y AGREGADOS	21,00	UN	$ 0,0	$ 0,0	$ 21.282.584,0	$ 0,0
DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE CONTRACCIÓN DE LOS SUELOS	21,00	UN	$ 0,0	$ 0,0	$ 1.039.500,0	$ 0,0
EXPANSIÓN LIBRE EN CONSOLIDÓMETRO	21,00	UN	$ 0,0	$ 0,0	$ 2.743.772,0	$ 0,0
EXPLORACION DEL SUBSUELO						
PERFORACIÓN MECÁNICA EN SUELO ROCA DE 10 m A 30 m	0,00	ML	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0
PERFORACIÓN MECÁNICA EN SUELO ROCA DE 10 m A 30 m	0,00	ML	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0
CARACTERIZACIÓN INICIAL						
RELACIONES HUMEDAD - PESO UNITARIO SECO EN LOS SUELOS (ENSAYO MODIFICADO DE COMPACTACIÓN)	21,00	UN	$ 0,0	$ 0,0	$ 2.509.931,0	$ 0,0
DETERMINACIÓN LÍMITE LÍQUIDO, LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS	21,00	UN	$ 0,0	$ 0,0	$ 970.200,0	$ 0,0
DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE CONTRACCIÓN DE LOS SUELOS	21,00	UN	$ 0,0	$ 0,0	$ 1.039.500,0	$ 0,0
DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD (PESO UNITARIO) DE MUESTRAS DE SUELO.	21,00	UN	$ 0,0	$ 0,0	$ 531.300,0	$ 0,0
ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS GRUESO Y FINO	21,00	UN	$ 0,0	$ 0,0	$ 1.453.937,0	$ 0,0
CONSOLIDACIÓN UNIDIMENSIONAL DE SUELOS - MÉTODO A (LENTA)	21,00	UN	$ 0,0	$ 0,0	$ 10.395.000,0	$ 0,0
COMPRESIÓN INCONFINADA EN MUESTRAS DE SUELO	21,00	UN	$ 0,0	$ 0,0	$ 1.232.708,0	$ 0,0
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN UNIAXIAL DE MUESTRAS DE ROCAS INTACTAS	21,00	UN	$ 0,0	$ 0,0	$ 2.356.200,0	$ 0,0
CARGA PUNTUAL EN MUESTRAS DE ROCA INTACTA	21,00	UN	$ 0,0	$ 0,0	$ 1.270.500,0	$ 0,0
COMPRESIÓN TRIAXIAL EN CONDICIÓN CD CONSOLIDADO - DRENADO SOBRE SUELOS (3 PUNTOS)	21,00	UN	$ 0,0	$ 0,0	$ 40.425.000,0	$ 0,0
COMPRESIÓN TRIAXIAL EN CONDICIÓN CU, CONSOLIDADO - NO DRENADO SOBRE SUELOS (3 PUNTOS)	21,00	UN	$ 0,0	$ 0,0	$ 23.294.109,0	$ 0,0
DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO ORGÁNICO DE UN SUELO MEDIANTE EL ENSAYO DE PÉRDIDA POR IGNICIÓN	21,00	UN	$ 0,0	$ 0,0	$ 1.131.900,0	$ 0,0
PERMEABILIDAD DE SUELOS GRANULARES (CABEZA CONSTANTE)	21,00	UN	$ 0,0	$ 0,0	$ 7.161.000,0	$ 0,0

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

ANEXO 1

SONDEO E INSPECCION DE REDES SANITARIAS						
INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMA CCTV PARA DIÁMETROS ENTRE 6" Y 36". INCL MANO DE OBRA IDÓNEA, INFORME ESCRITO DE DIAGNÓSTICO Y DVD CON VIDEO. INCL IVA	21,00	ML	$ 0,0	$ 0,0	$ 196.350,0	$ 0,0
INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMA CCTV PARA DIÁMETROS MAYORES A 36". INCL MANO DE OBRA IDÓNEA, INFORME ESCRITO DE DIAGNÓSTICO Y DVD CON VIDEO. INCL IVA	21,00	ML	$ 0,0	$ 0,0	$ 196.350,0	$ 0,0
LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 6" Y 18" DE DIÁMETRO Y CON GRADO DE COLMATACIÓN MENOR DEL 30%. INCL MANO DE OBRA IDÓNEA, SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMIN DE COMBUSTIBLE Y AGUA. INCL. IVA	21,00	ML	$ 0,0	$ 0,0	$ 265.650,0	$ 0,0
LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 16" Y 36" DE DIÁMETRO Y CON GRADO DE COLMATACIÓN MENOR DEL 30%. INCLUYE MANO DE OBRA IDÓNEA, SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMIN DE COMBUSTIBLE Y AGUA. INCL IVA	21,00	ML	$ 0,0	$ 0,0	$ 268.750,0	$ 0,0
EQUIPO VACTOR - SONDEO - LIMPIEZA - RECOLECCIÓN DE LODOS NO PELIGROSOS	21,00	HR	$ 0,0	$ 0,0	$ 5.062.000,0	$ 0,0
TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LODOS NO PELIGROSOS PROVENIENTES DE ALCANTARILLADO	21,00	KG	$ 0,0	$ 0,0	$ 5.544,0	$ 0,0
AGUA	21,00	LT	$ 0,0	$ 0,0	$ 300,0	$ 0,0
SUBTOTAL			$ 0,0	$ 0,0	$ 159.234.580,0	$ 0,0
VR. BASICO PARA AJUSTES DE PRECIOS UNITARIOS			$ 0,0		$ 8.512.694,0	
VR. BASICO PARA ACTIVIDADES A PAGAR POR PRECIO UNITARIO - INCLUYE AJUSTES			$ 0,0		$ 165.747.254,0	
IVA 19%			$ 0,0		$ 31.491.978,0	
VR. BASICO + IVA 19% PARA ACTIVIDADES A PAGAR POR PRECIO UNITARIO - INCLUYE AJUSTES			$ 0,0		$ 197.239.232,0	
6. SUBTOTAL			$ 197.239.232,0			
VALOR TOTAL (SUBTOTAL 5 + 6)			$ 337.110.102,0			

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

51
545
712

ANEXO 1

MATRIZ PARA CÁLCULO DE AIU

OBJETO DE LA LICITACIÓN:	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE POR MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO Y LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE LA MALLA VIAL Y DEL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES

COSTO DIRECTO ESTIMADO DE OBRA (CD)	$3.579.579.320,0		FECHA:	9-abr-19
TERMINO ESTIMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	7	MESES	CONTRATO No.	
COSTOS ESTIMADOS PARA COMPENSACIONES A SDA				
COSTOS ESTIMADOS PARA ENSAYOS DE LABORATORIO	$20.262.855,0			
AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA				

ÍTEM	A. ADMINISTRACIÓN 1. COSTOS MENSUALES DE PERSONAL CARGO	CANTIDAD	CATEGORÍA	DEDICACIÓN MES	TOPE SALARIO (MES)	FACTOR PRESTACIONAL	N. MESES	SALARIO + PRESTACIONES
		A		B	C	D	E	F=A*B*C*D*E
1,1	PERSONAL PROFESIONAL (Ingenieros y Otros)							
1,101	DIRECTOR DE OBRA	1	4	0,50	$6.276.000,00	1,4511	7,0	$31.875.830,00
1,102	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	1	6	1,00	$5.048.000,00	1,4519	7,0	$51.305.248,00
1,103	ESPECIALISTA EN REDES HIDROSANITARIAS	1	4	0,30	$6.276.000,00	1,4511	7,0	$19.125.498,00
1,104	ESPECIALISTA EN REDES SECAS	1	4	0,20	$6.276.000,00	1,4511	7,0	$12.750.332,00
1,105	ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMETRICO	1	4	0,00	$6.276.000,00	1,4511	7,0	$0,00
1,106	ESPECIALISTA EN URBANISMO Y ESPACIO PÚBLICO	1	4	0,05	$6.276.000,00	1,4511	7,0	$3.187.583,00
1,107	ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN	1	5	0,20	$5.660.000,00	1,4515	7,0	$11.501.634,00
1,108	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	1	4	0,00	$6.276.000,00	1,4511	7,0	$0,00
1,109	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	1	4	0,05	$6.276.000,00	1,4511	7,0	$3.187.583,00
1,110	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	1	4	0,10	$6.276.000,00	1,4511	7,0	$6.375.166,00
1,111	INGENIERO ESPECIALISTA EN SIG-CAD	1	6	0,00	$5.048.000,00	1,4519	7,0	$0,00
1,2	PERSONAL TÉCNICO Y							

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

ANEXO 1

	PERSONAL AUXILIAR							
1,112	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - AUXILIAR DE INGENIERÍA (No incluye Factor de Prestaciones)	1	N/A	0,30	$2.076.000,00	1,4576	7,0	$6.354.730,00
1,201	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - INSPECTOR 1 (No incluye Factor de Prestaciones)	2	N/A	1,00	$1.791.000,00	1,4592	7,0	$36.587.577,00
1,202	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - TOPÓGRAFO INSPECTOR (No incluye Factor de Prestaciones)	1	N/A	0,50	$2.461.000,00	1,4561	7,0	$12.542.310,00
1,202	TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CADENERO 1 (No incluye Factor de Prestaciones)	1	N/A	0,50	$1.526.000,00	1,5535	7,0	$8.297.491,00
1,203	TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CADENERO 2 (No incluye Factor de Prestaciones)	1	N/A	0,50	$1.329.000,00	1,5692	7,0	$7.299.171,00
1,204	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - LABORATORISTA INSPECTOR (No incluye Factor de Prestaciones)	1	N/A	0,50	$2.181.000,00	1,4572	7,0	$11.123.324,00
1,205	TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CONDUCTOR O MOTORISTA (No incluye Factor de Prestaciones)	1	N/A	0,80	$1.107.000,00	1,5935	7,0	$9.878.475,00
1,3	**PERSONAL ADMINISTRATIVO**							
1,301	TARIFA MES - PERSONAL ADMINISTRATIVO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO-ALMACENISTA (No incluye Factor de Prestaciones)	1	N/A	1,00	$1.635.000,00	1,4603	7,0	$16.712.627,00
1,302	TARIFA MES - PERSONAL ADMINISTRATIVO - SECRETARIA 2 (No incluye Factor de Prestaciones)	1	N/A	0,25	$1.107.000,00	1,5935	7,0	$3.087.023,00
							SUBTOTAL COSTOS MENSUALES DE PERSONAL	**$251.191.802,00**

2	GASTOS OPERACIONALES MENSUALES	CANT.	AREA (M2)	DEDICACIÓN	DEDICACIÓN X ÁREA (M2)	COSTO ($/M2.MES)	N. MESES	VALOR ($)
2,01	ALQUILER MES - ARRIENDO OFICINA INCL. ADMINISTRACIÓN, SERVICIOS PÚBLICOS, COMUNICACIONES	1	50,00	0,50	25,00	$29.429	7,0	$5.150.075,00
2,02	ALQUILER MES - CAMPAMENTOS INCL. SERVICIOS PÚBLICOS PROVISIONALES	2	80,00	1,00	160,00	$11.741	7,0	$13.149.920,00
2,03	TARIFA GLOBAL - GASTOS OFICINA (PAPELERIA, FOTOCOPIAS Y OTROS)	1	N/A	1,00	N/A	$668.258	7,0	$4.677.806,00

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

2,04	ALQUILER MES - LABORATORIO - Estudios (Equipo completo)	1	N/A	0,13	N/A	$5.095.000	7,0	$4.458.125,00
2,05	ALQUILER MES - EQUIPO DE TOPOGRAFÍA (Incluye tránsito, nivel y elementos complementarios).	1	N/A	0,50	N/A	$3.267.000	7,0	$11.434.500,00
2,06	ALQUILER MES - CAMPERO PICK-UP, CAMIONETA DE 1300-2000cc - MODELO 2011 - 2008 - INCIDENCIA 75%	1	N/A	0,80	N/A	$5.784.000	7,0	$32.390.400,00
	SUBTOTAL GASTOS OPERACIONALES MENSUALES							**$71.260.826,00**

TOTAL COSTOS PERSONAL + GASTOS OPERACIONALES POR EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN	**$322.452.428,00**
TOTAL COSTOS PERSONAL + GASTOS OPERACIONALES POR EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN EN PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO	**9,01%**

3. IMPUESTOS Y GARANTÍAS			
3,1	**IMPUESTOS**		
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**IMPUESTO**	**VALOR ($)**
3,101	Contribución Especial (Impuesto de Guerra Ley 1738 DIC18-2014 prorroga 4 años)	5,00%	$238.539.247,00
3,102	ICA (Ley 14 6jul1983, Res 219 25feb2004)	0,69%	$32.918.416,00
3,103	GMF (Ley 1739 23dic2014 modifica el Estatuto Tributario)	0,00%	$0,00
3,104	Estampilla Universidad Distrital (Acuerdo 53 de 10ene2002)	0,00%	$0,00
3,105	RETEFUENTE actividades de obra	6,00%	$286.247.096,00
3,106	RETEFUENTE actividades de consultoria (el valor de ensayo de laboratorio y ajustes a los diseños	2,00%	$95.415.699,00
3,107	Estampilla Unipedagógica (Dec 584 de 19 dic 2014)	0,50%	$23.853.925,00

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

SUBTOTAL IMPUESTOS	$676.974.383,00

3,2	GARANTIAS						
ÍTEM	DESCRIPCIÓN		VR. BASE	% ASEGURADO	VIGENCIA AMPARO (MESES)	TASA ASEGURADORA	VALOR ($)
3,201	Cumplimiento	GARANTIA UNICA	$4.770.784.937,0	30%	13,00	0,20%	$3.693.177,00
3,202	Buen Manejo de Anticipo		$954.156.987,0	100%	13,00	0,20%	$2.463.110,00
3,203	Salarios y Prestaciones Sociales		$4.770.784.937,0	10%	43,00	0,20%	$4.071.659,00
3,204	Estabilidad de la Obra		$4.770.784.937,0	30%	60,00	0,20%	$17.334.677,00
3,205	Predios, labores y Operaciones-Vigencia (Decreto 1082 de 2015 Sección III)	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$4.770.784.937,0	5%	7,00	0,30%	$499.733,00

SUBTOTAL GARANTÍAS	$27.762.356,00

TOTAL IMPUESTOS Y GARANTÍAS	$704.736.739,00

A continuación, observamos cada uno de los Componente SST-MA-SO, PGS Y PMT, incluyendo AIU.

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Desarrollo Urbano

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

ANEXO 1

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS	
OBJETO DE LA LICITACIÓN:	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE POR MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO Y LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE LA MALLA VIAL Y DEL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

COMPONENTE A – PERSONAL

EJECUCIÓN DE OBRA 0 MESES

EJECUCIÓN DE OBRAS

	ÍTEMS	UN.	CAT	CANT	DEDICH/MES	TOTAL DEDIC H/PROY	TARIFA	F.P	TOTAL ACTIVIDAD
1	ESPECIALISTA AMBIENTAL	MES	5	1		2,60	$ 5.660.000	1,4515	$ 23.003.268,0
2	ESPECIALISTA SST	MES	5	1		1,80	$ 5.660.000	1,4515	$ 14.787.815,0
3	RESIDENTE MAQUINARIA Y EQUIPOS	MES	6	1		0,75	$ 5.048.000	1,4519	$ 5.496.991,0
4	ESPECIALISTA FORESTAL	MES	6	1		0,80	$ 5.048.000	1,4519	$ 5.863.457,0
	BRIGADA DE ORDEN, ASEO Y LIMPIEZA								
7	TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (No incluye Factor de Prestaciones)	MES		3		17,00	$ 828.116	1,6479	$ 23.198.718,0
	ARQUEOLOGIA								
8	ARQUEOLOGO	MES	7	1		0,00	$ 3.816.000	1,4532	$ 0,0
9	ARQUITECTO BIC	MES	6	1		0,00	$ 5.048.000	1,4519	$ 0,0
		SUBTOTAL COMPONENTE A							$ 72.350.249,0

COMPONTE C. MANEJO DE LA VEGETACION Y DEL PAISAJE

	ÍTEMS	ESPECIFICACIÓN	UN.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
C1	MANEJO DE LA VEGETACION EXISTENTE Y DE ACTIVIDADES DE DISEÑO PAISAJISTICO					
1,1	PROTECCION DE ARBOLES	TELA VERDE DE CERRAMIENTO (2.10mx250)	M2	80,0	$ 645,00	$ 51.600,0
1,2	SOPORTE MALLA	VARA DE CORREDOR 6.0 M	UN	40,0	$ 15.750,00	$ 630.000,0
			SUBTOTAL DEL PROGRAMA			$ 681.600,0

COMPONTE D. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

	ÍTEMS	ESPECIFICACIÓN	UN.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
D 1	MANEJO DE CAMPAMENTOS Y CENTROS DE ACOPIO					
1,1	CANECAS PARA CAMPAMENTOS Y FRENTES DE OBRA	CANECA PLÁSTICA NEGRA DE 55 GALONES CON TAPA PLANA.	UN	10,0	$ 26.180,00	$ 261.800,0
			SUBTOTAL DEL PROGRAMA			$ 261.800,0

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

ANEXO 1

D 2	**MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN**					
2,1	PUNTO DE ACOPIO DE MATERIALES	PLASTICO NEGRO CALIBRE 6	M2	60,0	$ 1.155,00	$ 69.300,0
		SEÑALIZACION TUBULAR COLOMBINA PLASTICA	UN	100,0	$ 24.990,00	$ 2.499.000,0
		CINTA PARA SEÑALIZACION DE 500MT X 4" PELIGO CALIBRE 3.5	ROLLO	10,0	$ 15.470,00	$ 154.700,0
			SUBTOTAL DEL PROGRAMA			$ 2.723.000,0

D 3	**MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS**					
3,1	ACOPIO TEMPORAL DE RCD EN FRENTES DE OBRA	PLASTICO NEGRO CALIBRE 6	M2	200,0	$ 1.155,00	$ 231.000,0
3,2	KIT BRIGADA DE ASEO Y LIMPIEZA	CARRETILLA RUEDA NEUMATICA PLATON METALICO CAPACIDAD CINCO PIES CUBICOS MANGO MADERA TIPO BUGGY	UN	20,0	$ 107.100,00	$ 2.142.000,0
		PALA REDONDA 2 CON CABO	UN	50,0	$ 10.252,00	$ 512.600,0
		CEPILLO INDUSTRIAL DE NYLON CON CABO DE 35CM A 42CM X 9CM X 17CM	UN	50,0	$ 12.000,00	$ 600.000,0
		BARRA DE 18LB CON PUNTA Y PALA 150CM X 10CM	UN	5,0	$ 48.300,00	$ 241.500,0
		SERRUCHO DE 20" DIENTE ENDURECIDO	UN	5,0	$ 15.990,00	$ 79.950,0
		MARTILLO DE BOLA DE 2LB	UN	5,0	$ 27.100,00	$ 135.500,0
		BOLSA PARA BASURA TIPO INDUSTRIAL NEGRA DE 60 x 90 Cm CALIBRE 2 (PAQUETE DE 30 UNIDADES)	UN	200,0	$ 9.990,00	$ 1.998.000,0
			SUBTOTAL DEL PROGRAMA			$ 5.940.550,0

D 4	**CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS**					
4,1	DEMARCACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO	SEÑALIZACION TUBULAR COLOMBINA PLASTICA	UN	30,0	$ 24.990,00	$ 749.700,0
4,3		POLISOMBRA VERDE PARA CERRAMIENTO. SUMINISTRO E INSTALACION.	M2	400,0	$ 2.686,00	$ 1.074.400,0
			SUBTOTAL DEL PROGRAMA			$ 1.824.100,0

D 5	**MANEJO INTEGRAL DE CUERPOS DE AGUA**					
5,1	BAÑO	BAÑO TIPO LUXURY - ALQUILER, MANTENIMIENTO Y ASEO DE BAÑOS PORTÁTILES VIP, MENSUAL	UN/MES	5,0	$ 1.428.000,00	$ 7.140.000,0
5,2	PROTECCIÓN DE SUMIDEROS	PROTECCION A SUMIDEROS (Incluye suministro y colocación de bolsas de lona y geotextil NT 1600 o similar).	UN/MES	50,0	$ 7.903,00	$ 395.150,0

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

5,3		PLAFONADO DE POZOS (Incluye suministro y colocación de puntilla, tabla burra de 2.90 x0.28x0.025m, cinta de señalizacion cal 4 rollo 500mx0.10m y señalización tubular colombina plástica).	UN	20,0	$ 116.196,00	$ 2.323.920,0
5,4		POLISOMBRA VERDE PARA CERRAMIENTO. SUMINISTRO E INSTALACION.	M2	200,0	$ 2.686,00	$ 537.200,0
			SUBTOTAL DEL PROGRAMA			$ 10.396.270,0
			SUBTOTAL COMPONENTE D			$ 21.145.720,0

COMPONENTE E. GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					
ÍTEMS		UN.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
E1	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				
1,01	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS CON MEDICAMENTOS DE 22CM X 27CM	UN	2,0	$ 49.900,00	$ 99.800,0
1,02	CAMILLA MADERA PRIMEROS AUXILIOS INMOVILIZADOR CABEZA	UN	2,0	$ 190.400,00	$ 380.800,0
1,03	EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO DE 20LB TIPO ABC METALICO CON GANCHO Y AVISO	UN	10,0	$ 51.170,00	$ 511.700,0
1,04	BOTA CUERO LISA NEGRA SEGURIDAD PUNTERA DE ACERO	PAR	30,0	$ 29.750,00	$ 892.500,0
1,05	BOTA DE CAUCHO, CINTA AMARILLA, PUNTERA Y PLANTILLA EN ACERO	PAR	30,0	$ 77.653,00	$ 2.329.590,0
1,06	PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON INSERCION EN SILICONA CON CORDEL EN ESTUCHE 25DB	PAR	200,0	$ 1.296,00	$ 259.200,0
1,07	PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA	UN	30,0	$ 14.280,00	$ 428.400,0
1,08	MASCARILLA DESECHABLE CONTRA POLVOS Y PARTICULAS NO TOXICAS	UN	200,0	$ 1.785,00	$ 357.000,0
1,09	RESPIRADOR PARA GASES DOBLE SIN CARTUCHO	UN	50,0	$ 25.000,00	$ 1.250.000,0
1,10	FILTRO CONTRA POLVO PARA RESPIRADORES	UN	100,0	$ 1.473,00	$ 147.300,0
1,11	CASCO DE SEGURIDAD DIELECTRICO	UN	50,0	$ 14.280,00	$ 714.000,0
1,12	BARBUQUEJO EN REATA CON MENTONERA CON TRES APOYOS PARA CASCO	UN	50,0	$ 4.760,00	$ 238.000,0
1,13	GAFAS DE SEGURIDAD	UN	100,0	$ 3.570,00	$ 357.000,0
1,14	ARNES MULTIPROPOSITO CON ESLINGA - 4 ANILLOS - PARA RESTRICCION Y DETENCION DE CAIDAS CON PUNTO FIJO	UN	5,0	$ 116.620,00	$ 583.100,0
1,15	OVEROL EN DRILL DOS PIEZAS, CAMISA Y PANTALÓN	UN	50,0	$ 39.270,00	$ 1.963.500,0
1,16	OVEROL IMPERMEABLE INDUSTRIAL AMARILLO 2 PIEZAS CON CAPUCHA	UN	50,0	$ 27.900,00	$ 1.395.000,0
1,17	GUANTE CARNAZA REFORZADO EN CARNAZA LARGO	PAR	100,0	$ 9.000,00	$ 900.000,0
1,18	GUANTES DE VAQUETA	UN	50,0	$ 8.092,00	$ 404.600,0
1,19	GUANTE CAUCHO NEGRO CORRUGADO CALIBRE 35	PAR	50,0	$ 4.165,00	$ 208.250,0
1,20	GUANTE NITRILO 13" RESISTENTE CONTRA QUIMICOS COMBUSTIBLES SOLVENTES GRASAS	PAR	50,0	$ 5.355,00	$ 267.750,0
	EXÁMENES OCUPACIONALES				
1,21	EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE INGRESO O RETIRO	UN	50,0	$ 24.000,00	$ 1.200.000,0
1,22	EXAMEN DE AUDIOMETRÍA DE INGRESO O EGRESO	UN	50,0	$ 16.000,00	$ 800.000,0

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

1,23	EXAMEN DE OPTOMETRÍA DE INGRESO O EGRESO	UN	50,0	$ 16.000,00	$ 800.000,0
1,24	EXAMEN DE ESPIROMETRÍA DE INGRESO O EGRESO	UN	50,0	$ 16.000,00	$ 800.000,0
		SUBTOTAL DEL PROGRAMA			$ 17.287.490,0
		SUBTOTAL COMPONENTE E			$ 17.287.490,0

COMPONENTE F. PLAN DE SEÑALIZACIÓN						
ÍTEMS		ESPECIFICACIÓN	UN.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
F1	MANEJO SEÑALIZACIÓN FRENTE DE OBRA					
1,1	SEÑALIZACIÓN INTERNA DE EXCAVACIONES, POZOS, VACÍOS	SEÑALIZACION TUBULAR COLOMBINA PLASTICA	UN	20,0	$ 24.990,00	$ 499.800,00
		CINTA PARA SEÑALIZACION DE 500MT X 4" PELIGO CALIBRE 3.5	ROLLO	20,0	$ 15.470,00	$ 309.400,00
1,2	SEÑALES DE CAMPAMENTO Y FRENTES DE OBRA	SEÑAL EN POLIESTRIENO (30cm x 20cm) FOTOLUMINISCENTE - NORMA NTC - ISO	UN	20,0	$ 11.900,00	$ 238.000,00
		SEÑAL EN POLIESTRIENO (30cm x 45cm) REFLECTIVO GRADO INGENIERÍA - NORMA ISO	UN	50,0	$ 53.550,00	$ 2.677.500,00
		SUBTOTAL DEL PROGRAMA				$ 3.724.700,0
		SUBTOTAL COMPONENTE F				$ 3.724.700,0

SUBTOTAL COMPONENTES A+C+D+E+F		$ 116.189.759,00
A.I.U.	18,59%	$ 21.414.713,00
VALOR GLOBAL AMBIENTAL CON AIU : TOTAL COMPONENTES A+C+D+E+F		$ 136.604.472,00

NOTA: EN LOS ITEMS MARCADOS CON ** EL VALOR TOTAL SE OBTIENE DE MULTIPLICAR LA CANTIDAD POR EL NUMERO DE MESES DE EJECUCION DE OBRA Y POR EL VALOR UNITARIO.

MATRIZ PARA CÁLCULO DE AIU- AMBIENTAL

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

ANEXO 1

OBJETO DE LA LICITACIÓN:	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE POR MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO Y LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE LA MALLA VIAL Y DEL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES

MATRIZ PARA CÁLCULO DE AIU- AMBIENTAL

SUBTOTAL COMPONENTES A+C+D+E+F	$115.189.759,00			FECHA:	9-abr-19
TERMINO ESTIMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	0	MESES		CONTRATO No.	

3. IMPUESTOS Y GARANTÍAS

3,1 IMPUESTOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	IMPUESTO	VALOR ($)
3.101	Contribución Especial (Impuesto de Guerra Ley 1738 DIC18-2014 prorroga 4 años)	5,00%	$5.759.488,00
3.102	ICA (Ley 14 6jul1983, Res 219 25feb2004)	0,69%	$794.809,00
3.103	GMF (Ley 1739 23dic2014 modifica el Estatuto Tributario)	0,00%	$0,00
3.104	Estampilla Universidad Distrital (Acuerdo 53 de 10ene2002)	0,00%	$0,00
3.105	RETEFUENTE actividades de obra	6,00%	$6.911.386,00
3.106	RETEFUENTE actividades de consultoría (el valor de ensayo de laboratorio y ajustes a los diseños	2,00%	$2.303.795,00
3.107	Estampilla Unipedagógica (Dec 584 de 19 dic 2014)	0,50%	$575.949,00
		SUBTOTAL IMPUESTOS	$16.345.427,00

3,2 GARANTIAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN		VR. BASE	% ASEGURADO	VIGENCIA AMPARO (MESES)	TASA ASEGURADORA	VALOR ($)
3.201	Cumplimiento	GARANTIA UNICA	$115.189.759,00	30%	6,00	0,20%	$44.098,00
3.202	Buen Manejo de Anticipo		$23.037.952,00	100%	6,00	0,20%	$30.390,00
3.203	Salarios y Prestaciones Sociales		$115.189.759,00	10%	36,00	0,20%	$85.220,00
3.204	Estabilidad de la Obra		$115.189.759,00	30%	60,00	0,20%	$414.202,00
3.205	Predios, labores y Operaciones- Vigencia (Decreto 1082 de 2015 Sección 8)	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$115.189.759,00	5%	0,00	0,30%	$2.975,00
						SUBTOTAL GARANTÍAS	$576.885,00

TOTAL IMPUESTOS Y GARANTÍAS	$16.922.312,00
TOTAL IMPUESTOS Y GARANTÍAS EN PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO	14,69%

A. ADMINISTRACIÓN (1 + 2 + 3)	14,69%
I. IMPREVISTOS	1,00%
U. UTILIDAD	7,00%
A.I.U. (ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD)	22,69%

CONTROL DE INVERSIÓN GESTION SOCIAL PARA OBRAS DEL IDU

FORMATO	CÓDIGO	PROCESO		VERSIÓN	
		Proyectos			
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO					ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO					
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS					

OBJETO DE LA LICITACIÓN:	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE POR MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO Y LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE LA MALLA VIAL Y DEL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES

CONTROL DE INVERSIÓN GESTION SOCIAL PARA OBRAS DEL IDU

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

ANEXO 1

COMPONENTE		Unidad	Valor Unitario	Factor prestacional	Cantidad	Dedicación H/Mes	Plazo (Meses)	Dedicación Total (Meses)	Subtotal
Componente A. Personal Profesional de Gestión Social									
A.1	Residente Social (Categoria 5)	MES	$ 5.660.000	1,4515	1,00	0,60	7,00	4,20	$ 34.505.058,0
A.2	Asistente Social (Categoria 6)	MES	$ 3.816.000	1,4532	1,00	0,60	7,00	4,20	$ 23.290.727,0
	GUIA CIVICO								
A.4	TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (No incluye Factor de Prestaciones)	MES	$ 828.116	1,6479	1,00	1,00	7,00	7,00	$ 9.552.413,0
	ACTAS DE VECINDAD								
A.5	Asistente Social (Categoria 7)	MES	$ 3.816.000	1,4532	1,00	0,20	7,00	1,40	$ 7.763.576,0
A.6	Profesional Ingeniero o Arquitecto (Categoria 7)	MES	$ 3.816.000	1,4532				0,00	$ 0,0
								Subtotal Componente personal Profesional	**$ 75.111.774,0**
Componente B. Plan de Gestión Social									
COMPONENTE		**Unidad**	**Valor Unitario**			**Cantidad Obra**			**Subtotal**
B.1	**Programa de Información**								
B.1.1	VIDEO BEAM - ALQUILER POR DIA	DIA	$ 59.900			7,0			$ 419.300,0
								SubTotal programa de información	**$ 419.300,0**
B.2	**Programa de Divulgación al ciudadano**								
B.2.2	AFICHE TAMAÑO MEDIO PLIEGO A 4X0 TINTAS EN PROPALCOTE DE 115 GR.	UN	$ 655			3000,0			$ 1.965.000,0
B.2.3	PLEGABLES DE SOSTENIBILIDAD EN TRES CUERPOS TAMAÑO CARTA A 4X4 TINTAS EN PROPALCOTE.	UN	$ 333			5000,0			$ 1.665.000,0
B.2.1	IMPRESIÓN HOJA CARTA, A 1X0 TINTAS EN	UN	$ 150			3000,0			$ 450.000,0

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

	PAPEL BOND DE 75 GR.							
B.2.2	#N/A	#N/A						
							SubTotal programa de divulgación al ciudadano	$ 4.080.000,00

B.3	Programa de Atención al ciudadano								
COMPONENTE		Unidad	Valor Unitario	Cantidad		Dedicación Mes	Plazo (Meses)	Dedicación Total (Meses)	Subtotal
B.3.1	Adecuación del punto IDU-Atención al ciudadano								
B.3.1.1	TARIFA MES - EDICIÓN DE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA. Incluye 4 tapas plastificadas tamaño carta color blanco, con 6 tornillos, hojas de papel bond tamaño carta 75 gramos, 170 folios	UN/MES	$ 169.000,0	1,00		7,00	7,0	49,00	$ 8.281.000,0
B.3.1.2	ALQUILER DE SILLA PARA ESCRITORIO PARA PUESTO DE TRABAJO	UN/MES	$ 5.495,0	8,00		1,00	7,0	56,00	$ 307.720,0
B.3.1.3	ALQUILER DE PUESTO DE TRABAJO - ESCRITORIO 75x120x50cm	UN/MES	$ 8.520,0	4,00		1,00	7,0	28,00	$ 238.560,0
B.3.1.4	ALQUILER DE SILLA PLÁSTICA SIN BRAZOS	UN/MES	$ 1.569,0	10,00		1,00	7,0	70,00	$ 109.830,0
B.3.1.5	CARTELERA CON MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO, PAÑO COLOR GRIS CON CENEFA SUPERIOR, PUERTAS CORREDIZAS. Incl. transporte	UN	$ 458.150,0	1,00		1,00	7,0	7,00	$ 3.207.050,0
B.3.1.6	AVISO PUNTO CREA 1.50m x 0.90m EN LÁMINA GALVANIZADA	UN	$ 272.000,0	1,00		1,00	7,0	7,00	$ 1.904.000,0

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

	CAL. 24. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN								
B.3.1.7	ALQUILER DE PORTATIL CARACTERÍSTICAS: Procesador Intel, Core i3 4005U, celeron o similar, Memoria RAM de 4 GB (2 x 2048 MB)Disco duro de 500gb a 7200 rpmPantalla LED HP BrightView widescreen de alta definición con 35,6 cm (14") o similar, HD INTEL GRAPHIC HD4400UNIDAD DE DVD QUEMADORBLUETOOTH	UN/MES	$ 142.800,0	2,00		1,00	7,0	14,00	$ 1.999.200,0
B.3.1.8	ALQUILER MES - ARRIENDO OFICINA INCL. ADMINISTRACIÓN, SERVICIOS PÚBLICOS, COMUNICACIONES	M2/MS	$ 29.429,0	40,00		1,00	7,0	280,00	$ 8.240.120,0
B.3.1.9	TARIFA MES - SERVICIO TELEFÓNICA LOCAL Y LIMITADA, INTERNET BANDA ANCHA ILIMITADA 50 MB ESTRATO 3	MES	$ 146.925,0	2,00		1,00	7,0	14,00	$ 2.056.950,0
								SubTotal programa de atención al ciudadano	$ 26.344.430,0

SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL PARA EL PLAN DE GESTION SOCIAL		$ 75.111.774,0
SUBTOTAL COSTOS DE SUBPROGRAMAS DE PLAN DE GESTION SOCIAL		$ 30.843.730,0
SUBTOTAL COSTO DEL PLAN DE GESTION SOCIAL		$ 105.955.504,0
AIU	18,59%	$ 19.699.182,0
TOTAL COSTO DEL PLAN DE GESTION SOCIAL		$ 125.654.686,0

MATRIZ PARA CÁLCULO DE AIU- SOCIAL (PGS)

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

65

55X

718

OBJETO DE LA LICITACIÓN:	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE POR MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO Y LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE LA MALLA VIAL Y DEL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES

MATRIZ PARA CALCULO DE AIU- SOCIAL (PGS)

COSTO DIRECTO ESTIMADO PGS (CD)	$105.955.504,00		FECHA:	9-abr-19
TERMINO ESTIMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	0	MESES	CONTRATO No	

3. IMPUESTOS Y GARANTÍAS

3,1 IMPUESTOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	IMPUESTO	VALOR ($)
3,101	Contribución Especial (Impuesto de Guerra Ley 1739 DIC18-2014 prorroga 4 años)	5,00%	$5.297.775,00
3,102	ICA (Ley 14 6jul1983, Res 219 25feb2004)	0,69%	$731.093,00
3,103	GMF (Ley 1739 23dic2014 modifica el Estatuto Tributario)	0,00%	$0,00
3,104	Estampilla Universidad Distrital (Acuerdo 53 de 10ene2002)	0,00%	$0,00
3,105	RETEFUENTE actividades de obra	8,00%	$8.357.330,00
3,106	RETEFUENTE actividades de consultoria (el valor de ensayo de laboratorio y apoyo a la ingeniería	2,00%	$2.119.110,00
3,107	Estampilla Unpedegógica (Dec 584 de 19 dic 2014)	0,50%	$529.776,00
		SUBTOTAL IMPUESTOS	$15.035.086,00

3,2 GARANTIAS

ITEM	DESCRIPCIÓN		VR. BASE	% ASEGURADO	VIGENCIA AMPARO (MESES)	TASA ASEGURADORA	VALOR ($)
3,201	Cumplimiento	GARANTIA UNICA	$105.955.504,00	30%	6,00	0,20%	$40.601,00
3,202	Buen Manejo de Anticipo		$21.191.101,00	100%	6,00	0,20%	$28.192,00
3,203	Salarios y Prestaciones Sociales		$105.955.504,00	10%	36,00	0,20%	$76.627,00
3,204	Estabilidad de la Obra		$105.955.504,00	30%	60,00	0,20%	$381.236,00
3,205	Predios, labores y Operaciones- Vigencia (Decreto 1082 de 2015 Sección III)	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$105.955.504,00	5%	0,00	0,30%	$2.975,00
						SUBTOTAL GARANTIAS	$531.631,00

TOTAL IMPUESTOS Y GARANTÍAS	$15.566.917,00
TOTAL IMPUESTOS Y GARANTÍAS EN PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO	14,69%
A. ADMINISTRACIÓN (1 + 2 + 3)	14,69%
I. IMPREVISTOS	1,00%
U. UTILIDAD	7,00%
A.I.U. (ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD)	22,69%

Página 1

CONTROL DE INVERSIÓN PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano

OBJETO DE LA LICITACIÓN:	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE POR MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO Y LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE LA MALLA VIAL Y DEL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES

CONTROL DE INVERSIÓN PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO

PLAZO:	7	MESES

	DESCRIPCIÓN	TIEMPO		VALO	F.P.	CONSTRUCCION	CANT	VR TOTAL

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

ANEXO 1

No.		Und	Cant	CAT	R UNITARIO [MENSUAL]		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAL	
1	PERSONAL																									
	PERSONAL PROFESIONAL																									
1.1	ESPECIALISTA EN TRÁNSITO Y TRANSPORTE	UN/MES	1	4	$ 6.276.000	1,4511	0,70	0,70	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10												1,9	$ 17.304.022,0
2.1	RESIDENTE DE TRANSITO	UN/MES	1	7	$ 3.816.000	1,4532	0,50	0,50	0,10	0,10	0,10	0,10	0,0999998												1,5	$ 8.318.201,0
	AFORADOR																									
1,2	TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (No incluye Factor de Prestaciones)	UN/MES			$ 828.116	1,6479																			0,0	$ 0,0
	PALETERO																									
1,2	TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (No incluye Factor de Prestaciones)	UN/MES			$ 828.116	1,6479																			0,0	$ 0,0
																									SUB TOTAL COSTO PERSONAL	[redacted]
2	OTROS																									
2.1	TARIFA MES - EDICIÓN DE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA. Incluye 4 tapas plastificadas tamaño carta color blanco, con 6 tornillos, hojas de papel bond tamaño carta 75 gramos, 170 folios	UN/MES	1		$ 169.000		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000												7,0	$ 1.183.000,0
2.2	ALQUILER DE PORTATIL. CARACTERÍSTICAS: Procesador intel, Core i3 4005U, celeron o similar, Memoria RAM de 4 GB (2 x 2048 MB)Disco duro de 500gb a 7200 rpmPantalla LED HP BrightView widescreen de alta definición con 35,6 cm (14") o similar, HD INTEL GRAPHIC HD4400UNIDAD DE DVD QUEMADORBLUETOOTH	UN/MES	2		$ 142.800		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000												28,0	$ 3.998.400,0
	SEÑALIZACION TEMPORAL																									

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

MIRS LATINOAMERICA

MIRS-MAR-012-2019

Bogotá D.C.,18 de febrero de 2020

Señores:
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION CON&CON
Cra 7 N° 127-48 - Oficina 1006
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 137-2019 CUYO OBJETO ES CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 141-2019 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SCCIAL Y SISO LOS PROCESOS SST - MA – SO - PMT, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TIENE POR OBJETO: "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR MONTO AGOTABLE CON FORMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

ASUNTO: RESPUESTA COMUNICACIÓN C&C-CO137-2019-002

Cordial Saludo,

Por medio del presente oficio, nos permitimos dar respuesta a la comunicación **C&C-CO137-2019-002,** en la cual se reitera que las hojas de vida del personal no están completas, se les recuerda que se dará aprobación al equipo profesional completo para legalización ante en FDLM, se requiere la presentación de los perfiles faltantes para continuar con esta gestión.

Atentamente

NICK RANDY ALMEIDA GAMARRA
R.L. MIRS LATINOAMERICA S.A.S
CC **ALCALDIA LOCAL DE MARTIRES**
FONDO DE DESARROLLO LOCAL
Av. Calle 19 #28-80 Centro Comercial Calima Piso 7
Bogotá D.C.

5

MIRS LATINOAMERICA

MIRS-MAR-014-2019

Bogotá D.C., 27 de febrero de 2020

27/2/2020 Sticker web

Alcaldía Local de Mártires
R No. 2020-641-001145-2
2020-02-27 13:38 - Folios: 2 Anexos: 0
Destino: Área de Gestion de Desarr
Rem/D: MIRS SAS

Señores:
ALCALDIA LOCAL DE MARTIRES
FONDO DE DESARROLLO LOCAL
Av. Calle 19 #28-80 Centro Comercial Calima Piso 7
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 137-2019 CUYO OBJETO ES CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 141-2019 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SISO LOS PROCESOS SST - MA – SO - PMT, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TIENE POR OBJETO: "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR MONTO AGOTABLE CON FORMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES.

ASUNTO: ACLARACIÓN EXPERIENCIA PROFESIONALES REQUERIDOS CONTRATO CO-137-2019

Cordial Saludo,

En condición de garantizar la correcta evaluación de las hojas de vida, nos permitimos solicitar al FDLM la aclaración respecto a la experiencia requerida para los profesionales solicitados, puesto que dentro del anexo técnico se evidencia que hay perfiles que se repiten para diferentes profesionales como se muestra en las imágenes, así como también es de vital importancia que se presente el perfil del especialista ambiental, dado que no se encuentra dentro de los perfiles mínimos requeridos y al ser un área considerablemente importante dentro del proyecto.

ESPECIALISTA EN TRÁNSITO Y TRANSPORTE (1) UNO **Dedicación 30%**	Profesión Ingeniero Civil o de Vías y Transportes, con postgrado en el área de tránsito Experiencia Profesional mínimo CINCO (5) años contados a partir de la expedición de la matrícula profesional por parte del COPNIA	**Experiencia Especifica deberá acreditar experiencia como especialista en proyectos y/o presupuesto** de mínimo de tres (3) contratos en proyectos de obra para la Construcción o Conservación o Rehabilitación o Mantenimiento de infraestructura vial urbana para tráfico automotor

TOPOGRAFO (1) UNO Dedicacion 50%	Profesional Ingeniero topografico y/o tecnico topografo Experiencia Profesional minimo CINCO (5) años contados a partir de la expedicion de la matricula profesional por parte del COPNIA	Experiencia Especifica debera acreditar experiencia como especialista en proyectos y/o practicante de minimo de dos (2) contratos en proyectos de obra para la Construccion Conservacion Rehabilitacion Mantenimiento de infraestructura vial para trafico pesado
RESIDENTE SOCIAL (1) UNO Dedicación 60%	Profesional en trabajo social No menor de cinco (5) años contados entre la fecha de expedición de la matrícula y la fecha de cierre del plazo del presente proceso de selección	Experiencia Especifica deberá acreditar experiencia como SISO de minimo dos (2) contratos en proyectos de obra para la Construccion Conservacion Rehabilitacion Mantenimiento de infraestructura vial para trafico pesado

Atentamente

NICK RANDY ALMEIDA GAMARRA
R.L. MIRS LATINOAMERICA S.A.S
P
CC CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN CON&CON
Cra 7 N° 127-46 Oficina 1006
Bogotá D.C.

55

554
721

MIRS LATINOAMERICA

MIRS-MAR-018-2019

Bogotá D C., 10 de marzo de 2020

Señores:
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION CON&CON
Cra / N° 127-48 - Oficina 1006
Bogotá D C

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 137-2019 CUYO OBJETO ES CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 141-2019 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA AMBIENTAL, SOCIAL Y SISO LOS PROCESOS SST - MA - SO - PMT DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TIENE POR OBJETO: "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR MONTO AGOTABLE CON FORMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

ASUNTO: LLAMADO DE ATENCIÓN.

Cordial Saludo,

Por medio del presente oficio, nos permitimos hacer un llamado de atención por el incumplimiento al compromiso adquirido en el comité del día 06/03/2020 respecto a la entrega de las hojas de vida con las *observaciones dadas en esta reunión, dado que a la fecha esta interventoría no ha recibido* documentación de parte de ustedes.

Adicionalmente, solicitamos las pólizas actualizadas del contrato de obra pública N°137-2019 anteriormente en respuesta del oficio MIRS-MAR-007-2019, habían sido radicadas por parte de ustedes las pólizas del contrato, pero deben ser con fecha del último acto que es la firma del acta de inicio

Atentamente,

NICK RANDY ALMEIDA GAMARRA
R.L. MIRS LATINOAMERICA S.A.S
Proyecto: DAFC - SAHM
CC ALCALDIA LOCAL DE MARTIRES
FONDO DE DESARROLLO LOCAL
Av. Calle 19 #28-80 Centro Comercial Calima Piso 7
Bogotá D.C

9+40 con
Cobro

69
88
722

MIRS LATINOAMERICA

MIRS-MAR-019-2020

Bogotá D.C.,16 de marzo de 2020

Señores:
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN CON&CON
Cra 7 N° 127-48 - Oficina 1006
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 137-2019 CUYO OBJETO ES CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 141-2019 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SISO LOS PROCESOS SST - MA – SO - PMT, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TIENE POR OBJETO: "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR MONTO AGOTABLE CON FORMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES.

ASUNTO: **ENTREGA RADICADOS ESP Y SDM**

Cordial Saludo,

Por medio del presente oficio, nos permitimos hacer un llamado de atención al incumplimiento del compromiso adquirido por ustedes en el comité del día 06 de marzo de 2020, el cual debian radicar ante esta interventoría los oficios a las Empresas de Servicios Públicos y Secretaría de Movilidad, a la fecha no se ha recibido esto y el compromiso era para el 12 de marzo de 2020. Solicitamos que sean radicados máximo en un (1) día hábil.

CON & CON
16 MAR
2:45 pm

Atentamente

NICK RANDY ALMEIDA GAMARRA
R.L. MIRS LATINOAMERICA S.A.S

Proyecto: DAFC-SAHM
CC **ALCALDIA LOCAL DE MARTIRES**
FONDO DE DESARROLLO LOCAL
Av. Calle 19 #28-80 Centro Comercial Calima Piso 7
Bogotá D.C.

acueducto

Secama

331001 S-2020-075019
Bogotá, D. C., 25 de marzo de 2020

Ingeniero
JUAN PABLO RICCI RUIZ
Representante Legal
CON & CON
Av. Carrera 7 No. 127 – 48 Oficina 1006
Teléfono: 4821681
Bogotá D.C.

Asunto. Oficio No. E-2020-036124
Contrato de Obra 137 de 2019

Cordial saludo ingeniero Juan:

En atención al oficio del asunto la Dirección Servicio Acueducto y Alcantarillado de la Zona 3 informa que la Empresa CON&CON Consultoría y Construcciones debe adelantar las consultas solicitadas en la planoteca de la EAB-ESP ubicada en la Av. Calle 24 No. 37 – 15 y hacer las investigaciones en terreno para confirmar la información encontrada en la planoteca de la EAB-ESP.

Adicionalmente se invita que los Diseños de Acueducto y Alcantarillado que sean necesarios, se desarrollen bajo la directriz de las Normas Técnicas NS-031, NS 047, NS-029, NS-035, NP-027, NS-058, NS-073, NS-090, y NS-085.

Atentamente,

JOHAN ARIEL TAYER SARMIENTO
Director de Servicio Acueducto y Alcantarillado Zona 3

c.c. Luis Enrique Rodríguez Jaramillo, Subgerente de la Zona 3
Gestión Planoteca Dirección Servicio Acueducto y Alcantarillado Zona 3

Remitente
Nombre/Razón Social: EAB-ESP
Dirección: AV CALLE 24 # 37 - 15
Ciudad: BOGOTA D.C
Departamento: BOGOTA D.C
Código postal: 111321396
Envío: RA257384777CO

Destinatario
Nombre/Razón Social: CON & CON
Dirección: Av Carrera 7 # 127 - 48 Of 1006
Ciudad: BOGOTA D.C
Departamento: BOGOTA D.C
Código postal: 110121306
Fecha admisión: 25/03/2020 16:33:57

SC701-1

BOGOTÁ

Carrera 8 No 20 – 70 Piso 1 Oficina de Correspondencia ETB
Código Postal 110311 Bogotá Colombia
Conmutador: 242 2000

ECRGC EOI 475 - 2020

AL CONTESTAR POR FAVOR CITE ESTE CONSECUTIVO

CECO RI 62

Para seguimiento utilice este N° 22020006741
Fecha 6/04/2020 Hora 10:55p m. Folios 1 Anexo 0
Asunto: CERTIFICACACION DE REDES CONTRATO 137-2019 RAD ETB 32020005783 ECRGC EOI 475-2020
Se recibe para verificación no implica aceptación

Bogotá, 06 ABR 2020

Señor:
JUAN PABLO RICCI RUIZ
R L CON&CON S.A.S
Avenida Carrera 7 No. 127– 48 Oficina 1006
Teléfono: 4821681
Bogotá D.C.

Asunto Certificación de Redes – Contrato No. 137 – 2019
Radicado ETB 32020005783 del 11 -03- 2020

Respetado señor Ricci:

En respuesta a la comunicación radicada ante ETB S.A. ESP. mediante la cual solicita información de existencia de redes para el proyecto del asunto, atentamente se informa que en el espacio público se encuentra infraestructura en servicio apta para el tendido de red, cumpliendo con las normas vigentes de construcción, además aloja la red de telecomunicaciones que presta servicio actualmente en el sector, información que ha sido remitida al correo electrónico martiresconycon.2018@gmail.com indicado en el oficio de solicitud. Con relación a la ejecución de posibles ampliaciones o renovaciones se informa que en el corto plazo ETB actualmente no tiene previsto ejecutar proyectos en el sector

Es preciso señalar que durante la ejecución de las obras se deben conservar las redes en buen estado y tomar las mayores precauciones para evitar daño o hurto; en caso de presentarse alguno de estos siniestros, el constructor será el responsable y deberá asumir los costos asociados a la reparación de la infraestructura y red de ETB.

La información suministrada por ETB deberá ser utilizada de manera confidencial, garantizado por todos los medios a su alcance que los trabajadores a su servicio y demás personas que autorice respetarán la reserva sobre la misma. La violación de confidencialidad o el uso indebido de la información dará lugar a reclamar indemnización por parte de ETB. El receptor de esta información no adquiere derechos de propiedad o disposición respecto de la información suministrada por ETB

A continuación, se relacionan los datos del profesional asignado para realizar el seguimiento y el acompañamiento durante la ejecución del contrato.

Delegado ETB:	Ingeniera Ivone Astrid Suárez Galvis
Celular:	305-7134841
Teléfono local	2422759
Dependencia ETB:	Gerencia Red de Distribución
Correo Electrónico:	ivone.suarezg@etb.com.co

Cordialmente,

CESAR AUGUSTO QUINTERO GIRALDO
Gerente Red de Distribución

vanti

20150216-038-20

Bogota D C marzo 12 de 2020

Señores
CON & CON
Atn. Juan Pablo Ricci Ruiz
Carrera 7 N° 127-48 oficina 1006
Celular 3134318970

Asunto
Nombramiento de delegado. Contrato de Obra N° CO-137-2019

Respetados Señores

Dando al alcance a su solicitud **C&C-CO137-2019-009**, le informamos que el delegado por parte de Gas Natural S A ESP. es **Miguel Angel Gonzalez Pineda**. a quien pueden contactar al celular **3184528826**. correo electrónico. **mgonzalezpi@grupovanti.com.** También ponemos en su conocimiento que. en la zona de ejecución de dichas obras nuestra compañía dispone de un recorredor de línea Sr **Camilo Sanchez** Celular **3153464081**. con quien pueden solventar la mayoría de situaciones que se presentan en el día a día de sus obras

Les agradecemos en la ejecución de sus trabajos seguir las recomendaciones para el desarrollo de excavaciones en zonas aledañas a las redes de Gas Natural S A ESP acorde a la NT-061-ESP 'Plan de Prevención de Daños y de esta manera tomar acciones preventivas sobre la infraestructura construida.

Para las solicitudes de Certificación de redes, y Viabilidad de redes para la Prestacion del Servicio de Gas para nuestros clientes externos (Constructoras, Empresas Obras en Espacio Público y en personas naturales) se debe realizar la solicitud en los vinculos que aparecen ya que direccionan a un formulario para ingreso de los datos básicos y de los anexos obligatorios (Archivos PDF de Localización y Archivos CAD) de la solicitud. Al finalizar la solicitud por el Cliente, se direcciona la petición al

Correo Signatural@grupovanti.com **para su respectiva gestión por parte de Planificación Red y Gestion Cartográfica.**

https://www.grupovanti.com/co/inicio/hogar/servicio+al+cliente/1292102459150/oficina+virtual.html

Gas

Natural tener en cuenta esta información para el tramite de los planos esquemáticos de los sectores a intervenir dentro del alcance del proyecto

Es importante realizar una reunión de inicio con el contratista y/o interventoría con el objeto de aclarar las características particularidades de la infraestructura de la red de distribución de alta y media presión de gas natural y el apoyo y acompañamiento que la empresa **Gas Natural S.A. ESP** ofrece durante el desarrollo del proyecto. de igual manera solicitamos informar a **Gas Natural S.A. ESP** el inicio de las Labores con el fin de coordinar una charla preventiva para la prevención de daños en la red de distribución con el personal de la obra, enviar a el correo **mgonzalezpi@grupovanti.com**

Cordialmente,

MIGUEL ANGEL GONZALEZ PINEDA
Gestor Técnico Red - GN

726

vanti

10153410 – 6277 – 2020
Bogotá, 20 de Marzo 2020.

Señores.
Consultoría y Construcción S.A.S.
Atn. Juan Pablo Ricci Ruiz.
Representante Legal
martiresconycon.2018@gmail.com
Tel. 4821681 - 5203971.
Avenida Carrera 7 No.127-48, Oficina 1006.
Bogotá, D.C.

Asunto: Certificación de Red.
Proyecto: Contrato de Obra No. CO-137-2019.

Respetado Señor.

En respuesta a su comunicado C&C-CO137-2019-009, en el cual solicita información de las redes existentes de gas natural ubicadas en la zona de espacio público indicados en su solicitud, le informamos que Vanti S.A. ESP., cuenta con una infraestructura de red construida y/o diseñada en polietileno y/o acero, como se evidencia en los planos adjuntos.

Por otra parte le informamos que se deben tener en cuenta las Normas de Instrucciones y recomendaciones para tareas de Excavación y Movimientos de suelo en la vía pública y la norma NT-061-ESP -"Plan de Prevención de Daños", la cual debe ser descargada directamente en el portal escala por medio del siguiente enlace;
https://aplicativos.gasnaturalfenosa.com.co/productos/NT-061-COL-PDF.pdf

Las acometidas domiciliarias no se encuentran registradas en los planos, pero su localización corresponde a la línea perpendicular entre el anillo de red de gas y el centro de medición; su profundidad inicia desde la TEE en 50 cm y disminuye progresivamente hasta el punto de conexión con el centro de medición. En el caso que corresponda se deberá gestionar en coordinación con las instancias competentes los certificados para la gestión de riesgos, zonas de amenaza y protección ambiental.

Para complementar la información requerida en cuanto a especificaciones técnicas y procesos constructivos, y una vez definida la fase de construcción del proyecto, comunicarse con servicios técnicos al teléfono 3485500 Ext. 85877 y/o Ext.85800, con el fin de coordinar las obras de traslado, protección o des habilitación de las redes, paz y salvo de obra que se encuentran en la zona de afectación del proyecto.

vanti

Con relación a las redes diseñadas, informar oportunamente a Vanti S.A. ESP., el inicio de la fase de construcción del proyecto, con el fin de coordinar las intervenciones a realizar, para redes diseñadas de polietileno comunicarse con Operación Red Zona Bogotá, Para redes diseñadas de acero comunicarse con Operaciones Centrales de Red, al teléfono 3485500.

En caso de urgencia que se presente en el lugar de la intervención por favor comunicarse con la línea de atención de urgencias (Fijo) 01800919052 y 164.

Al momento de requerir información de la red de gas natural, se dispone de 3 canales para realizar la solicitud a la Empresa:

Un primer canal mediante acceso a la página de Vanti S.A. ESP., **http://www.grupovanti.com** en el menú Constructores y Diseñadores / Solicitud de Certificados / Certificación de redes para obras en espacio público y diligenciando el formulario de Datos requeridos. Un segundo canal mediante correo electrónico **signatural@grupovanti.com** indicando la misma información requerida en la carta. Finalmente, un tercer canal mediante **Carta radicada en las oficinas de Gas Natural (Cl 71 A 5-38) a nombre de Planificación Red y Gestión Cartográfica y asunto "Solicitud Certificación Redes Existentes"**; el solicitante debe especificar datos de Razón Social, NIT, Nombre Solicitante, Dirección Correspondencia, Teléfono, Numero de Contrato, Empresa Contratante, Dirección de la obra o sitio a intervenir y Plano o Imagen de localización del área de interés de fuentes como Google Earth o CAD.

Cordialmente.

Grisel Yasmin Gutiérrez Castaño
Gestión de Activos
Planificación Red y Gestión Cartográfica
Elaboró: Ruben Arango
Anexo: 12 Planos Formato A2

14
350
727

08109170
2020/04/22

codensa

Bogotá,

Señor
JUAN PABLO RICCI RUIZ
CON Y CON SAS
Avenida Carrera 7 No 127 48 Oficina 1006
Teléfono: 4821681
Martiresconycon.2018@gmail.com
Bogotá D.C.

Asunto: Derecho de Petición
No. 02625910 del 01 de abril de 2020
Radicado Referencia SDA No 2020ER55621

Respetado señor Esteban.

Reciba un cordial saludo de Enel-Codensa[1]. Recibimos un traslado por competencia de la Subdirección De Control Ambiental Al Sector Público relacionada en el asunto, en la cual solicita redes existentes para el proyecto CO-137-2019, con la empresa Con Y Con SAS, en las diferentes zonas de la comunicación.

En atención a su comunicado le informamos que, es necesario que nos envié un archivo georreferenciado tipo SHAPE donde se identifiquen los polígonos o las zonas donde se requiere extraer la información de infraestructura eléctrica existente.

Si requiere información o tiene alguna inquietud sobre algún punto de esta respuesta, lo invitamos a ingresar a la página web de Enel - Codensa www.enel.com.co en la sección Personas, ubicada en la parte superior izquierda de la página en donde un asesor le ayudará a través de nuestro servicio de video llamada o chat de servicio.

Finalmente, le informamos que contra la presente comunicación no proceden recursos por tratarse de un acto de carácter informativo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 75 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y no encontrarse su solicitud enmarcada dentro de las causales establecidas en el Artículo 154 de la ley 142 de 1994.

[redacted]

[1] *Codensa S.A ESP es parte del Grupo Enel. El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica continúa siendo CODENSA S.A ESP*

08109170
2020/04/22

codensa

Aprovechamos esta oportunidad, para reiterarle la constante disposición de Enel-Codensa[2] hacia todo lo que signifique la búsqueda de soluciones para nuestros clientes.

Reiteramos nuestro deseo de servirle,

Cordialmente,

Firmado digitalmente Sistema Documental Mercurio[3]
Gilberto Alexander Porras Forero
Oficina Peticiones y Recursos
HATF /CENTRO DE SERVICIO AL CLIENTE AVENIDA SUBA

Su proceso se encuentra en este momento del proceso

www.enel.com.co

7 115 115 5 115 115

radicaciones@enel.com

www.enel.com.co/personas/defensor-cliente

Página Web www.enel.com.co/empresas/defensor-del-cliente
Acérquese a nuestra oficina ubicada en el Centro de Servicio Codensa.
Atención en nuestra oficina ubicada en la Carrera 19 No. 53 -43 o Chapinero.

[2] Codensa S.A ESP es parte del Grupo Enel. El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica contenida siendo CODENSA S.A ESP

[3] La firma digital que acompaña este documento tiene la misma validez de la firma manuscrita, de acuerdo con lo establecido en el parágrafo del Artículo 28 de la Ley 527 de 1999

728

SDM-SS-61874-2020
Bogotá D.C.,

Ingeniero:
JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA
Director de Obra
CON & CON
Av. Carrera 7 N° 127-48
Teléfono: 821681-5203972
Ciudad

Referencia: Solicitud de diseños de señalización vertical y horizontal existentes en la SDM. para el Contrato de Obra **FDLM-137-2019**

Radicado: SDM-60119-2020

Localidad: Los Mártires

Cordial saludo.

En atención a su solicitud y revisados los archivos de la Secretaría Distrital de Movilidad SDM, se pudo establecer que la Entidad cuenta con algunos diseños de señalización, coincidentes con los tramos objeto de la intervención, los cuales se presentan a continuación:

Tabla No 1

No	CIV	TRAMO	DESDE	HASTA	PLANO 1	PLANO 2
1	14000772	KR 25A	AC 6	CL 6 BIS	MV_14_240_575_11 ZE_14_156_1556_10	EL_14_001 EX_14_098_1881_12
2	14000741	KR 25A	CL 6BIS	CL 6A	MV_14_240_575_11 ZE_14_156_1556_10	EL_14_001 EX_14_098_1881_12
3	14000718	KR 25A	CL 6A	CL 7	ZE_14_156_1556_10	EX_14_098_1881_12
4	14001678	KR 25A	CL 7	CL 7BIS	ZE_14_156_1556_10	EX_14_098_1881_12
5	14001545	CL 1A BIS	AC 1	KR 26	MV_14_012 EX_14_085_1249_11	TPD_PL_1547 ZE_14_022_1249_11
6	14001619	CL 1C	KR 19A	KR 19BBIS	MV_14_012	EX_14_101_1881_12
7	14001616	CL 1C	KR 19BBIS	KR 19C	EX_14_101_1881_12	
8	14001469	CL 1F	KR 24A	KR 24B	EX_14_085_1249_11	EX_14_101_1881_12
9	14001481	CL 1F	KR 24	KR 24A	EX_14_085_1249_11	EX_14_101_1881_12
10	14001156	CL 2B	KR 25A	KR 25	ZE_14_222_1744_10	EX_14_085_1249_11
11	14001517	KR 25	CL 1ABIS	CL 1B	MV_14_012 ZE_14_022_1249_11	EX_14_085_1249_11
12	14001505	KR 18	CL 2	CL 3	EX_14_101_1881_12	
13	14001265	KR 25	CL 2	CL 2A	EX_14_085_1249_11	
14	14000125	KR 24	CL 22A	DG 22BBIS	EX_14_104_1881_12	
15	14001058	KR 25	CL 2C	CL 3	EL_14_002 MV_16_169_1249_11	ZE_14_222_1744_10 EX_14_085_1249_11
16	14000565	CL 12	KR 20A	KR 21	EX_14_088_1249_11	
17	14000573	CL 12	KR 20	KR 20A	EX_14_088_1249_11	
18	14000282	CL 15	KR 27	KR 28A	EX_14_106_1881_12	EX_14_091_1249_11
19	14000205	CL 17	KR 28A	KR 30	MV_16_091_1703_10 EX_14_106_1881_12	AV_NQS_CARRIL_BUS_2015 EX_14_091_1249_11
20	14001367	CL 18	KR 27A	KR 28	EX_14_084_1249_11	EX_14_107_1881_12
21	14000550	CL 12A	KR 20	KR 21	EX_14_088_1249_11	

Fuente: Elaboración propia

Teniendo en cuenta lo anterior, se envía al correo electrónico martiresconycon.2018@gmail.com, los diseños de señalización vial con los que cuenta la Entidad, en los cuales se incluyen los tramos viales de su solicitud.

Respuesta a derecho de petición - Contrato CO-137-2019 (CON&CON S.A.S.)

Ideca Mail <ideca@catastrobogota.gov.co>

Mar 24/03/2020 14:47

Para: raul.esteban@gobiernobogota.gov.co <raul.esteban@gobiernobogota.gov.co>
CC: Julia Edith Espindola Garcia <jespindola@catastrobogota.gov.co>; Pedro Alberto Pinzon Montero <ppinzon@catastrobogota.gov.co>
Cco: Astrid Yadira Duitama Guio <aduitama@catastrobogota.gov.co>; Yenny Katerine Castillo Pinilla <ycastillo@catastrobogota.gov.co>; Hernan Mauricio Bernal Cubillos <hbernal@catastrobogota.gov.co>

2 archivos adjuntos (4 MB)

ReqCON&CON_ER6807.gdb.zip; 20200311_ER6807_SOLICITUD.pdf;

ideca

Bogotá D.C.,

Doctor
RAÚL HERNANDO ESTEBAN GARCÍA
raul.esteban@gobiernobogota.gov.co
Alcalde Local
Alcaldía Local de Los Mártires
Av. Calle 19 No. 28-80 Centro Comercial Calima Piso 7 Torre Parqueaderos
Bogotá D.C.
Código Postal: 111411

Asunto: Respuesta a derecho de petición – solicitud de información y/o posibles ampliaciones o renovaciones. Comunicación C&C-CO137-2019-005 del 09/03/2020 (CON & CON Consultoría y Construcción S.A.S.).

Referencia: Radicado UAECD No. 2020ER6807 de 11/03/2020.

Respetado doctor:

En atención al requerimiento hecho por la empresa CON & CON Consultoría y Construcción S.A.S. a través de la comunicación del asunto y en el marco del Contrato de Obra No. CO-137-2019 (CONTRATO DE OBRA No. CO-137-2019: "Contratar a precios unitarios por la modalidad de monto agotable las obras y actividades para la conservación de la malla vial y del espacio público de la Localidad de Los Mártires"); nos permitimos hacer entrega de la información geográfica de las redes e infraestructura de servicios públicos que se encuentra disponible en IDECA a partir de lo suministrado por las empresas GAS NATURAL S.A. ESP, CODENSA S.A. ESP, EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ – ETB S.A. ESP y EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ – EAAB ESP y conforme a los acuerdos existentes con dichas ESP.

Dicha información se le remite a usted directamente pues, en alusión a dichos acuerdos, **el acceso a la información debe realizarse directamente a través de la entidad del Distrito contratante del proyecto**, que para estos efectos corresponde a la ALCALDÍA LOCAL DE LOS MÁRTIRES. Usted en este caso podrá disponerle al Contratista la información de las áreas geográficas objeto de estudio, trasladando con ello las respectivas condiciones de uso aplicables a la misma (o a través del área responsable o supervisor del proyecto al interior de la Alcaldía Local). Lo hacemos de manera digital, teniendo en cuentas las circunstancias que actualmente estamos

viviendo con ocasión de las medidas sanitarias y acciones transitorias decretadas por el Gobierno Nacional y la Administración Distrital.

La información requerida se entrega para un área de influencia de 100 metros de cada uno de los CIV suministrados por el contratista, tanto en formato GDB (*File Geodatabase, versión 10.5.1*) como en formato DWG (versión 2013) de la manera subsiguiente:

Entidad custodia	Temática	Objeto geográfico		Fecha de actualización a IDECA por parte del custodio
EAAB	Acueducto	Accesorio	Accesorio	17/02/2020
		Distrito	Distrito	
		Hidrante	Hidrante	
		Linea Lateral	LineaLateral	
		Pitómetro	Pitometro	
		Red Matriz	RedMatriz	
		Red Menor	RedMenor	
		Sector	Sector	
		Sectorización	Sectorizacion	
		Subsector	Subsector	
		Valvula Control	ValvulaControl	
		Válvula Sistema	ValvulaSistema	
		Zona	Zona	
	Alcantarillado Pluvial	Estructura de Red Pluvial	EstructuraRedPluvial	
		Linea Lateral Pluvial	LineaLateralPluvial	
		Pozos Pluvial	PozosPluvial	
		Red Local Pluvial	RedLocalPluvial	
		Red Troncal Pluvial	RedTroncalPluvial	
		Sumidero Pluvial	SumideroPluvial	
	Alcantarillado Sanitario Combinado	Caja Domiciliaria Sanitario Combinado	CajaDomiciliariaSanCom	
		Cuenca Sanitario Combinado	CuencaSanCom	
		Estructura de Red Sanitario Combinado	EstructuraRedSanCom	
		Linea Lateral Sanitario Combinado	LineaLateralSanCom	
		Pozos Sanitario Combinado	PozosSanCom	
		Red Local Sanitario Combinado	RedLocalSancom	
		Red Troncal Sanitario Combinado	RedTroncalSanCom	
		SubCuenca Sanitario Combinado	SubCuencaSanCom	
		Sumidero Sanitario Combinado	SumideroSanCom	
		UGA Sanitario Combinado	UGASanCom	
ETB	Telecomunicaciones	Apoyo de la Red de Transmision	Poste	18/02/2020
		Armarios	Armario	
		Cámaras	Camara	
		Red de Telecomunicaciones	Canalizacion	
		Teléfonos Públicos	Teléfono_Publico	
CODENSA	Energia	Apoyos Media Tensión	APOYOS_MT_BTA	31/01/2020
		Camaras	CAMARAS_BTA	
		Centro de Distribución Pedestal	CD_PEDESTAL_BTA	
		Luminarias	LUMINARIAS_BTA	
		Lineas de Media Tension (Red MT)	RED_MT_BTA	
