
"OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DEL MODULO "A" DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR EN EL COMANDO AEREO DE COMBATE No 1 EN PUERTO SALGAR-CUNDINAMARCA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXAS"

ACTA DE VECINDAD

1. LOCALIZACION Y FOTOGRAFIAS UNIDAD A INTERVENIR



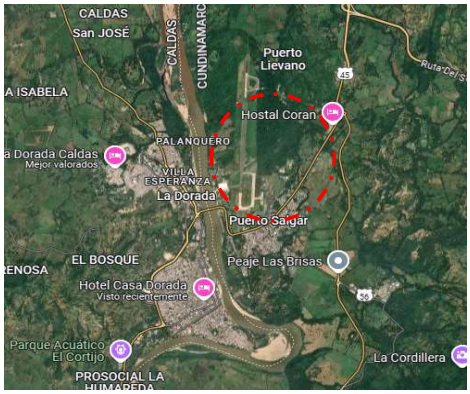

2. DATOS DEL PREDIO

FRENTE DE OBRA : COMANDO AEREO DE COMBATE N° 1 PUERTO SALGAR - CUNDINAMARCA

UNIDAD A INTERVENR : MODULO A

UBICACIÓN	REFERENCIA	OBSERVACIONES
NORTE	PARQUE PANELES SOLARES	SE IDENTIFICA UN CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA QUE EN BUEN ESTADO.
SUR	CALZADA INTERNA EN ASFALTO	SE IDENTIFICA UNA CARPETA ASFALTICA CON DETERIORO GENERAL Y UNA ACABADO IRREGULAR, EVIDENCIA DE BACHES Y FISURA DE LA RODADURA, EL MATERIAL COLINDANTE CON LA ZONA DE INTERVENCION PRESENTA SEPARACION DE MATERIAL PARTICULADO.
ESTE	ZONA VERDE	LA ZONA DE INTERVENCION COLINDA CON UNA AMPLIA ZONA VERDE CON CURVAS DE NIVEL QUE PRESENTAN UN NIVEL NEGATIVO EN REFERENCIA A LA CALZADA DEL SUR Y CON REFERENCIA A LA ZONA DE DESARROLLO CONSTRUCTIVO.
OESTE	ALMACEN D1	HACIA EL COSTADO OCCIDENTAL DE LA ZONA A INTERVENIR, SE UBICA EL ALMACEN D1, ESTE SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA PRUDENTE NO MENOR A 10M Y SEPARADO POR UNA CERCA VIVA, LA CONSTRUCCION PRESNETA DETERIORO POR FALTA DE MANTENIMIENTO EN SU FACHADA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

NORTE





SUR







ESTE





OESTE





3. OBSERVACIONES GENERALES:

La zona de intervención es una zona abierta que se encuentra inmersa entre un parque de paneles solares, un mercado (grandes superficies) el parqueadero del mercado mencionado, una via de circulación interna en la base; se evidencia un terreno irregular con cuerpos arboreos, no se evidencia en la inspección visual algun tipo de red, elemento ajeno o similar que deba ser descrito o relacionado en el presente documento.

Se evidencia un alto deterioro en la carpeta asfaltica, esta presenta "piel de cocodrilo", baches, irregularidad en la superficie, el borde de la carpeta presenta desprendimiento parcial de esta. **Se anexa registro filmico del estado actual de la via.**

Para constancia se firma a los VEINTIUN (21) días del mes de ENERO DE 2025

ARQ. FREDY MEDINA	ING. GIOVANNY GARCIA	ST JEFFERY GIOVANNY CHIQUILLO SALAMANCA
CONSORCIO COINVAL	GRUCOING	FUERZA AEREA COLOMBIANA
CONTRATISTA	INTERVENTORIA	SUPERVISOR
