DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

DESAJ MONTERÍA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ACTA FINAL NUMERICA CONTRATO SER099 DE 2024

CONTRATISTA: CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE
ENTIDAD CONTRATANTE: RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

VALOR INICIAL:	**$ 129.879.376,00**
VALOR ADICIONAL BALANCE No. 1:	**$ 8.485.252,00**
VALOR TOTAL	**$ 138.364.628,00**

CONTRATO SER099 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO: Contratar en nombre de la Nacion - Consejo Superior De La Judicatura, la ejecución de obras de mantenimiento del palacio de Justicia del Municipio de Sahagun, Departamento De Cordoba.

CONDICIONES INICIALES						MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRAS		OBRA EJECUTADA					
								ACTA PARCIAL #1		PRESENTE ACTA FINAL ICLUIDA ADICION		ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDADES	UND	CANT INICIAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL INICIAL	CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL FINAL
1	PINTURAS Y ESTUCO												
1,1	Impermeabilización con materiales tipo SIKA para reparación de fisuras en muros exteriores, incluye raspado de muro, revoque y todo lo necesrio para trabajo en altura y correcta aplicación e instalación.	ml	76,00	$ 62.000	$ 4.712.000,00	4,00	$ 248.000,00	25,00	$ 1.550.000,00	55,00	$ 3.410.000,00	80,00	$ 4.960.000,00
1,2	Resane y estuco en muros exteriores. Incluye limpieza de muros, raspado de estuco existente y todo lo necesrio para trabajo en altura y correcta aplicación e instalación.	M2	130,00	$ 47.019	$ 6.112.470,00	10,00	$ 470.190,00	100,00	$ 4.701.900,00	40,00	$ 1.880.760,00	140,00	$ 6.582.660,00
1,3	Lineal de pintura de primera calidad, tipo Koraza para muros exteriores, incluye lavadode paredes, trabajo en altura y todo lo necesario para una correcta ejecución de la actividad.	ML	440,00	$ 29.900	$ 13.156.000,00	57,26	$ 1.712.030,00	238,00	$ 7.116.200,00	259,26	$ 7.751.830,00	497,26	$ 14.868.030,00
1,4	Pintura de primera calidad, tipo Koraza para muros exteriores en fachada y patios, incluye lavado de paredes y todo lo necesrio para trabajo en altura y correcta aplicación e instalación.	M2	1100,00	$ 55.400	$ 60.940.000,00	-	$ 0,00	567,00	$ 31.411.800,00	533,00	$ 29.528.200,00	1100,00	$ 60.940.000,0
1,5	Pintura epóxica para pisos exteriores (parquederos, rampas, cajas de registro y bordillos), incluye delimitación, lineales de demarcación y señalización.	M2	40,00	$ 129.800	$ 5.192.000,00	-	$ 0,00	0,00	$ 0,00	40,00	$ 5.192.000,00	40,00	$ 5.192.000,00
1,6	Mantenimiento para lineales en superboard, afectados por la humedad (incluye reforzamiento, pintura, reparación, estuco, trabajos en altura y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento)	ml	23,00	$ 96.780	$ 2.225.940,00	1,00	$ 96.780,00	13,00	$ 1.258.140,00	11,00	$ 1.064.580,00	24,00	$ 2.322.720,00
1,7	Suministro e instalacion de silicona (tipo sika flex) en el perimetro exterior de las ventanas, incluye arreglo de elementos dañados en las ventanas (como seguros y empaquetadura) todo lo necesrio para trabajo en altura y correcta aplicación e instalación. Si se requiere deben arreglarse seguros de ventanas.	ml	96,00	$ 78.050	$ 7.492.800,00	- 16,00	-$ 1.248.800,00	36,00	$ 2.809.800,00	44,00	$ 3.434.200,00	80,00	$ 6.244.000,00
2	OTROS												
2,1	Enchape estilo roca (con cenefa o listón superior), para paredes en jardineras de patios interiores, a media altura, incluye todo lo necesrio para trabajo en altura y correcta aplicación e instalación.	ml	14,00	$ 127.820	$ 1.789.480,00	- 10,00	-$ 1.278.200,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 511.280,00	4,00	$ 511.280,00
2,2	Aseo, cobertura plástica y limpieza de muebles y enseres (antes, durante y posterior a la ejecución de las obras)	GLB	1,00	$ 1.499.100	$ 1.499.100,00	-	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 1.499.100,00	1,00	$ 1.499.100,00
							-						
	OBRAS ADICIONALES NO PREVISTAS												
NP 01	Suministr, Transporte y riego de material seleccionado tipo caliza para jardineras internas y externas, para evitar salpicaduras en paredes por motivos de lluvia o riego de plantas.	M3	7,00	$ 291.000	$ 2.037.000,00	-	$ 0,00	0,00	$ 0,00	7,00	$ 2.037.000,00	7,00	$ 2.037.000,00
NP 02	Mantenimiento de superboard, afectados por la humedad (incluye reforzamiento, pintura, reparación, estuco, trabajos en altura y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento)	M2	25,00	$ 188.000	$ 4.700.000,00	-	$ 0,00	0,00	$ 0,00	25,00	$ 4.700.000,00	25,00	$ 4.700.000,00

OBSERVACIONES DEL CONTRATANTE:	**TOTAL COSTOS DIRECTOS CONTRATO INICIAL MAS ADICIONAL:**		**$ 109.856.790,00**	**$ 0,00**	**$ 48.847.840,00**	**$ 61.008.950,00**	**$ 109.856.790,00**
	ADMINISTRACIÓN:	**12%**	$ 13.182.815,00	$ 0,00	$ 5.861.741,00	$ 7.321.074,00	$ 13.182.815,00
	IMPREVISTOS:	**8%**	$ 8.788.543,00	$ 0,00	$ 3.907.828,00	$ 4.880.716,00	$ 8.788.543,00
OBSERVACIONES DEL OFERENTE:	**UTILIDADES:**	**5%**	$ 5.492.840,00	$ 0,00	$ 2.442.392,00	$ 3.050.448,00	$ 5.492.840,00
	IVA (sobre utilidad):	**19%**	$ 1.043.640,00	$ 0,00	$ 464.054,00	$ 579.585,00	$ 1.043.640,00
		VALOR TOTAL:	**$ 138.364.628,00**	**$ -**	**$ 61.523.855,00**	**$ 76.840.773,00**	**$ 138.364.628,00**

VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO	**$ 129.879.376,00**
VALOR ADICIONAL BALANCE FINAL	**$ 8.485.252,00**

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	% FACTURADO	VALOR NETO A PAGAR ACTAFINAL DE OBRA, INCLUIDO ADICIONAL	SALDO POR PAGAR	% EJECUTADO ACUMULADO INCLUIDAS OBRAS ADICIONALES
1	ACTA FINAL DE OBRA, INCLUIDA ADICION		$ 76.840.773,00	55,53%	**$ 76.840.773,00**	$ 0,00	100%

Lo anterior, se firma a los cuatro (04) dias del mes de marzo del 2025, por los que en ella intervinieron.

CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE
C.C 78.508.558 DE BOGOTA.
CONTRATISTA

JAIRO LUIS DIAZ ARTEAGA
SUPERVISOR

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA** **DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL**	**DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL** **DESAJ MONTERÍA**

OBJETO	OBJETO DEL CONTRATO: Contratar en nombre de la Nacion - Consejo Superior De La Judicatura, la ejecución de obras de mantenimiento del palacio de Justicia del Municipio de Sahagun, Departamento De Cordoba.				
CONTRATO No.	SER099 DE 2024				
CONTRATISTA:	CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE	**SUPERVISOR:**	JAIRO DIAZ		
ITEM	1,1	Impermeabilización con materiales tipo SIKA para reparación de fisuras en muros exteriores, incluye raspado de muro, revoque y todo lo necesrio para trabajo en altura y correcta aplicación e instalación.		**UNIDAD**	ML

LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**TOTAL**	**ESQUEMA O DIAGRAMA**
	Largo	**Ancho**	**Alto**			**ACUMULADO**	
PALACIO JUSTICIA DE SAHAGUN CORDOBA				25,00	M	25,00	
				55,00		55,00	
	TOTAL					**80,00**	

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE
CONTRATISTA

Aprobó
EL SUPERVISOR:

Firma
Nombre: JAIRO LUIS DIAZ ARTEAGA
SUPERVISOR

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
DESAJ MONTERÍA

OBJETO	OBJETO DEL CONTRATO: Contratar en nombre de la Nacion - Consejo Superior De La Judicatura, la ejecución de obras de mantenimiento del palacio de Justicia del Municipio de Sahagun, Departamento De Cordoba.		
CONTRATO No.	SER099 DE 2024		
CONTRATISTA:	CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE	**SUPERVISOR:**	JAIRO DIAZ
ITEM	1,2	Resane y estuco en muros exteriores. Incluye limpieza de muros, raspado de estuco existente y todo lo necesrio para trabajo en altura y correcta aplicación e instalación.	**UNIDAD** M2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA O DIAGRAMA
	Largo	Ancho	Alto			ACUMULADO	
PALACIO JUSTICIA DE SAHAGUN CORDOBA				100,00	M2	100,00	 
				40,00	M2	40,00	
	TOTAL					140,00	

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE
CONTRATISTA

Aprobó
EL SUPERVISOR:

Firma
Nombre: JAIRO LUIS DIAZ ARTEAGA
SUPERVISOR

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL	DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DESAJ MONTERÍA

OBJETO	OBJETO DEL CONTRATO: Contratar en nombre de la Nacion - Consejo Superior De La Judicatura, la ejecución de obras de mantenimiento del palacio de Justicia del Municipio de Sahagun, Departamento De Cordoba.				
CONTRATO No.	SER099 DE 2024				
CONTRATISTA:	CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE	**SUPERVISOR:**	JAIRO DIAZ		
ITEM	1,3	Lineal de pintura de primera calidad, tipo Koraza para muros exteriores, incluye lavadode paredes, trabajo en altura y todo lo necesario para una correcta ejecución de la actividad.		**UNIDAD**	M

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA O DIAGRAMA
	Largo	Ancho	Alto			ACUMULADO	
PALACIO JUSTICIA DE SAHAGUN CORDOBA				238,00	M	238,00	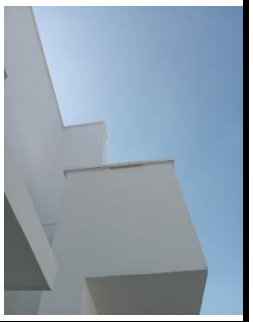
				259,26	M	259,26	
	TOTAL					497,26	

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE
CONTRATISTA

Aprobó
EL SUPERVISOR:

Firma
Nombre: JAIRO LUIS DIAZ ARTEAGA
SUPERVISOR

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL	DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DESAJ MONTERÍA

OBJETO	OBJETO DEL CONTRATO: Contratar en nombre de la Nacion - Consejo Superior De La Judicatura, la ejecución de obras de mantenimiento del palacio de Justicia del Municipio de Sahagun, Departamento De Cordoba.				
CONTRATO No.	SER099 DE 2024				
CONTRATISTA:	CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE	**SUPERVISOR:**	JAIRO DIAZ		
ITEM	1,4	Pintura de primera calidad, tipo Koraza para muros exteriores en fachada y patios, incluye lavado de paredes y todo lo necesrio para trabajo en altura y correcta aplicación e instalación.		**UNIDAD**	M2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA O DIAGRAMA
	Largo	Ancho	Alto			ACUMULADO	
PALACIO JUSTICIA DE SAHAGUN CORDOBA				567,00	M2	567,00	
				533,00	M2	533,00	
					primera calidad,		
	TOTAL					1.100,00	

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE
CONTRATISTA

Aprobó
EL SUPERVISOR:

Firma
Nombre: JAIRO LUIS DIAZ ARTEAGA
SUPERVISOR

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL	DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DESAJ MONTERÍA

OBJETO	OBJETO DEL CONTRATO: Contratar en nombre de la Nacion - Consejo Superior De La Judicatura, la ejecución de obras de mantenimiento del palacio de Justicia del Municipio de Sahagun, Departamento De Cordoba.				
CONTRATO No.	SER099 DE 2024				
CONTRATISTA:	CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE	**SUPERVISOR:**	JAIRO DIAZ		
ITEM	1,5	Pintura epóxica para pisos exteriores (parquederos, rampas, cajas de registro y bordillos), incluye delimitación, lineales de demarcación y señalización.		**UNIDAD**	M2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA O DIAGRAMA
	Largo	Ancho	Alto			ACUMULADO	
PALACIO JUSTICIA DE SAHAGUN CORDOBA				40,00	M2	40,00	
	TOTAL					40,00	

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE
CONTRATISTA

Aprobó
EL SUPERVISOR:

Firma
Nombre: JAIRO LUIS DIAZ ARTEAGA
SUPERVISOR

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA** **DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL**	**DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL** **DESAJ MONTERÍA**

OBJETO	OBJETO DEL CONTRATO: Contratar en nombre de la Nacion - Consejo Superior De La Judicatura, la ejecución de obras de mantenimiento del palacio de Justicia del Municipio de Sahagun, Departamento De Cordoba.				
CONTRATO No.	SER099 DE 2024				
CONTRATISTA:	CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE	**SUPERVISOR:**	JAIRO DIAZ		
ITEM	1,6	Mantenimiento para lineales en superboard, afectados por la humedad (incluye reforzamiento, pintura, reparación, estuco, trabajos en altura y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento)		**UNIDAD**	M

LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**TOTAL**	**ESQUEMA O DIAGRAMA**
	Largo	**Ancho**	**Alto**			**ACUMULADO**	
PALACIO JUSTICIA DE SAHAGUN CORDOBA				13,00	M	13,00	
						11,00	
	TOTAL					**24,00**	

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE
CONTRATISTA

Aprobó
EL SUPERVISOR:

Firma
Nombre: JAIRO LUIS DIAZ ARTEAGA
SUPERVISOR

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL	DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DESAJ MONTERÍA

OBJETO	OBJETO DEL CONTRATO: Contratar en nombre de la Nacion - Consejo Superior De La Judicatura, la ejecución de obras de mantenimiento del palacio de Justicia del Municipio de Sahagun, Departamento De Cordoba.				
CONTRATO No.	SER099 DE 2024				
CONTRATISTA:	CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE	**SUPERVISOR:**	JAIRO DIAZ		
ITEM	1,7	Suministro e instalacion de silicona (tipo sika flex) en el perimetro exterior de las ventanas, incluye arreglo de elementos dañados en las ventanas (como seguros y empaquetadura) todo lo necesrio para trabajo en altura y correcta aplicación e instalación. Si se requiere deben arreglarse seguros de ventanas.		**UNIDAD**	M

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA O DIAGRAMA
	Largo	Ancho	Alto			ACUMULADO	
PALACIO JUSTICIA DE SAHAGUN CORDOBA				36,00	M	36,00	
				44,00		44,00	
	TOTAL					80,00	

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE
CONTRATISTA

Aprobó
EL SUPERVISOR:

Firma
Nombre: JAIRO LUIS DIAZ ARTEAGA
SUPERVISOR

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL	DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DESAJ MONTERÍA

OBJETO	OBJETO DEL CONTRATO: Contratar en nombre de la Nacion - Consejo Superior De La Judicatura, la ejecución de obras de mantenimiento del palacio de Justicia del Municipio de Sahagun, Departamento De Cordoba.				
CONTRATO No.	SER099 DE 2024				
CONTRATISTA:	CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE	**SUPERVISOR:**	JAIRO DIAZ		
ITEM	2,1	Enchape estilo roca (con cenefa o listón superior), para paredes en jardineras de patios interiores, a media altura, incluye todo lo necesrio para trabajo en altura y correcta aplicación e instalación.		**UNIDAD**	M

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA O DIAGRAMA
	Largo	Ancho	Alto			ACUMULADO	
PALACIO JUSTICIA DE SAHAGUN CORDOBA				4,00	M	4,00	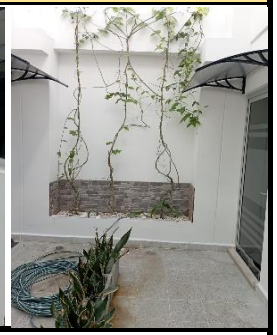
	TOTAL					4,00	

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE
CONTRATISTA

Aprobó
EL SUPERVISOR:

Firma
Nombre: JAIRO LUIS DIAZ ARTEAGA
SUPERVISOR

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL	DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DESAJ MONTERÍA

OBJETO	OBJETO DEL CONTRATO: Contratar en nombre de la Nacion - Consejo Superior De La Judicatura, la ejecución de obras de mantenimiento del palacio de Justicia del Municipio de Sahagun, Departamento De Cordoba.				
CONTRATO No.	SER099 DE 2024				
CONTRATISTA:	CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE	**SUPERVISOR:**	JAIRO DIAZ		
ITEM	2,2	Aseo, cobertura plástica y limpieza de muebles y enseres (antes, durante y posterior a la ejecución de las obras)		**UNIDAD**	GLOBAL

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA O DIAGRAMA
	Largo	Ancho	Alto			ACUMULADO	
PALACIO JUSTICIA DE SAHAGUN CORDOBA				1,00	GLOBAL	1,00	
	TOTAL					1,00	

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE
CONTRATISTA

Aprobó
EL SUPERVISOR:

Firma
Nombre: JAIRO LUIS DIAZ ARTEAGA
SUPERVISOR

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL	DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DESAJ MONTERÍA

OBJETO	OBJETO DEL CONTRATO: Contratar en nombre de la Nacion - Consejo Superior De La Judicatura, la ejecución de obras de mantenimiento del palacio de Justicia del Municipio de Sahagun, Departamento De Cordoba.				
CONTRATO No.	SER099 DE 2024				
CONTRATISTA:	CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE	**SUPERVISOR:**	JAIRO DIAZ		
ITEM	NP 01	Suministr, Transporte y riego de material seleccionado tipo caliza para jardineras internas y externas, para evitar salpicaduras en paredes por motivos de lluvia o riego de plantas.		**UNIDAD**	M3

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA O DIAGRAMA
	Largo	Ancho	Alto			ACUMULADO	
PALACIO JUSTICIA DE SAHAGUN CORDOBA				7,00	M3	7,00	
	TOTAL					7,00	

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE
CONTRATISTA

Aprobó
EL SUPERVISOR:

Firma
Nombre: JAIRO LUIS DIAZ ARTEAGA
SUPERVISOR

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL	DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DESAJ MONTERÍA

OBJETO	OBJETO DEL CONTRATO: Contratar en nombre de la Nacion - Consejo Superior De La Judicatura, la ejecución de obras de mantenimiento del palacio de Justicia del Municipio de Sahagun, Departamento De Cordoba.				
CONTRATO No.	SER099 DE 2024				
CONTRATISTA:	CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE	**SUPERVISOR:**	JAIRO DIAZ		
ITEM	NP 02	Mantenimiento de superboard, afectados por la humedad (incluye reforzamiento, pintura, reparación, estuco, trabajos en altura y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento)		**UNIDAD**	M2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA O DIAGRAMA
	Largo	Ancho	Alto			ACUMULADO	
PALACIO JUSTICIA DE SAHAGUN CORDOBA	4,00	2,00		8,00	M3	8,00	
	4,00	2,50		10,00	M3	10,00	
	4,00	1,75		7,00	M3	7,00	
	TOTAL					25,00	

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE
CONTRATISTA

Aprobó
EL SUPERVISOR:

Firma
Nombre: JAIRO LUIS DIAZ ARTEAGA
SUPERVISOR
