La Paz - Cesar, Seis (06) de Marzo de 2025

Doctor:
EDGARDO JESUS AROCA MINDIOLA
Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial
La Paz - Cesar

REFERENCIA: Informe de Actividades del 17 de Febrero de 2025 al 03 de Marzo de 2025.

IDENTIFICACION E INDIVIDUALIZACION DEL CONVENIO SOLIDARIO

MODALIDAD DE CONVENIO	SOLIDARIO DE OBRA
OFICINA O SECRETARIA QUE GENERA LA NECESIDAD	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL
OBJETO	MANTENIMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE AL RESGUARDO CAÑO PADILLA DESDE LA Y VIA LOS ENCANTOS HASTA EL RESGUARDO INDIGENA CAÑO PADILLA MUNICIPIO DE LA PAZ DEPARTAMENTO DEL CESAR
CONTRATISTA	RESGUARDO INDÍGENA EL ROSARIO, BELLA VISTA Y YUCATÁN, REPRESENTANTE LEGAL JAIME LUIS OLIVELLA MARQUEZ.
NIT	**824004424**
VALOR	CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS. ($44.997.339,17) M/CTE.
PLAZO	UN (1) MES
NOMBRE DEL SUPERVISOR	EDGARDO AROCA MINDIOLA
FECHA DESIGNACION DE SUPERVISOR	17 DE FEBRERO DE 2025
CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPIO DE LA PAZ , CESAR.

FECHA SUSCRIPCION DEL CONVENIO	17 DE FEBRERO DE 2025.
FECHA DE INICIO	17 de Febrero de 2025
FECHA DE TERMINACION	03 de Marzo de 2025
CDP	020610 De 06 De Febrero de 2025
RP	02171 del 17 de Febrero de 2025.
MODIFICACIONES:	
CESIÓN:	N.A.
ADICIONAL EN VALOR:	N.A.
PRORROGAS	N.A.

GARANTIAS

Pólizas N.º 421417 Y 013001001791 de SURAMERICANA , se encuentra debidamente diligenciada y cumple con los plazos y términos estipulados en el Convenio N°CD-CONVSOL-007 de **2025,** suscrito entre la Acaldia Municipal de La Paz Cesar y RESGUARDO INDIGINA EL ROSARIO BELLA VISTA Y YUCATAN, identificado con NIT: **824004424,** Cuyo objeto es**:** MANTENIMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE AL RESGUARDO CAÑO PADILLA DESDE LA Y VIA LOS ENCANTOS HASTA EL RESGUARDO INDIGENA CAÑO PADILLA MUNICIPIO DE LA PAZ DEPARTAMENTO DEL CESAR**.** La póliza contiene las siguientes especificaciones:

AMPARO	FECHA INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17-FEB-2025	02-JULIO-2025	4.499.733.91
CALIDAD DEL SERVICIO	17-FEB-2025	02-JUL-2025	4.499.733.91
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	04-MARZO-2025	04-SEPT-2025	4.499.733.91
PRESTACIONES SOCIALES	17-FEBR-2025	03-MARZO-2028	2.249.866.95
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	17-FEBR-2025	02-JULIO-2025	4.499.733,91

ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA

Por medio del presente doy a conocer el desarrollo del INFORME de actividades ejecutadas conforme al contrato No. CONVSOL-007-2025 de Febrero 17 de 2025 cuyo objeto es**: "MANTENIMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE AL RESGUARDO CAÑO PADILLA DESDE LA Y VIA LOS ENCANTOS HASTA EL RESGUARDO INDIGENA CAÑO PADILLA MUNICIPIO DE LA PAZ DEPARTAMENTO DEL CESAR."**

1. Del 18 de Febrero de 2025 al 21 de Febrero de 2024 Se realizo Rocería a la Vía Terciaria de la Y y vía los encantos hasta el Resguardo Indígena caño padilla, El Rosario, Bella Vista y Yucatán, donde se corto maleza, arboles tirados en la vía y chamizos que obstaculizaban el tránsito normal.
2. Los días 22, 23, 24 de febrero del año 2025 se Realizó Mantenimiento a la vía Vía Terciaria de la Y y vía los encantos hasta el Resguardo Indígena caño padilla, donde se realizó desagües, Rocería, se limpiaron cunetas y se apodaron algunos árboles grandes que estaban alrededor de la carretera y que estaban en mal estado
3. Acompañe del día 25 de febrero de 2025 al día 26 febrero de 2025 a la máquina de bulldozer donde excavo los terrenos que estaban en mal estado en el Resguardo El Rosario, Bella Vista Y Yucatan Vía Terciaria de la Y y vía los encantos hasta el Resguardo Indígena caño padilla.
4. Se Hicieron Cunetas Nuevas en lugares estratégicos con la Maquina Bulldozer para que la lluvia no dañara de nuevo la vía para Temporadas de Invierno, así mismo se Ampliaron las Vueltas cerradas en Puntos que los Carros no Daban la vuelta.
5. Para la semana del 27 de febrero al 03 de Marzo de 2025, se realizó mejoramiento completo a los puntos más críticos e intransitables que comunican al Vía Terciaria de la Y y vía los encantos hasta el Resguardo Indígena caño padilla.
6. Se Realizo en las vías Terciarias de la Laguna de los indios y el Resguardo Indígena el Rosario Limpieza de Cunetas, Descoles, Remoción de Pequeños Derrumbes, rocería de taludes y zonas laterales o bordes, así mismo se rellenaron huecos donde los vehículos no podían pasar.
7. Con la máquina de Bulldozer se hicieron en la vía zanjas y Canales para que el agua drenara de una mejor manera y así recibir y encauzar fuentes de agua naturales
8. Se mejoro el mal estado de la vía que comunica el corregimiento de la laguna de los indios y el resguardo indígena el rosario, y así mismo se mejoró la movilidad y productividad de los campesinos de estas veredas.

PRESUPUESTO EJECUTADO:


ALCALDÍA DE LA PAZ	MANTENIMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE AL RESGUARDO CAÑO PADILLA DESDE LA "Y "VIA LOS ENCANTOS HASTA RESGUARDO INDIGENA CAÑO PADILLA, MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR. ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ - CESAR SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRIRORIAL CONTIENE: PRESUPUESTO OFICIAL	ALCALDÍA DE LA PAZ

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
1	ROCERIA Y LIMPIEZA DE CUNETAS DE LA VIA DE ACCESO				$ 40.356.358,00
1,1	ROCERIA DE VIA	HA	2,16	$ 1.987.732	$ 4.293.500,00
1,2	LIMPIEZA A MANO DE CUNETAS	ML	3.580,00	$ 2.528	$ 9.050.240,00
1,3	CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	17.439,08	$ 1.549	$ 27.012.618,00
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 40.356.358,00
	COSTOS ADMINISTRACIÓN			10,5%	$ 4.237.417,59
	COSTOS IMPREVISTOS			1,0%	$ 403.563,58
	COSTOS UTILIDAD			0,0%	$ -
	SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS				$ 4.640.981,17
	TOTAL				$ 44.997.339,17

Balance Financiero

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE %	ESTADO
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$44.997.339,17	100	
VALOR PAGO PRIMER DESEMBOLSO	$44.997.339,17	100%	PENDIENTE
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	$44.997.339,17	100%	PENDIENTE
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (LO QUE FALTA POR EJECUTAR)	$0		
VALOR TOTAL EJECUTADO	$44.997.339,17	100%	
VALOR TOTAL AMORTIZADO	$0	0	

BALANCE EN TIEMPO

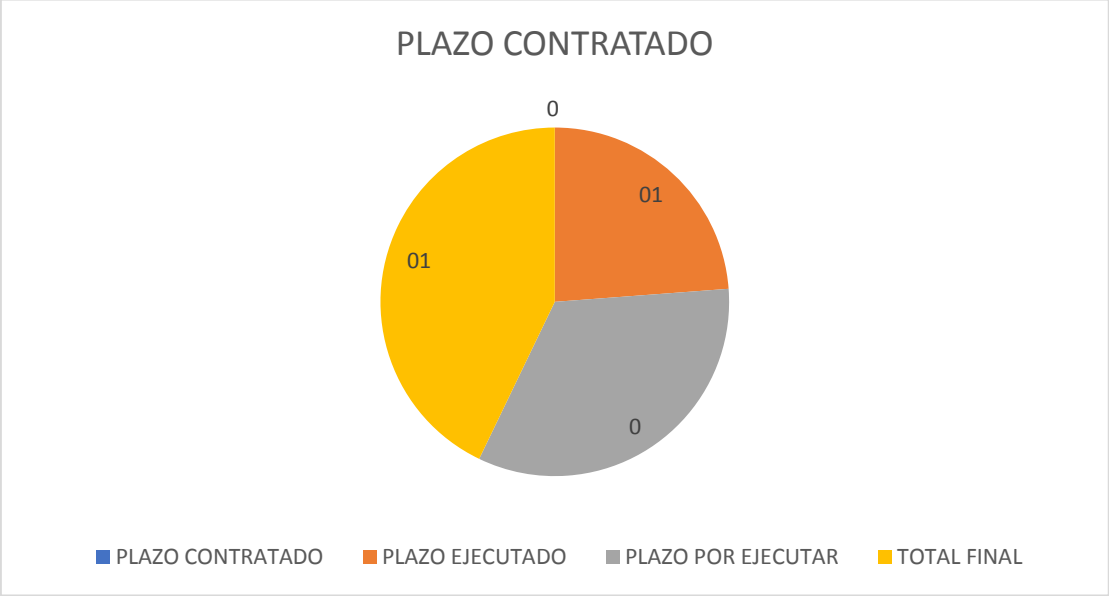

ANEXO: Planilla de Seguridad Social y Registro Fotográfico.

Atentamente,

Resguardo Indígena El Rosario, Bella Vista y Yucatán
Representante Legal
JAIME LUIS OLIVELLA MARQUEZ
C.C 1.067.808.333 de la Paz – Cesar
Contratista

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS



















