Bogotá D. C., 17 de agosto de 2023

Señores:
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO
Victor Manuel Buitrago Vega
Asesor Grupo de Infraestructura
Supervisor Contrato

REF.: REGISTRO FOTOGRÁFICO MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SISTEMAS DE VENTILACIÓN MECÁNICA Y AIRES ACONDICIONADOS DE C.S.B - MHCP - DICIEMBRE 2022, CORRESPONDIENTE A ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 3.307-2022, DENTRO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. MHCP-PMC-34-2022, CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS COMPONENTES Y PARTES MECÁNICAS QUE COMPONEN EL SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

Se realizaron mantenimientos correctivos encontrados durante las rutinas de mantenimientos preventivos a los siguientes equipos:

1 Unidad VEC-3 LOREN COOK 210CAF-DWCL1 ARR3 270SF17515-01/0004001 UC1 – Sótano Parqueadero

- ✓ VARIADOR DE VELOCIDAD TIPO VLT FC 51 DE 1,5 KW/ 2HP / 380-480V INCLUYE DISPLAY MARCA DANFOSS, INCLUYE: INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

2 Unidad Evaporadora LG MiniSplit ARNU09GTUC2 UC1 - Oficina

- ✓ BOMBA DE CONDENSADO ASPEN PUMPS MINI ORANGE 12L/HORA 220V, INCLUYE: INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

3 TABLEROS DE CONTROL


- ✓ PILOTOS INCLUYE: INSTALACIÓN 8 30.000 19% 240.000

4 Unidad Evaporadora -3TR YORK YMKFXC036BBH — BX 27640167515080030 UC1 Cuarto UPS

- ✓ BOMBA CONDENSADO CENTRIFUGA PARA CASSETTE ~ 220v / SICCOM CP08 INCLUYE: INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

REGISTRO FOTOGRÁFICO MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS



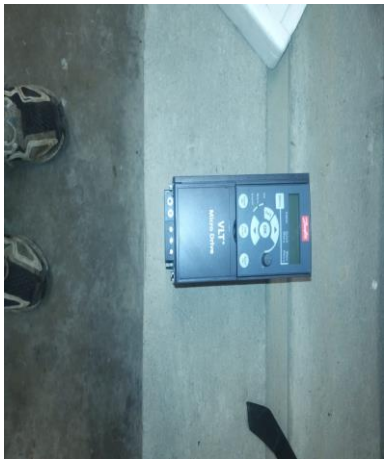


















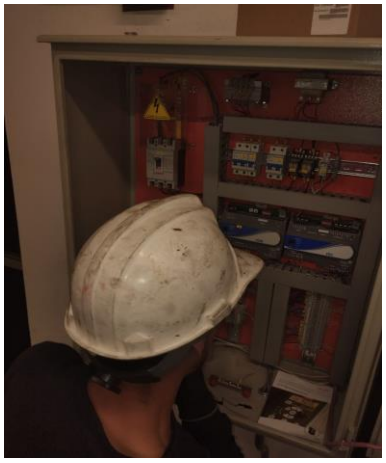

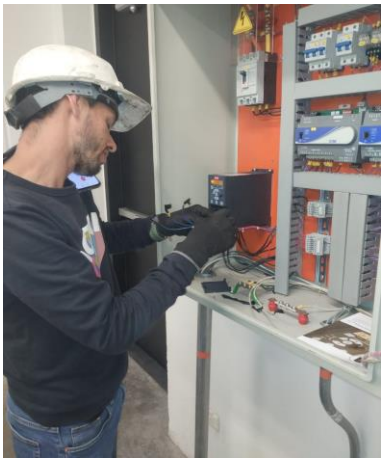VLT
Micro Drive


ASPEN
ASPENPUMPS.COM


LG NOM
ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MULTI
UNIDAD EVAPORADORA
MODELO ARNU24GTPC2
REFRIGERACION
CAPACIDAD 24.200 Btu/h
CONSUMO 33 W
CORRIENTE 0,15 A
CALEFACCION
CAPACIDAD 27.300 Btu/h
CONSUMO 33 W
Precaución








SICCOM
CP08
SICCOM
CP08

AUDITORIO
AUDITORIO
AUDITORIO
BAÑOS

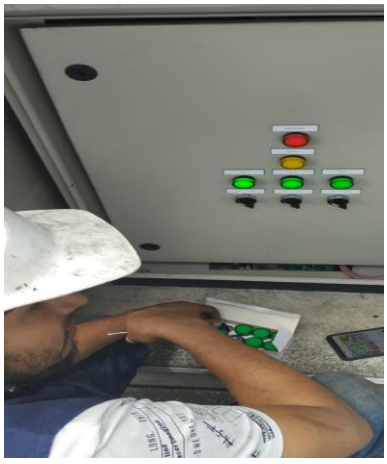

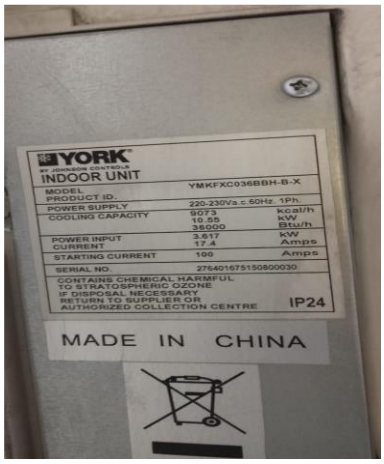

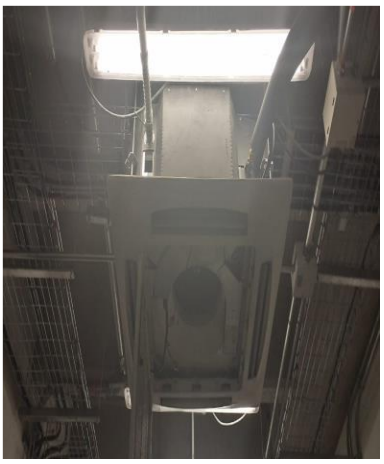Saludo cordial,

Miguel Antonio Castiblanco Pineros
COMPUSERTEC INGENIERIA SAS
