Fecha 01/Marzo/2025

- Estado del Tiempo: soleado

- Jornada Laboral → Mañana: 7:00 a.m - 12:00 m
  1:00 p.m - 4:00 p.m

- Personal en obra → Ing. Residente de obra, Maestro, ayudante (15), oficiales (5), operador, conductor almacenista, calador, Residente interventoria, SST interventoria, soldador (3)

- Herramientas y Equipos: Miniretroexcavadora, Bentín saltarin, mezcladora, taladro demoledor, vibradores de concreto, herramienta menor

- Actividades Ejecutadas: se continua con trabajos de extension y compactacion de material seleccionado de relleno, se continua con amarre de acero para tapa de tanque de almacenamiento, se realiza jornada de acero figuracion y se continuan con trabajos de topografia para realizar verificacion y chequeo de niveles y ubicacion de elementos estructurales, se realiza charla e implementacion de seguridad y salud en el trabajo

OBSERVACIONES:

Contratista

Interventoria

Fecha 03/MARZO/2025

- Estado del Tiempo: soleado
- Jornada Laboral → Mañana: 7:00 am - 12:00 m
  Tarde: 1:00 p.m - 5:00 p.m
- Personal en Obra: Ing. Residente de Obra, Maestro HSE obra; Ing SST interventoria, Oficial (5), ayudante (16) operador, conductor, almacenista, soldadores (3), Ing. Residente interventoria
- Herramientas y Equipos: Miniretroexcavadora, saltarin, mezcladora, benitin, taladro demoledor, pulidores, trozadora, herramientas menores
- Actividades Realizadas: se inicia jornada laboral con charla de seguridad y salud en el trabajo, se continua con trabajos de amarre de acero y figurado de vigas de placa de tanque, se realiza amarre y figurado de elemento estructural B3-2, se realiza trabajos de excavacion manual para pedestales de tuberias que serviran como anclajes de lineas de vida, se realizan trabajos de extension y compactacion de material seleccionado.

OBSERVACIONES: se solicita al contratista realizar trabajos de impermeabilizacion y curado tanto interna como externamente a todas las paredes del tanque, debido a algunas anomalias presentadas y detalladas despues del desencofrado del mismo.

* Se ha observado que ingresa Personal Ajeno a la Obra, S.n EPP, N. ARL, Se le Notifica al Hse de la obra. Pero no hay Respuesta

Contratista Interventoria

FECHA 04/MAR20/2025

- Estado del tiempo: Mañana nublado

- Jornada Laboral → Mañana: 7:00 a.m - 12:00 m
  Tarde: 1:00 pm - 5:00 p.m

- Personal en obra: ing residente obra, Hse obra, Maestro, ing SST interventoria, oficiales (6) ayudantes (15), almacenista, conductor, soldador (3) operador

- Herramientas y Equipos: Minirretroexcavadora, mezcladora, saltarin, bentín, taladro demoledor, pulidora, trozadora, herramienta menor

- Actividades Realizadas: Se inicia jornada laboral con charla de salud y seguridad en el trabajo, se continuan con trabajos de figurado y amarre de acero de tapa y vigas de tanque RCI, se continua con figurado y amarre de acero de elemento estructural BB-2, se realiza jornada de adecuacion de espacios para ubicacion de formaletas metálicas, se inician actividades de encofrado de plantilla para tapa de tanque de almacenamiento de agua y RCI.

OBSERVACIONES: Se realiza como recomendacion al contratista reforzar la estructura de soporte con un número superior de parales por metro cuadrado para al momento de fundir plantilla o tapa del tanque, esta no tenga afectaciones por el peso del concreto y no colapse.

Contratista

Interventoria

Powered by CamScanner

Fecha: 05/MARZO/2025

- Estado del tiempo: soleado
- Jornada Laboral → Mañana: 7:00 am - 12:00 m
  Tarde: 1:00 pm - 5:00 pm
- Personal en obra: ing Residente, HSE, Maestro oficiales (3), ayudantes (15), soldador (3), celador almacenista, Ing SST interventoría, operador, conductor, ing. Residente interventoría
- Herramientas y Equipos: Minimetro, saltarin, bexitin, mezcladora, trozadora, flejadoras artesanales, vibradores, soldadoras, herramienta menor
- Actividades Ejecutadas: se realiza charla de salud y seguridad en el trabajo al inicio de la jornada, se continuan con actividades de extensión y compactación de material seleccionado de relleno, se continuan con trabajos de plantilla o estructura para placa tapa del tanque, se continua con amarre y figurado de acero de estructura B3-2, se continuan con trabajos de curado e impermeabilización de muros del tanque, se inicia instalación de manto para implementación y construcción de filtro.
  OBSERVACIONES: Se recomienda instalar cuerdas que hagan las veces de Barandas, para que los trabajadores se sostengan cuando esten caminando x encima de los estribos, se le hace Recomendación a Ing Pablo y a Angie R Altamirando

Se recomienda al contratista seguir las especificaciones técnicas para la construcción e instalación de Geo-compuesto.

RTA: De la observación referente del personal que ingresa ajeno a la obra no se ha notificado con nombre, ni fecha del personal que está ingresando a las instalaciones de la obra. Cabe aclarar que el personal que quiera ingresar se recomienda siempre estar afiliado a una administradora de riesgos laborales. Aclarando la observación presentada el día 05 de Marzo, después de evaluar la actividad, se ha determinado que no es posible implementar dicha acerca como barandas debido que obstaculiza la movilidad para los trabajadores afectando el desempeño en el área de trabajo. Se observa...

Contratista

Interventoría

FECHA 06/MARZO/2025

- Estado del tiempo: se presenta mañana nublada.

- Jornada Laboral: → Mañana 7:00 a.m - 12:00 m
  1:00 p.m - 5:00 p.m

- Personal en obra: Maestro, oficiales (6), Hse obra, Hse interventoría, Residente de obra, ayudantes (15) soldador (3), almacenista, ingeniero Residente de interventoría, operador, soldadores (3).

- Herramientas y equipos: mini retroexcavadora, bentin, sultorin, flejadoras, trozadora, pulidoras, mezcladora, herramientas menores

- Actividades Ejecutadas: se continuen con trabajos de encofrado de plantilla tapa del tanque de almacenamiento, se continuan con

trabajos de extensión, compactación y relleno con material seleccionado en área baja del tanque, se continuan con trabajos de sol dadura y herrería, se realiza charla de implementación de seguridad y salud en el trabajo.

OBSERVACIONES:

1 Se recomienda al contratista realizar el retiro del material o suelo saturado y/o contaminado antes de realizar los rellenos de mejoramiento de suelo, así como realizar el desagüe de aguas estancadas en zonas bajas aledañas al tanque de almacenamiento de agua y RCI

2. En la actividad de impermeabilización externa del tanque de agua subterraneo, sistema de Geo-compuesto, se recomienda que al momento de ejecutarlo, se manejen pendientes para direccionar las escorrentías y el sistema instalado sea funcional, así como la construcción de una caja recolectora que despues se conlleve al manhole de vertimiento final

3. Se solicita al contratista informar a la interventoría las extensiones de las jornadas laborales y entregar la programación semanal teniendo en cuenta lo anteriormente enunciado, ya que se estan ejecutando actividades sin la supervisión de la interventoría.

Contratista

Interventoría

Fecha 07/MARZO/2025

- Estado del tiempo: día nublado

- Jornada Laboral → Mañana 7:00 a.m - 12:00 m
  1:00 p.m - 5:00 p.m

- Personal en obra: Residente de Obra, Hse de obra, Maestro, oficiales (6), ayudantes (15), conductor, almacenista, soldadores (3), ing. Residente interventoria, SST interventoria celador

- Herramientas y Equipos: Minirretroexcavadora, camión turbo, Equipos menores, bentín, Motobomba, mezcladora, herramientas menores

- Actividades Realizadas: Se continuo con trabajos de encofrado y construcción de plantilla para placa tapa del tanque de almacenamiento de agua potable y Red contraincendios, se continuan con trabajos de figurado de acero y de re llenos con material seleccionado, al inicio de la jornada se realiza charla de seguridad y salud en el trabajo por parte del personal Hse dispuesto en obra.

OBSERVACIONES!

- Se solicita al contratista informe de desglose donde se aprecie la implementación del PMA, de igual manera la resolución actualizada del plan de manejo de tráfico.

Contratista

Interventoria

Powered by CamScanner

Fecha 08/MARZO/2025

- Estado del tiempo: soleado

- Jornada Laboral → Mañana 7:00 am - 10:30 a.m

- Personal en obra: Ing. Residente, HSE, Maestro. oficiales (6), almacenista, ayudantes (15), conductor, celador, soldadores (3), SST interventor, ing. residente de interventoria, operador

- Herramientas y Equipos: Miniretroexcavadora, saltarin, benitin, motobomba, mezcladora, trozadora, herramientas menores, equipos menores.

- Actividades Realizadas: Se realiza charla e implementacion de seguridad y salud en el trabajo, se realizan ponches de orden y aseo, se realiza descarga de acero y se continuan con trabajos de construccion de plantilla o estructura para placa tapa del tanque, se continua con la construccion de impermeabilizacion externa de los muros de tanque con sistema geocompuesto.

OBSERVACIONES:

-Se le solicitó al contratista que todo subcontratista debe entregar su ARL, todo trabajador - (Operador de Volqueta. Electricos, Grupo Vanti, y demás), deben presentar la planilla de ARL como minimo. Es responsabilidad del Consorcio Mirador del RIO, permitir que se realicen trabajos al interior de la Obra Sin Seguridad.

-

Contratista

Interventoria

FECHA 10/MARZO/2025

- Estado del tiempo: soleado
- Jornada Laboral → Mañana 7:00 a.m - 00 m
  Tarde 1:00 p.m - 5:00 p.m
- Personal en Obra: Ing. Residente, HSE, Maestro, oficiales (6) ayudantes (15), conductor, soldador (3), SST interventoria, almacenista, operador, celador, Residente interventorsa
- Herramientas y Equipos: Miniretroexcavadora, mezcladora, benitín, motobomba, frezadora, saltorin, equipos menores, herramientas.
- Actividades Realizadas: se realiza Inicio de jornada con charla de seguridad y salud en el trabajo, se continuan con trabajos de alistamiento de encofrado o plantilla de pluca tapa del tanque de almacenamiento de agua potable y RCI, se continuan con trabajos de figurado de acero se realizo jornada de aseo y limpieza en áreas de operaciones y maniobras para evitar incidentes de trabajo.

OBSERVACIONES:

Se recomienda al contratista, asegurar los entablados en madera que se están ubicando en la plantilla o estructura de soporte de la tapa que sellara el tanque de almacenamiento ya que pueden generar contratiempos al momento del vaciado si no se encuentran bien instaladas.

Contratista

Interventoria

FECHA | 11 / MARZO / 2025

- Estado del tiempo: soleado

- Jornada laboral: mañana 7:00 a.m - 12:00 m
  tarde 1:00 p.m - 5:00 pm

- Personal en obra: ingeniero residente administrativo, Vigia HSE, almacenista, maestro, oficial (7), cebador, ayudantes (18), operador, conductor, topografo, SST interventoria, residente interventoria

- Herramientas y Equipos: minirretro-excavadora Bonitin, saltarin, mezcladora, motobombas, trozadora, herramientas menores, equipos menores, nivel ó estación topográfica.

- Actividades Realizadas: se inicia jornada con charla de seguridad y salud en el trabajo, se continuan con trabajos de abastecimiento de estructura para posterior fundación de tapa en concreto del tanque de almacenamiento, se reanudan trabajos de relleno, extension y compactación de material seleccionado, se realizan rellenos y compactacion con suelo-cemento en algunas áreas donde se observa afectación (humedad) por nivel freatico o nacimiento de agua por algun agente no identificado, se recomienda al contratista realizar seguimiento de esta situación.

OBSERVACIONES

Contratista

Interventoria

Anexo 6.

INFORME GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INFORME MENSUAL GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FEBRERO – 2025



(PERIODO DEL 11 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DE 2025)

CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RÍO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA/SANTANDER

CONTRATO 0401-23

PERIODO DEL INFORME DEL 11 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO 2025

CONSORCIO RIO GRANDE

NIT: 901668549-7

BARRANCABERMEJA - SANTANDER 2024

Elaborado por:
ANGIE PAOLA ALTAMIRANDA MARTINEZ
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
LICENCIA SST No. RES.4502

Revisado por interventoría:
CARLOS AUGUSTO RANGEL DÍAZ
ESP. EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO LICENCIA SST No RES.10242

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO GENERAL 5
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 5
3. ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST 6
4. ELEMENTOS DE LA GESTION SST 6
4.1 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 6
4.2 Afiliaciones y aportes al Sistema General de Seguridad Social 7
4.3 Evaluación médica de ingreso. 10
5. ACTIVIDADES DE SST 10
5.1 Inducción y notificación de riesgos. 10
5.2 Actividades realizadas en obra 11
5.3 Personal en obra 11
5.4 Retiro de personal 11
5.5 Charlas diarias 11
5.6 Entrega de Dotación y Reposición de Epp 12
5.7 Inspección de orden y aseo 12
5.8 Preoperacionales, herramientas menores, maquinaria y equipos 13
5.10 Atención de Emergencias y Desastres, primeros auxilios, inspección de camilla de emergencia, botiquín y extintores. 13
5.11 Pausas activas 14
5.12 Hidratación del Personal 14
5.13 Capacitaciones y sensibilizaciones. 14
5.14 Incapacidades 15
5.15 Análisis de Trabajo Seguro (ATS) 15
5.16 Permiso de Trabajo en Alturas 16
5.17 Plan de Manejo de Transito (PMT) 17

5.18 Plan Manejo Ambiental (PMA) 18

6. SANEAMIENTO BÁSICO 18

6.3 INDICADORES DE SST – Res 0312/2019 20

7. SEÑALIZACIÒN 22

8. CONCLUSIONES 22

INTRODUCCIÓN

Inicialmente, se procede a presentar el Informe de seguridad y salud en el trabajo, durante el periodo del informe del 11 de febrero al 10 de marzo de 2025, en el cual se muestra el resumen de las actividades realizadas en beneficio conforme a este proyecto, con el fin de garantizar el cumplimiento de los compromisos obtenidos.

Por medio de las actividades de seguridad y salud en el trabajo efectuadas durante el periodo de cada una de las etapas constructivas del proyecto de obra, se promueven la calidad de vida, salud física y mental, el desarrollo de sus capacidades, desarrollo personal y social de todos los grupos de interés.

1. OBJETIVO GENERAL

Destacar de manera sencilla evidenciando con registros fotográficos las acciones de aseguramiento y cumplimiento de los aspectos de seguridad industrial, salud ocupacional y gestión ambiental en las diferentes áreas de trabajo del Proyecto Construcción del Mirador del Río y acciones complementarias del Distrito de Barrancabermeja.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Velar por la calidad de vida de los trabajadores y proporcionar ambientes de trabajo seguro, con el fin de conservar su integridad.
2. Ejecutar las actividades de promoción de la salud y prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales establecidas en el Sistema de Gestión de seguridad y Salud en el Trabajo.
3. Realizar seguimiento a la ejecución de las actividades de Seguridad y Salud en el trabajo del Cronograma establecido por el Consorcio.
4. Mantener en cero los índices de ausentismo por accidente de trabajo y enfermedad laboral.
5. Intervenir los factores de riesgo para disminuir los efectos de su exposición en los diferentes cargos.
6. Evaluar los resultados de la ejecución de las actividades programadas en el cronograma de SST.

7. Generar estrategias para la prevención de enfermedades laborales y accidentes de trabajo, aumentar el autocuidado y mantener bajos los índices de ausentismo.
8. Cumplir las medidas de manejo ambiental para prevenir, mitigar, corregir o compensar los efectos negativos producto de las actividades del proyecto, ayudando a la conservación de los Recursos Naturales.

3. ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST

Seguridad y Salud en el trabajo son los ejes fundamentales para el desarrollo de toda actividad económica donde se promociona la salud y se realiza prevención de enfermedades y accidentes laborales que interrumpan el desarrollo normal de las actividades productivas. Por lo tanto, es responsabilidad de los ejecutores asumir de manera colectiva su responsabilidad y de este modo buscar y poner en práctica las medidas necesarias que contribuyen a mantener y mejorar los niveles de eficiencia en las operaciones constructivas del proyecto, con el fin de brindar a sus trabajadores un medio laboral seguro.

4. ELEMENTOS DE LA GESTION SST

4.1 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Con respecto a lo anteriormente mencionado, **CONSORCIO RÍO GRANDE** muestra soportes de las acciones o prácticas desarrolladas para la ejecución de la **CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RÍO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA (SANTANDER)** durante el periodo correspondiente del 11 de febrero al 10 de marzo de 2025, dando cumplimiento a lo establecido en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y por ende de la respectiva normatividad legal vigente, el cual se referencia mediante objetivos tendientes a promover, mejorar y conservar el bienestar individual y colectivo del recurso humano del proyecto en todos los niveles operativos, evidenciando el compromiso indispensable con el área.

4.2 Afiliaciones y aportes al Sistema General de Seguridad Social.

Dando cumplimiento a los requerimientos y lineamientos legales en al área de Seguridad y Salud en el Trabajo, CONSORCIO RÍO GRANDE ejecuta el seguimiento y verificación al pago de aportes de la seguridad social de todo el personal.

El personal apto para los diferentes cargos se afilia a las respectivas entidades exigidas por la ley (ARL, EPS, AFP, CAJA DE COMPENSACION). Se lleva a cabo el pago de la seguridad social y parafiscal de acuerdo con la fecha de pago de su planilla y se entrega los soportes de las mismas para cumplir con los requisitos exigidos por la normatividad vigente. Concluyendo que actualmente se cuenta con ARL AXA COLPATRIA. Fechas de pago de seguridad social por NIT y ARL

CONTRATISTA	NIT	NUMERO DE EMPLEADOS	FECHA DE PAGO	ARL
CONSORCIO RÍO GRANDE	901668549-7	Menos de 50 personas	Los días 05 y 20 de cada mes	AXA COLPATRIA

Fuente: *Elaboración propia, 2024*

A continuación, se muestra el personal activo en el periodo del mes de febrero. ***(Se anexa la planilla de seguridad social del mes de febrero). Ver anexo 1.***

NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	CARGO
1. EVER DE JESUS HINCAPIE VIDES	1042213191	OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN
2. JUAN CARLOS TRECO MONSALVE	91442822	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN
3. PABLO DALLOS RAMIREZ	1096187294	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN

4. LUIS ADOLFO MEJIA ALVAREZ	7709383	RESIDENTE DE OBRA
5. JORGE ANTONIO GOMEZ BARON	13923929	DIRECTOR DE OBRA
6. JAVIER MAURICIO HERRERA HERNANDEZ	73167554	INGENIERO ESTRUCTURAL
7. PABLO ANTONIO MEZA DE LEÓN	1094244801	RESIDENTE AMBIENTAL
8. ARISTIDES JOSE GUZMAN TENNORIO	7368547	MAESTRO DE OBRA
9. VICTOR ADOLFO AVENDAÑO	1096253522	AYUDANTE DE CONSTRUCCION
10. ANGIE PAOLA ALTAMIRANDA MARTINEZ	1102884306	AUXILIAR HSE
11. ANDRES MAURICIO HERRERA FONSECA	1005182950	AYUDANTE DE CONSTRUCCION
12. ELKIN DARIO LEAL HERAZO	91429377	AYUDANTE DE CONSTRUCCION
13. WILFRIDO MORALES CASTELLARES	1085045933	OFICIAL DE CONSTRUCCION
14. MARVIN EDUARDO NOVOA LAMBIS	13571355	AYUDANTE DE CONSTRUCCION
15. ERBINSON AVENDAÑO CUELLAR	1096204542	OFICIAL DE CONSTRUCCION
16. JESUS MANUEL RUZ BOHORQUEZ	1102580681	AYUDANTE DE CONSTRUCCION
17. ARGEMIRO MIGUEL CUELLO CONTRERAS	9033972	OFICIAL DE CONSTRUCCION
18. JESUS ALBERTO MARTINEZ CARPIO	1096243416	AYUDANTE DE CONSTRUCCION
19. KENNETH GIOVANNY LOPEZ RAMOS	1096215262	AYUDANTE DE CONSTRUCCION
20. MIGUEL ANTONIO OSORNO PARRA	1005178116	AYUDANTE DE CONSTRUCCION
21. MAYCOL YESID LARGO GUARIN	1096193530	AYUDANTE DE CONSTRUCCION
22. JOSE LUIS MEDINA MEDINA	3842012	ALMACENISTA
23. JOSE ARMANDO MORA RETAMOSO	1096242036	AYUDANTE DE CONSTRUCCION
24. CRISTIAN MENDEZ ALVARADO	1096193299	AYUDANTE DE CONSTRUCCION
25. WILLITON VILORIA JIMENEZ	13851292	AYUDANTE DE CONSTRUCCION

26. EDUARDO ENRIQUE RIOS RODRIGUEZ	8854026	AYUDANTE DE CONSTRUCCION
27. JUAN DAVID RODAS LAGUNA	1039691755	AYUDANTE DE CONSTRUCCION
28. GEINER MORALES HERRERA	13571127	OFICIAL DE CONSTRUCCION
29. ALVARO JAVIER HERRON	1032252127	OFICIAL DE CONSTRUCCION
30. FREDDY ALFONSO ROYETT NARVAEZ	91448469	AYUDANTE DE CONSTRUCCION
31. OMAR ANDRES REINOSA LOPEZ	1102721453	AYUDANTE DE CONSTRUCCION
32. OSCAR EDUARDO CASTRO DURAN	13566591	AYUDANTE DE CONSTRUCCION
33. SERGIO MANUEL RUEDA PRADA	1096209791	AYUDANTE DE CONSTRUCCION
34. CARLOS AMARO NOVOA LAMBIS	1096198066	AYUDANTE DE CONSTRUCCION
35. CRISTIAN CAMILO COLEY MONCADA	1096253007	AYUDANTE DE CONSTRUCCION
36. JUAN SEBASTIAN SAAVEDRA VANEGAS	1096232850	AYUDANTE DE CONSTRUCCION
37. TULIO ARMANDO CASTRO DE LEON	1052967294	INGENIERO CIVIL
38. GUILLERMO ALONSO GARCIA AVELLA	74180122	DIRECTOR DE OBRA
39. IVONNE KATHERINE LOPEZ TOVAR	1098605107	CONTADORA
40. ERIS ENRIQUE MAESTRE ALVAREZ	12647521	INGENIERO HSE
41. JHAN CARLOS SALOM PADILLA	1096244499	ADMINISTRADOR
42. EDWING ALIRIO SILVA RUEDA	91496077	ESPECIALISTA HIDRAULICO
43. MAYRA ALEJANDRA VELASCO	1121936429	INSPECTORA
44. JUAN ANTONIO GONZALEZ BELEÑO	1096223278	OFICIAL DE CONSTRUCCION
45. LUIS MUÑOZ PEREZ	3984704	AYUDANTE DE CONSTRUCCION
46. TEOALDO GUERRA MARTINEZ	1096247470	AYUDANTE DE CONSTRUCCION
47. LUIS ENRIQUE MORA FLOREZ	91446405	AYUDANTE DE CONSTRUCCION

48. LUIS ADRIAN MEJIA ALVAREZ	77091383	ARQUITECTO ESPECIALISTA
49. FERNANDO GONZALEZ MANCERA	13570996	OFICIAL DE CONSTRUCCION

Personal subcontratado en el periodo del mes de diciembre. ***(Se anexa la planilla de seguridad social del mes de febrero)***. ***Ver anexo 2.***

NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	CARGO
1. DAVID CORDERO CAMPO	13889325	SOLDADOR
2. JESUS ANTONIO MARULANDA JARAMILLO	13886837	SOLDADOR
3. JOSE RAMON SILVA MADARIAGA	1096221263	SOLDADOR

Fuente: *Elaboración propia, 2024*

4.3 Evaluación médica de ingreso.

En cumplimiento a lo descrito en la normatividad vigente*:* resolución 2346 de 2007

"por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales", **CONSORCIO RÍO GRANDE** ejecutó verificación de las condiciones de salud física, mental y social de cada trabajador previo a su ingreso al proyecto mediante la exigencia legal de la práctica de exámenes médicos ocupacionales, los cuales fueron realizados acorde a las condiciones de trabajo a las que estaría expuesto el trabajador y especificaciones del cargo a desempeñar.

5. ACTIVIDADES DE SST

5.1 Inducción y notificación de riesgos.

Como parte del proceso que realiza **CONSORCIO RÍO GRANDE**, para la vinculación o ingreso de personal al proyecto, se realizó inducción a cada trabajador con el fin de socializar temas puntuales en Seguridad y Salud en el

Trabajo y generalidades ambientales. Se realizó la inducción, donde participaron los colaboradores y los temas abordados fueron comprendidos por los colaboradores.

5.2 Actividades realizadas en obra

- Corte, figurado y armado de acero.
- Excavación manual y mecánica, relleno y compactación.
- Trabajos con soldadura.
- Ampliación de cerramiento en lámina.
- Cargue y descargue de material.
- Construcción de redes
- Construcción de tanque contraincendios y agua potable
- Construcción de columnas

5.3 Personal en obra

El consorcio cuenta con personal de mano de obra calificado, que según su profesión desempeñan actividades específicas; de igual manera se cuenta con mano de obra calificada que desempeña actividades en su mayoría operativas.

5.4 Retiro de personal

En el periodo comprendido entre el día 11 de febrero al 10 de marzo de 2025 se presentó una (1) novedad de retiro de personal. ***Ver anexo 3.***

NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	CARGO
ISRAEL PEREIRA VILLA	8.867.840	OFICIAL DE OBRA

5.5 Charlas diarias

Durante el periodo comprendido entre el día 11 de febrero al 10 de marzo de 2025 se realizaron charlas de seguridad diarias antes de iniciar labores donde se

abordaron diferentes temas relacionados de acuerdo con las actividades realizadas de seguridad y salud en el trabajo, prevención de accidentes y enfermedades laborales, identificación de peligros y riesgos en la obra, allí se contó con la participación de los colaboradores.
Dichos temas son asociados a los riesgos que implican las labores y definidos a los diferentes aspectos de salud, seguridad industrial, higiene industrial, medio ambiente, así como la consecución de los efectos negativos que implican el incumplimiento de las normas de seguridad en la realización de las diversas actividades. ***Ver anexo 4.***

5.6 Entrega de Dotación y Reposición de Epp

En el periodo comprendido entre el día 11 de febrero al 10 de marzo de 2025 se realizó entrega de dotación y EPP (Elementos de protección personal) al personal que ingresó nuevo a la obra, reposición de EPP al personal antiguo que labora y prestan sus servicios en la obra, esta se hizo de acuerdo con el cargo a desempeñar, de tal manera que en la inspección se encontraron guantes deteriorados, engrasados, gafas de seguridad en mal estado (rayadas), protectores auditivos averiados. ***Ver anexo 5.***

5.7 Inspección de orden y aseo

En el sector de la construcción y en cualquier otra actividad laboral, el mantenimiento de unos niveles aceptables de seguridad se refleja en gran medida por conseguir las condiciones de orden y aseo durante la ejecución de las actividades laborales.

La mayoría de los accidentes producidos en las obras de construcción ocurren por el incumplimiento de la regla básica en cualquier lugar de trabajo. La carencia de orden y aseo, el exceso de confianza y la falta de experiencia son algunos de los factores que provocan los accidentes y que su vez se relacionan con las caídas al mismo y distinto nivel, o golpes, resbalones y choques.

Se realizaron jornadas de orden y aseo, con el fin de mejorar las áreas de trabajo, mejorar el aspecto físico y evitar accidentes laborales en la obra. ***Ver anexo 6.***

5.8 Preoperacionales, herramientas menores, maquinaria y equipos

Las inspecciones preoperacionales se pueden definir como las exploraciones físicas que debe realizar un operador, previa ejecución de funciones con el equipo a fin de identificar fallas físicas existentes o potenciales en el cuerpo de la máquina que puedan derivar en reparaciones, accidentes o tiempo de inactividad inesperado.

Estas se realizan con frecuencia diaria, evidenciándose en el formato único de forma semanal. Para el periodo comprendido entre el día 11 de diciembre al 10 de enero de 2025, se realizaron inspecciones a la maquinaria para llevar a cabo diferentes actividades: la maquinaria usada fue la excavadora, rodillo de compactación, canguro de compactación, pulidora, tronzadora, sierra circular, equipos de soldadura, Motobombas, Taladro, herramientas menores. ***Ver anexo 7.***

5.9 Atención de Emergencias y Desastres, primeros auxilios, inspección de camilla de emergencia, botiquín y extintores.

Se estableció punto de encuentro temporal ubicado en la carrera 1 entre calle 50 y con calle 51 en la entrada principal de la obra, en un lugar seguro en el exterior de la obra, libre de obstáculos, cuerdas eléctricas y caídas de árboles, establecido y delimitado tomando en cuenta las condiciones de riesgo o seguridad existentes en el lugar. Debidamente señalizado para que la población pueda identificarla en una situación de emergencia determinada el cual fue socializado a los trabajadores.

Así mismo se ubicaron los equipos de primeros auxilios en una zona con fácil acceso al momento de llegar a necesitarlos, contando con sus debidos cuidados de almacenamiento para que se conserven en buen estado.

Para la prevención de incendios se tiene un extintor multipropósito de 20 libras de color amarillo se encuentra en la obra para la cualquier eventualidad presentada. Se socializó con los trabajadores, se tiene establecido un punto de acopio para la camilla y el botiquín para realizar traslado de trabajador o la atención primaria en

caso de cualquier eventualidad que se llegue a presentar. De igual manera se realizó inspección al botiquín, extintor, camilla que estuvieran en buen estado y con fecha vigente. ***Ver anexo 8.***

5.10 Pausas activas

Las pausas activas se hacen todos los días durante 5 minutos, espacios de relajación y pausas activas de trabajo con juegos, motivaciones y charlas en los que se les informa de la importancia de la protección personal y el autocuidado. ***Ver anexo 9.***

5.11 Hidratación del Personal

La hidratación es parte de la salud y de las medidas preventivas que se deben tomar al momento de ejecutar actividades laborales, especialmente cuando estas actividades se realizan en zonas abiertas. Una correcta hidratación puede prevenir muchos accidentes laborales y situaciones de bajo rendimiento, así como mejorar la sensación de bienestar de los colaboradores.

El personal cuenta con termos de agua para la hidratación durante el día y se les da espacios durante la jornada para que realicen su debida hidratación.

5.12 Capacitaciones y sensibilizaciones.

Las capacitaciones de formación en seguridad y salud en el trabajo establecen el método más eficaz para concientizar y fomentar una cultura de prevención de riesgos laborales. Estas garantizan la adquisición de conocimientos, el desarrollo de habilidades y la mejora de actitudes, comportamientos fundamentales para garantizar la seguridad en el trabajo, reduciendo el mínimo de incidentes y accidentes laborales.

Se realizaron las siguientes capacitaciones y sensibilizaciones:

- Capacitación: Riesgo y Prevención del Consumo alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas por Asesora Axa Colpatria Odalis Ibarra. ***Ver anexo 10.***

5.13 Incapacidades

Durante el periodo comprendido entre el 11 de febrero al 10 de marzo de 2025 se presentó (1) incapacidad del personal. ***Anexo 11.***

5.14 Análisis de Trabajo Seguro (ATS)

Un análisis de trabajo seguro (ATS) es un proceso sistemático para identificar, evaluar y controlar los riesgos asociados con un trabajo o tarea específica. El objetivo principal de un ATS es prevenir lesiones y enfermedades ocupacionales, y garantizar un entorno de trabajo seguro y saludable.

Procedimiento para realizar un ATS:

1. Seleccionar el trabajo o tarea que se va a analizar.
2. Recopilar información sobre el trabajo o tarea, incluyendo los procedimientos actuales, los equipos y herramientas utilizados, y los riesgos potenciales.
3. Identificar los riesgos potenciales asociados con el trabajo o tarea, incluyendo los riesgos físicos, químicos, biológicos y psicosociales.
4. Evaluar la gravedad y la probabilidad de cada riesgo identificado.
5. Implementar controles para mitigar o eliminar los riesgos identificados, incluyendo la modificación de procedimientos, la provisión de equipo de protección personal, y la capacitación de los trabajadores.
6. Revisar y actualizar el ATS regularmente para asegurarse de que los controles sigan siendo efectivos y que se identifiquen y controlen nuevos riesgos.

   Ver anexo 12.

5.15 Permiso de Trabajo en Alturas

El permiso de trabajo en alturas es un documento necesario para realizar trabajos en alturas que impliquen riesgos para la seguridad de los trabajadores. Este permiso asegura que las condiciones de seguridad sean las adecuadas y que se hayan tomado todas las medidas necesarias para prevenir accidentes.

Un **permiso de trabajo en alturas**, normalmente se deben seguir estos pasos:

1. **Evaluación de riesgos**: Antes de emitir el permiso, se realiza una evaluación de los riesgos asociados con el trabajo en alturas. Esto incluye el análisis de factores como la altura, la estabilidad de las estructuras, las condiciones climáticas, y los equipos de protección personal (EPP).
2. **Plan de trabajo seguro**: El empleador debe asegurarse de que haya un plan que contemple las medidas preventivas y de seguridad a seguir durante el trabajo. Esto puede incluir la utilización de arnés, líneas de vida, redes de seguridad, y otras medidas.
3. **Formación y capacitación**: Los trabajadores deben estar capacitados en el uso de equipos de protección, así como en la ejecución segura del trabajo en alturas.
4. **Verificación de los equipos**: Se debe verificar que los equipos de protección personal, como arneses y cascos, estén en buenas condiciones y sean los adecuados para el tipo de trabajo a realizar.
5. **Autorización**: Una vez que se hayan cumplido todos los requisitos, se otorga el permiso de trabajo en alturas, que debe ser firmado por el responsable de seguridad de la empresa y por los trabajadores involucrados.
6. **Supervisión**: Durante el trabajo, puede haber una supervisión constante para asegurar que se cumplan las medidas de seguridad.

Ver anexo 13.

5.16 Plan de Manejo de Transito (PMT)

El plan de manejo de tránsito (PMT) es un conjunto de estrategias y procedimientos que se implementan para garantizar la seguridad vial, optimizar el flujo de vehículos, y reducir los riesgos en una zona determinada. Este plan es usado en el proyecto en construcción donde se realizan intervenciones que afectan el tránsito regular.

Objetivos del Plan Manejo de Tránsito (PMT):

1. Garantizar la seguridad de los peatones, conductores y trabajadores.
2. Si la obra afecta alguna vía importante, se debe diseñar rutas alternas claras para los usuarios.
3. Incluir la instalación de señales adecuadas para dirigir el tráfico y alertar sobre cambios en la circulación.
4. Uso adecuado de señales de advertencia, información y orientación.
5. Implementación de barreras físicas (si es necesario) para separar las áreas de trabajo del tránsito.
6. Informar a los conductores y peatones sobre los cambios en el tránsito con suficiente antelación.
7. Supervisión de la efectividad del plan durante la ejecución del proyecto.
8. Hacer modificaciones al plan de manejo si se presentan nuevos desafíos o cambios inesperados en el tráfico.

Ver anexo 14.

5.17 Plan Manejo Ambiental (PMA)

Un Plan de Manejo Ambiental (PMA) es un documento técnico y operativo que describe las acciones, medidas y estrategias a seguir para prevenir, mitigar o compensar los impactos ambientales del proyecto. Su propósito es asegurar que las intervenciones humanas se realicen de manera responsable, respetando el entorno natural y promoviendo la sostenibilidad.

Objetivos de un Plan de Manejo Ambiental (PMA):

1. Prevenir y minimizar los impactos ambientales negativos
2. Promover el uso sostenible de los recursos naturales
3. Cumplir con la legislación y normativas ambientales
4. Mitigar los riesgos asociados a la contaminación
5. Monitorear y evaluar los impactos ambientales
6. Fomentar la educación y capacitación ambiental
7. Planificar la restauración de áreas impactadas

Ver anexo 15.

6. SANEAMIENTO BÁSICO

6.1 Punto ecológico

El CONSORCIO RIO GRANDE dispone de un punto ecológico según normatividad legal vigente (Resolución No. 2184 de 2019), con código de colores blanco, negro y verde para la separación de residuos en la fuente, se ha evidenciado que los colaboradores tienen gran compromiso y conciencia en la disposición de los residuos, lo que más se genera en la obra son residuos de plástico.
Los colores son:

Blanco: residuos aprovechables limpios y secos, como plástico, vidrio, metales, papel y cartón.

Negro: residuos no aprovechables como el papel higiénico; servilletas, papeles y cartones contaminados con comida; papeles metalizados, entre otros. En esta bolsa o recipiente también deberán disponerse los residuos COVID-19 como tapabocas, guantes, entre otros.

Verde: residuos orgánicos aprovechables como los restos de comida, residuos de corte de césped y poda de jardín, etc.

Nota: También es importante dejar claro, que los residuos convencionales producidos en el lugar de la obra son recolectados por la EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS PÚBLICOS VEOLIA donde posteriormente realizan la disposición final en sitio autorizado para ese fin.

Se tiene una alianza y nos encontramos en diálogos con una Asociación de recicladores llamada AREYA (Asociación de recicladores Yariguíes), donde tienen como propuesta brindarnos la separación en la fuente, clasificación, manejo y disposición final de los residuos sólidos aprovechables, con su respectivo certificado de residuos, la idea también es realizar capacitaciones y sensibilizaciones con el apoyo de esta asociación y realizar diferentes actividades que sean amigables con el medio ambiente, de tal manera que estamos comprometidos ecológicamente, porque este proyecto fue formulado y debe contar con condiciones bioclimáticas en sus materiales, actividades y demás para el cumplimento de certificación LEED.

6.2 Residuos sólidos aprovechables

La Asociación de recicladores Yariguíes (AREYA) nos socializó la propuesta de sensibilización, recolección y transporte de materiales aprovechables.
ASOCIACIÓN DE RECICLADORES YARIGUÍES - AREYA E.S.P identificada con el NIT: 901204510-1. Se realizaron jornadas de orden y aseo, se clasificaron los residuos sólidos y se tiene el convenio (AREYA) se les entregaron los residuos sólidos de aluminio, chatarra, archivo, cartón, pasta, PET, plástico, vidrio, plegadiza, por lo tanto, AREYA es la encargada de brindarle el manejo adecuado, clasificación

y disposición final de dichos residuos sólidos, esta asociación certifica haber realizado la recepción de residuos sólidos aprovechables en forma definitiva, por parte de CONSORCIO RIO GRANDE, identificado con el NIT 901668549-7.

6.3 INDICADORES DE SST – Res 0312/2019

NOMBRE DEL INDICADOR	MIDE	FORMULA	INTERPRETACIÓN	CONCLUSIÓN
Frecuencia de accidentalidad	(Número de veces que ocurre un accidente de trabajo en el mes	(Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100	(0 accidentes de trabajo en el periodo del mes de 11 de febrero al 10 de marzo / 25 trabajadores en el mes) *100 = 0	En el periodo del mes 11 de febrero al 10 de marzo / 25 no se presentó accidente laboral

A continuación, se puede apreciar la frecuencia de accidentalidad, severidad por accidentalidad y ausentismo por causa médica.

Severidad de accidentalidad	Número de días perdidos por accidentes de trabajo en el mes.	(Número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes + número de días cargados en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100	(0 días de incapacidad en el mes 11 de febrero al 10 de marzo / 25 trabajadores en el mes) * 100 = 0	En el periodo de 11 de febrero al 10 de marzo no se presentaron incapacidades por accidentes laborales

Fuente: *Elaboración propia, 2024*

Ausentismo por causa médica	Ausentismo es la no asistencia al trabajo, con incapacidad médica	(Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el periodo 11 de febrero al 10 de marzo / Número de días de trabajo programados en el mes) * 100	(0 días de incapacidad en el periodo 11 de febrero al 10 de marzo / 30 días programados en el mes) * 100 = 0	En el periodo de 11 de febrero al 10 de marzo se perdieron 0 días por incapacidad médica.

7. SEÑALIZACIÒN

La señalización es una de las herramientas de prevención que complementa las estrategias de promoción para la salud y la seguridad en los lugares de trabajo. Estas permiten identificar los peligros y disminuir los riesgos que resultan peligrosos por el solo hecho de ser desconocidos. En el periodo reportado se utilizó señalización para el cerramiento de las vías que se iban a intervenir, como son las barreras, cintas de peligro, conos reflectivos, esto con el fin de evitar situaciones adversas en la obra, material de acero que ingresaba a la obra, áreas de maquinaria en movimiento, áreas de excavación, baños, equipo de emergencia debidamente señalizadas.

8. CONCLUSIONES

Se concluye que el cuidado personal de todas las personas pertenecientes al **CONSORCIO RÍO GRANDE** es prioridad en dicha obra antes mencionado, de tal manera que el equipo de trabajadores ha sido responsable en cuanto a las medidas de prevención, uso adecuado de EPP disminuyendo riesgos, accidentes y condiciones inseguras, lo cual ha favorecido la ejecución en cuanto a calidad de la obra. Se logró evidenciar que las charlas diarias abordadas, permiten sensibilizar al trabajador y hace que este cumpla a cabalidad con sus responsabilidades laborales.

Para el mes comprendido entre 11 de febrero al 10 de marzo no se presentó ningún accidente laboral, sin embrago las actividades programadas en el calendario se abordaron sin novedad.

REGISTRO FOTOGRAFICO MES DE FEBRERO

ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA

Armado, encofrado y fundida de tanque contraincendios y agua potable










Relleno y compactación con material seleccionado para acondicionamiento de área de placa entre piso



Proceso de pulido de formaletas para encofrado

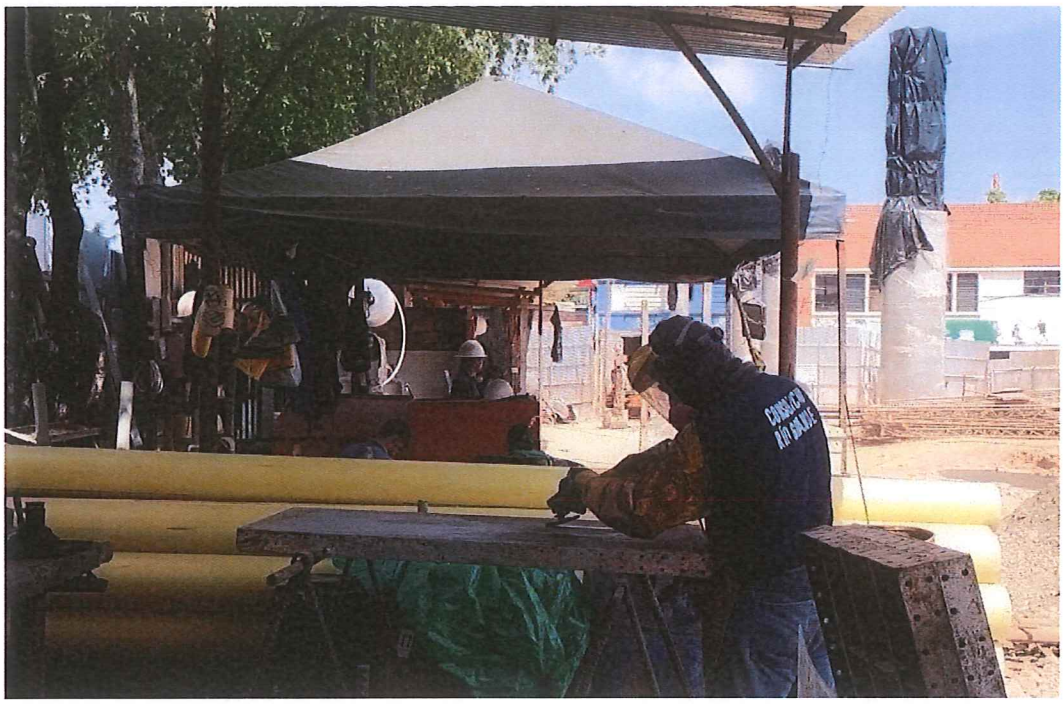


CHARLAS DE SEGURIDAD DIARIAS





ENTREGA DE DOTACIÓN Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÒN PERSONAL

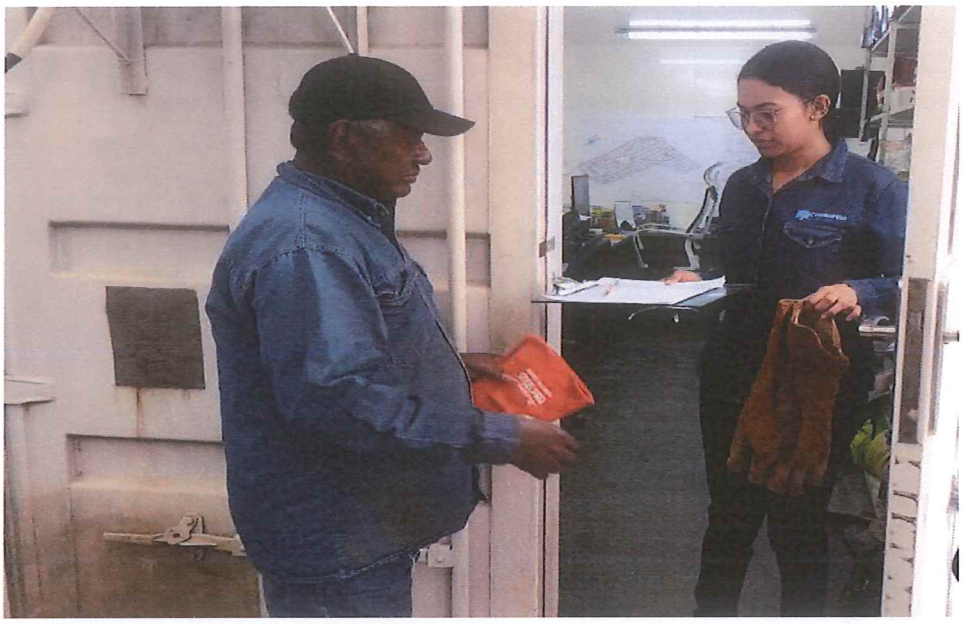



INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO





ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

Kit de Emergencia: (Botiquín, Camilla rígida, extintor multipropósito de 20 libras)







PAUSAS ACTIVAS

Pausas activas en la obra






SEÑALIZACIÓN





INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE EQUIPOS




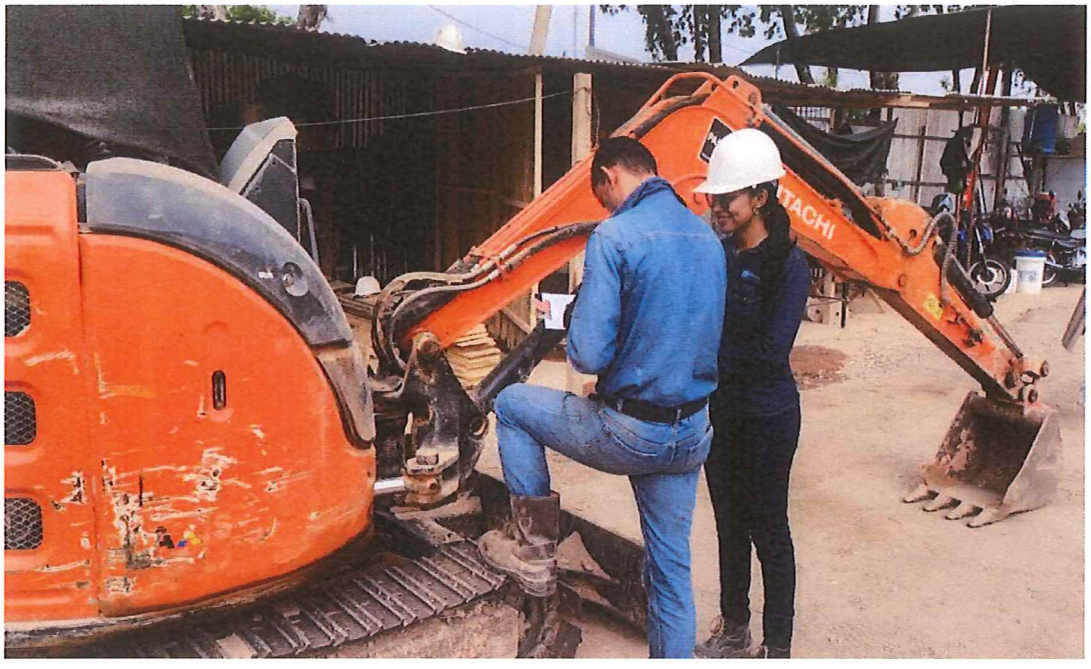

PUNTO DE HIDRATACIÓN



PUNTO ECOLOGICO

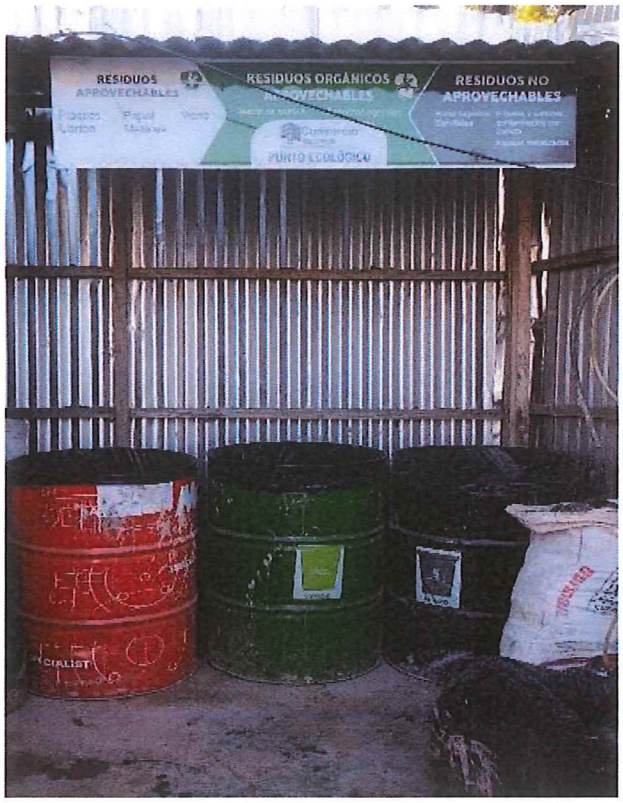

CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACIONES

Capacitación sobre Riesgo y Prevención del Consumo alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas por Asesora Axa Colpatria





ANEXO 1.
PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEBRERO

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901668549	7	CONSORCIO RIO GRANDE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CSC RIO GRANDE	Carrera 19 No. 55-59 Barrio Uribe Uribe	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6555500	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1261226353	9481353911	E	2025/02/12	2025/02/12	BANCO DE OCCIDENTE	0	$5,742,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CSC RIO GRANDE (11 Afiliados)																							$18,540,168	$2,966,600			$18,540,168	$741,800			$18,565,862	$742,900			$18,540,168		$1,290,700		$0	$0		$5,742,000
Centro de Trabajo: EQ MIN V (11 Afiliados)																							$18,540,168	$2,966,600			$18,540,168	$741,800			$18,565,862	$742,900			$18,540,168		$1,290,700		$0	$0		$5,742,000
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (11 Afiliados)																							$18,540,168	$2,966,600			$18,540,168	$741,800			$18,565,862	$742,900			$18,540,168		$1,290,700		$0	$0		$5,742,000
1	CC	1052967294	CASTRO TULIO	X	X															X	23030 1	1	$133,334	$21,400	EPS037	1	$133,334	$5,400	CCF40	1	$138,890	$5,600	14-4	1	$133,334	6.960%	$9,300	1	$0	$0	SI	$41,700
2	CC	9102427	CORREA FRANCISCO																		23100 1	30	$5,000,000	$800,000	EPS005	30	$5,000,000	$200,000	CCF40	30	$5,000,000	$200,000	14-4	30	$5,000,000	6.960%	$348,000	30	$0	$0	SI	$1,548,000
3	CC	74180122	GARCIA GUILLERMO	X	X															X	23020 1	1	$166,667	$26,700	EPS005	1	$166,667	$6,700	CCF40	1	$173,611	$7,000	14-4	1	$166,667	6.960%	$11,700	1	$0	$0	SI	$52,100
4	CC	13923929	GOMEZ JORGE																		23030 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF40	30	$1,500,000	$60,000	14-4	30	$1,500,000	6.960%	$104,400	30	$0	$0	SI	$464,400
5	CC	73167554	HERRERA JAVIER							X											23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF40	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
6	CC	1098605107	LOPEZ IVONNE	X	X															X	23100 1	1	$50,000	$8,000	EPS002	1	$50,000	$2,000	CCF40	1	$52,083	$2,100	14-4	1	$50,000	6.960%	$3,500	1	$0	$0	SI	$15,600
7	CC	12647521	MAESTRE ERIS																		23030 1	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF40	30	$2,500,000	$100,000	14-4	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	SI	$774,000
8	CC	77091383	MEJIA LUIS																		23020 1	30	$5,000,000	$800,000	EPS037	30	$5,000,000	$200,000	CCF40	30	$5,000,000	$200,000	14-4	30	$5,000,000	6.960%	$348,000	30	$0	$0	SI	$1,548,000
9	CC	1096244499	SALOM JHAN	X	X															X	23020 1	1	$100,000	$16,000	EPS041	1	$100,000	$4,000	CCF40	1	$104,167	$4,200	14-4	1	$100,000	6.960%	$7,000	1	$0	$0	SI	$31,200
10	CC	91496077	SILVA EDWING	X	X															X	23020 1	1	$166,667	$26,700	EPS005	1	$166,667	$6,700	CCF40	1	$173,611	$7,000	14-4	1	$166,667	6.960%	$11,700	1	$0	$0	SI	$52,100
11	CC	1121936429	VELASCO MAYRA																		23030 1	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF40	30	$2,500,000	$100,000	14-4	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	SI	$774,000
Total			**Afiliados(11)**																				$18,540,168	$2,966,600			$18,540,168	$741,800			$18,565,862	$742,900			$18,540,168		$1,290,700		$0	$0		$5,742,000

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901668549	7	CONSORCIO RIO GRANDE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CSC RIO GRANDE	Carrera 19 No. 55-59 Barrio Uribe Uribe	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6555500	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1261226353	9481353911	E	2025/02/12	2025/02/12	BANCO DE OCCIDENTE	0	$5,742,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				11	$2,966,600	$0	$0	$2,966,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$808,000	$0	$0	$808,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,061,400	$0	$0	$1,061,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,097,200	$0	$0	$1,097,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$1,290,700	$0	$0	$1,290,700
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	11	$1,290,700	$0	$0	$1,290,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$742,900	$0	$0	$742,900
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	11	$742,900	$0	$0	$742,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				11	$741,800	$0	$0	$741,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$305,400	$0	$0	$305,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$4,000	$0	$0	$4,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$59,000	$0	$0	$59,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$373,400	$0	$0	$373,400
TOTAL				11	$5,742,000	$0	$0	$5,742,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901668549	7	CONSORCIO RIO GRANDE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CSC RIO GRANDE	Carrera 19 No. 55-59 Barrio Uribe Uribe	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6555500	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1261214727	9481352471	E	2025/02/12	2025/02/12	BANCO DE OCCIDENTE	0	$13,757,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CSC RIO GRANDE (26 Afiliados)																					$44,506,405	$7,122,000			$44,506,405	$1,779,300			$44,628,813	$1,784,200			$44,506,405		$3,072,400		$0	$0		$13,757,900

Planilla Resumen

aportes en línea

Centro de Trabajo: OPE V (26 Afiliados)																							$44,506,405	$7,122,000			$44,506,405	$1,779,300			$44,628,813	$1,784,200			$44,506,405		$3,072,400		$0	$0		$13,757,900
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (26 Afiliados)																							$44,506,405	$7,122,000			$44,506,405	$1,779,300			$44,628,813	$1,784,200			$44,506,405		$3,072,400		$0	$0		$13,757,900
1	CC	1102884306	ALTAMIRANDA ANGIE							X											25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF40	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
2	CC	1096204542	AVENDAÑO ERBINSON							X											230301	30	$1,751,000	$280,200	EPS037	30	$1,751,000	$70,100	CCF40	30	$1,751,000	$70,100	14-4	30	$1,751,000	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
3	CC	1096253522	AVENDAÑO VICTOR							X											230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF40	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
4	CC	92033972	CUELLO ARGEMIRO							X		X									230201	30	$1,809,761	$289,600	EPS005	30	$1,809,761	$72,400	CCF40	30	$1,809,761	$72,400	14-4	30	$1,809,761	6.960%	$126,000	30	$0	$0	Si	$560,400
5	CC	1096187294	DALLOS PABLO							X		X									25-14	30	$1,458,314	$233,400	EPS037	30	$1,458,314	$58,400	CCF40	30	$1,458,314	$58,400	14-4	30	$1,458,314	6.960%	$101,500	30	$0	$0	Si	$451,700
6	CC	7368547	GUZMAN ARISTIDES																		230301	30	$4,000,000	$640,000	EPS037	30	$4,000,000	$160,000	CCF40	30	$4,000,000	$160,000	14-4	30	$4,000,000	6.960%	$278,400	30	$0	$0	Si	$1,238,400
7	CC	91432683	HERNANDEZ RODOLFO										X								230901	1	$47,450	$7,600	ESSC24	1	$47,450	$0	CCF40	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$7,600
8	CC	91432683	HERNANDEZ RODOLFO		X					X		X								X	230901	29	$1,399,259	$223,900	ESSC24	29	$1,399,259	$56,000	CCF40	29	$1,853,817	$74,200	14-4	29	$1,399,259	6.960%	$97,400	29	$0	$0	Si	$451,500
9	CC	1005182950	HERRERA ANDRES							X		X									230201	30	$1,446,709	$231,500	EPS037	30	$1,446,709	$57,900	CCF40	30	$1,446,709	$57,900	14-4	30	$1,446,709	6.960%	$100,700	30	$0	$0	Si	$448,000
10	CC	1042213191	HINCAPIE EVERDE							X		X									230201	30	$1,809,761	$289,600	EPS037	30	$1,809,761	$72,400	CCF40	30	$1,809,761	$72,400	14-4	30	$1,809,761	6.960%	$126,000	30	$0	$0	Si	$560,400
11	CC	1096193530	LARGO MAYCOL							X											230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF40	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
12	CC	91429377	LEAL ELKIN							X		X									230301	30	$1,454,446	$232,800	EPS037	30	$1,454,446	$58,200	CCF40	30	$1,454,446	$58,200	14-4	30	$1,454,446	6.960%	$101,300	30	$0	$0	Si	$450,500
13	CC	1096215262	LOPEZ KENNETH											X							230301	2	$94,900	$15,200	EPS005	2	$94,900	$3,800	CCF40	0	$0	$0	14-4	2	$94,900	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$19,000
14	CC	1096215262	LOPEZ KENNETH							X		X									230301	28	$1,375,018	$220,100	EPS005	28	$1,375,018	$55,100	CCF40	28	$1,375,018	$55,100	14-4	28	$1,375,018	6.960%	$95,800	28	$0	$0	Si	$426,100
15	CC	1096243416	MARTINEZ JESUS							X		X									230301	30	$1,466,050	$234,600	EPS037	30	$1,466,050	$58,700	CCF40	30	$1,466,050	$58,700	14-4	30	$1,466,050	6.960%	$102,100	30	$0	$0	Si	$454,100
16	CC	3842012	MEDINA JOSE							X											25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF40	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
17	CC	1096193299	MENDEZ CRISTIAN							X		X									25-14	30	$1,466,050	$234,600	EPS041	30	$1,466,050	$58,700	CCF40	30	$1,466,050	$58,700	14-4	30	$1,466,050	6.960%	$102,100	30	$0	$0	Si	$454,100
18	CC	1094244801	MEZA PABLO																		230301	30	$4,000,000	$640,000	EPS037	30	$4,000,000	$160,000	CCF40	30	$4,000,000	$160,000	14-4	30	$4,000,000	6.960%	$278,400	30	$0	$0	Si	$1,238,400
19	CC	1096242036	MORA JOSE							X											230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$57,000	CCF40	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
20	CC	1085045933	MORALES WILFRIDO							X		X									230301	30	$1,804,864	$288,800	EPS037	30	$1,804,864	$72,200	CCF40	30	$1,804,864	$72,200	14-4	30	$1,804,864	6.960%	$125,700	30	$0	$0	Si	$558,900
21	CC	13571355	NOVOA MARVIN							X		X									230301	30	$1,469,918	$235,200	EPS017	30	$1,469,918	$58,800	CCF40	30	$1,469,918	$58,800	14-4	30	$1,469,918	6.960%	$102,400	30	$0	$0	Si	$455,200
22	CC	1005178116	OSORNO MIGUEL																X		230301	5	$237,250	$38,000	EPS041	5	$237,250	$9,500	CCF40	0	$0	$0	14-4	5	$237,250	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$47,500
23	CC	1005178116	OSORNO MIGUEL							X		X									230301	25	$1,217,196	$194,800	EPS041	25	$1,217,196	$48,700	CCF40	25	$1,217,196	$48,700	14-4	25	$1,217,196	6.960%	$84,800	25	$0	$0	Si	$377,000
24	CC	8867840	PEREIRA ISRAEL							X		X									25-14	30	$1,804,864	$288,800	ESSC24	30	$1,804,864	$72,200	CCF40	30	$1,804,864	$72,200	14-4	30	$1,804,864	6.960%	$125,700	30	$0	$0	Si	$558,900
25	CC	8854026	RIOS EDUARDO							X											230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS048	30	$1,423,500	$57,000	CCF40	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
26	CC	1039691755	RODAS JUAN							X		X									230301	30	$1,469,918	$235,200	EPS002	30	$1,469,918	$58,800	CCF40	30	$1,469,918	$58,800	14-4	30	$1,469,918	6.960%	$102,400	30	$0	$0	Si	$455,200
27	CC	1102580681	RUZ JESUS							X		X									230301	30	$1,469,918	$235,200	EPS037	30	$1,469,918	$58,800	CCF40	30	$1,469,918	$58,800	14-4	30	$1,469,918	6.960%	$102,400	30	$0	$0	Si	$455,200
28	CC	91442822	TRECO JUAN							X		X									230301	30	$1,446,709	$231,500	EPS002	30	$1,446,709	$57,900	CCF40	30	$1,446,709	$57,900	14-4	30	$1,446,709	6.960%	$100,700	30	$0	$0	Si	$448,000
29	CC	13851292	VILORIA WILLINTON							X		X									230301	30	$1,466,050	$234,600	ESSC24	30	$1,466,050	$58,700	CCF40	30	$1,466,050	$58,700	14-4	30	$1,466,050	6.960%	$102,100	30	$0	$0	Si	$454,100
Total	**Afiliados(26)**																						$44,506,405	$7,122,000			$44,506,405	$1,779,300			$44,628,813	$1,784,200			$44,506,405		$3,072,400		$0	$0		$13,757,900

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901668549	7	CONSORCIO RIO GRANDE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CSC RIO GRANDE	Carrera 19 No. 55-59 Barrio Uribe Uribe	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6555500	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1261214727	9481352471	E	2025/02/12	2025/02/12	BANCO DE OCCIDENTE	0	$13,757,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				26	$7,122,000	$0	$0	$7,122,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,212,400	$0	$0	$1,212,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	16	$4,639,600	$0	$0	$4,639,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$1,038,500	$0	$0	$1,038,500
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$231,500	$0	$0	$231,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				26	$3,072,400	$0	$0	$3,072,400
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	26	$3,072,400	$0	$0	$3,072,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				26	$1,784,200	$0	$0	$1,784,200
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	26	$1,784,200	$0	$0	$1,784,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				26	$1,779,300	$0	$0	$1,779,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	$243,900	$0	$0	$243,900
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$57,000	$0	$0	$57,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$115,800	$0	$0	$115,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	10	$826,700	$0	$0	$826,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	$230,900	$0	$0	$230,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$116,700	$0	$0	$116,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$188,300	$0	$0	$188,300
TOTAL				26	$13,757,900	$0	$0	$13,757,900

ANEXO 2.
PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL SUBCONTRATISTAS MES DE FEBRERO

aportes en línea

Comprobante Liquidacion

Datos Generales Del Aportante

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electronico	Ciudad-Departamento	Celular
CC 13889325		CORDERO CAMPO DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	gestionar.seguros2018@hotmail.com	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	3203186533

Clave: 9481595859

Pague hasta	Dias de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2025/03/06	0	$0	$277,100
2025/03/07	0	$0	$277,100

Periodo Pensión: 2025-02 **Periodo Salud: 2025-02**

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
ARL	1	1	$99,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		1	$99,100
EPS	1	1	$178,000
NUEVA E.P.S.		1	$178,000
SUBTOTAL			$277,100
COMISION OPERADOR			$0
IVA			$0
TOTAL			$277,100

Canales de Pago

BANCARIOS

Banco AV Villas

Banco de Occidente

Banco de Bogotá

NO BANCARIOS

Efecty éxito SURTIMAX Carulla

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

Powered by CamScanner

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 13889325		CORDERO CAMPO DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 76 a 22 02	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6019325	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-02		9481595859	I	2025/03/07			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tab vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$0	$0			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$277,100
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$0	$0			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$277,100
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)						$0	$0			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$277,100
1	CC	13889325	CORDERO DAVID		0	$0	$0	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	0	$0	$0	No	$277,100
Total Afiliados(1)						$0	$0			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$277,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 13889325		CORDERO CAMPO DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 76 a 22 02	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6019325	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-02		9481595859	I	2025/03/07			0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$99,100	$0	$0	$99,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$99,100	$0	$0	$99,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$277,100	$0	$0	$277,100

Powered by CamScanner

aportes en línea

Comprobante Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electronico	Ciudad-Departamento	Celular
CC 1096221263		SILVA MADARIAGA JOSE RAMON	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	gestionar.seguros2018@hotmail.com	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	3229299850

Clave: 9483024599

Pague hasta	Dias de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2025/03/13	0	$0	$504,900
2025/03/14	0	$0	$504,900
2025/03/17	3	$1,100	$506,000
2025/03/18	4	$1,400	$506,300
2025/03/19	5	$1,800	$506,700
2025/03/20	6	$2,000	$506,900
2025/03/21	7	$2,300	$507,200
2025/03/25	11	$3,600	$508,500
2025/03/26	12	$4,000	$508,900
2025/03/27	13	$4,300	$509,200

Periodo Pensión: 2025-02 **Periodo Salud: 2025-02**

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
AFP	1	1	$227,800
PORVENIR		1	$227,800
ARL	1	1	$99,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		1	$99,100
EPS	1	1	$178,000
NUEVA EPS MOVILIDAD		1	$178,000
SUBTOTAL			$504,900
COMISION OPERADOR			$0
IVA			$0
TOTAL			$504,900

Canales de Pago

BANCARIOS

Banco AV Villas · Banco de Occidente · Banco de Bogotá

NO BANCARIOS

Sefecty · éxito · SURTIMAX · Carulla

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1096221263		SILVA MADARIAGA JOSE RAMON	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	call 50 casa 160	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6021584	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-02		9483024599	I	2025/03/14			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$504,900
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$504,900
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$504,900
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																			23030	30		$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	0	$0	$0	No	$504,900
1	CC	1096221263	SILVA JOSE																1			$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$504,900
Total	**Afiliados(1)**																																								

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1096221263		SILVA MADARIAGA JOSE RAMON	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	call 50 casa 160	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6021584	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-02		9483024599	I	2025/03/14			0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$99,100	$0	$0	$99,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$99,100	$0	$0	$99,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$504,900	$0	$0	$504,900

aportes en línea

Comprobante Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
CC 13886837		MARULANDA JARAMILLO JESUS ANTONIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	GESTIONAR.SEGUROS2018@HOTMAIL.COM	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	3107916968

Clave: 9477153984

Pague hasta	Dias de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2024/12/09	0	$0	$253,000
2024/12/10	0	$0	$253,000

Periodo Pensión: 2024-11 **Periodo Salud: 2024-11**

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
ARL	1	1	$90,500
ARL SURA		1	$90,500
EPS	1	1	$162,500
NUEVA E.P.S.		1	$162,500
SUBTOTAL			$253,000
COMISION OPERADOR			$0
IVA			$0
TOTAL			$253,000

Canales de Pago

BANCARIOS

Banco AV Villas

Banco de Occidente

Banco de Bogotá

NO BANCARIOS

efecty éxito SURTIMAX Carulla

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

Powered by CamScanner

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 13886837		MARULANDA JARAMILLO JESUS ANTONIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	TRV 50 59 56 BOSTON	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6002158	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11		9477153984	I	2024/12/10			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	rec	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$0	$0			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$90,500		$0	$0		$253,000
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$0	$0			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$90,500		$0	$0		$253,000
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																					$0	$0			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$90,500		$0	$0		$253,000
1	CC	13886837	MARULANDA JESUS																	0	$0	$0	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	0	$0	$0	Na	$253,000
Total Afiliados(1)																					$0	$0			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$90,500		$0	$0		$253,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 13886837		MARULANDA JARAMILLO JESUS ANTONIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	TRV 50 59 56 BOSTON	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6002158	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11		9477153984	I	2024/12/10			0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$90,500	$0	$0	$90,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$90,500	$0	$0	$90,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$253,000	$0	$0	$253,000

Powered by CamScanner

ANEXO 3.
RETIRO DE PERSONAL

RENUNCIA LABORAL VOLUNTARIA

Barrancabermeja, 15 de febrero de 2025

Señores

Consorcio Rio Grande

Por intermedio de la presente les comunico a ustedes, mi renuncia voluntaria al cargo de oficial de obra que ejercía en la empresa.

Agradezco las oportunidades ofrecidas durante el tiempo laborado por motivos personales tomo la decisión.

Atentamente,

Israel Pereira Villa

CC: 8.867.840

ANEXO 4.
CHARLAS DIARIAS

Consorcio Río Grande	CÓDIGO DEL REGISTRO	TITULO DEL REGISTRO	Revisión: 2
	PA-R-01	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha: 01/30/2016
			Página: 1 de 1

TIPO DE REUNIÓN		FECHA		HORA			
CAPACITACIÓN	X	DÍA	12	DESDE:	7:00	a.m	p.m
SENSIBILIZACIÓN		MES	Febrero	HASTA:	7:45	a.m	p.m
ENTRENAMIENTO		AÑO	2025				
MOTIVACIÓN							
CHARLA HSE							
INDUCCIÓN							
DIVULGACIÓN							
APROBACIÓN							

DIRIGIDO A: Personal Operativo de la obra

TITULO O NOMBRE DE LA REUNIÓN: Riesgo y Prevención del consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas.

OBJETIVO: Promover la salud y el bienestar de los individuos, especialmente en el ámbito laboral mediante la reducción de los riesgos asociados con el uso de estas sustancias.

ASISTENTES

ITEM	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	MANUEL POLO	AYUDANTE	
2	Williston Villarga	Aux.	Williston Villarga
3	Andres Herrera Fonseca	Ay.	
4	[illegible]	Of.	
5	[illegible]	Of.	
6	[illegible]	AYUDANTE	
7	Cristian Mendoza Albiñana	Ayudante	
8	JUAN DAVID RODAS	AYUDANTE	JUAN RODAS
9	Jesus [illegible]	Aux.	Jesus [illegible]
10	Juan Carlos Tuco M	Aux. C	Juan Carlos
11	Elkin Lea	Ay.	
12	Jesus Coronado	Soldador	
13	Miguel A Osorno	AYUDANTE	Miguel
14	Wilfredo Moreno	Of.	
15	[illegible]	AYUDANTE	
16	Pablo Dallos M.	Ayudante	
17	Jose L Medina M.	Conductor	
18			
19			
20			

CONCLUSIONES

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA EVALUACIÓN:

FIRMA DEL INSTRUCTOR

FIRMA INTERVENTORIA

Consorcio Río Grande	CÓDIGO DEL REGISTRO	TITULO DEL REGISTRO	Revisión: 2
	PA-R-01	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha: 01/30/2016
			Página: 1 de 1

TIPO DE REUNIÓN		FECHA		HORA			
CAPACITACIÓN		DÍA	13	DESDE:	7:00	a.m	p.m
SENSIBILIZACIÓN		MES	Febrero	HASTA:	7:10	a.m	p.m
ENTRENAMIENTO		AÑO	2025				
MOTIVACIÓN							
CHARLA HSE	X						
INDUCCIÓN							
DIVULGACIÓN							
APROBACIÓN							

DIRIGIDO A: Personal Operativo de obra.

TITULO O NOMBRE DE LA REUNIÓN: Empatía laboral.

OBJETIVO: Crear un ambiente de trabajo positivo y colaborativo, donde los trabajadores se comprendan y apoyen mutuamente, mejorando las relaciones interpersonales y contribuye a un clima organizacional saludable.

ASISTENTES

ITEM	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	MIGUEL OSORNO	AYUDANTE	Miguel
2	[illegible]	OFICIAL	
3	Jesus M	AYUDANTE	Jesus M
4	Williston Viloria	AYUDANTE	WILLISTON VILORIA
5	Harvey Ramon A	OP. RETRO	FIRMA
6	Cristian Mendez Alvarado	Ayudante	
7	Juan carlos Preco	AYUDANTE T.C	Juan Preco
8	JUAN DAVID RODAS	AYUDANTE	JUAN RODAS
9	PABLO [illegible]	AYUDANTE	
10	[illegible]	OF.	
11	[illegible]	Soldador	
12	[illegible]	OF.	
13	[illegible]	AYUDANTE	
14	[illegible]		
15	KENNETH C. LOPEZ R.	AYUDANTE	
16	Jose L Medina M	CONDUCTOR	
17			
18			
19			
20			

CONCLUSIONES

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA EVALUACIÓN:

FIRMA DEL INSTRUCTOR

FIRMA INTERVENTORIA

Consorcio Río Grande	CÓDIGO DEL REGISTRO	TITULO DEL REGISTRO	Revisión: 2
	PA-R-01	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha: 01/30/2016
			Página: 1 de 1

TIPO DE REUNIÓN		FECHA		HORA			
CAPACITACIÓN		DÍA	15	DESDE:	7:00	a.m	p.m
SENSIBILIZACIÓN		MES	Febrero	HASTA:	7:10	a.m	p.m
ENTRENAMIENTO		AÑO	2025				
MOTIVACIÓN							
CHARLA HSE	X						
INDUCCIÓN							
DIVULGACIÓN							
APROBACIÓN							

DIRIGIDO A: Personal Operativo de la obra.

TITULO O NOMBRE DE LA REUNIÓN: Dinamica cuidado de Manos.

OBJETIVO: Sensibilizar y promover hábitos de higiene y protección para mantener las manos Saludables, previniendo riesgos y mejorando el bienestar de los trabajadores.

ASISTENTES

ITEM	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Administrador	GF	
2	KENNETH S. LOPEZ N.	AYUDANTE	
3	MIGUEL A OSORIO	AYUDANTE	
4	Edwin Leal	A.y	
5	Andres Herrera Fonseca	Ay	
6	Jesus Ruz	Ay.	
7	Cristian Mendez Alvarado	Ayudante	
8	Jesus Alberto Martinez Carrillo	Ayudante	
9	PABLO JAIME R	AYUDANTE	
10	Wilfredo Morales G.	Of.	
11	Anderson salazar	Ayudante	
12	MANUEL DAVIS	AYUDANTE	
13	Jesus [illegible]	Soldador	
14	William [illegible]	Ay.	
15	David [illegible]	Soldador	
16	JUAN DAVID Rodas	AYUDANTE	JUAN Rodas
17	Jose L Medina M.	Conductor	
18			
19			
20			

CONCLUSIONES

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA EVALUACIÓN:

FIRMA DEL INSTRUCTOR

FIRMA INTERVENTORIA

Consorcio Río Grande	CÓDIGO DEL REGISTRO	TITULO DEL REGISTRO	Revisión: 2
	PA-R-01	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha: 01/30/2016
			Página: 1 de 1

TIPO DE REUNIÓN		FECHA		HORA			
CAPACITACIÓN		DÍA	17	DESDE:	7:00	a.m	p.m
SENSIBILIZACIÓN		MES	Febrero	HASTA:	7:10	a.m	p.m
ENTRENAMIENTO		AÑO	2025				
MOTIVACIÓN							
CHARLA HSE	X						
INDUCCIÓN							
DIVULGACIÓN							
APROBACIÓN							

DIRIGIDO A: Personal operativo de la obra.

TITULO O NOMBRE DE LA REUNIÓN: Uso y obligación de los EPP.

OBJETIVO: Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores al minimizar los riesgos a los que están expuestos en su entorno laboral.

ASISTENTES

ITEM	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	KENNETH G. LOPEZ R.	AYUDANTE	
2	Cristian Mendez Alvarado	Ayudante	
3	DAVID CORDERO C	Soldador	
4	Elkin Leal	A.y	
5	Jesus Coronado	Soldador E-11	
6	Jhon DAVID RODAS	AYUDANTE	Jhon Rodas
7	Anderson Salazar	Ayudante	Anderson Salazar
8	Jesus Ruiz	A.y.	
9	Andres Herrera fonseca	A.y	
10	Juan carlos Ureña	A.y. T.C	
11	MIGUEL A OSORIO	AYUDANTE	MIGUEL
12	Wilfredo Moreno	Of.	
13	PABLO BALLESTA	AYUDANTE	
14	Williton Viloria	AYt.	Williton Viloria
15	Jesus Alberto Martinez Campos	AY	
16	FERNANDO CASTILLO	OFICIAL	
17	JUAN DOMINGUEZ	AYUDANTE	
18	Jose L. Medina M	Conductor	
19			
20			

CONCLUSIONES

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA EVALUACIÓN:

FIRMA DEL INSTRUCTOR

FIRMA INTERVENTORIA

Consorcio Río Grande	CÓDIGO DEL REGISTRO	TITULO DEL REGISTRO	Revisión: 2
	PA-R-01	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha: 01/30/2016
			Página: 1 de 1

TIPO DE REUNIÓN		FECHA		HORA			
CAPACITACIÓN		DÍA	18	DESDE:	7:00	a.m	p.m
SENSIBILIZACIÓN		MES	Febrero	HASTA:	7:10	a.m	p.m
ENTRENAMIENTO		AÑO	2025				
MOTIVACIÓN							
CHARLA HSE							
INDUCCIÓN	X						
DIVULGACIÓN							
APROBACIÓN							

DIRIGIDO A: Personal operativo nuevo de la obra.

TITULO O NOMBRE DE LA REUNIÓN: Inducción a personal operativo nuevo. SST

OBJETIVO: Divulgación de política, objetivos, control de peligros, Trabajos en alturas del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

ASISTENTES

ITEM	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Cristian Coley	AY	Cristian Coley
2	Carlos Amaro NOVOA Lambis	Ayudante	Carlos A. Novoa Lambis
3	Geiner Morales Herrera	Oficial	
4	FREDDY ALFONSO ROJETT NAVARRETE	Ayudante	
5	Juan Sebastian Saavedra Vanegas	Ayudante	Juan Sebastian Saavedra
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

CONCLUSIONES

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA EVALUACIÓN:

FIRMA DEL INSTRUCTOR

FIRMA INTERVENTORIA

Consorcio Río Grande	CÓDIGO DEL REGISTRO	TITULO DEL REGISTRO	Revisión: 2
	PA-R-01	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha: 01/30/2016
			Página: 1 de 1

TIPO DE REUNIÓN		FECHA		HORA			
CAPACITACIÓN		DÍA	18	DESDE:	7:00	a.m	p.m
SENSIBILIZACIÓN		MES	Febrero	HASTA:	9:10	a.m	p.m
ENTRENAMIENTO		AÑO	2025				
MOTIVACIÓN							
CHARLA HSE	X						
INDUCCIÓN							
DIVULGACIÓN							
APROBACIÓN							

DIRIGIDO A: Personal Operativo de la obra.

TITULO O NOMBRE DE LA REUNIÓN: Presentación y divulgación del personal nuevo y sus funciones.

OBJETIVO: Proporcionar una introducción clara y estructurada a la empresa, su cultura, sus políticas o procedimientos.

ASISTENTES

ITEM	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Yanuin Pinto	Ayudante	
2	Jose Pelaez	Soldador	
3	Jesus Maestranda	Soldador	
4	Yuan Carlos Freo	AZ Tec	
5	Willinton Vilorio	AZ +	
6	Jesus Alberto Martinez Carpio	Ayudante	
7	David Cabrera C	Soldador	
8	Jesus Paz	A.T.	
9	Cristian Mateo Alvarado	Ayudante	
10	Juan Rodas	Ayudante	Juan Rodas
11	Pablo Pinto R	Ayudante	
12	Kenneth D. Lopez D.	Ayudante	
13	Miguel A. Osorno	Ayudante	
14	Elkin Leal	A.y	
15	Andres Herrera Fonseca	A.y	
16	Wilfredo Montes	Soldador	
17	Jose C. Medina M	Soldador	
18	Wilfredo Montes	op	
19			
20			

CONCLUSIONES

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA EVALUACIÓN:

FIRMA DEL INSTRUCTOR

FIRMA INTERVENTORIA

Consorcio Río Grande	CÓDIGO DEL REGISTRO	TITULO DEL REGISTRO	Revisión: 2
	PA-R-01	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha: 01/30/2016
			Página: 1 de 1

TIPO DE REUNIÓN		FECHA		HORA			
CAPACITACIÓN		DÍA	20	DESDE:	7:00	a.m	p.m
SENSIBILIZACIÓN		MES	Febrero	HASTA:	7:10	a.m	p.m
ENTRENAMIENTO		AÑO	2025				
MOTIVACIÓN							
CHARLA HSE	X						
INDUCCIÓN							
DIVULGACIÓN							
APROBACIÓN							

DIRIGIDO A: Personal operativo de la obra.

TITULO O NOMBRE DE LA REUNIÓN: Campaña Cuidado de Manos

OBJETIVO: Fomentar hábitos saludables de higiene y protección de las manos, sensibilizando a los trabajadores sobre la importancia de este cuidado para prevenir lesiones, infecciones.

ASISTENTES

ITEM	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Anthony Guarin Tenorio	Maestro obra	
2	Anderson salcedo	Ayudante	Anderson Salcedo
3	Miguel A Osorio	Ayudante	Miguel
4	TEEDDY ALFONSO ROYETT NAVARRETE	Ayudante	
5	Geiner Morales Herrera	Oficial	
6	Cristian Mendez Alvarado	Ayudante	
7	[illegible]	@Fi Cont	
8	PABLO DAVID R	AYUDANTE	
9	Jesus Ruiz	A y A	Jesus Ruiz
10	Willinton Uloria	A y A	Willinton Uloria
11	Carlos A. Novoa Lambis	Ayudante	Carlos A. Novoa L.
12	[illegible]	Ayudante	
13	Jesus [illegible]	Soldador E-11	
14	Juan David Rodas	Ayudante	Juan Rodas
15	Jesus Alberto Martinez Carpio	Ayudante	
16	KENNETH C. LOPEZ R	AYUDANTE	
17	Juan Sebastian Saavedra Barreras	Ayudante	
18	Elkin Leal	A y	
19	Andres Herrera Fonseca	A y	
20	Cristian camilo cadet	A y	Cristian Cadet

CONCLUSIONES

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA EVALUACIÓN:

FIRMA DEL INSTRUCTOR

FIRMA INTERVENTORIA

Consorcio Río Grande	CÓDIGO DEL REGISTRO	TITULO DEL REGISTRO	Revisión: 2
	PA-R-01	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha: 01/30/2016
			Página: 1 de 1

TIPO DE REUNIÓN		FECHA		HORA			
CAPACITACIÓN		DÍA	22	DESDE:	7:00	a.m	p.m
SENSIBILIZACIÓN		MES	Febrero	HASTA:	7:10	a.m	p.m
ENTRENAMIENTO		AÑO	2025				
MOTIVACIÓN							
CHARLA HSE	X						
INDUCCIÓN							
DIVULGACIÓN							
APROBACIÓN							

DIRIGIDO A: Personal operativo de la obra.

TITULO O NOMBRE DE LA REUNIÓN: Ausentismo laboral

OBJETIVO: Sensibilizar a los trabajadores sobre las causas, consecuencias de las ausencias injustificadas en el entorno laboral.

ASISTENTES

ITEM	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Wilfrido Morelo C.	OF.	
2	Williston Viloria	AY.	Williston Viloria
3	Cristian camilo coley	AY.	Cristian Coley
4	Elkin Leal		
5	Julio David Rodas	Ayudante	Julio Rodas
6	KENNETH G. LOPEZ M.	AYUDANTE	
7	Juan Sebastian Saavedra	Ayudante	
8	Jesus Ruiz	Ayudante	
9	Cristian Mendez Alvarado	Ayudante	
10	Jesus Montes	AY.	
11	Geiner Morales Herrera	Oficial	
12	FREDDY ALFONSO ROJETT NAVAREZ	Ayudante	
13	Pedro Diaz R.	Ay	
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

CONCLUSIONES

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA EVALUACIÓN:

Angie Alvarado.
FIRMA DEL INSTRUCTOR

FIRMA INTERVENTORIA

Consorcio Río Grande	CODIGO DEL REGISTRO	TITULO DEL REGISTRO	Revisión: 2
	PA-R-01	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha 01/30/2026
			Página 1 de 1

TIPO DE REUNIÓN		FECHA		HORA			
CAPACITACIÓN		DÍA	25	DESDE:	7:00	a.m	p.m
SENSIBILIZACIÓN		MES	Febrero	HASTA:	7:10	a.m	p.m
ENTRENAMIENTO		AÑO	2025				
MOTIVACIÓN							
CHARLA HSE							
INDUCCIÓN							
DIVULGACIÓN	X						
APROBACIÓN							

DIRIGIDO A: Personal Operativo de la Obra

TITULO O NOMBRE DE LA REUNIÓN: Permiso de Trabajo en Alturas.

OBJETIVO: Garantizar que los trabajadores realicen las actividades laborales en alturas lo hagan de manera segura, cumpliendo con todas las normativas de seguridad para prevenir accidentes y proteger la integridad física de los trabajadores

ASISTENTES

ITEM	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Andrés Herrera Fonseca	A. of	
2	EVER LINCAPE U	OFICIAL	EVER
3	Geiner Morayes Herrera	Oficial	
4	Gastian Mendez Alvarado	Ayudante	
5	Juan sebastian Saavedra	Ayudante	
6	KENNETH G. LOPEZ R.	AYUDANTE	
7	Jesus Paz	A.V.	
8	Jesus Alberto Martinez Carpio	Ay	
9	Anderson Salcedo	Ay	
10	Jair Medina M.	Conductor	
11	MIGUEL A OSORNO	AYUDANTE	
12	Carlos Amaro NOVOA Lambis	Ayudante	
13	Daniel Erazo	Soldador	
14	Jesus Mendoza	Soldador E.I.	
15	Williston Viloria	Ay.	
16	MANUEL NOVOA	AYUDANTE	
17	Cristian Camilo, Caley	Ay	Cristian Caley
18	PABLO DAVILA R.	AYUDANTE	
19	JUAN RODAS	AYUDANTE,	JUAN RODAS
20	FREDY ALFONSO ROYETT NADAEZ	Ayudante	

CONCLUSIONES

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA EVALUACIÓN:

FIRMA DEL INSTRUCTOR

FIRMA INTERVENTORIA

Consorcio Río Grande	CÓDIGO DEL REGISTRO	TITULO DEL REGISTRO	Revisión: 2
	PA-R-01	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha: 01/30/2026
			Pagina: 1 de 1

TIPO DE REUNIÓN		FECHA		HORA			
CAPACITACIÓN		DÍA	26	DESDE:	7:00	a.m	p.m
SENSIBILIZACIÓN		MES	Febrero	HASTA:	7:10	a.m	p.m
ENTRENAMIENTO		AÑO	2025				
MOTIVACIÓN							
CHARLA HSE	x						
INDUCCIÓN							
DIVULGACIÓN							
APROBACIÓN							

DIRIGIDO A: Personal operativo de la obra.

TITULO O NOMBRE DE LA REUNIÓN: Formato de Permiso de Trabajo en Alturas

OBJETIVO: Realizar el formato de trabajo en altura de forma controlada, segura y alineada con las normativas de salud y seguridad ocupacional.

ASISTENTES

ITEM	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Elkin Leal	Ayt	
2	David Cardenas	Soldador	
3	José Leal	Soldador	
4	Carlos A. Nova Lambis	ayudante	Carlos A. Nova L.
5	Miguel A Osorio	Ayudante	
6	Cristian Camilo Coley	Ayt	Cristian Coley
7	Jose L Medina M	conductor	
8	Williston Viloria	Ayt	Williston Viloria
9	Juan Rodas	AYUdante	Juan Rodas
10	Jesus Alberto Martinez Carpio	Ayudante	
11	Andres Herrera Fonseca	A. y	
12	Kenneth G. Lopez R.	Ayudante	
13	Pablo Pallares R	Ayudante	
14	Cristian Mendez Alvarado	Ayudante	
15			
16			
17			
18			
19			
20			

CONCLUSIONES

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA EVALUACIÓN:

FIRMA DEL INSTRUCTOR

FIRMA INTERVENTORIA

Consorcio Río Grande	CÓDIGO DEL REGISTRO	TITULO DEL REGISTRO	Revisión: 2
	PA-R-01	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha: 01/30/2016
			Página: 1 de 1

TIPO DE REUNIÓN		FECHA		HORA			
CAPACITACIÓN		DÍA	27	DESDE:	7:00	a.m	p.m
SENSIBILIZACIÓN		MES	Febrero	HASTA:	7:40	a.m	p.m
ENTRENAMIENTO		AÑO	2025				
MOTIVACIÓN							
CHARLA HSE	X						
INDUCCIÓN							
DIVULGACIÓN							
APROBACIÓN							

DIRIGIDO A: Personal Operativo de la obra.

TITULO O NOMBRE DE LA REUNIÓN: Trabajo Bajo la Lluvia.

OBJETIVO: Tomar medidas como suspensión del trabajo, manipulación de maquinaria, evitar los trabajo en altura, utilizar el calzado adecuado.

ASISTENTES

ITEM	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Apolinar Espinosa Tenorio	Maestro obra	
2	Jose Silva	Soldador	
3	Juan Carlos Trejo	Electricista	
4	Wilfredo Morales	Oficial	
5	MIGUEL A OSORNO	Ayudante	Miguel
6	William Vidal	Ayudante	William Vidal
7	FREDDY ALFONSO ROYETT NIEBLES	Ayudante	
8	Jesy	Ayudante	
9	Samuel Contreras	Soldador	
10	Jesus Hernandez	Soldador	
11	Carlos A NOVOA Tambis	Ayudante	Carlos A. Novoa Tambis
12	Jesus Alberto Martinez Carpio	Ayudante	
13	Juan sebastian saavedra	Ayudante	
14	Gomer Morales Herrera	Oficial	
15	Pablo Emilio R	AYUDANTE	
16	Reinaldo	Oficial	
17	Jose Rodas	Ayudante	Jose Rodas
18	Cristian Mendez Alvarado	Ayudante	
19	Cristian camilo colon	Ay	Cristian Colon
20	Elkin Leal	A.y	

CONCLUSIONES

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA EVALUACIÓN:

FIRMA DEL INSTRUCTOR

FIRMA INTERVENTORIA

Consorcio Río Grande	CÓDIGO DEL REGISTRO	TITULO DEL REGISTRO	Revisión: 2
	PA-R-01	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha: 01/30/2016
			Página: 1 de 1

TIPO DE REUNIÓN		FECHA		HORA			
CAPACITACIÓN		DÍA	1	DESDE:	7:00	a.m	p.m
SENSIBILIZACIÓN		MES	Mayo	HASTA:	7:10	a.m	p.m
ENTRENAMIENTO		AÑO	2025				
MOTIVACIÓN							
CHARLA HSE	X						
INDUCCIÓN							
DIVULGACIÓN							
APROBACIÓN							

DIRIGIDO A: Personal Operativo de la obra.

TITULO O NOMBRE DE LA REUNIÓN: Manual de funciones

OBJETIVO: Establecer de manera clara y detallada las responsabilidades, tareas y funciones de cada puesto dentro de la obra

ASISTENTES

ITEM	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Aristides Guerra Tenorio	Maestro obra	
2	Eder Hincapie V	Oficial	
3	Jesus Maturana	Soldador	
4	Juan Rodas	Ayudante	Juan R.
5	Willinton Vilora	Ay.	Willinton Vilora
6	Cristian camilo cadey	Ay	Cristian cadey
7	Jesus Alberto Martinez Carpio	Ay	
8	Juan Sebastian Saavedra	Ayudante	
9	Carlos Andres Nova Lambis	Ayudante	Carlos A. Nova Lambis
10	Geiner Morales Herrera	Oficial	
11	Freddy Alfonso Royett Narvaez	Ayudante	
12	Kenneth G. Lopez R.	ayudante	
13	Josy Ra	Ay.	Josy Ra
14	Andres Herrera Fonseca		
15	Pablo Pulido R.	Ayudante	
16	Wilfrido Morales	Of.	
17	Manuel Nova	Ayudante	
18	Arizmendi Cedillo	Oficial	
19	Juan carlos Trejo	Ay. Of.	
20	Elkin Leal	Ay.	

CONCLUSIONES: Buena Charla — Soldador

MIGUEL OSORNO — AYUDANTE — miguel

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA EVALUACIÓN: Jose Silva — Soldador

FIRMA DEL INSTRUCTOR

FIRMA INTERVENTORIA

Consorcio Río Grande	CÓDIGO DEL REGISTRO	TITULO DEL REGISTRO	Revisión: 2
	PA-R-01	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha: 01/30/2016
			Página: 1 de 1

TIPO DE REUNIÓN

CAPACITACIÓN	
SENSIBILIZACIÓN	
ENTRENAMIENTO	
MOTIVACIÓN	
CHARLA HSE	X
INDUCCION	
DIVULGACIÓN	
APROBACIÓN	

FECHA

DÍA	04
MES	Marzo
AÑO	2025

HORA

DESDE:	7:00	a.m	p.m
HASTA:	7:10	a.m	p.m

DIRIGIDO A: Personal Operativo de la obra.

TITULO O NOMBRE DE LA REUNIÓN: Dinamica "Cara o Sello"

OBJETIVO: Garantizar que los trabajadores entiendan sus responsabilidades y las realicen de manera correcta, eficiente y segura.

ASISTENTES

ITEM	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Jesus Alberto Martinez Carpio	Ayuda	
2	Cristian Camilo Calen	AY	Cristian calen
3	PABLO DAVIS R	AY	
4	Geiner Morales Herrera	Oficial	
5	Jeyker Rodas L.	Ayudante	Jeyker Rodas
6	Arsides Quiñon Tenorio	Maestro Obra	
7	Jose C Medina M	Conductor	
8	Miguel Calen	Soldador	
9	Wilfredo Morales C.	Ofc	
10	EDWIN NOVOA	AYUDANTE	
11	Alexander Castillo	Oficial	
12	Juan Carlos Trejo M	AY T.C	
13	Andres Herrera Fonseca	A. y	
14	Cristian Mendez Alvarado	Ayudante	
15	MIGUEL A OSORNO	AYUDANTE	MIGUEL
16	Jesus Paz	Ayt	
17	Juan Sebastian Escalante	ayudante	
18	Carlos A. Novoa Lambis	ayudante	Carlos A. Novoa Lambis
19	Williston Vilorio	AYT	Williston Vilorio
20	Jose Silva	Soldador	
	YESENIA ELIZABETH C. LOPEZ R.	AYUDANTE	

CONCLUSIONES

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA EVALUACIÓN:

FIRMA DEL INSTRUCTOR

FIRMA INTERVENTORIA

Consorcio Río Grande	CÓDIGO DEL REGISTRO	TITULO DEL REGISTRO	Revisión: 2
	PA-R-01	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha: 01/30/2026
			Página: 1 de 1

TIPO DE REUNIÓN		FECHA		HORA			
CAPACITACIÓN		DÍA	5	DESDE:	7:00	a.m	p.m
SENSIBILIZACIÓN		MES	Marzo	HASTA:	7:10	a.m	p.m
ENTRENAMIENTO		AÑO	2025				
MOTIVACIÓN							
CHARLA HSE							
INDUCCIÓN	X						
DIVULGACIÓN							
APROBACIÓN							

DIRIGIDO A: Personal operativo nuevo de la obra

TITULO O NOMBRE DE LA REUNIÓN: Inducción a personal operativo nuevo de la obra.

OBJETIVO: Divulgación de la política, objetivos, control de peligros, trabajos en alturas del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

ASISTENTES

ITEM	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Juan Antonio Gonzalez Beleño	oficial	
2	Luis Muñoz Perez	ayudante	
3	Teobaldo Guerra Martinez	ayudante	
4	Luis Enrique Mora	ayudante	
5	Fernando Gonzalez Muncera	oficial	Fernando Gonzalez
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

CONCLUSIONES

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA EVALUACIÓN:

FIRMA DEL INSTRUCTOR

FIRMA INTERVENTORIA

Consorcio Río Grande	CÓDIGO DEL REGISTRO	TITULO DEL REGISTRO	Revisión: 2
	PA-R-01	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha: 01/30/2016
			Página: 1 de 1

TIPO DE REUNIÓN		FECHA		HORA			
CAPACITACIÓN		DÍA	5	DESDE:	7:00	a.m	p.m
SENSIBILIZACIÓN		MES	Mar-10	HASTA:	7:10	a.m	p.m
ENTRENAMIENTO		AÑO	2025				
MOTIVACIÓN							
CHARLA HSE	X						
INDUCCIÓN							
DIVULGACIÓN							
APROBACIÓN							

DIRIGIDO A: Personal operativo de la obra.

TITULO O NOMBRE DE LA REUNIÓN: Presentación y divulgación del personal nuevo.

OBJETIVO: Proporcionar una introducción clara y estructurada de la empresa, su cultura, sus políticas y procedimientos.

ASISTENTES

ITEM	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Cristian Mendez Alvarado	Ayudante	
2	PABLO DARIO R	AYUDANTE	
3	Cristian camilo coley	AY	Cristian coley
4	DAVID Cordero C	Soldador	
5	Juan carlos Trejos	A T a	
6	Jesus Maqueda	Soldador	
7	Jesus Lat	Ay	
8	Juan sebastian Saavedra	Ayudante	
9	MANUEL PINEDA	AYUDANTE	
10	William Vijo	Ayt	
11	Carlos A. Mora Lombis		
12	Alexander Cortes	oficial	
13	JUAN Rodas	AYUDANTE	JUAN R.
14	pedro Herrera fonseca	Ay	
15	Rosinsa Echeverri	Operador	Rosinsa
16	Jose C Medina M	conductor	
17	KENNETH G. LOPEZ R.	AYUDANTE	
18			
19			
20			

CONCLUSIONES

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA EVALUACIÓN:

FIRMA DEL INSTRUCTOR

FIRMA INTERVENTORIA

Consorcio Río Grande	CÓDIGO DEL REGISTRO	TITULO DEL REGISTRO	Revisión: 2
	PA-R-01	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha: 01/30/2016
			Página: 1 de 1

TIPO DE REUNIÓN		FECHA		HORA			
CAPACITACIÓN		DÍA	6	DESDE:	7:00	a.m	p.m
SENSIBILIZACIÓN		MES	Mayo	HASTA:	7:10	a.m	p.m
ENTRENAMIENTO		AÑO	2025				
MOTIVACIÓN							
CHARLA HSE	X						
INDUCCIÓN							
DIVULGACIÓN							
APROBACIÓN							

DIRIGIDO A: Personal operativo de la obra.

TITULO O NOMBRE DE LA REUNIÓN: Uso de los elementos de protección personal

OBJETIVO: Proteger la salud y la seguridad de los trabajadores, Prevenir lesiones y enfermedades ocupacionales y mejorar la productividad y la eficiencia en el lugar de trabajo.

ASISTENTES

ITEM	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Jose L Medina M	Conductor	
2	Rosmar Montero	operador	Rosmar
3	Andres Herrera Fonseca	A.y	
4	Jesus [illegible]	A.T.	Jesus
5	[illegible]	Oficial	
6	KENNETH G. LOPEZ R.	AYUDANTE	
7	Miguel A OSORNO	Ayudante	miguel
8	[illegible]	Ayudante	
9	Jesus Alberto Martinez Carpio	Ayudante	
10	Eug [illegible]	Oficial	Eug
11	Juan Sebastian Saavedra	Ayudante	
12	Jesús [illegible]	Soldador	
13	[illegible]	AY	
14	[illegible]	AYUDANTE	
15	Juan [illegible]	A.y.t	
16	Williston Vilo...	A.y.t	Williston Vilo...
17	Elkin Jeal	A.y	
18	Jaime Morales Herrera	Oficial	
19	Luis Enrique Mora	Oficial	
20	Carlos A. Novoa Lambis	ayudante	Carlos A. Novoa Lambis
	David Rodas	Ayudante	David Rodas
	Jose Salcedo	Soldador	

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA EVALUACIÓN:

FIRMA DEL INSTRUCTOR

FIRMA INTERVENTORIA

Consorcio Río Grande	CÓDIGO DEL REGISTRO	TITULO DEL REGISTRO	Revisión. 2
	PA-R-01	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha: 01/30/2026
			Pagina: 1 de 1

TIPO DE REUNIÓN		FECHA		HORA			
CAPACITACIÓN		DÍA	7	DESDE:	7:00	a.m	p.m
SENSIBILIZACIÓN		MES	Marzo	HASTA:	7:10	a.m	p.m
ENTRENAMIENTO		AÑO	2025				
MOTIVACIÓN							
CHARLA HSE	X						
INDUCCIÓN							
DIVULGACIÓN							
APROBACIÓN							

DIRIGIDO A: Personal operativo de la obra.

TITULO O NOMBRE DE LA REUNIÓN: Trabajo en Equipo y Liderazgo

OBJETIVO: Lograr una colaboración efectiva entre los trabajadores para alcanzar metas comunes, optimizando habilidades individuales y colectivas.

ASISTENTES

ITEM	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Arnaldo Bunces Tenorio	Maestro obra	
2	Jesus Maldonado	Soldador	
3	Luis Enrique Mora	Of. C.Q	
4	Elkin Leal	A.y	
5	Pablo Ballesteros	ayudante	
6	Carlos A. Novoa Lambis	ayudante	Carlos A. Novoa Lambis
7	Jesus Alberto Martinez Campo	Ayudante	
8	Miguel A. Osorno	Ayudante	
9	Teodoldo Guerra Martinez	Ayudante	
10	Andres Herrera Fonseca	Ay	
11	[illegible] Tres	A-1	
12	[illegible]	[illegible]	
13	[illegible]	[illegible]	
14	Eder Luna Playa	Oficial	
15	Wilfredo Martinez	[illegible]	
16	Luis Muñoz Perez	ayudante	
17	Abdiel Novoa	Ayudante	
18	Williston Silveira	Ayt	Williston Silveira
19	Gabriel Morales Herrera	Oficial	
20	Jesus Rodas	Ayudante	Jesus R.
CONCL	Cristian Mendez Alvarado	Ayudante	

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA EVALUACIÓN:

FIRMA DEL INSTRUCTOR

FIRMA INTERVENTORIA

Consorcio Río Grande	CÓDIGO DEL REGISTRO	TITULO DEL REGISTRO	Revisión: 2
	PA-R-01	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha: 01/30/2016
			Página: 1 de 1

TIPO DE REUNIÓN		FECHA		HORA			
CAPACITACIÓN		DÍA	07	DESDE:	7:00	a.m	p.m
SENSIBILIZACIÓN		MES	Marzo	HASTA:	7:10	a.m	p.m
ENTRENAMIENTO		AÑO	2025				
MOTIVACIÓN							
CHARLA HSE	X						
INDUCCIÓN							
DIVULGACIÓN							
APROBACIÓN							

DIRIGIDO A: Personal operativo de la obra.

TITULO O NOMBRE DE LA REUNIÓN: Jornada de Orden y Aseo.

OBJETIVO: Mantener el área de trabajo limpio, organizado y libre de riesgos con el fin de facilitar la productividad, la seguridad y el bienestar de los trabajadores.

ASISTENTES

ITEM	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	MARVIN NOVOA	AYUDANTE	
2	Fernando Gonzalez M.	Oficial	
3	Jesus Alberto Martinez Campo	Ayudante	
4	HECTOR hincapie v.	Oficial	
5	Rosmeal Gutierrez	operador	ROSMEAL
6	Andres Herrera Fonseca	A. y	
7	KENNETH G. LOPEZ R.	AYUDANTE	
8	Sebastian Saavedra	ayudante	
9	PEDRO [illegible] R.	AYUDANTE	
10	[illegible] Rodas	AYUDANTE	
11	Luis Enrique Yara	OFICIAL	
12	Teobaldo Cuevas Martinez	Ayudante	
13	[illegible]	Oficial	
14	Cristian Mendez Aguilar	Ayudante	
15	MIGUEL A OSORIO	AYUDANTE	MIGUEL
16	Nolfredo Morales	Of.	
17	Elmer Morales Herrera	Oficial	
18	William Vilorio		
19	Carlos A. Novoa Lambis	ayudante	Carlos A. Novoa Lambis
20			

CONCLUSIONES

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA EVALUACIÓN:

FIRMA DEL INSTRUCTOR

FIRMA INTERVENTORIA

Consorcio Río Grande	CÓDIGO DEL REGISTRO	TITULO DEL REGISTRO	Revisión: 2
	PA-R-01	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha: 01/30/2016
			Página: 1 de 1

TIPO DE REUNIÓN		FECHA		HORA			
CAPACITACIÓN		DÍA	10	DESDE:	7:00	a.m	p.m
SENSIBILIZACIÓN		MES	Marzo	HASTA:	7:10	a.m	p.m
ENTRENAMIENTO		AÑO	2025				
MOTIVACIÓN							
CHARLA HSE	X						
INDUCCIÓN							
DIVULGACIÓN							
APROBACIÓN							

DIRIGIDO A: Personal Operativo de la obra.

TITULO O NOMBRE DE LA REUNIÓN: Actitud por Seguridad

OBJETIVO: Fomentar una mentalidad proactiva y responsable en todos los trabajadores para identificar, prevenir y minimizar los riesgos potenciales en su entorno de trabajo.

ASISTENTES

ITEM	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Jose L Medina M	Conductor	
2	Elkin Tegl Cordero C	Ayd	
3	David Cordero C	Soldador	
4	Jesus Maymunda	Soldador	
5	Juan David Rodas	Ayudante	Juan Rodas
6	Geiner Morales Herrera	Oficial	
7	Luis Enrique Mora	Oficial	
8	Teobaldo Cuerra Martinez	Ayudante	
9	Luis Arroyo Perez	ayudante	
10	Kenneth G. Lopez R.	Ayudante	
11	Jesus Alberto Martinez Carpio	Ayudante	
12	Juan sebastian Saavedra	Ayudante	
13	William Vibria	Ayt.	
14	Juan carlos Trecon	P4 T. C	
15	Andres Herrera fonseca	A.y	
16	Marvin Novoa	Ay. Soldante	
17	Carbi A. Nova Lembis	ayudante	Carbi A. Nova L.
18	Miguel A. Osorio	Ayudante	
19	Alfredo Mena	Ofic	
20	Pablo Davila M	AYUDANTE	

CONCLUSIONES: Jose Ruz Alvarado

Ay T. Oficial

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA EVALUACIÓN:

FIRMA DEL INSTRUCTOR

FIRMA INTERVENTORIA

ANEXO 5.
ENTREGA DE DOTACIÓN Y REPOSICIÓN DE EPP

Consorcio Río Grande

ENTREGA Y/O REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y BIOSEGURIDAD

CÓDIGO: HSE-FOR-04
VERSIÓN: 0.0
FECHA: 23/01/2023

CONTRATO No.: 0401-23

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	FECHA DE ENTREGA (dd/mm/aa)	ELEMENTO ENTREGADO																			OTRO ELEMENTO	OBSERVACIONES	FIRMA DEL EMPLEADO
			TYVECK	OVEROL	BOTAS DE SEGURIDAD EN CUERO	BOTAS DE SEGURIDAD EN CAUCHO	G. CUERO / VAQUETA	G. CARNAZA	G. NITRILO	GAFAS LENTE OSCURO	GAFAS LENTE CLARO	TAPABOCAS	MASCARILLA PARA VAPORES ORGANICOS	PROTECTOR AUDITIVO	TAPABOCAS DESECHABLE	GEL ANTIBACTERIAL	ALCOHOL	TOALLAS DESECHABLES DE PAPEL	JABON LIQUIDO PARA MANOS			
Kenneth Lopez	Ayudante	05/03/25								X													
Wilfido Montes	Oficial	05/03/25					X																
Pablo Bullos	AYUDANTE	05/03/25					X																
Teobaldo Guerra	Ayudante	05/03/25					X																
Ever Mincapie	Oficial	05/03/25					X																
Marvin Novoa	Ayudante	05/03/25					X			X													
Jesus Martinez	Ayudante	06/03/25																					
David Cordero	Soldador	06/03/25																				Guantes Soldador	
Carlos Novoa	Ayudante	06/03/25					X																
Geiner Montes	Oficial	07/03/25					X																

Como trabajador manifiesto que recibí inducción sobre el correcto destino y uso que debo dar a los elementos de protección personal que me han sido entregados. A su vez manifiesto que los elementos que se me han suministrado se encuentran en perfecto estado.

Manifiesto que soy responsable por utilizar y mantener adecuadamente los elementos de protección personal que se me han suministrado (según el Artículo 3, capítulo III, de la Resolución 2400/79)

Consorcio Río Grande	ENTREGA Y/O REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y BIOSEGURIDAD	CÓDIGO: HSE-FOR-04 VERSIÓN: 0.0 FECHA: 23/01/2023

CONTRATO No.: 0401-23

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	FECHA DE ENTREGA (dd/mm/aa)	ELEMENTO ENTREGADO																			OTRO ELEMENTO	OBSERVACIONES	FIRMA DEL EMPLEADO
			TYVECK	OVEROL	BOTAS DE SEGURIDAD EN CUERO	BOTAS DE SEGURIDAD EN CAUCHO	G. CUERO / VAQUETA	G. CARNAZA	G. Presición	GAFAS LENTE OSCURO	GAFAS LENTE CLARO	TAPABOCAS	MASCARILLA PARA VAPORES ORGANICOS	PROTECTOR AUDITIVO	TAPABOCAS DESECHABLE	GEL ANTIBACTERIAL	ALCOHOL	TOALLAS DESECHABLES DE PAPEL	JABON LIQUIDO PARA MANOS			
Miguel Osorno	Ayudante	05/02/25											X											MIGUEL
Jesus Ruiz	Ayudante	05/02/25					X																	
David Cordero	Soldador	05/02/25					X	X																
Kenneth Lopez	Ayudante	06/02/25					X																	
Evar Hincapie	Oficial	06/02/25					X																	
Wilfredo Montiel	Oficial	06/02/25					X																	
Wellington Urbina	Ayudante	07/02/25					X																	
Ismael Pereira	Oficial	05/02/25							X															
Juan David Rodas	Ayudante	11/02/25					X																	
Kenneth Lopez	Ayudante	11/02/25					X																	
David Cordero	Soldador	17/02/25								X														
Jesus Martinez	Ayudante	17/02/25					X																	
Jose Silva M.	Soldador	17/02/25																				Peto.		
Andres Herrera	Ayudante	17/02/25							X	X														
Wilfredo Montiel	Oficial	18/02/25					X																	
Jesus Ruiz	Ayudante	18/02/25					X																	
[illegible]	Ayudante	18/02/25					X		X															
Marvin Novoa	Ayudante	18/02/25					X		X															

Como trabajador manifiesto que recibí inducción sobre el correcto destino y uso que debo dar a los elementos de protección personal que me han sido entregados. A su vez manifiesto que los elementos que se me han suministrado se encuentran en perfecto estado.

Manifiesto que soy responsable por utilizar y mantener adecuadamente los elementos de protección personal que se me han suministrado (según el Artículo 3, capítulo III, de la Resolución 2400/79)

Consorcio Río Grande

ENTREGA Y/O REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y BIOSEGURIDAD

CÓDIGO: HSE-FOR-04
VERSIÓN: 0.0
FECHA: 23/01/2023

CONTRATO No.: 0401-23

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	FECHA DE ENTREGA (dd/mm/aa)	ELEMENTO ENTREGADO																	OTRO ELEMENTO	OBSERVACIONES	FIRMA DEL EMPLEADO
			TYVECK	OVEROL	BOTAS DE SEGURIDAD EN CUERO	BOTAS DE SEGURIDAD EN CAUCHO	G. CUERO / VAQUETA	G. CARNAZA	G. NITRILO	GAFAS LENTE OSCURO	GAFAS LENTE CLARO	TAPABOCAS	MASCARILLA PARA VAPORES ORGÁNICOS	PROTECTOR AUDITIVO	TAPABOCAS DESECHABLE	GEL ANTIBACTERIAL	ALCOHOL	TOALLAS DESECHABLES DE PAPEL	JABON LIQUIDO PARA MANOS			
Juan Carlos Trico	Ayudante	13/02/25					X															
Wilfrido Morales	Oficial	14/02/25					X															
Jesus Martinez	Ayudante	14/02/25								X												
Carlos Novoa	Ayudante	20/02/25								X												
Gainer Montes	Oficial	22/02/25					X															
Freddy Royett	Ayudante	22/02/25					X															
Freddy Royett	Ayudante	25/02/25								X												
Cristian Colay	Ayudante	25/02/25								X												
Erika Leal	Ayudante	25/02/25					X															
Wilfrido Montes	Oficial	25/02/25					X															
Marin Novoa	Ayudante	26/02/25					X															
Kenneth Lopez	Ayudante	26/02/25					X															
Cristian Mendez	Ayudante	03/03/25					X															
Pablo Pallos	Ayudante	03/03/25								X												
Juan Carlos Trico	Ayudante	07/03/25								X												
Jean Sanchez	Ayudante	04/03/25					X															
Kenneth Lopez	Ayudante	04/03/25					X															
Jesus Ruiz	Ayudante	04/03/25					X															

Como trabajador manifiesto que recibí inducción sobre el correcto destino y uso que debo dar a los elementos de protección personal que me han sido entregados. A su vez manifiesto que los elementos que se me han suministrado se encuentran en perfecto estado.

Manifiesto que soy responsable por utilizar y mantener adecuadamente los elementos de protección personal que se me han suministrado (según el Artículo 3, capítulo III, de la Resolución 2400/79)

Consorcio Río Grande	ENTREGA DE REPOSICION DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CODIGO: HSE-FOR-09 VERSIÓN: 0 FECHA: 23/01/2023

EMPRESA:	CONSORCIO RIO GRANDE	CONTRATO:	0401-23	FECHA DE ENTREGA:	2/20/2025

NOMBRE DEL TRABAJADOR	IDENTIFICACION	CARGO	DOTACIÓN O EPP ENTREGADO						FIRMA
			CAMISA	PANTALON	BOTAS DE SEGURIDAD	CASCO DE SEGURIDAD	BOTAS DE CAUCHO	IMPERMEBLE	
Geiner Morales Herrera	13.571.127	Oficial	-	-	-	-	1	1	
Freddy Poyett N.	91.448.469	Ayudante	-	-	-	-	1	1	
Ivan Sebastian Saavedra	1096232850	Ayudante	-	-	-	-	1	1	
Carlos Novoa Lambis	1096798068	Ayudante	-	-	-	-	1	1	Carlos A. Novoa Lambis
Cristian Colay Moncada	1096232850	Ayudante	-	-	-	-	1	1	Cristian colay

ENTREGA:	Angie Altamiranda Martinez	CARGO:	HSE	FIRMA	

ANEXO 6.
INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO

Consorcio Río Grande

INSPECCION DE ORDEN Y ASEO

Codigo: R-HSE-08	
Version:01	
Fecha: 11 Nov del 2015	
Pagina 1 de 1	

Fecha: 18 - Febrero - 2025 **Inspeccionado por:** Angie Altamiranda **Cargo:** Auxiliar HSE **Área:** Mirador del río Mirador del Río

Proyecto: Construcción del mirador del río y acciones complementarias del Distrito de Barrancabermeja	**Nº del proyecto:** 0401-23

AREA	DESCRIPCION	Cumplimiento C	NC	NA	ÁREA	DESCRIPCION	Cumplimiento C	NC	NA
Oficinas generales	Instalaciones fisicas adecuadas	✓			Talleres de reparación	No hay elementos innecesarios	✓		
	Elementos de trabajo distribuidos adecuadamente	✓				Existe la distribucion de elementos dentro de la demarcación correspondiente	✓		
	Limpieza general	✓				Limpieza general	✓		
	Libre de elementos de trabajo(EPP, Herramientas..etc)	✓				Señalamiento claro de carteleras de salud ocupacional	✓		
	señalamiento claro, carteleras de salud ocupacional	✓				aplicación de las 5 eses	✓		
	Aplicacion de las 5 eses	✓			Area de almacenamiento	Adecuado apilamiento de materiales	✓		
Manejo de residuos	Separacion de residuos	✓				Señalizacion adecuada cuando aplique	✓		
	Uso de recipientes adecuados	✓				Areas de acceso y de transito libres de obstrucción	✓		
	Recipientes separados para trapos aceiitosos, residuosresiduos inflamables, quimicos y/o domesticos	✓				Desague apropiado en el area de almacenamiento	✓		
	Aplicación de las 5 eses	✓				Libre y sin objetos materiales extraños	✓		
Maquinas, equipos y herramientas	En buen estado	✓				Aplicación de las 5 eses	✓		
	Limpios y libres de elementos innecesarios	✓			HALLAZGOS				
	Almacenamiento adecuado cuando esten o no en uso	✓			Cultivar a los trabajadores de ser responsable de mantener su propio espacio de trabajo ordenado y limpio y areas comunes.				
	aplicación de las 5 eses	✓							
Carriles de tránsito	Superficies en buen estado limpios y libres de elementos innecesarios	✓							
	Señales y demarcacion en salud ocupacional y libre de obstrucciones	✓							
Señalización General y demarcación de Area	Señalizacion de areas y demarcacion general	✓			RECOMENDACIONES				
	Señalamiento claro en los pasillos	✓							
	Señalización de emergencia	✓							
	Aplicación de las 5 eses	✓			C: CUMPLE NC: NO CUMPLE NA: NO APLICA				

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN AMBIENTAL		Pag: 1 de 2
	Código: HSE-FOR-27	Versión: 0.0	Fecha: 23 de Ene de 2023

Fecha: DD 26 MM 02 AA 25

Área: Obra Mirador Responsable: Angie Altamiranda Proyecto: Mirador del Río

ASPECTOS A EVALUAR	VALORACIÓN			OBSERVACIONES O CORRECCIONES
IMPACTOS AMBIENTALES	SC	NC	NA	
1. Estan identificacdos todos los aspectos e impactos ambientales de la zona en la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales del área	✓			
MANEJO DE ESCOMBROS	**SC**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES O CORRECCIONES**
1. La zona de dispocisión de escombros, esta lejos de cuerpos de agua o sistemas de aguas lluvias.			✓	
2. Los escombros generados en las obras son dispuestos correctamente, no generan obstáculo para peatones y rutas de evacuación .			✓	
3. Los escombros son enviados a una escombrera autorizada por la autoridad ambiental competente u otras obras para material de relleno.			✓	
4. Los escombros están "Limpios", no presentan contaminación o mezcla con residuos peligrosos.			✓	
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	**SC**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES O CORRECCIONES**
1. La zona de almacenamiento de residuos solidos estan lejos de cuerpos de agua o sistemas de alcantarillado o sumideros de aguas lluvias.	✓			
2. Las canecas, bolsas o recipientes para almacenamiento de residuos estan en buen estado, no presentan deterioro alguno.	✓			
3. Se separan los residuos en punto ecológico con recipientes con código de colores de acuerdo a la normatividad vigente o requisitos del cliente	✓			
4. Se entregan los resduos a entidades competentes para su disposición final	✓			
5. Se ha divulgado al personal de la clasificación de los residuos y como debe manejarlos y disponerlos	✓			
MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS	**SC**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES O CORRECCIONES**
1. Si tienen separados los residuos liquidos de los solidos (No se mezclan)	✓			
2. Los contenedores de los residuos liquidos estan en buen estado, no existen fugas.	✓			
3. Existe barrera para contención de residuos liquidos y esta se encuentra en buen estado	✓			
4. El personal esta capacitado y es conciente del manejo que debe darle a los residuos liquidos	✓			
5. La zona de almacenamiento de residuos liquidos esta lejos de sumideros de aguas lluvias. O los sumideros de aguas lluvias tienen las barreras correspondientes.	✓			
6. Los pisos de la zona de almacenamiento parcial de residuos liquidos no presentan gritas o estan protegidos de tal forma que no generen contaminación del suelo	✓			

ANEXO 7. PREOPERACIONALES, HERRAMIENTAS MENORES, MAQUINARIA Y EQUIPOS

Consorcio Río Grande	PREOPERACIONAL HERRAMIENTA MENOR	CÓDIGO: HSE-FOR-07
		VERSIÓN: 0.0
		FECHA: 23/01/2023

Proyecto/Obra: Construcción del mirador del río y acciones complementarias del Distrito de Barrancabermeja

Inspección: Diaria: Semanal: Mensual: X

Semana desde: Febrero 11 / 2025	**Hasta:** Marzo 10 / 2025	**Área/ubicación:** Mirador del río - Barrancabermeja
Inspeccionado Por: Elkin Leal	**Cargo:** Almacenista	**Firma:**
Reportado a: Angie Altamiranda.	**Cargo:** Auxiliar HSE	**Firma:** Angie Altamiranda

CANTIDAD	ELEMENTOS	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM		ESTADO
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
14	Palas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
1	Pala cuadrada	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
1	palin	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
9	Picas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
5	palas draga	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
2	porras 16lb	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
9	Barras	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
4	Marfillos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
2	Alicate	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		

OBSERVACIONES

Responsable de corregir la condición por parte del contratista:		Para la fecha:	
Firma:			
Fecha verificación compromisos:			

Consorcio Río Grande	PREOPERACIONAL DE RETROCARGADORA O PAJARITA	CÓDIGO: HSE-FOR-99
		VERSIÓN: 0.0

OBRA: Mirador del Río
EQUIPO: Minicargador
OPERADOR: Harvey Rincón Avila
INSPECCIONADO POR: Harvey Rincón Avila.

MODELO: —o—
MARCA: BOBCAT
SERIE: AH6M194JD
FECHA DE INSPECCIÓN: 11 Febrero / 2025 - 18 Febrero / 2025

	ITEM	APLICA		LUNES				MARTES				MIERCOLES				JUEVES				VIERNES				SABADO				DOMINGO			
		SI	NO	B	A	R	D	B	A	R	D	B	A	R	D	B	A	R	D	B	A	R	D	B	A	R	D	B	A	R	D
SISTEMA ELECTRICO	Encendido			✓				✓				✓				✓				✓											
	Luces			✓				✓				✓				✓				✓											
	TABLERO DE INDICADORES																														
	Indicador de temperatura del motor			✓				✓				✓				✓				✓											
	Indicador de presiòn de aceite del motor			✓				✓				✓				✓				✓											
	Indicador o Amperimetro			✓				✓				✓				✓				✓											
	Pito			✓				✓				✓				✓				✓											
	Alarma de retroceso			✓				✓				✓				✓				✓											
MOTOR																															
SISTEMA HIDRAULICO	Cilindros			✓				✓				✓				✓				✓											
	Mangueras			✓				✓				✓				✓				✓											
	Bombas Hidraulicas			✓				✓				✓				✓				✓											
	SISTEMA DE ENFRIAMIENTO																														
CABINA	Protección Abierta			✓				✓				✓				✓				✓											
	Protección Cerrada																														
	Cinturón de seguridad			✓				✓				✓				✓				✓											
	Extintor de incendio			✓				✓				✓				✓				✓											
	Asiento			✓				✓				✓				✓				✓											
OTROS	Rodamiento			✓				✓				✓				✓				✓											
	Hoja Topadora			✓				✓				✓				✓				✓											
	Sistema Ripper		✓		✓				✓				✓				✓				✓										
	Llantas		✓		✓				✓				✓				✓				✓										
	Cuchilla		✓		✓				✓				✓				✓				✓										
	Escarificador		✓		✓				✓				✓				✓				✓										
	Rodillo		✓		✓				✓				✓				✓				✓										
FIRMAS	FIRMA DEL MECANICO Y/O OPERADOR			✓				✓				✓				✓				✓											
	Vo.Bo. HSE			✓				✓				✓				✓				✓											

OBSERVACIONES:

B: BUENO A: ACEPTABLE R: REGULAR D: DEFICIENTE

Consorcio Río Grande	PREOPERACIONAL DE RETROCARGADORA O PAJARITA	CÓDIGO: HSE-FOR-09
		VERSIÓN: 0.0

OBRA: Mirador del Rio
EQUIPO: Minicargador
OPERADOR: Harvey Rincón Avila
INSPECCIONADO POR: Harvey Rincón Avila

MODELO: —0—
MARCA: BOTCAT
SERIE: AHGM794JD
FECHA DE INSPECCIÓN: 19 feb - 26 Feb / 2025

	ITEM	APLICA		LUNES				MARTES				MIERCOLES				JUEVES				VIERNES				SABADO				DOMINGO			
		SI	NO	B	A	R	D	B	A	R	D	B	A	R	D	B	A	R	D	B	A	R	D	B	A	R	D	B	A	R	D
SISTEMA ELECTRICO	Encendido			✓				✓				✓								✓											
	Luces			✓				✓				✓								✓											
	TABLERO DE INDICADORES																														
	Indicador de temperatura del motor			✓				✓				✓								✓											
	Indicador de presiòn de aceite del motor			✓				✓				✓								✓											
	Indicador o Amperimetro			✓				✓				✓								✓											
	Pito			✓				✓				✓								✓											
	Alarma de retroceso			✓				✓				✓								✓											
MOTOR																															
SISTEMA HIDRAULICO	Cilindros			✓				✓				✓								✓											
	Mangueras			✓				✓				✓								✓											
	Bombas Hidraulicas			✓				✓				✓								✓											
	SISTEMA DE ENFRIAMIENTO																														
CABINA	Protección Abierta			✓				✓				✓								✓											
	Protección Cerrada																														
	Cinturón de seguridad			✓				✓				✓								✓											
	Extintor de incendio			✓				✓				✓								✓											
	Asiento			✓				✓				✓								✓											
OTROS	Rodamiento			✓				✓				✓								✓											
	Hoja Topadora			✓				✓				✓								✓											
	Sistema Ripper		✓		✓				✓				✓								✓										
	Llantas		✓		✓				✓				✓								✓										
	Cuchilla		✓		✓				✓				✓								✓										
	Escarificador		✓		✓				✓				✓								✓										
	Rodillo		✓		✓				✓				✓								✓										
FIRMAS	FIRMA DEL MECANICO Y/O OPERADOR			HRA				HRA				HRA								HRA											
	Vo.Bo. HSE																														

OBSERVACIONES:

B: BUENO A: ACEPTABLE R: REGULAR D: DEFICIENTE

Consorcio Río Grande	PREOPERACIONAL DE RETROCARGADORA O PAJARITA	CÓDIGO: HSE-FOR-99
		VERSIÓN: 0.0

OBRA: Rio grande
EQUIPO: Retro excavadora
OPERADOR: Robinson Gutierrez
INSPECCIONADO POR: Robinson Gutierrez

MODELO: 310
MARCA: Hitachi
SERIE: AHGM794JD
FECHA DE INSPECCIÓN: 03-Marzo-2025 - 08/Marzo-2025

	ITEM	APLICA		LUNES				MARTES				MIERCOLES				JUEVES				VIERNES				SABADO				DOMINGO			
		SI	NO	B	A	R	D	B	A	R	D	B	A	R	D	B	A	R	D	B	A	R	D	B	A	R	D	B	A	R	D
SISTEMA ELECTRICO	Encendido			✓								✓				✓				✓											
	Luces			✓								✓				✓				✓											
	TABLERO DE INDICADORES			✓								✓				✓				✓											
	Indicador de temperatura del motor			✓								✓				✓				✓											
	Indicador de presiòn de aceite del motor			✓								✓				✓				✓											
	Indicador o Amperimetro			✓								✓				✓				✓											
	Pito			✓								✓				✓				✓											
	Alarma de retroceso																														
MOTOR																															
SISTEMA HIDRAULICO	Cilindros					✓								✓				✓				✓									
	Mangueras			✓								✓				✓				✓											
	Bombas Hidraulicas			✓								✓				✓				✓											
	SISTEMA DE ENFRIAMIENTO			✓								✓				✓				✓											
CABINA	Protección Abierta			✓								✓				✓				✓											
	Protección Cerrada																														
	Cinturón de seguridad			✓								✓				✓				✓											
	Extintor de incendio																														
	Asiento			✓								✓				✓				✓											
OTROS	Rodamiento					✓								✓				✓				✓									
	Hoja Topadora			✓								✓				✓				✓											
	Sistema Ripper			✓								✓				✓				✓											
	Llantas																														
	Cuchilla			✓								✓				✓				✓											
	Escarificador			✓								✓				✓				✓											
	Rodillo																														
FIRMAS	FIRMA DEL MECANICO Y/O OPERADOR			Robinson								Robinson				Robinson				Robinson											
	Vo.Bo. HSE			Anya Altamirano								Anya Altamirano				Anya Altamirano				Anya Altamirano											

OBSERVACIONES:

B: BUENO A: ACEPTABLE R: REGULAR D: DEFICIENTE

Consorcio Río Grande	INSPECCION PREOPERACIONAL TRONZADORA	CODIGO: HSE-FOR-100
		VERSION: 0.0
		FECHA: 23-01-2023
		PAGINA 1 DE 1

FECHA: Febrero 11 - 2025

PERIODO: DEL Feb. 11 AL Feb. 18 DEL 2025

TRONZADORA Nº 1

MARCA : Dewalt

DESCRIPCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA , CONEXIÓN A TIERRA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LOS MANDOS DE ARRANQUE Y PARADA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL SISTEMA DE SUSPENSION Y ROTACION (MANIJA , RESORTE ,EJES ,POLEAS ,CORREAS , RODAMIENTOS, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA Y DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ACCESORIOS ADECUADOS PARA EL CORTE DE MATERIAL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN BURROS O SOPORTE PARA EL MANEJO DEL MATERIAL LARGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS , ASEO , LUBRICACION ,ETC.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE ORDEN Y ASEO DE LA MAQUINA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA DIARIA DEL OPERADOR														
FIRMA DE INSPECTOR HSE														

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

OBSERVACIONES: ———————————————

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.

Consorcio Río Grande	INSPECCION PREOPERACIONAL TRONZADORA	CODIGO: HSE-FOR-100 VERSION: 0.0 FECHA: 23-01-2023 PAGINA 1 DE 1

FECHA: Febrero 14 | 2025

PERIODO: DEL Feb. 14 AL Feb. 26 DEL 2025

TRONZADORA Nº 1

MARCA: Dewalt

DESCRIPCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA , CONEXION A TIERRA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LOS MANDOS DE ARRANQUE Y PARADA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y ROTACION (MANIJA , RESORTE ,EJES ,POLEAS ,CORREAS , RODAMIENTOS, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA Y DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ACCESORIOS ADECUADOS PARA EL CORTE DE MATERIAL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN BURROS O SOPORTE PARA EL MANEJO DEL MATERIAL LARGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS , ASEO , LUBRICACION ,ETC.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE ORDEN Y ASEO DE LA MAQUINA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA DIARIA DEL OPERADOR														
FIRMA DE INSPECTOR HSE														

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

OBSERVACIONES: _____

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.

Consorcio Río Grande	INSPECCION PREOPERACIONAL TRONZADORA	CODIGO: HSE-FOR-100
		VERSION: 0.0
		FECHA: 23-01-2023
		PAGINA 1 DE 1

FECHA: Febrero 27 - 2025

PERIODO: DEL Feb. 27 AL Marzo 7 DEL 2025

TRONZADORA N° 1

MARCA: Dewalt

DESCRIPCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA , CONEXIÓN A TIERRA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LOS MANDOS DE ARRANQUE Y PARADA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y ROTACION (MANIJA , RESORTE ,EJES ,POLEAS ,CORREAS , RODAMIENTOS, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA Y DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ACCESORIOS ADECUADOS PARA EL CORTE DE MATERIAL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN BURROS O SOPORTE PARA EL MANEJO DEL MATERIAL LARGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS , ASEO , LUBRICACION ,ETC.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE ORDEN Y ASEO DE LA MAQUINA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA DIARIA DEL OPERADOR	Wilfredo Morales		Wilfredo Morales		Wilfredo Morales		Wilfredo Morales		Wilfredo Morales		Wilfredo Morales			
FIRMA DE INSPECTOR HSE	Angie Altamirano		Angie Altamirano		Angie Altamirano		Angie Altamirano		Angie Altamirano		Angie Altamirano			

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

OBSERVACIONES: ———————————————

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.

Consorcio Río Grande	ENTREGA Y/O INSPECCIÓN DE MOTOBOMBA	CÓDIGO: HSE-FOR-66 VERSIÓN: 0.0 FECHA: 23/01/2023

ENTREGA [ ] INSPECCION [X]

Ciudad: Barrancabermeja Ubicación de la Motobomba: Obra Mirador del Río Semana del: 19 al 26 de(MES): Feb de(AÑO): 2025

Operador: Argemiro Avello Horas de Operación (último cambio de aceite): _____

Marca: Wavior Clase: Diesel Modelo: _____

Otras caracteristicas: _____

	ITEM A INSPECCIONAR	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		OBSERVACIONES GENERALES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
1	Nivel aceite del motor	✓		✓						✓		✓				
2	Tanques y tapas	✓		✓						✓		✓				
3	Estado del tubo de escape o exhosto	✓		✓						✓		✓				
4	Resortes y retenedores	✓		✓						✓		✓				
5	Defensa	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A				
6	Filtro de combustible	✓		✓						✓		✓				
7	Filtro de aceite	✓		✓						✓		✓				
8	Filtro de aire	✓		✓						✓		✓				
9	Valvula de admisión	✓		✓						✓		✓				
10	Valvula de compresión	✓		✓						✓		✓				
11	Sellos mecanicos del Carter	✓		✓						✓		✓				
12	Carburador	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A				
13	Tornilleria en general	✓		✓						✓		✓				
14	Pines	✓		✓						✓		✓				
15	Pasadores del equipo	✓		✓						✓		✓				
16	Bujias	✓		✓						✓		✓				
17	Cuchillas	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A				
18	Contrapesas	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A				
19	Fusibles	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A				
20	Presión aire de las llantas	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A				
21	Latoneria / Pintura	✓		✓						✓		✓				
22	Otro															

B: Bueno M: Malo

	CONDICIONES ANORMALES DE OPERACIÓN	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		OBSERVACIONES GENERALES
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1	Fuga aceite motor / transmisión		X		X						X		X			
2	Fuga combustibles / vapores		X		X						X		X			
3	Fuga en el exosto / gases		X		X						X		X			
4	Fallas en los anillos		X		X						X		X			
5	Juego axial del cigüeñal		X		X						X		X			

OBSERVACIONES: _____

NOTA: Diligenciar sólo cuando se realice entrega

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Yo _____ declaro que he recibido el equipo _____ en el estado señalado.

A partir de la fecha y hasta el equipo este bajo mi responsabilidad asumo que los riesgos y los daños que por descuido o negligencia puedan ocurrir con este equipo. Igualmente sé que está prohibido emplear el equipo en cualquier cosa o actividad que sea diferente a la que la empresa ha ordenado.

ENTREGA: _____ RECIBE: _____

FIRMA: _____ FIRMA: _____

C.C.No.: _____ C.C.No.: _____

NOTA: Diligencie sólo cuando realice inspección

INSPECCION REALIZADA POR:

NOMBRE: Angie Altamiranda

CARGO: Auxiliar HSE

FIRMA: Angie Altamiranda

RESPONSABLE DEL EQUIPO:

NOMBRE: Anstides Guzmán

CARGO: Maestro de Obra

FIRMA: _____

Consorcio Río Grande	ENTREGA Y/O INSPECCIÓN DE MOTOBOMBA	CÓDIGO: HSE-FOR-66 VERSIÓN: 0.0 FECHA: 23/01/2023

ENTREGA [ ] INSPECCION [X]

Ciudad: Barrancabermeja Ubicación de la Motobomba: Obra Mirador del Río Semana del: 27 al 7 de(MES): Feb. de(AÑO): 2025

Operador: Williston Vilorio Horas de Operación (último cambio de aceite): _____

Marca: Waviov Clase: Diesel Modelo: _____

Otras caracteristicas: _____

	ITEM A INSPECCIONAR	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		OBSERVACIONES GENERALES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
1	Nivel aceite del motor	✓				✓						✓				
2	Tanques y tapas	✓				✓						✓				
3	Estado del tubo de escape o exhosto	✓				✓						✓				
4	Resortes y retenedores	✓				✓						✓				
5	Defensa	N/A				N/A						N/A				
6	Filtro de combustible	✓				✓						✓				
7	Filtro de aceite	✓				✓						✓				
8	Filtro de aire	✓				✓						✓				
9	Valvula de admisión	✓				✓						✓				
10	Valvula de compresión	✓				✓						✓				
11	Sellos mecanicos del Carter	✓				✓						✓				
12	Carburador	N/A				N/A						N/A				
13	Tornilleria en general	✓				✓						✓				
14	Pines	✓				✓						✓				
15	Pasadores del equipo	✓				✓						✓				
16	Bujias	✓				✓						✓				
17	Cuchillas	N/A				N/A						N/A				
18	Contrapesas	N/A				N/A						N/A				
19	Fusibles	N/A				N/A						N/A				
20	Presión aire de las llantas	N/A				N/A						N/A				
21	Latoneria / Pintura	✓				✓						✓				
22	Otro															

B: Bueno M: Malo

	CONDICIONES ANORMALES DE OPERACIÓN	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		OBSERVACIONES GENERALES
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1	Fuga aceite motor / transmisión		X				X						X			
2	Fuga combustibles / vapores		X				X						X			
3	Fuga en el exosto / gases		X				X						X			
4	Fallas en los anillos		X				X						X			
5	Juego axial del cigüeñal		X				X						X			

OBSERVACIONES: _____

NOTA: Diligenciar sólo cuando se realice entrega

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Yo _____ declaro que he recibido el equipo _____ en el estado señalado.

A partir de la fecha y hasta el equipo este bajo mi responsabilidad asumo que los riesgos y los daños que por descuido o negligencia puedan ocurrir con este equipo. Igualmente sé que está prohibido emplear el equipo en cualquier cosa o actividad que sea diferente a la que la empresa ha ordenado

ENTREGA: _____ RECIBE: _____

FIRMA: _____ FIRMA: _____

C.C.No.: _____ C.C.No.: _____

NOTA: Diligencie sólo cuando realice inspección

INSPECCION REALIZADA POR:

NOMBRE: Angie Altamiranda

CARGO: Auxiliar HSE

FIRMA: Angie Altamiranda

RESPONSABLE DEL EQUIPO:

NOMBRE: Aristides Guzmán

CARGO: Maestro de Obra

FIRMA: _____

Consorcio Río Grande	INSPECCION PREOPERACIONAL VIBROCOMPACTADOR	Código: HSE-FOR-98 Versión: 0.0 Fecha: 23/01/2023

SEMANA DEL 11 Febrero AL 18 Febrero MARCA _____ MODELO _____ SERIE _____

OPERADOR Andres Herrera Fonseca UBICACIÓN Obra Mirador del Río PROYECTO 0401-23

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (Trabajo nocturno)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* De trabajo traseras (Trabajo nocturno)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	*Cabina antivuelo (R.O.P.S)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Cinturón de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Extintor de incendios 10 lbs PQS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Indicadores (hidráulicos, refrigerantes, horometro,	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control ingreso humo (tubo de escape)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Escaleras y apoyos de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejo retrovisor central (convexo)	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Estado de pedales	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de mandos manuales	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado de cilindro (amortiguadores)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Puntos de lubricación	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de viraje	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Dirección (terminales, bomba hidráulica)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Mando de estacionamiento (emergencia)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	* Motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores y tornillos en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Freno de servicio	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Resguardos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Anclajes de contrapeso		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Guardas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del bastidor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR	Andres Herrera Fonseca													
	FIRMA SUPERVISOR SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Consorcio Río Grande	INSPECCION PREOPERACIONAL VIBROCOMPACTADOR	Código: HSE-FOR-98 Versión: 0.0 Fecha: 23/01/2023

SEMANA DEL 19 Febrero AL 20 Febrero MARCA _____ MODELO _____ SERIE _____

OPERADOR Andres Herrera Fonseca UBICACIÓN Obra Mirador del Río PROYECTO 0401-23

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (Trabajo nocturno)	✓		✓											
	* De trabajo traseras (Trabajo nocturno)	✓		✓											
CABINA	*Cabina antivuelo (R.O.P.S)	✓		✓											
	* Cinturón de seguridad		✓		✓										
	Extintor de incendios 10 lbs PQS	✓		✓											
	Asiento	✓		✓											
	Mandos de avance	✓		✓											
	* Indicadores (hidráulicos, refrigerantes, horometro,	✓		✓											
	Control ingreso humo (tubo de escape)	✓		✓											
	* Alarma de retroceso		✓		✓										
	Pito		✓		✓										
	Escaleras y apoyos de acceso	✓		✓											
	Espejo retrovisor central (convexo)		✓		✓										
	Estado de pedales	✓		✓											
	Estado de mandos manuales	✓		✓											
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	✓		✓											
	* Estado de cilindro (amortiguadores)	✓		✓											
	Llantas en buen estado		✓		✓										
	Puntos de lubricación	✓		✓											
	Mecanismo de viraje	✓		✓											
	* Dirección (terminales, bomba hidráulica)	✓		✓											
	* Mando de estacionamiento (emergencia)		✓		✓										
	* Motor	✓		✓											
	Pasadores y tornillos en buen estado	✓		✓											
	Batería y cables	✓		✓											
	* Freno de servicio	✓		✓											
	* Resguardos	✓		✓											
	Anclajes de contrapeso		✓		✓										
	Guardas	✓		✓											
	Estado del bastidor	✓		✓											
FIRMA	FIRMA OPERADOR	Andres Herrera Fonseca													
	FIRMA SUPERVISOR SST														



HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE SIERRA CIRCULAR	SSOMA-E37-FR69
OBRA:	Construcción del mirador del río y acciones complementarias del Distrito de Barrancabermeja	ÁREA
EMPRESA:	Consorcio Río Grande	Taller de soldadura y figurado de acero
N.º del proyecto: 0401-23	Inspección: Rutinaria: Semanal: X Mensual: Del: 11 Febrero Hasta: 18 Feb.	Marca:

ELEMENTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES
¿El cable y enchufe de alimentación está en buen estado?	✓			
¿Herramienta cuenta con código de color del mes?			X	
¿El protector de la hoja está operativo?	✓			
¿La hoja de la sierra está en buen estado? (Sin dientes saltados o quebrados, sin resinas pegada)	✓			
¿El botón de encendido está en buenas condiciones?	✓			
¿Existe mesa de trabajo estable?			X	
¿Lugar de trabajo libre de obstáculos y de sustancias deslizantes?	✓			
¿Trabajador autorizado para operar la herramienta?	✓			
¿La faja de transmisión se encuentra debidamente tensada?			X	
¿La faja de transmisión se encuentra en condiciones adecuadas?			X	
¿Los botones de encendido y apagado se encuentran en óptimas condiciones?	✓			
¿El equipo cuenta con señalización y equipo extintor?	✓			

REALIZADO POR:		REVISADO Y APROBADO POR:	
NOMBRE Anstides Guzman T.		**NOMBRE** Angie Altamiranda M.	
CARGO Maestro de obra.		**CARGO** Auxiliar HSE	
Febrero 11 - 2025		Febrero 11 - 2025	
FECHA	**FIRMA**	**FECHA**	**FIRMA**

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE SIERRA CIRCULAR	SSOMA-E37-FR69
OBRA:	Construcción del mirador del río y acciones complementarias del Distrito de Barrancabermeja	ÁREA
EMPRESA:	Consorcio Río Grande	Taller de soldadura y figurado de acero
N.° del proyecto: 0401-23	Inspección: Rutinaria: Semanal: X Mensual: Del: 19 Febrero Hasta: 26 Feb.	Marca:

ELEMENTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES
¿El cable y enchufe de alimentación está en buen estado?	✓			
¿Herramienta cuenta con código de color del mes?			X	
¿El protector de la hoja está operativo?	✓			
¿La hoja de la sierra está en buen estado? (Sin dientes saltados o quebrados, sin resinas pegada)	✓			
¿El botón de encendido está en buenas condiciones?	✓			
¿Existe mesa de trabajo estable?			X	
¿Lugar de trabajo libre de obstáculos y de sustancias deslizantes?	✓			
¿Trabajador autorizado para operar la herramienta?	✓			
¿La faja de transmisión se encuentra debidamente tensada?			X	
¿La faja de transmisión se encuentra en condiciones adecuadas?			X	
¿Los botones de encendido y apagado se encuentran en óptimas condiciones?	✓			
¿El equipo cuenta con señalización y equipo extintor?	✓			

REALIZADO POR:		REVISADO Y APROBADO POR:	
NOMBRE Aristides Guzmán T.		NOMBRE Angie Altamiranda M.	
CARGO Maestro de Obra.		CARGO Auxiliar HSE	
19 Febrero - 2025		19 Febrero - 2025	
FECHA	FIRMA	FECHA	FIRMA

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE SIERRA CIRCULAR	SSOMA-E37-FR69

OBRA:	Construcción del mirador del río y acciones complementarias del Distrito de Barrancabermeja	ÁREA
EMPRESA:	Consorcio Río Grande	Taller de soldadura y figurado de acero
N.° del proyecto: 0401-23	Inspección: Rutinaria: Semanal: X Mensual: Del: Febrero 27 Hasta: Marzo 7	Marca:

ELEMENTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES
¿El cable y enchufe de alimentación está en buen estado?	✓			
¿Herramienta cuenta con código de color del mes?			X	
¿El protector de la hoja está operativo?	✓			
¿La hoja de la sierra está en buen estado? (Sin dientes saltados o quebrados, sin resinas pegada)	✓			
¿El botón de encendido está en buenas condiciones?	✓			
¿Existe mesa de trabajo estable?			X	
¿Lugar de trabajo libre de obstáculos y de sustancias deslizantes?	✓			
¿Trabajador autorizado para operar la herramienta?	✓			
¿La faja de transmisión se encuentra debidamente tensada?			X	
¿La faja de transmisión se encuentra en condiciones adecuadas?			X	
¿Los botones de encendido y apagado se encuentran en óptimas condiciones?	✓			
¿El equipo cuenta con señalización y equipo extintor?	✓			

REALIZADO POR:		REVISADO Y APROBADO POR:	
NOMBRE Aristides Guzmán T.		NOMBRE Angie Altamirando M.	
CARGO Maestro de Obra.		CARGO Auxiliar HSE	
Febrero 27 - 2025		Febrero 27 - 2025	Angie Altamirando.
FECHA	FIRMA	FECHA	FIRMA
