Fondo de Bienestar Social y de capacitación de la Contraloría General del Departamento

ACTA DE RECIBO CONTRATO No. CMC-002-2025

Contrato No.	CMC-002-2025
Entidad contratante:	Fondo de Bienestar Social y de Capacitación de la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
Objeto:	Suministro e instalación de carpintería en aluminio y vidrio para la zona del área donde se realizan actividades de bienestar social para los funcionarios de la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
Modalidad de selección:	Mínima cuantía
Contratista:	Manufacturas De Aluminio Cúcuta S.A.S. identificado con NIT No. 890.502.709-7, R/L Juan Pablo García Herreros Morelli identificado con c.c. No. 88.228.049 de Cúcuta
Valor inicial del contrato:	$ 35.561.789,00 Treinta y cinco millones quinientos sesenta y un mil setecientos ochenta y nueve pesos.
Adición en valor:	$ 4.224.500,00 Cuatro millones doscientos veinticuatro mil quinientos pesos - Fecha: 12 de marzo de 2025.
Valor final del contrato:	$ 39.786.289,00 Treinta y nueve millones setecientos ochenta y seis mil doscientos ochenta y nueve pesos
Fecha de Inicio:	Cuatro (04) de marzo de 2025
Plazo de ejecución:	Quince (15) días calendario
Adición en tiempo:	Veinticinco (25) días calendario - Fecha: 12 de marzo de 2025
Plazo total de ejecución	Cuarenta (40) días calendario
Fecha de terminación	11 de abril de 2025
CDP:	- 006 del 17 de febrero de 2025 por valor de $ 37.566.939 - 009 del 11 de marzo de 2025 por valor de $ 4.224.500
RP:	- 007 de 03 de marzo de 2025 por valor de $ 35.561.789 - 010 del 12 de marzo de 2025 por valor de $ 4.224.500
Supervisor:	Ing. Lilia Aracely Reyes Carvajalino
Garantías:	Póliza No. 4223952 y su modificación, expedida por la compañía Seguros Generales Suramericana S.A. el día 4 de marzo de 2025, a favor del Fondo de Bienestar Social y de Capacitación de la Contraloría General de Norte de Santander.

Valores asegurados en la póliza así:

AMPAROS	%	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
			DESDE			HASTA		
			AÑO	MES	DIA	AÑO	MES	DIA
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	20	$ 7.957.257,80	25	02	28	25	04	11
Cumplimiento del contrato	20	$ 7.957.257,80	25	02	28	25	08	11
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	5	$ 1.989.314,45	25	02	28	28	04	11

Fondo de Bienestar Social y de capacitación de la Contraloría General del Departamento

ACTA DE RECIBO CONTRATO No. CMC-002-2025

En San José de Cúcuta, siendo los veintiséis (26) días del mes de marzo de 2025, en las instalaciones de la Contraloría General del Departamento de Norte de Santander, se reunieron las siguientes personas: Ingeniera Lilia Aracely Reyes Carvajalino, en calidad de Supervisora del Contrato No. CMC-002-2025 y el Señor Juan Pablo García Herreros Morelli, representante legal de la Empresa Manufacturas De Aluminio Cúcuta S.A.S., como contratista.

Se procede a verificar el cumplimiento de las características técnicas del Contrato No. CMC-002-2025 así:

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Cumple
1	Suministro e instalación de: Puerta ventana en cristal templado incoloro 10MM. Incluye herrajes tipo chapeta, bisagras de giro, chapa central, manija de 60cmsx1", bisagra hidráulica, apoyos de ½ x 9cms, monedas de amarre entre cristales, perfil F para vidrios fijos por parte inferior y superior y accesorios de 0.45 x 2,40 + 3,60 x 2,79 + 0,37 x 2,40 + 13,6 x 2,06 = 1 (Incluye suministro e instalación de refuerzo metálico superior en pintura color madera, detallado y pintura de baranda existente en color negro 13,60 ml, detallado y pintura de parales verticales en color negro (0-0-X-0-0/0-0-0-0-0-0 0-0-0).	UN	1	SI
2	Suministro e instalación de: Puerta batiente en cristal templado incoloro 10MM, incluye herrajes tipo chapeta, bisagras de giro, chapa central, manija de 60cms x 1", bisagra hidráulica y accesorios de 1,12 x 2,90 = 1 (X).	UN	1	SI
3	Refuerzo aéreo de estructura metálica existente, soporte para vidrio de jardineras, guardilla, alistamiento alfajía existente.	UN	1	SI

Para dejar constancia del cumplimiento de las características técnicas se procede a plasmar el registro fotográfico así:

Fondo de Bienestar Social y de capacitación de la Contraloría General del Departamento

ACTA DE RECIBO CONTRATO No. CMC-002-2025

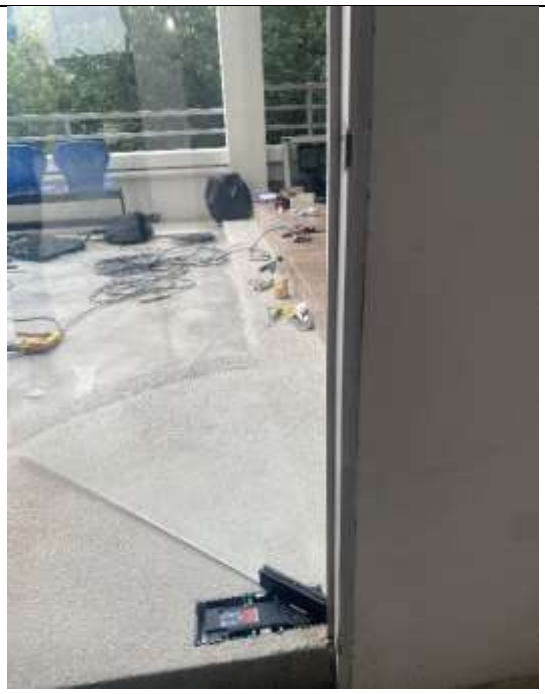
Registro Fotográfico

	
Foto No. 1 Desmonte de marco y puerta puerta existente	Foto No. 2 Desmonte puerta existente
	
Foto No. 3 Desmonte marco de puerta existente	Foto No. 4 Alistamiento piso para instalación puerta batiente

ACTA DE RECIBO CONTRATO No. CMC-002-2025

	
Foto No. 5 Terminación alistamiento piso para suministrar e instalar la puerta batiente	Foto No. 6 Nivelación y arreglo filo alfajía existente
	
Foto No. 7 Instalación perfil inferior F 1” ½” x 1” ½”	Foto No. 8 Pintura en negro baranda existente – terminación instalación perfil inferior F 1” ½” x 1” ½”

ACTA DE RECIBO CONTRATO No. CMC-002-2025

	
Foto No. 9 Pintura en negro baranda existente – terminación instalación perfil inferior F 1" ½" x 1" ½"	Foto No. 10 Pintura en negro baranda existente
	
Foto No. 11 Instalación motor puerta batiente	Foto No. 12 Instalación tapa piso motor puerta batiente

ACTA DE RECIBO CONTRATO No. CMC-002-2025

	
Foto No. 13 Instalación puerta batiente	Foto No.14 Instalación puerta batiente
	
Foto No.15 Instalación puerta batiente	Foto No.16 Instalación puerta batiente

	
Foto No. 17 Espesor o ancho del vidrio puerta batiente	Foto No. 18 Instalación chapa y agarradera puerta batiente
	
Foto No. 19 Resane muro después de quitar el marco	Foto No.20 Resane muro después de quitar el marco

	
Foto No.21 Construcción muro lateral izquierdo en concreto para sostener vidrio	Foto No.22 Construcción muro lateral derecho en concreto para sostener vidrio

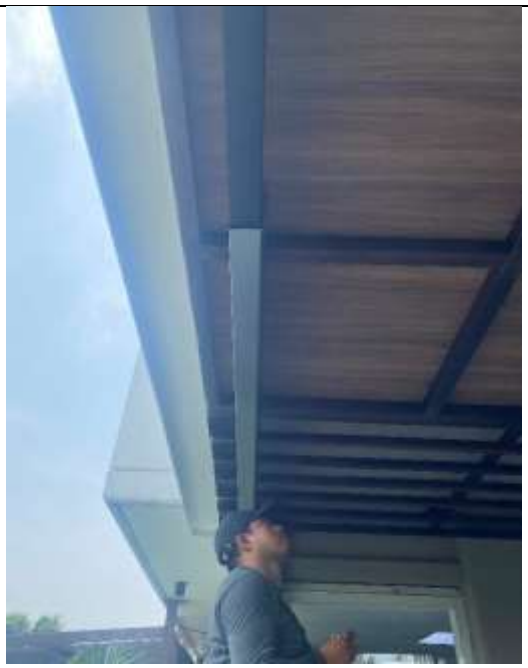
	
Foto No.23 Instalación refuerzo metálico en estructura existente	Foto No.24 Instalación refuerzo metálico en estructura existente

	
Foto No.25 Instalación refuerzo metálico en estructura existente	Foto No.26 Instalación refuerzo metálico en estructura existente
	
Foto No.27 Instalación refuerzo metálico en estructura existente	Foto No.28 Instalación refuerzo metálico en estructura existente

	
Foto No.29 Suministro e instalación vidrio cerramiento terraza	Foto No.30 Suministro e instalación vidrio cerramiento terraza

	
Foto No.31 Suministro e instalación vidrio lateral cerramiento terraza	Foto No.32 Suministro e instalación vidrio lateral cerramiento terraza

	
Foto No.33 Suministro e instalación vidrio fahada cerramiento terraza	Foto No.34 Suministro e instalación vidrio fahada cerramiento terraza
	
Foto No.35 Suministro e instalación vidrio fachada cerramiento terraza	Foto No.36 Suministro e instalación vidrio fahada cerramiento terraza

	
Foto No.37 Suministro e instalación puerta batiente fahada cerramiento terraza	Foto No.38 Suministro e instalación puerta batiente fahada cerramiento terraza
	
Foto No.39 Cerramiento terraza en vidrio terminado.	Foto No.40 Cerramiento terraza en vidrio terminado.

ACTA DE RECIBO CONTRATO No. CMC-002-2025

	
Foto No.41 Cerramiento terraza en vidrio terminado.	Foto No.42 Cerramiento terraza en vidrio terminado.

De acuerdo a lo anterior, se considera cumplida a satisfacción el contrato **CMC-002-2025** cuyo objeto es: "Suministro e instalación de carpintería en aluminio y vidrio para la zona del área donde se realizan actividades de bienestar social para los funcionarios de la Contraloría General del Departamento Norte de Santander", por lo cual es procedente la realización del pago por la suma de (**$ 39.786.289,00)** Treinta y nueve millones setecientos ochenta y seis mil doscientos ochenta y nueve pesos, para lo cual se invita al contratista a presentar su respectiva factura, junto con los soportes de pago de aportes al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales y aportes parafiscales, caja de compensación familiar, ICBF, y SENA.

La presente acta de recibo se firma bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los 26 días de marzo de 2025.

JUAN PABLO GARCÍA HERREROS MORELLI
CONTRATISTA

LILIA ARACELY REYES CARVAJALINO
SUPERVISORA
