
PROGRAMACION SALAMINA


Id	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1	**Actividades iniciales**	**$ 0**	**26 días**	**vie 22/12/23**	**lun 15/01/24**	
2	Visitas de inspeccion	$ 0	2 días	vie 22/12/23	sáb 23/12/23	
3	Realizacion de balances de mayores y menores	$ 0	24 días	sáb 23/12/23	lun 15/01/24	2
4	**Progamacion ORIP SALAMINA**	**$ 39.503.701**	**45 días**	**mar 16/01/24**	**mié 28/02/24**	
5	**PRELIMINARES**	**$ 5.998.557**	**7 días**	**mar 16/01/24**	**lun 22/01/24**	
6	DESMONTE DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	$ 1.161.896	3 días	vie 19/01/24	dom 21/01/24	9
7	DESMONTE DE CUBIERTA	$ 125.966	4 días	vie 19/01/24	lun 22/01/24	9
8	DESMONTE DE TANQUE DE ALMACENAMIETO DE AGUA POTABLE	$ 112.645	1 día	vie 19/01/24	vie 19/01/24	9
9	PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA	$ 416.141	3 días	mar 16/01/24	jue 18/01/24	3
10	RECORRIDO DE CUBIERTA TEJA ONDULADA	$ 4.181.908	1 día	mar 16/01/24	mar 16/01/24	9CC
11	**CARPINTERÍA EN MADERA**	**$ 3.599.046**	**20 días**	**lun 22/01/24**	**dom 11/02/24**	
12	MUEBLE SUPERIOR COCINA 180X80X33,8CM	$ 863.153	20 días	lun 22/01/24	dom 11/02/24	5
13	MUEBLE BAJO MESÓN COCINA	$ 2.060.582	20 días	lun 22/01/24	dom 11/02/24	5

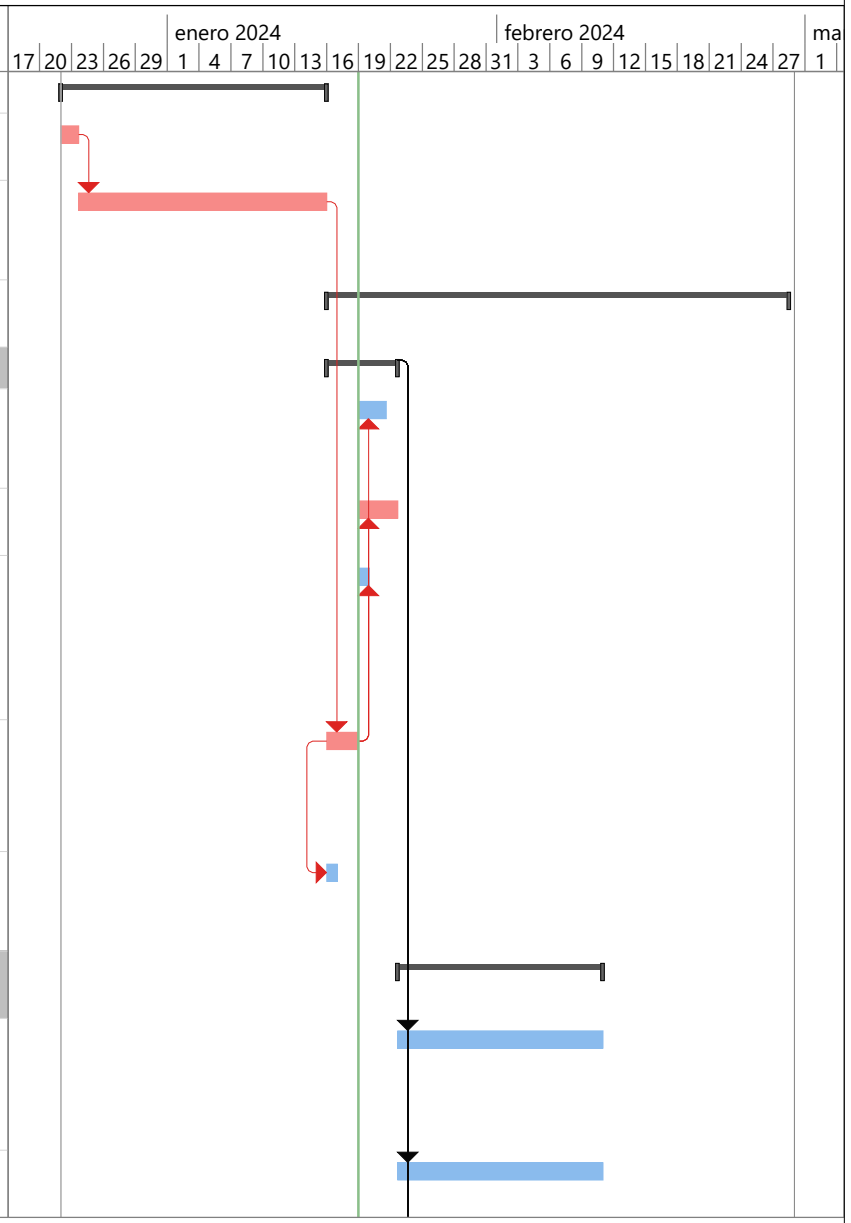

HACER DE COLOMBIA SAS


PROGRAMACION SALAMINA

Id	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
14	MANTENIMIENTO PUERTA EN MADERA	$ 368.518	20 días	lun 22/01/24	dom 11/02/24	5
15	BRAZO HIDRÁULICO PARA PUERTA 150KG	$ 306.793	20 días	lun 22/01/24	dom 11/02/24	5
16	**CIELORRASOS**	**$ 4.793.005**	**5 días**	**mié 31/01/24**	**lun 5/02/24**	
17	MANTENIMIENTO DE CIELORRASO EN FIBRA MINERAL	$ 4.793.005	5 días	mié 31/01/24	lun 5/02/24	18
18	**CUBIERTAS**	**$ 680.346**	**9 días**	**lun 22/01/24**	**mié 31/01/24**	
19	TEJA DE FIBROCEMENTO P7 NO.5	$ 305.406	4 días	sáb 27/01/24	mié 31/01/24	20
20	ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO	$ 374.940	5 días	lun 22/01/24	sáb 27/01/24	5
21	**ENCHAPE MUROS**	**$ 598.940**	**9 días**	**lun 5/02/24**	**mar 13/02/24**	
22	ESTUCO EXTERIOR	$ 435.503	4 días	sáb 10/02/24	mar 13/02/24	23
23	ESTUCO PLASTICO INTERIOR	$ 163.437	5 días	lun 5/02/24	sáb 10/02/24	17
24	**FACHADAS Y REVESTIMIENTOS**	**$ 443.852**	**4 días**	**mié 31/01/24**	**dom 4/02/24**	

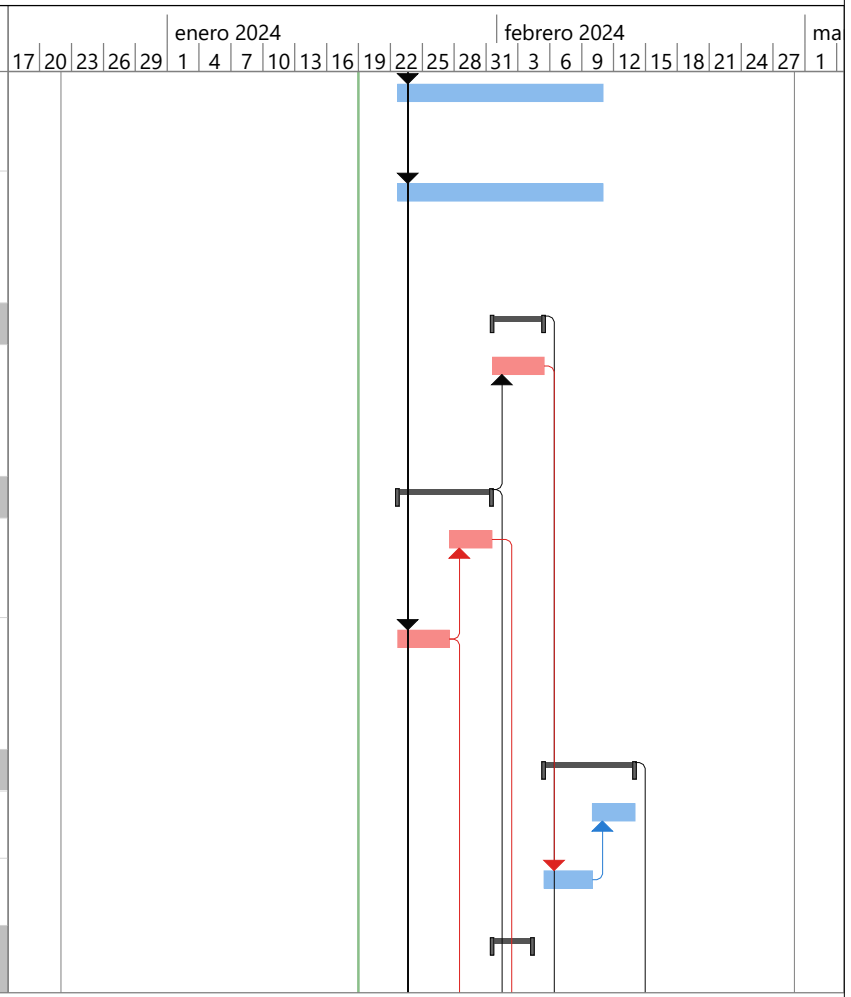

PROGRAMACION SALAMINA


Id	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
25	PINTURA PREMIUM DE MAXIMA RESISTENCIA Y DURABILIDAD PARA SUPERFICIES EXTERIORES EXPUESTAS A LA INTEMPERIE [2 MANOS]	$ 443.852	4 días	mié 31/01/24	dom 4/02/24	18
26	**PINTURAS**	**$ 7.425.620**	**18 días**	**lun 5/02/24**	**jue 22/02/24**	
27	VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS	$ 7.123.333	12 días	dom 11/02/24	jue 22/02/24	28
28	VINILO TIPO 2 CIELORRASOS 2 MANOS	$ 302.287	6 días	lun 5/02/24	dom 11/02/24	16
29	**RED ELÉCTRICA**	**$ 7.290.190**	**5 días**	**jue 22/02/24**	**mar 27/02/24**	
30	LUMINARIA LED 60X60CM DE SOBREPONER/DES	$ 7.290.190	5 días	jue 22/02/24	mar 27/02/24	26
31	**RED HIDRÁULICA**	**$ 1.592.383**	**4 días**	**lun 22/01/24**	**vie 26/01/24**	
32	CAMBIO DE ARBOL Y FLOTADOR POR SISTEMA AHORRADOR	$ 258.533	4 días	lun 22/01/24	vie 26/01/24	5
33	CAMBIO KIT REPUESTO FLUXÓMETRO	$ 293.123	4 días	lun 22/01/24	vie 26/01/24	5
34	TANQUE DE POLIETILENO DE 500 LT	$ 1.040.727	4 días	lun 22/01/24	vie 26/01/24	5
35	**ASEO-SEÑALIZACIÓN**	**$ 985.448**	**37 días**	**lun 22/01/24**	**mar 27/02/24**	

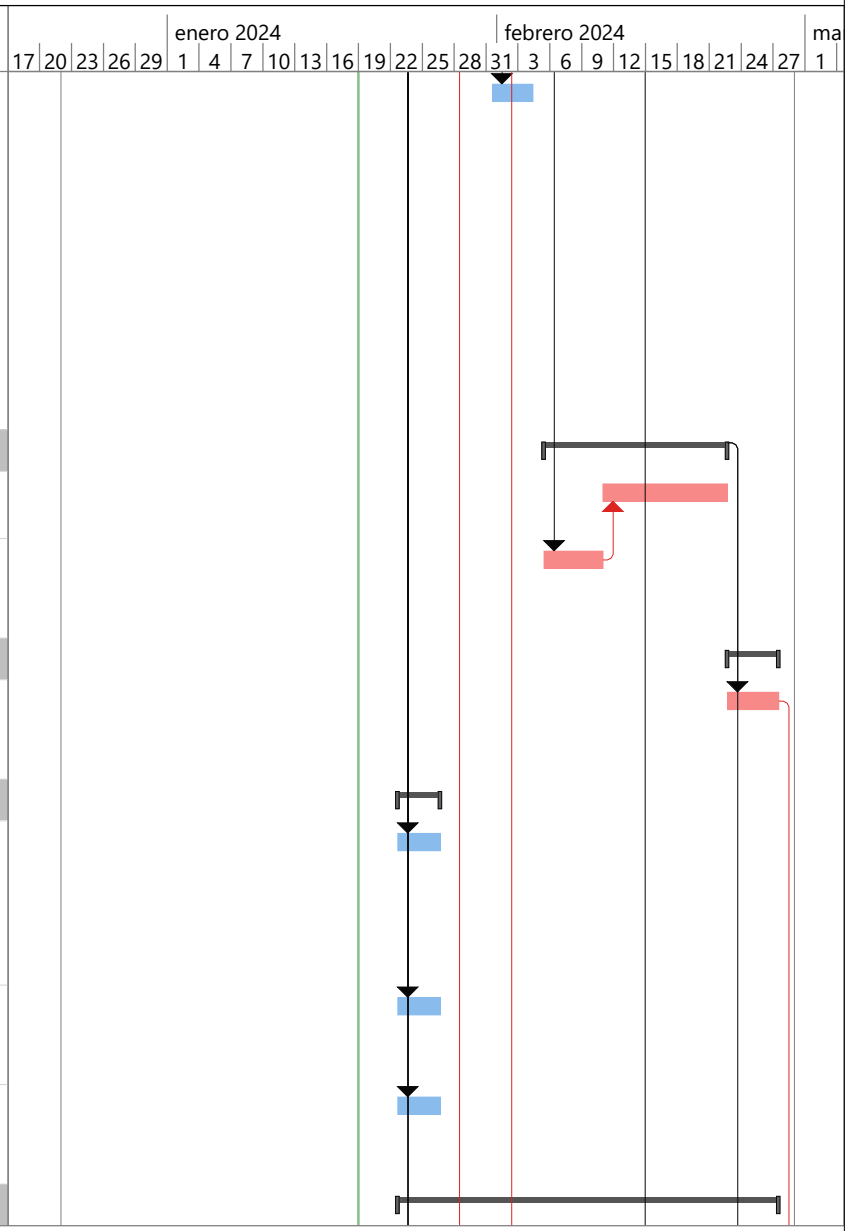

HACER DE COLOMBIA SAS

PROGRAMACION SALAMINA

Id	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
36	ASEO GENERAL DE OBRA	$ 431.662	5 días	jue 22/02/24	mar 27/02/24	26
37	CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA	$ 515.998	20 días	lun 22/01/24	dom 11/02/24	5
38	PLACA DE SEÑALIZACIÓN 21X30CM	$ 37.788	20 días	lun 22/01/24	dom 11/02/24	5
39	**NP ACTIVIDADES NO PREVISTAS**	**$ 6.096.313**	**38 días**	**lun 22/01/24**	**mié 28/02/24**	
40	GESTION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICIONES GENERALES	$ 158.436	3 días	lun 22/01/24	jue 25/01/24	5
41	SILICONA VENTANERIA	$ 399.500	2 días	sáb 17/02/24	dom 18/02/24	45
42	INSTALACION LAMPARA	$ 155.519	1 día	mar 27/02/24	mié 28/02/24	30
43	TEJA FIBROCEMENTO TIPO ESPAÑOL L=1,63	$ 301.962	2 días	lun 29/01/24	mié 31/01/24	19FF
44	IMPERMEABILIZAC VIGA CANAL	$ 4.446.116	5 días	sáb 27/01/24	jue 1/02/24	20
45	IMPERMEABILIZAC DE MUROS	$ 634.780	3 días	mié 14/02/24	vie 16/02/24	21

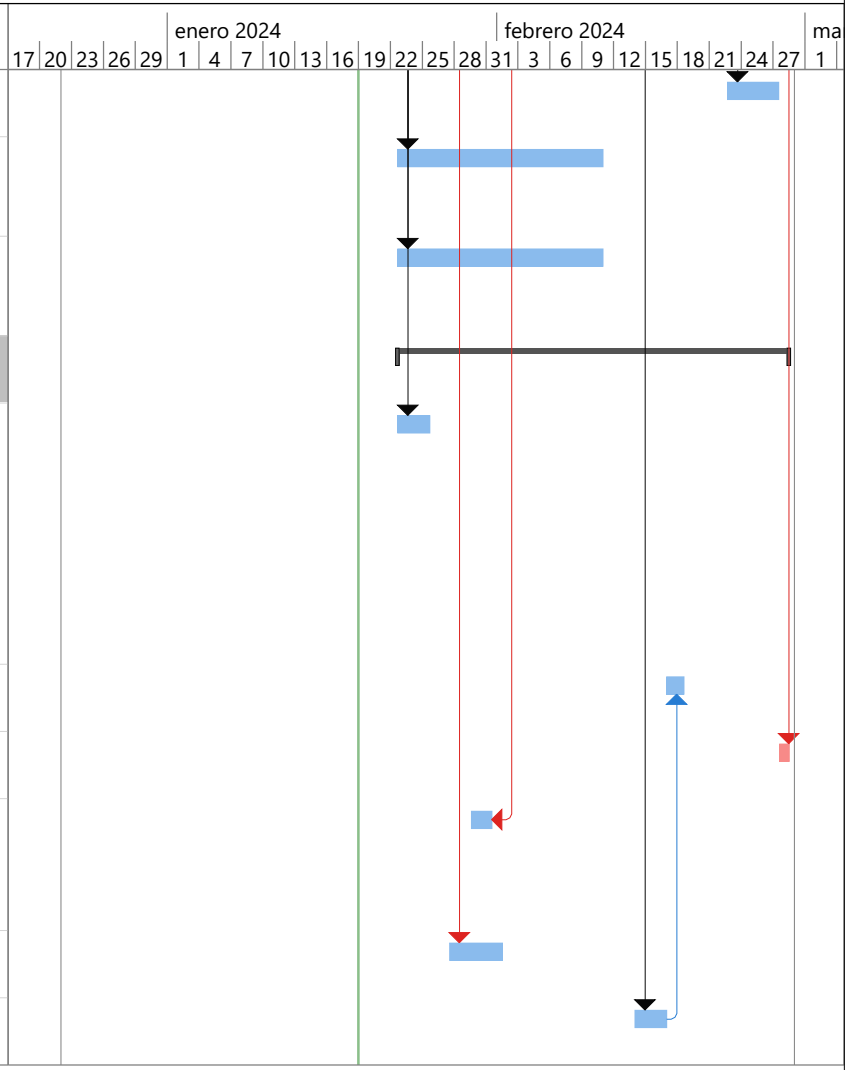

HACER DE COLOMBIA SAS
