ALFREDO VARGAS MARTINEZ
INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIÓN
INGENIERO CIVL

INFORME PARCIAL 02



CONTRATO DE OBRA No. MI-SAMC-004-2024

OBJETO: OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO E INSTALACION DE VALVULA REDUCTORA DE PRESION DEL MUNICIPIO DE IZA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

CONTRATISTA

ALFREDO VARGAS MARTINEZ

SUPERVISOR

YARLEY GERARDO PEDRAZA DIAZ

Carrera 15 bis No. 6-15 Sur Sogamoso, Cel 3133937930, e-mail: ing2006alfredov@yahoo.es

Scanned with OKEN Scanner

Contenido

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO....3
INTRODUCCION....4
OBJETIVOS....5
LOCALIZACION DEL PROYECTO....6
RESUMEN CARACTERISTICAS DEL CONTRATO:....7
SEGUIMIENTO FINANCIERO AL CONTRATO DE OBRA....8
CONTROL DE PÓLIZAS DEL CONTRATISTA DE OBRA....8
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PRESENTE INFORME....12
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES....13
ANEXO FOTOGRAFICO....14
SEÑALIZACIÓN....15
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO....18
RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)....20
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA....22
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D = 1" RDE 13.5....24
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC 2 PULGADAS RDE 21 U.M....25
VISITAS DE SEGUIMIENTO....27
ASEO GENERAL....28

Carrera 15 bis No. 6-15 Sur Sogamoso, Cel 3133937930, e-mail: ing2006alfredov@yahoo.es

Scanned with OKEN Scanner

INFORME PARCIAL DE OBRA

MARZO 27 DE 2025

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No.	*MI SAMC-004-2024*
OBJETO:	*"OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO E INSTALACION DE VALVULA REDUCTORA DE PRESION DEL MUNICIPIO DE IZA DEPARTAMENTO DE BOYACA*
CONTRATISTA:	*ALFREDO VARGAS MARTINEZ*
IDENTIFICACION	*CC No: 74.182.148 DE SOGAMOSO*
VALOR INICIAL CONTRATO:	*CIENTO CUARENTA MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON 58 CENTAVOS M/CTE ($140.123.883,58) .*
PLAZO INICIAL:	*CUARENTA Y CINCO DIAS (45)*
ACTA DE INICIO	*07 ENERO DE 2025*
ACTA SUSPENSION	*07 ENERO DE 2025*
ACTA REINICIO	*23 ENERO 2025*
PRORROGA	*CUARENTA Y CINCO DIAS*
ADICION RECURSOS	*SETENTA MILLONES VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 38 CENTAVOS*

Carrera 15 bis No. 6-15 Sur Sogamoso, Cel 3133937930, e-mail: ing2006alfredov@yahoo.es

Scanned with OKEN Scanner

INTRODUCCION

El municipio de Iza dentro de las actividades en temas de acueducto requiere la actualización y remodelación de redes del sistema al igual que mejorar el sistema de derivación de ducto principal de Coservicios realizando la apertura de zanjas e instalación de redes, tee de derivación y suministro de macromedidor, por lo que se efectúa el contrato de obra: "OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO E INSTALACION DE VALVULA REDUCTORA DE PRESION DEL MUNICIPIO DE IZA DEPARTAMENTO DE BOYACA. con un tiempo de ejecución de cuarenta y cinco días.

Una vez verificadas las necesidades adicionales en materia de suministro en el servicio de agua potable se requirió adicionar recursos para ampliar redes en el sector Colina Campestre y en la calle 5 salida hacia el municiplo de Sogamoso.

Carrera 15 bis No. 6-15 Sur Sogamoso, Cel 3133937930, e-mail: ing2006alfredov@yahoo.es

Scanned with OKEN Scanner

OBJETIVOS

Objetivo general

Realizar las adecuaciones necesarias para la instalación de válvula reductora de presión

Realizar el suministro e instalación de tubería para ampliar redes de acueducto en el municipio de Iza.

Objetivos específicos:

- Realizar cada una de las actividades del contrato
- Solicitar al municipio los permisos requeridos para el desarrollo del mismo
- Solicitar recomendaciones y ajustes a la secretaria de planeación, Unidad de servicios públicos para la optima ejecución de las actividades.
- Realizar las adecuaciones en e tiempo estipulado con el fin de brindar servicio ágil y eficiente.

Carrera 15 bis No. 6-15 Sur Sogamoso, Cel 3138837930, e-mail: [redacted]

Scanned with OKEN Scanner


LOCALIZACION DEL PROYECTO

Localización general



Localización especifica

- Barrio Sauzalin
- Sector Colina campestre

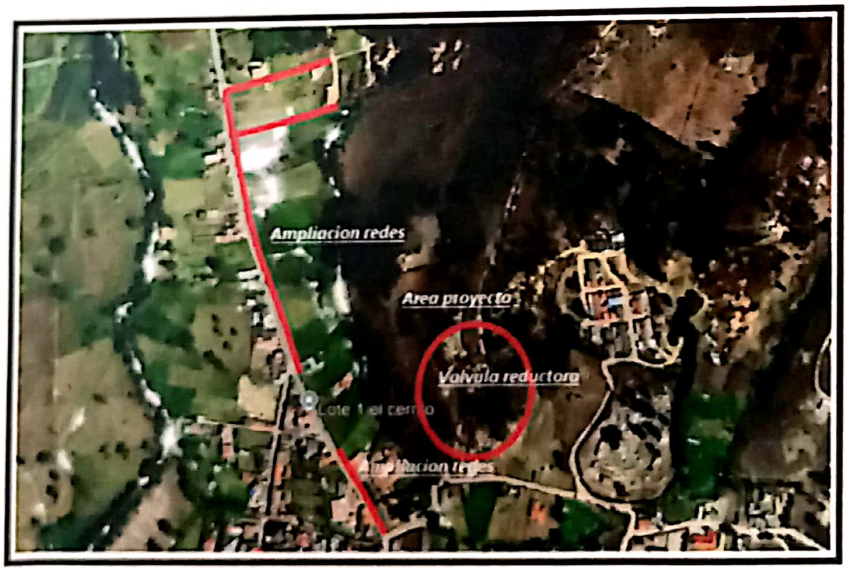

Carrera 15 bis No. 6-15 Sur Sogamoso, Cel 3133937930, e-mail: ing2006alfredov@yahoo.es

Scanned with OKEN Scanner

RESUMEN CARACTERISTICAS DEL CONTRATO:

FECHA PRESENTE INFORME:	27 de Marzo DE 2025
MODALIDAD DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA PUBLICA
NUMERO DE CONTRATO.	MI SAMC-004-2024
CONTRATANTE	*MUNICIPIO DE IZA NIT:981.856.625-1*
CONTRATISTA	***ALFREDO VARGAS MARTINEZ***
Identificación Dirección Teléfono Correo electrónico	*C.C. 74.182.148 DE SOGAMOSO* *Calle 2 No. 9-02 piso 2 DE SOGAMOSO.* *3133937930* *ing2006alfredov@yahoo.es*
OBJETO:	***OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO E INSTALACION DE VALVULA REDUCTORA DE PRESION DEL MUNICIPIO DE IZA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.***
VALOR TOTAL INICIAL	*CIENTO CUARENTA MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON 58 CENTAVOS M/CTE ($140.123.883,58) INCLUIDO AIU*
PLAZO DE EJECUCION INICIAL	El plazo para la ejecución del contrato será de cuarenta y cinco (45) dias contados desde la firma del acta de inicio.
FECHA DEL CONTRATO	*TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2024*
FECHA DEL ACTA DE INICIO	*07 DE ENERO DE 2025*
FECHA DE SUSPENSION 1:	*07 DE ENERO DE 2025*
FECHA DE REINICIO 1:	*23 DE ENERO DE 2025*
VALOR ADICIONAL	*SETENTA MILLONES VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 38 CENTAVOS*
TERMINO DE EJECUCIÓN FINAL	*NOVENTA DIAS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO*
FECHA DE TERMINACION	*VEINTITRES (23) DE ABRIL DE 2025*

Carrera 15 bis No. 6-15 Sur Sogamoso, Cel 3133937930, e-mail: ing2006alfredov@yahoo.es

Scanned with OKEN Scanner

SEGUIMIENTO FINANCIERO AL CONTRATO DE OBRA

BALANCE DEL CONTRATO	VALOR	PAGOS EFECTUADOS	PORCENTAJE Y/O EQUIVALENCIA
VALOR CONTRATO	$ 140.123.883,58		
ACTA PARCIAL No. 1		66.392.352,58	
VALOR ADICIONAL	$ 70.023.800,38		
VALOR PARCIAL 2		50.505.042,10	55,63 %
VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL O DE RECIBO FINAL		$ 93.250.289,28	44,37%
SUMAS IGUALES	$ 210.147.683,96	210.147.683,96	100%

CONTROL DE PÓLIZAS DEL CONTRATISTA DE OBRA

Según las condiciones del contrato suscrito, el contratista de acuerdo a la Cláusula SEPTIMA: GARANTIAS para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento el contratista deberá presentar la garantía de cumplimiento en original a la entidad.

Clase de Riesgos	%	Sobre el Valor	Vigencia
Cumplimiento del contrato	10	Del contrato	La del contrato y seis (6) meses más.
Calidad del servicio	10	Del contrato	La del contrato y seis (6) meses más.
Pago de salarios y prestaciones sociales	5	Del contrato	La del contrato y tres (3) años más.
Responsabilidad Civil extracontractual		EL MONTO SERA DE 200 SMLMV. NO APLICA %	La del contrato.
Estabilidad de la obra	10	Del contrato	El termino de ejecución del contrato y DOS (2) años más.

Carrera 15 bis No. 6-15 Sur Sogamoso, Cel 3133937930, e-mail: ing2006alfredov@yahoo.es

Scanned with OKEN Scanner

Póliza de Contrato de obra

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL-ANEXO 2

COMPAÑÍA ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A NIT 860.009.578-6
POLIZA SEGURO No.	**51-44-101028702**
FECHA DE EXPEDICIÓN:	24-01-2025

COBERTURAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	INICIAL	FINAL	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	07-01-2025	28-08-2025	$ 14.012.388,36
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	07-01-2025	28-02-2028	$7.006.194,18
CALIDAD DEL SERVICIO	07-01-2025	28-08-2025	$ 14.012.388,36
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	07-02-2025	28-02-2030	$14.012.388,36

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL-ANEXO 2

COMPAÑÍA ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A NIT 860.009.578-6
POLIZA SEGURO No.	**51-40-101009671**
FECHA DE EXPEDICIÓN:	24-01-2025

COBERTURAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	INICIAL	FINAL	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	07-01-2025	28-02-2025	260.000.000
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	07-01-2025	28-02-2025	130.000.000
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	07-01-2025	28-02-2025	130.000.000

Resolución de aprobación de pólizas del Municipio de Iza No. _____ de 2025 de fecha __ de _____ de 2025.

Se anexa copia de las pólizas descritas

Carrera 15 bis No. 6-15 Sur Sogamoso, Cel 3133937930, e-mail: ing2006alfredov@yahoo.es

Scanned with OKEN Scanner

Póliza de Contrato de obra Suspensión, reinicio Numero 1.

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL-ANEXO 4

COMPAÑÍA ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A NIT 860.009.578-6
POLIZA SEGURO No.	**51-44-101028702**
FECHA DE EXPEDICIÓN:	24-01-2025

COBERTURAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	INICIAL	FINAL	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	07-01-2025	13-09-2025	$ 14.012.388,36
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	07-01-2025	15-03-2028	$7.006.194,18
CALIDAD DEL SERVICIO	07-01-2025	13-09-2025	$ 14.012.388,36
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	28-02-2025	28-02-2030	$14.012.388,36

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL-ANEXO 3

COMPAÑÍA ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A NIT 860.009.578-6
POLIZA SEGURO No.	**51-40-101009671**
FECHA DE EXPEDICIÓN:	24-01-2025

COBERTURAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	INICIAL	FINAL	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	07-01-2025	15-03-2025	260.000.000
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	07-01-2025	15-03-2025	130.000.000
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	07-01-2025	15-03-2025	130.000.000

Resolución de aprobación de pólizas del Municipio de Iza No. _____ de 2025 de fecha __ de _____ de 2025.

Se anexa copia de las pólizas descritas

Carrera 15 bis No. 6-15 Sur Sogamoso, Cel 3133937930, e-mail. ing2006alfredov@yahoo.es

Scanned with OKEN Scanner

Póliza Adicional en valor y plazo

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL-ANEXO 6

COMPAÑÍA ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A NIT 860.009.578-6		
POLIZA SEGURO No.	51-44-101028702		
FECHA DE EXPEDICIÓN:	13-03-2025		
COBERTURAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	INICIAL	FINAL	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	07-01-2025	30-10-2025	$ 21.014.768,40
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	07-01-2025	30-04-2028	$10.507.384,20
CALIDAD DEL SERVICIO	07-01-2025	30-10-2025	$ 21.014.768,40
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	28-02-2025	28-02-2030	$21.014.768,40

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL-ANEXO 5

COMPAÑÍA ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A NIT 860.009.578-6		
POLIZA SEGURO No.	51-40-101009671		
FECHA DE EXPEDICIÓN:	13-03-2025		
COBERTURAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	INICIAL	FINAL	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	07-01-2025	30-04-2025	284.700.000
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	07-01-2025	30-04-2025	142.350.000
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	07-01-2025	30-04-2025	142.350.000

Resolución de aprobación de pólizas del Municipio de Iza No. 097 de 2025 de fecha 13 de Marzo de 2025.

Se anexa copia de las pólizas descritas

Carrera 15 bis No. 6-15 Sur Sogamoso, Cel 3133937930, e-mail: ing2006alfredov@yahoo.es

Scanned with OKEN Scanner

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PRESENTE INFORME

Excavación manual en material conglomerado

Relleno con material seleccionado proveniente de excavación compactado con plancha vibradora

Relleno para redes en arena de peña(suministro, extendido, humedecimiento y compactación)

Suministro e instalación tubería PVC presión d = 1" RDE 13.5

Suministro e instalación tubería PVC 2 pulgadas RDE 21 U.M

Se efectúa balance al presupuesto teniendo en cuenta el acta de mayores y menores cantidades

Carrera 15 bis No. 6-15 Sur Sogamoso, Cel 3133937930, e-mail: ing2006alfredov@yahoo.es

Scanned with OKEN Scanner

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Realizar las actividades con el acompañamiento constante de la unidad de servicios públicos con el fin de velar por el suministro constante de agua potable y evitar desperdicios por rupturas.

Se instalalaron diámetros de acuerdo a lo establecido a través de la Secretaria Planeación y de la Unidad de Servicios Públicos del municipio de Iza.

Ing. ALFREDO VARGAS MARTINEZ
CONTRATISTA

Carrera 15 bis No. 6-15 Sur Sogamoso, Cel 3133937930, e-mail: ing2006alfredov@yahoo.es

Scanned with OKEN Scanner

ANEXO FOTOGRAFICO

SEÑALIZACIÓN

EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO

RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)

RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D = 1" RDE 13.5

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC 2 PULGADAS RDE 21 U.M

VISITAS DE SEGUIMIENTO


ASEO GENERAL

Carrera 15 bis No. 6-15 Sur Sogamoso, Cel 3133937930, e-mail: ing2006alfredov@yahoo.es

Scanned with OKEN Scanner

SEÑALIZACIÓN



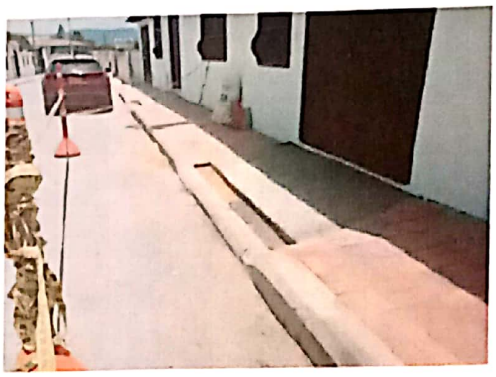









Carrera 15 bis No. 6-15 Sur Sogamoso, Cel 3133937930, e-mail: ing2006alfredov@yahoo.es

Scanned with OKEN Scanner














Carrera 15 bis No. 6-15 Sur Sogamoso, Cel 3133937930, e-mail: ing2006alfredov@yahoo.es

Scanned with OKEN Scanner

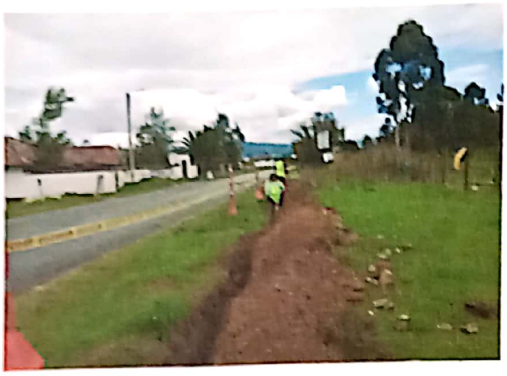







Carrera 15 bis No. 6-15 Sur Sogamoso, Cel 3133937930, e-mail: ing2006alfredov@yahoo.es

Scanned with OKEN Scanner

EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO













Carrera 15 bis No. 6-15 Sur Sogamoso, Cel 3133937930, e-mail: ing2006alfredov@yahoo.es

Scanned with OKEN Scanner














Carrera 15 bis No. 6-15 Sur Sogamoso, Cel 3133937930, e-mail: ing2006alfredov@yahoo.es

Scanned with OKEN Scanner

RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)



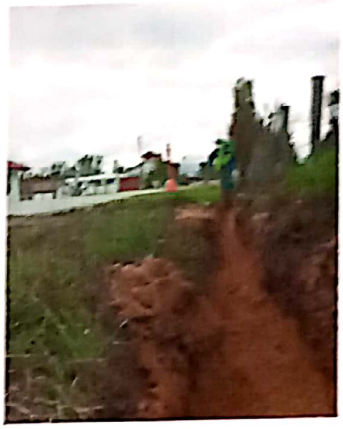











Carrera 15 bis No. 6-15 Sur Sogamoso, Cel 3133937930, e-mail: ing2006alfredov@yahoo.es


Scanned with OKEN Scanner

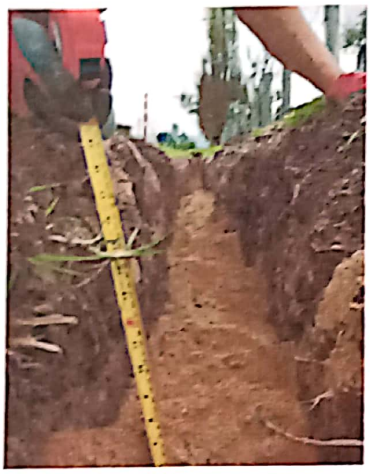

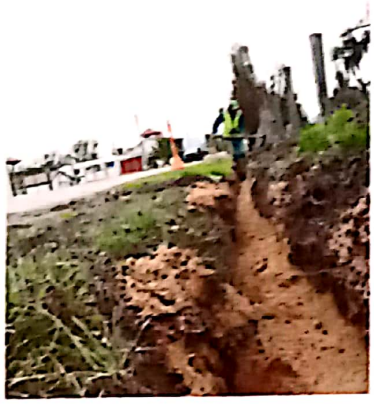





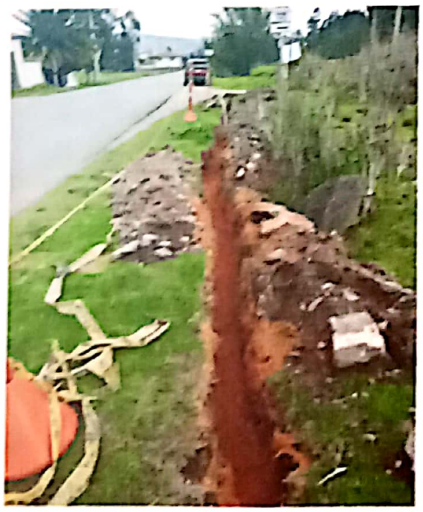



Carrera 15 bis No. 6-15 Sur Sogamoso, Cel 3133937930, e-mail: ing2006alfredov@yahoo.es

Scanned with OKEN Scanner

RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA













Carrera 15 bis No. 6-15 Sur Sogamoso, Cel 3133937930, e-mail: ing2006alfredov@yahoo.es

Scanned with OKEN Scanner














Carrera 15 bis No. 6-15 Sur Sogamoso, Cel 3133937930, e-mail: ing2006alfredov@yahoo.es

Scanned with OKEN Scanner

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D = 1" RDE 13.5





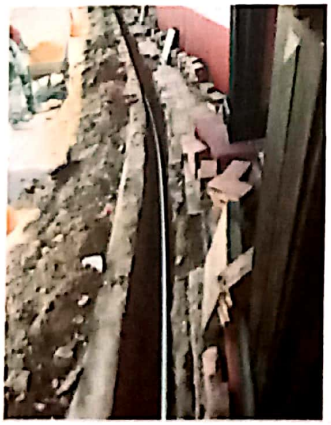


Carrera 15 bis No. 6-15 Sur Sogamoso, Cel 3133937930, e-mail: ing2006alfredov@yahoo.es

Scanned with OKEN Scanner

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC 2 PULGADAS RDE 21 U.M













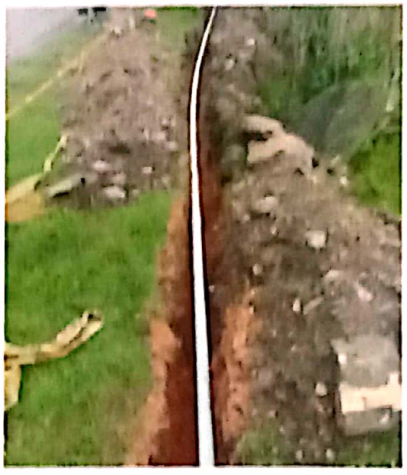


Carrera 15 bis No. 6-15 Sur Sogamoso, Cel 3133937930, e-mail: ing2006alfredov@yahoo.es

Scanned with OKEN Scanner



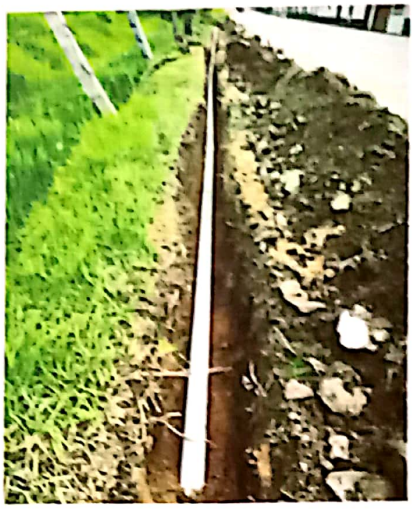

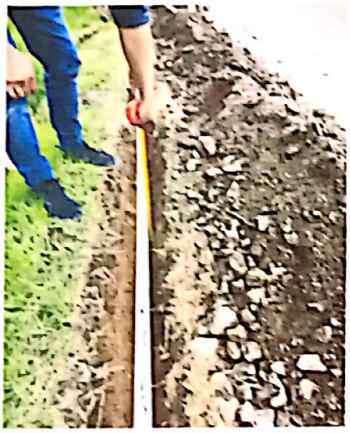







Carrera 15 bis No. 6-15 Sur Sogamoso, Cel 3133937930, e-mail: ing2305alfredo@yahoo.es

Scanned with OKEN Scanner

VISITAS DE SEGUIMIENTO















Carrera 15 bis No. 6-15 Sur Sogamoso, Cel 3133937930, e-mail: ing2006alfredov@yahoo.es


Scanned with OKEN Scanner

ASEO GENERAL







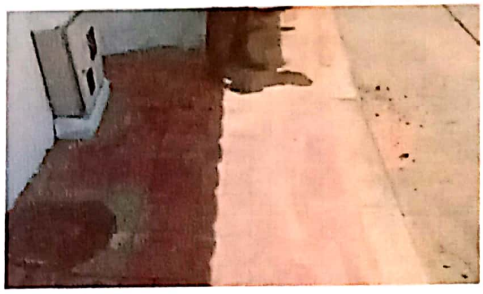





Carrera 15 bis No. 6-15 Sur Sogamoso, Cel 3133937930, e-mail: ing2006alfredov@yahoo.es

Scanned with OKEN Scanner

CORRESPONDENCIA

Carrera 15 bis No. 6-15 Sur Sogamoso, Cel 3133937930, e-mail: ing2006alfredov@yahoo.es

Scanned with OKEN Scanner

	COMUNICACIONES OFICIALES			
República de Colombia	NIT 891 856 077 - 1			Alcaldía Municipal de Iza
	VERSIÓN 04	CÓDIGO M-GT-T07	Página 1 de 1	

Iza 18 de febrero de 2025

Ingeniero
ALFREDO VARGAS MARTINEZ
Contratista MI SAMC -004-2024

REFERENCIA: CONTRATO No MI-SAMC-004-2024, OBJETO: OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO E INSTALACION DE VALVULA REDUCTORA DE PRESION DEL MUNICIPIO DE IZA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

Atento saludo Ingeniero Vargas.

De acuerdo a la reunión realizada en el despacho de la Alcaldía municipal entre el sr Alcalde EDGAR ALEXANDER AVELLA FLOREZ el supervisor del contrato ingeniero YARLEY GERARDO PEDRAZA el jefe de la unidad de servicios públicos ingeniero JORGE ENRIQUE PULIDO CHAPARRO en la cual se revisaron los planes de expansión reparación y mantenimiento de redes, la unidad de servicios públicos determino que para brindar servicio eficiente se requiere ampliación de 710 metros en tubería de dos pulgadas pvc en el sector *Colina Campestre, salida hacia el municipio de Sogamoso y 1100 metros* en tubería de dos pulgadas pvc en el sector san Miguel salida hacia el municipio de Cuítiva.

Al igual que se le solicita en coordinación con el supervisor implantar y verificar el área de la caja de la válvula reductora, y adicionar la tubería hacia el sector Sauzalin y tubería para el hidrante.

Por lo anterior requerimos que en coordinación con el supervisor del contrato realicen el balance de cantidades de obra de con el fin de realizar las actuaciones que se requieran.

Sin otro particular

EDGAR ALEXANDER AVELLA FLOREZ
Alcalde Municipal

JORGE ENRIQUE PULIDO CH.
Jefe Unidad de Servicios Públicos

YARLEY GERARDO PEDRAZA DIAZ
Secretario de Planeación y Obras
Supervisor

	NOMBRE	CARGO
[illegible]	[illegible]	[illegible]

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

374

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 01
CONTRATO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA
No. MI-SAMC-004-2024

1. INFORMACION CONTRATO

FECHA	TRECE (13) DE MARZO DE 2025
PERIODO:	DEL 23 DE ENERO AL 13 DE MARZO DEL 2025
CONTRATISTA	ALFREDO VARGAS MARTINEZ
C.C. / NIT.	74.182.148 DE SOGAMOSO
OBJETO	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO E INSTALACIÓN DE VALVULA REDUCTORA DE PRESION DEL MUNICIPIO DE IZA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DOCIENTOS DIEZ MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON 96 CENTAVOS M/CTE ($210.147.683,96)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CIENTO CUARENTA MILONES CIENTO VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON 58 CENTAVOS M/CTE ($140.123.683,58)
VALOR ADICIONAL DEL CONVENIO	SETENTA MILLONES VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 38 CENTAVOS M/CTE ($70.023.800,38)
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	TREINTA (30) DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024
FECHA DE INICIO	SIETE (07) DÍAS DEL MES DE ENERO DEL 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS
PRORROGA	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS
PLAZO TOTAL	NOVENTA (90) DIAS.
FECHA DE SUSPENSIÓN	SIETE (07) DÍAS DEL MES DE ENERO DEL 2025
TIEMPO DE SUSPENSIÓN	DIECISEIS (16) DIAS.
FECHA DE TERMINACIÓN CON ACTA DE REINICIO.	NUEVE (09) DE MARZO DE 2025.
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	VEINTITRES (23) DE ABRIL DE 2025
RUBRO(S) PRESUPUESTAL (ES) Y VALOR DE CADA RUBRO	2.3.2.01.01.001.03.08.01.02 DENOMINADO ACCESSO DE LA POBLACION PARA MENTENER AGUA POTABLE ALCANTARILLADO $83.092.129, RUBRO 2.3.2.02.02.009.02.01 DENOMINADO ACCESSO DE LA POBLACION PARA MENTENER AGUA POTABLE ACUEDUCTO $ 19.595.879, RUBRO 2.3.2.02.02.009.02.01, DENOMINADO ACCESSO DE LA POBLACION PARA MENTENER AGUA POTABLE ACUEDUCTO $37.435.875,58. 2.3.2.02.02.005.11 CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN – ACUEDUCTOS OPTIMIZADOS $70.023.800,38
DISPONIBILIDAD	2024000250 - 2025000078
REGISTRO	2024000313 - 2025000074
GARANTIAS	51-44-101028702 - 51-40-101009671
NOMBRE DEL SUPERVISOR	YARLEY GERARDO PEDRAZA DIAZ

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

2. COMPONENTE CONTABLE Y FINANCIERO

ITEM	CONCEPTO	VALORES
A	VALOR INICIAL	$ 140.123.883,58
B	VALOR ADICIONADO	$ 70.023.800,38
C	VALOR TOTAL (A+B)	$210.147.683,96
E	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$66.392.352,58
F	VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS	$ 0,00
G	VALOR EJECUTADO (E+F)	$66.392.352,58
H	SALDO POR EJECUTAR (C-G)	$143.755.331,38

Se firma por los que en ella intervienen en Iza el Trece (13) de marzo del año 2025.

ALFREDO VARGAS MARTINEZ
Contratista

YARLEY GERARDO PEDRAZA DÍAZ
Supervisor

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

ADICIÓN EN VALOR Y PRORROGA No. 1 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No MI-SAMC-004-2024 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE IZA – BOYACÁ Y ALFREDO VARGAS MARTINEZ

FECHA	SIETE (07) DÍAS DEL MES DE MARZO DE 2025
NUMERO DE CONTRATO	MI-SAMC-004-2024
CONTRATANTE:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE IZA NIT 891-856 077-3 R/L EDGAR ALEXANDER AVELLA FLOREZ
CONTRATISTA	ALFREDO VARGAS MARTINEZ
Identificación	C C No 74.182.148 expedida en Sogamoso
OBJETO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO E INSTALACION DE VALVULA REDUCTORA DE PRESION DEL MUNICIPIO DE IZA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
VALOR TOTAL CONTRATO:	DOSCIENTOS DIEZ MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON 96 CENTAVOS M/CTE ($210 147 683,96)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CIENTO CUARENTA MILLONES CIENTO VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON 58 CENTAVOS M/CTE ($140 123 883,58)
VALOR ADICIONAL CONVENIO	SETENTA MILLONES VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 38 CENTAVOS M/CTE ($70 023 800,38)
FECHA ACTA DE INICIO	Siete (07) dias del mes de enero de 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS
PRORROGA	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS.
PLAZO TOTAL	noventa (90) dias
FECHA DE SUSPENSIÓN	SIETE (07) DE ENERO DE 2025
TIEMPO DE SUSPENSIÓN	DIECISÉIS (16) DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN CON ACTA DE REINICIO	NUEVE (09) DE MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	veintitrés (23) de abril de 2025
SUPERVISIÓN	YARLEY GERARDO PEDRAZA DIAZ
ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7170944

Entre los suscritos EDGAR ALEXANDER AVELLA FLOREZ, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No.1.053.538.030 de Iza en su calidad de Alcalde del Municipio de IZA (Boyacá), posesionado por la Notaria del Circulo de Pesca Boyacá según consta en la Escritura Publica No. 501 de Diciembre 29 de 2023, en uso de sus funciones y facultades para contratar contenidas en la Constitución Política de Colombia de 1991, ley 136 de 1994, 1551 de 2012, ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, y actuando en nombre y representación de la alcaldía del municipio de IZA - Boyacá con NIT. 891.856 077-3, y quien para efectos del presente Adicional se denominará el CONTRATANTE, debidamente facultado para suscribir contratos, de conformidad con lo dispuesto en la ley 136 de 1994, la ley 1150 de 2007, la ley 1551 de 2012, la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007 y las normas civiles y comerciales que legislan sobre la materia, y quien en adelante se denominará el MUNICIPIO como CONTRATANTE, por una parte y por la otra JOHN ALFREDO VARGAS MARTINEZ Identificado con c.c. 74.182.148 de Sogamoso, mayor de

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

edad, quien declara bajo gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma del presente documento, que no se encuentra incurso en causal alguna de inhabilidad, incompatibilidad y prohibición para contratar de conformidad con los numerales 1° y 2° del artículo 8° de la Ley 80 de 1993, Ley 617 de 2000 y el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, y demás normas concordantes y quien en adelante se denominará contractualmente como el CONTRATISTA hemos convenido celebrar la presente ADICIÓN EN VALOR Y PRORROGA No 1 AL CONTRATO DE OBRA SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No MISAMC-004-2024, teniendo en cuenta las siguientes, CONSIDERACIONES 1. Que el municipio de Iza Boyacá, realizo el proceso de contratación de Menor cuantía No MISAMC-004-2024, CUYO OBJETO ES "OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO E INSTALACION DE VALVULA REDUCTORA DE PRESION DEL MUNICIPIO DE IZA DEPARTAMENTO DE BOYACA" 2. Que de fecha Siete (7) días del mes de enero de 2025 se suscribió acta de inicio al presente contrato de selección abreviada de menor cuantía No MISAMC-004-2024 3. Que según comité de obra realizado el día 21 de febrero de 2025 se puedo identificar que el área definida para construir la caja en concreto donde quedara la válvula reductora debe tener el suficiente espacio para manipular y realizar posibles mantenimientos posteriores por lo que se requiere un área de 3,20*3,20 por lo que el volumen de excavación en roca, concreto para muros y placas es superior al contratado al igual que el acero de refuerzo 4. Que realizada la zanja para la instalación de tubería de tres pulgadas el supervisor solicito incluir una red de 2 pulgadas que suministrara el servicio al sector Sauzalin y una red de 3 pulgadas que conectara al hidrante ubicado en el área del proyecto. 5. Visitados los sectores dentro del municipio de Iza el supervisor y el contratista realizan medidas para instalar red de acueducto en el sector a la salida hacia el municipio de Sogamoso y hacia el municipio de Cuitiva 6 Que de esa visita se realizó la cabana de mayores y menores cantidades al igual que la memoria de cantidades las cuales son presentadas en el comité y se avala por las partes la ejecución de las actividades planteadas en está definiéndose que se requiere una adición de SETENTA MILLONES VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 38 CENTAVOS MCTE ($70.023.800,38) 7. Que con base en las consideraciones expuestas hemos acordado celebrar el presente adicional que se regirá por las siguientes cláusulas: CLAUSULA PRIMERA Modificar la Clausula segunda obligaciones de las partes de tal manera que se realizará las siguientes actividades

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	OTRO	CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR
1.00	CONSTRUCCION								
		UN	1.00	$	$	1	0.00	0.00	$
		UN	2.00	$	$	1	1.00	2.00	$
		UN	2.00	$	$	1	2.00	1.00	$
		UN	0.00	$	$		0.00	0.00	$
		M	0.00	$	$	1	0.00	0.00	$
		UN	0.00	$	$		1.00	0.00	$
		UN	1.00	$	$		1.00	1.00	$
		UN	1.00	$	$		1.00	1.00	$
		UN	1.00	$	$		1.00	1.00	$
		UN	1.00	$	$	1	1.00	1.00	$
		UN	1.00	$	$		1.00	1.00	$
		UN	1.00	$	$		1.00	1.00	$

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

	ITEM PVC								
		M		$	$				
		UND		$	$				
		UND		$	$				
		UND		$	$				
		UND		$	$				
		M3		$	$				
		M		$	$				
		UND		$	$				
		M		$	$				
		UND		$	$				
		UND		$	$				
		M3		$	$				
		M3		$	$				
		M3		$	$				
		U		$	$				
		M3		$	$				
		M3		$	$				
	ACTIVIDADES NO CONTEMPLADAS								
		M2		$					
		M		$					
		UND		$					
		UND		$					
		UND		$					
		M		$					
		UND		$					
		UND		$					
		UND		$					
		M		$					
		M		$					
		M3		$					
	TOTAL				$				
	ADMINISTRACION 22%				$				
	IMPREVISTOS 4%				$				
	UTILIDAD 4%				$				
TOTAL					$				

CLAUSULA SEGUNDA: Modificar la cláusula sexta adicionando la suma de SETENTA MILLONES VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 38 CENTAVOS M/CTE ($70 023 800,38), según Certificado de disponibilidad presupuestal No. 2025000078 a cargo al rubro 2 3 2.02.02.005.11.40.4003.4003017 denominado construcción y servicios de la construcción – acueductos optimizados Alcaldía expedida por el secretario de Hacienda **CLAUSULA TERCERA:** Modificar la cláusula octava. plazo de duración del contrato noventa (90) días. **CLÁUSULA CUARTA: DOCUMENTOS**: presente adicional y prorroga obliga jurídicamente a las partes los documentos que a continuación se relacionan **a)** Estudio Previo para el adicional en valor, en plazo, y modificatorio **b)** Disponibilidad presupuestal. **c)** Registro presupuestal. **d)** Todos los demás documentos

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

relativos al mismo, suscritos y cruzados entre las partes. **CLAUSULA QUINTA:** El presente documento se perfecciona con la firma de las partes y la aprobación de la modificación de las garantías. **CLAUSULA SEXTA**: Las demás cláusulas que no fueron modificadas por el presente MODIFICATORIO, conservan su vigencia y alcance.

Para constancia se firma a los siete (07) días del mes de marzo del año dos mil veinticinco (2025).

EL MUNICIPIO.

EDGAR ALEXANDER AVELLA FLOREZ
Alcalde Municipal

EL CONTRATISTA

ALFREDO VARGAS MARTINEZ
CC No. 74.182.148 de Sogamoso

	NOMBRE	CARGO
ELABORÓ	ING. NUBIA MILENA RODRIGUEZ	CONTRATISTA
REVISÓ	LILIANA ISABEL MESA DIAZ	ASESORA JURIDICA
APROBÓ	EDGAR ALEXANDER AVELLA FLOREZ	ALCALDE MUNICIPAL

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

ADICIÓN EN VALOR Y PRORROGA No. 1 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No MI-SAMC-004-2024 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE IZA – BOYACÁ Y ALFREDO VARGAS MARTINEZ

a) Que con fecha treinta (03) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) se firmó CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No MI-SAMC-004-2024 cuyo objeto es "OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO E INSTALACIÓN DE VALVULA REDUCTORA DE PRESION DEL MUNICIPIO DE IZA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ", de conformidad con las condiciones, características y especificaciones señaladas en los estudios previos y la propuesta presentada por el contratista

b) Que con fecha 07 de enero de 2025, se firmó el acta de inicio al contrato de obra

c) Que la secretaria de planeación y obras publicas el dia 21 de febrero de los corrientes realizó Comite de obra con el fin de revisar el avance y estado de los trabajos adelantados, asi como las actividades por ejecutarse encontrandose la necesidad de ejecutar algunas actividades que No se encuentran establecidas en el contrato, pero que en todo caso resultan imprescindibles para la correcta terminación de la obra

d) Que la obra No contempla para su correcta ejecución se requiere que el área definida para construir la caja en concreto donde quedara la válvula reductora debe tener el suficiente espacio para manipular y realizar posibles mantenimientos posteriores por lo que se requiere un área de 3.20*3.20 por lo que el volumen de excavación en roca, concreto para muros y placas es superior al contratado al igual que el acero de refuerzo

e) Que para el control del flujo de las redes hidràulicas se requiere un pozo de mayor profundidad al final de la red e inicio del colector final, obras no contempladas en el contrato.

f) Que . Que realizada la zanja para la instalación de tubería de tres pulgadas el supervisor solicito incluir una red de 2 pulgadas que suministrara el servicio al sector Sauzalin y una red de 3 pulgadas que conectara al hidrante ubicado en el área del proyecto.

g) Que Visitados los sectores dentro del municipio de Iza el supervisor y el contratista realizan medidas para instalar red de acueducto en el sector a la salida hacia el municipio de Sogamoso y hacia el municipio de Cuitva

h) Que Que de esa visita se realizo la sabana de mayores y menores cantidades al igual que la memoria de cantidades las cuales son presentadas en el comité y se avala por las partes la ejecución de las actividades planteadas en está definiéndose que se requiere una adición de SETENTA MILLONES VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 38 CENTAVOS M/CTE ($70.023.800,38) y prorroga por veinte (20) días.

i) En virtud del principio de economía las normas que fijan los procedimientos se utilizan para agilizar las decisiones así mismo los procedimientos se deberán adelantar en el menor tiempo y con la menor cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos.

Que se busca celebrar ADICIONAL Nº 1 Y PRORROGA Nº. 1 AL **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No MI-SAMC-004-2024** SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE G IZA – BOYACÁ Y ALFREDO VARGAS MARTINEZ, cuyo objeto es "OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO E INSTALACIÓN DE VALVULA REDUCTORA DE PRESION DEL MUNICIPIO DE IZA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ "

j) Que la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015 establecen la posibilidad de modificar, adicionar y prorrogar los contratos los cuales Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

2) Que se determina la necesidad de efectuar adición, prorroga a celebrar ADICIONAL Nº. 1 Y PRORROGA Nº 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No MI-SAMC-004-2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE G IZA – BOYACÁ Y ALFREDO VARGAS MARTINEZ

3) Que con ocasión a los cambios referidos se requiere ajustar el alcance contractual en relación a la adquisición adicional, para una prórroga de cuarenta y cinco (45) días

4) Que el supervisor del contrato considera viable y ajustada la adición, prorroga y aclaratorio comentado en numerales anteriores.

5) Que se cuenta con disponibilidad presupuestal expedida por la Secretaria de Hacienda.

6) Que el valor que se pretende adicionar no supera el 50% del valor inicial.

7) Que la presente adición y prorroga no genera modificación del objeto contractual

Para respaldar el valor adicionar el municipio cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 2025000078 de fecha 03 de marzo, rubro 2.3.2.02.02.005.11.40.4003.4003017 denominado construcción y servicios de la construcción – acueductos optimizados Alcaldía de la vigencia fiscal 2025 por un valor de SETENTA MILLONES VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 38 CENTAVOS M/CTE ($70.023.800,38)

En el sentido de prorrogar el plazo cuarenta y cinco (45) días. se establece como plazo total el siguiente noventa (90) días.

YARLEY GERARDO PEDRAZA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS

	NOMBRE	CARGO
ELABORÓ	ING. NENA MILENA RODRIGUEZ	CONTRATISTA
REVISÓ	EDGAR ALEXANDER AVELLA FLOREZ	ALCALDE MUNICIPAL
APROBÓ	EDGAR ALEXANDER AVELLA FLOREZ	ALCALDE MUNICIPAL

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

MEMORIA DE CANTIDADES

Carrera 15 bis No. 6-15 Sur Sogamoso, Cel 3133937930, e-mail: ing2006alfredov@yahoo.es

Scanned with OKEN Scanner

OBRA	OBRAS DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO E INSTALACION DE VALVULA REDUCTORA DE PRESION DEL MUNICIPIO DE IZA DEPARTAMENTO DE BOYACA

MUNICIPIO DE IZA DEPARTAMENTO DE BOYACA	FORMATO	VERSIÓN: 0 CODIGO 01 FECHA: Enero 2025

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA	OBRAS DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO E INSTALACION DE VALVULA REDUCTORA DE PRESION DEL MUNICIPIO DE IZA DEPARTAMENTO DE BOYACA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	CAP 3 ITEMS NO PREVISTOS	UNIDAD:	UmIN
ITEM:	3,11 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC 2 PULGADAS RDE 21 U.M	CANTIDAD:	685,00

AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO				
Tuberia 2 pulgadas	685,00					1,00	ml	685,00
Aproxima Resultado a :			2	Decimales			TOTAL	685,00

ESQUEMA GRAFICO





ALFREDO VARGAS MARTINEZ
CONTRATISTA

YARLEY GERARDO PEDRAZA DIAZ
SUPERVISOR

Scanned with OKEN Scanner

OBRA:	OBRAS DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO E INSTALACION DE VALVULA REDUCTORA DE PRESION DEL MUNICIPIO DE IZA DEPARTAMENTO DE BOYACA

MUNICIPIO DE IZA DEPARTAMENTO DE BOYACA	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CODIGO 01
		FECHA: Enero 2025

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	OBRAS DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO E INSTALACION DE VALVULA REDUCTORA DE PRESION DEL MUNICIPIO DE IZA DEPARTAMENTO DE BOYACA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	CAP 2 RED PVC		
ITEM:	2,13 RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO EXTENDIDO HUMEDECIMINETO Y COMPACTACION)	UNIDAD:	M3
		CANTIDAD:	29,30

AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO				
Tuberia 2 pulgadas	685,00	0,30	0,12					24,66
Tuberia 1 pulgada	129,00	0,30	0,12					4,64
Aproxima Resultado a :			2	Decimales			TOTAL	29,30

ESQUEMA GRAFICO



ALFREDO VARGAS MARTINEZ
CONTRATISTA

YARLEY GERARDO PEDRAZA DIAZ
SUPERVISOR

Scanned with OKEN Scanner

OBRA:	OBRAS DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO E INSTALACION DE VALVULA REDUCTORA DE PRESION DEL MUNICIPIO DE IZA DEPARTAMENTO DE BOYACA

MUNICIPIO DE IZA DEPARTAMENTO DE BOYACA	FORMATO	VERSIÓN: 0 CODIGO 01 FECHA: Enero 2025

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	OBRAS DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO E INSTALACION DE VALVULA REDUCTORA DE PRESION DEL MUNICIPIO DE IZA DEPARTAMENTO DE BOYACA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	CAP 2 RED PVC	UNIDAD:	M3
ITEM:	2,14 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACION COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	CANTIDAD:	68,38

AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO				
Tuberia 2 pulgadas	685,00	0,30	0,28			1,00	M3	57,54
Tuberia 1 pulgada	129,00	0,30	0,28			1,00	M3	10,84
Aproxima Resultado a :				2	Decimales		TOTAL	68,38

ESQUEMA GRAFICO



ALFREDO VARGAS MARTINEZ
CONTRATISTA

YARLEY GERARDO PEDRAZA DIAZ
SUPERVISOR

Scanned with OKEN Scanner

OBRA:	OBRAS DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO E INSTALACION DE VALVULA REDUCTORA DE PRESION DEL MUNICIPIO DE IZA DEPARTAMENTO DE BOYACA

MUNICIPIO DE IZA DEPARTAMENTO DE BOYACA	FORMATO	VERSION: 4 CODIGO: 01 FECHA: Enero 2026

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	OBRAS DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO E INSTALACION DE VALVULA REDUCTORA DE PRESION DEL MUNICIPIO DE IZA DEPARTAMENTO DE BOYACA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	CAP 2 RED PVC	UNIDAD:	M3
ITEM:	2.3.4 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	CANTIDAD:	97,62

AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO				
Tuberia 2 pulgadas	685,00	0,30	0,40			1,00	M3	82,20
Tuberia 1 pulgada	129,00	0,30	0,40			1,00	M3	15,48
	Aproxima Resultado a :			2	Decimales		TOTAL	97,68

ESQUEMA GRAFICO





ALFREDO VARGAS MARTINEZ
CONTRATISTA

YARLEY GERARDO PEDRAZA DIAZ
SUPERVISOR

Scanned with OKEN Scanner

OBRA:	OBRAS DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO E INSTALACION DE VALVULA REDUCTORA DE PRESION DEL MUNICIPIO DE IZA DEPARTAMENTO DE BOYACA

MUNICIPIO DE IZA DEPARTAMENTO DE BOYACA	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CODIGO 01
		FECHA: Enero 2025

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


OBRA:	OBRAS DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO E INSTALACION DE VALVULA REDUCTORA DE PRESION DEL MUNICIPIO DE IZA DEPARTAMENTO DE BOYACA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO	CAP 2 RED PVC	UNIDAD:	ML
ITEM:	2,10 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC PRESION D 1" RDE 13,5	CANTIDAD:	129,00

AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO				
Tuberia 1 pulgada	129,00						m	129,00
Aproxima Resultado a :				2	Decimales		TOTAL	129,00

ESQUEMA GRAFICO

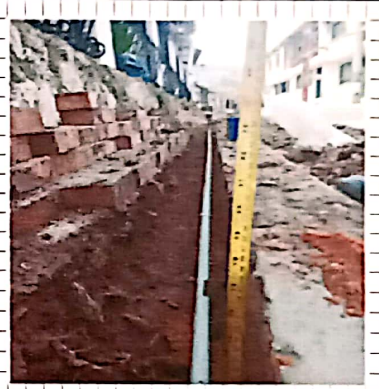

ALFREDO VARGAS MARTINEZ
CONTRATISTA

YARLEY GERARDO PEDRAZA DIAZ
SUPERVISOR

Scanned with OKEN Scanner

SEGURIDAD SOCIAL

Carrera 15 bis No. 6-15 Sur Sogamoso, Cel 3133937930, e-mail: ing2006alfredov@yahoo.es

Scanned with OKEN Scanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 74382148		VARGAS MARTINEZ ALFREDO	A - 200 O MAS COTIZANTES	AYUDANTE	K 13 10 27	PAYA-BOYACA	3125426864	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	45055208	9483222430	E	2025/03/12	2025/03/18	BANCO DE OCCIDENTE	6	$1,914,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: AYUDANTE (5 Afiliados)						$6,168,500	$987,000			$6,168,500	$247,000			$6,065,584	$242,900			$6,168,500	$429,500		$0	$0
Centro de Trabajo: AYUDANTE (5 Afiliados)						$6,168,500	$987,000			$6,168,500	$247,000			$6,065,584	$242,900			$6,168,500	$429,500		$0	$0
Ciudad: PAYA Depto: BOYACA (5 Afiliados)						$6,168,500	$987,000			$6,168,500	$247,000			$6,065,584	$242,900			$6,168,500	$429,500		$0	$0
1	CC	1002740706	AVELLA JULIETH	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
2	CC	79785819	DUARTE JOSE	230201	25	$1,186,250	$189,800	EPS041	25	$1,186,250	$47,500	CCF10	25	$1,186,250	$47,500	14-23	25	$1,186,250	$82,600	25	$0	$0
3	CC	7162890	LA ROTTA HECTOR	25-14	25	$1,186,250	$189,800	EPS005	25	$1,186,250	$47,500	CCF10	25	$1,186,250	$47,500	14-23	25	$1,186,250	$82,600	25	$0	$0
4	CC	7126890	RODRIGUEZ EDWIN	230301	25	$1,186,250	$189,800	EPS037	25	$1,186,250	$47,500	CCF10	25	$1,083,334	$43,400	14-23	25	$1,186,250	$82,600	25	$0	$0
5	CC	74325446	VANEGAS MARCO	230301	25	$1,186,250	$189,800	EPS037	25	$1,186,250	$47,500	CCF10	25	$1,186,250	$47,500	14-23	25	$1,186,250	$82,600	25	$0	$0
Total	**Afiliados(5)**					$6,168,500	$987,000			$6,168,500	$247,000			$6,065,584	$242,900			$6,168,500	$429,500		$0	$0

Scanned with OKEN Scanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 74182148		VARGAS MARTINEZ ALFREDO	A - 200 O MAS COTIZANTES	AYUDANTE	K 13 10 27	PAYA-BOYACA	3125426864	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	450955208	9483222430	E	2025/03/12	2025/03/18	BANCO DE OCCIDENTE	6	$1.914.000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$987,000	$3,900	$0	$990,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$417,600	$1,600	$0	$419,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$379,600	$1,500	$0	$381,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$189,800	$800	$0	$190,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$429,500	$1,700	$0	$431,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	5	$429,500	$1,700	$0	$431,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$242,900	$1,000	$0	$243,900
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	5	$242,900	$1,000	$0	$243,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$247,000	$1,000	$0	$248,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$152,000	$600	$0	$152,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$47,500	$200	$0	$47,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$47,500	$200	$0	$47,700
TOTAL				**5**	**$1,906,400**	**$7,600**	**$0**	**$1,914,000**

2025/03/18 04:12 PM

Scanned with OKEN Scanner

ACTA PARCIAL 02

Carrera 15 bis No. 6-15 Sur Sogamoso, Cel 3133937930, e-mail: ing2006alfredov@yahoo.es

Scanned with OKEN Scanner

MUNICIPIO DE IZA - BOYACÁ SECRETARIA DE PLANEACIÓN ACTA PARCIAL #2	CONTRATO No. MI-SAMC-004-2024 OBJETO: OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO E INSTALACION DE VALVULA REDUCTORA DE PRESION DEL MUNICIPIO DE IZA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. Contratista: ALFREDO VARGAS MARTINEZ Supervisor: YARLEY GERARDO PEDRAZA DIAZ Valor Inicial Contrato: $140.123.883,58 Valor Total Contrato: $ 210.147.693,96	PLAZO (45) DIAS INICIO ENERO 07 2025 SUSPENSION 1 ENERO 07 2025 REINICIO 1 ENERO 23 2025 PARCIAL 1 MARZO 06 2025 Valor Adicional $ 70.023.800,38	VALOR PARCIAL 2 $ 50.505.042,10 PARCIAL 2 MARZO 31 2025 PLAZO INICIAL 45 DIAS PLAZO ADCIONAL 45 DIAS

CONDICIONES ORIGINALES						MAYORES Y MENORES PARA ADICIONAR		CONDICIONES ACTUALIZADAS		SABANA PARCIAL 1		SABANA PARCIAL 2	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	P.UNITARIO	VALOR	(+/-)	CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR				
1.00	VALVULA REDUCTORA												
1.01	CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	M3	3,95	$ 1.004.308,23	$ 3.967.017,50	+	0,11	4,06	$ 4.077.491,41	4,06	$ 4.077.491,41		
1.02	CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	M3	0,90	$ 961.647,52	$ 865.482,76	+	1,15	2,05	$ 1.971.377,42	2,05	$ 1.971.377,42		
1.03	CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS	M3	0,90	$ 839.445,61	$ 755.501,04	+	0,92	1,82	$ 1.531.148,79		$ -		
1.04	EXCAVACION EN ROCA CON COMPRESOR Y DINAMITA	M3	10,40	$ 241.343,15	$ 2.509.968,76	-	-10,40	0,00	$ -		$ -		
1.05	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	KG	452,00	$ 7.002,12	$ 3.164.958,24	+	388,00	840,00	$ 5.881.780,80	720,00	$ 5.041.526,40		
1.06	SUMINSTRO E INSTALACION TAPA CON MARCO METALICA SECCION 60X80 PARA CAMARA	UND	1,00	$ 258.950,00	$ 258.950,00	-	-1,00	0,00	$ -		$ -		
1.07	SUMINISTRO VALVULA REDUCTORA DE PRESION, MODELO 720 DE 2" CUERPO EN HD, ACTUADOR DOBLE CÁMARA, CONEXIÓN BRIDA ANSI CLASE 150. PILOTO METÁLICO CON ÚNICA CONSIGNA AGUAS ABAJO (INCLUYE ACCESORIOS Y TRANSICION A SERVICIO)	UND	1,00	$ 39.489.652,00	$ 39.489.652,00		0,00	1,00	$ 39.489.652,00		$ -		
1.08	SUMINISTRO E INSTALACION BYPASS 2" CON VALUVULA DE ALIVIO	UND	1,00	$ 7.865.850,00	$ 7.865.850,00		0,00	1,00	$ 7.865.850,00		$ -		
1.09	SUMINISTRO E INSTALACION MACRO MEDIDOR DE CAUDAL (INCLUYE ACCESORIOS Y VALVULA COMPUERTA 2")	UND	1,00	$ 8.556.471,00	$ 8.556.471,00		0,00	1,00	$ 8.556.471,00		$ -		
1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA MARIPOSA D=3"	UND	1,00	$ 652.204,91	$ 652.204,91	+	0,00	1,00	$ 652.204,91	1	$ 652.204,91		
1.11	SUMINISTRO E INSTALACION COLLARIN METALICO 8X1" (INCLUYE PERFORACION)	UND	1,00	$ 556.470,00	$ 556.470,00	-	-1,00	0,00	$ -		$ -		
1.12	SUMINISTRO E INSTALACION REDUCCION METALICA 2"X1" BRIDAS Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y SERVICIO	UND	1,00	$ 486.470,00	$ 486.470,00		-1,00	0,00	$ -		$ -		

Scanned with OKEN Scanner

1.13	SUMINISTRO E INSTALACION VÁLVULA DE CHEQUE H.F. D = 3" E. BRIDA	UND	1,00	$ 1.265.576,73	$ 1.265.576,73		0,00	1,00	$ 1.265.576,73		$		
	RED PVC						0,00				$		
2.01	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC D=3" RDE 11 UNION MECANICA	ML	127,00	$ 80.244,80	$ 10.191.089,60	+	177,00	0,00	$		$		
2.02	CODO PVC RADIO CORTO 90° D = 3"	UND	1,00	$ 143.932,99	$ 143.932,99		1,00	0,00	$		$		
2.03	CODO PVC GRAN RADIO 45° RDE 21 D=3"	UND	1,00	$ 99.265,82	$ 99.265,82		1,00	0,00	$		$		
2.04	CODO PVC GRAN RADIO 22 1/2° RDE 21 D=3"	UND	1,00	$ 66.142,29	$ 66.142,29		1,00	0,00	$		$		
2.05	CODO PVC RADIO CORTO 90° D = 3"	UND	2,00	$ 143.932,99	$ 287.865,98		0,00	2,00	$ 287.865,98		$		
2.06	CODO PVC GRAN RADIO 45° RDE 21 D=3"	UND	2,00	$ 99.265,82	$ 198.531,64		2,00	0,00	$		$		
2.07	EXCAVACION EN ROCA CON COMPRESOR Y DINAMITA (RED TUBERIA 3", 1" Y 1/2")	M3	51,36	$ 241.343,15	$ 12.395.884,18		51,36	0,00	$		$		
2.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO TUBERIA PVC-P 1/2" RDE 9	ML	135,00	$ 12.900,10	$ 1.734.764,50		70,00	65,00	$ 895.256,50	65,00	$ 895.256,50		
2.09	SUMINISTRO E INSTALA CION REGISTRO CORTINA ROSCADO REDWHITE 1/2"	UND	1,00	$ 46.565,28	$ 46.565,28	+	5,00	4,00	$ 185.261,12		$		
2.10	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA PVC PRESION D = 1" RDE 13.5	ML	147,00	$ 13.557,70	$ 2.041.461,90		37,00	110,00	$ 1.527.547,00		$	329,00	4.799.553,90
2.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA 3/4" Y INCLUYE TUBERÍA PE + UAD 1" , REGISTRO DE CORTE, ACCESORIOS DERIVACIÓN Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS PARA SU CONEXIÓN	UND	1,00	$ 321.823,00	$ 321.823,00	+	1,00	2,00	$ 643.646,00		$		
2.12	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO CORTINA ROSCADO REDWHITE 1"	UND	2,00	$ 98.760,00	$ 197.520,00		2,00	0,00	$		$		
2.13	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)	M3	16,36	$ 115.920,05	$ 1.895.646,18	+	34,71	51,07	$ 5.889.995,40	17,54	$ 3.497.241,58	29,00	3.378.877,26
2.14	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M3	35,00	$ 28.055,23	$ 911.933,05	+	49,18	84,18	$ 2.198.540,33	25,81	$ 542.795,64	68,00	1.781.454,40

Scanned with OKEN Scanner

2.14	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	M3	17.30	$ 91.714,13	$ 1.586.654,44	-	79,00	97,20	$ 8.914.613,44		$ -	97,68	8.958.636,22	
2.15	CORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	M	36.00	$ 5.638,74	$ 202.994,64	-	-36,00	0,00	$ -		$ -			
2.16	SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) ("")	M3	3.60	$ 970.419,84	$ 3.493.511,42	-	-3,60	0,00	$ -		$ -			
2.17	RELLENO BASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M3	14.30	$ 110.973,70	$ 1.586.923,91	-	-14,30	0,00	$ -		$ -			
	ACTIVIDADES NO CONTEMPLADAS						0,00				$ -			
3.01	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0,07 MTS 14 Mpa (2000 PSI)	M2		$ 44.574,48		+	10,24	10,24	$ 456.442,59	10,24	$ 456.442,59			
3.02	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC D=3" RDE 21 UNION MECANICA	ML		$ 69.652,82		+	243,00	243,00	$ 16.925.535,26	243,00	$ 16.925.535,26			
3.03	SUMINISTRO E INSTALACION UNION DE REPARACION PVC 3"	UND		$ 66.530,82		+	3,00	3,00	$ 199.592,46	3,00	$ 199.592,46			
3.04	CODO PVC GRAN RADIO 90° RDE 21 D=3"	UND		$ 103.720,82		+	4,00	4,00	$ 414.883,28	3,00	$ 311.162,46			
3.05	CAJA DE INSPECCION DE 1,00 *1,00 *1,00 MTS LADRILLO	UND		$ 600.593,18		+	1,00	1,00	$ 600.593,18	1,00	$ 600.593,18			
3.06	CAJA DE INSPECCION DE 1.20 +120 *1.20 MTS LADRILLO	ML		$ 717.673,97		+	2,00	2,00	$ 1.435.347,94	0	$ -			
3.07	SUMINISTRO E INSTALACION TAPA CON MARCO METALICA SECCION 70*70 PARA CAMARA, REGISTRO Y MACROMEDIDOR Y DERIVACION	UND		$ 394.942,82		+	4,00	4,00	$ 1.579.770,43	0	$ -			
3.08	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA MARIPOSA D=2"	UND		$ 329.404,58		+	2,00	2,00	$ 658.809,16	0	$ -			
3.09	SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION PVC D=3"	UND		$ 54.073,21		+	1,00	1,00	$ 54.073,21	0	$ -			
3.10	SUMINISTRO EINSTALCION TEE PARTIDA 8X2	UND		$ 5.068.024,66		+	1,00	1,00	$ 5.068.024,66	0	$ -			

Scanned with OKEN Scanner

3.11	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC 2 PULGADAS RDE 21 U M	ML		$ 33.488,10		+	718,50	718,50	$ 24.061.199,85	18,71	$ 626.562,35	685,09	22.979.348,50
3.12	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA H.G D=2"	ML		$ 88.690,85		+	12,00	12,00	$ 1.068.690,20	0	$ -		
3.13	EXCAVACION EN ROCA CON COMPRESOR	M3		$ 241.277,81		+	71,86	71,86	$ 17.338.223,43	71,86	$ 17.338.223,43		
	TOTAL				$ 107.787.602,76				$ 161.652.064,65		$ 51.071.040,47		38.850.632,49
	ADMINISTRACION 22%				$ 23.713.272,60				$ 35.563.454,22		$ 11.235.628,90		$ 8.547.007,17
	IMPREVISTOS 4%				$ 4.311.504,11				$ 6.466.082,58		$ 2.042.841,61		$ 1.554.001,29
	UTILIDAD 4%				$ 4.311.504,11				$ 6.466.082,58		$ 2.042.841,61		$ 1.554.001,29
							AUSTE (-)	AUSTE (-)					
TOTAL					$ 140.123.883,58		VALOR	VALOR TOTAL	$ 210.147.693,96		$ 66.392.352,58		$ 50.505.042,10
SON	**CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL CUARENTA Y DOS PESOS CON 10 CENTAVOS**												

ALFREDO VARGAS MARTINEZ
CONTRATISTA

YARLEY GERARDO PEDRAZA DIAZ
SUPERVISOR

EDGAR ALEXANDER AVELLA FLOREZ
ALCALDE MUNICIAL

Scanned with OKEN Scanner



POLIZAS Y APROBACION

Scanned with OKEN Scanner

RESOLUCIÓN No. 097
13 de marzo de 2025

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA UNAS GARANTÍAS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No MI-SAMC-004-2024 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE IZA – BOYACA Y ALFREDO VARGAS MARTINEZ

El Alcalde del Municipio de Iza – Boyacá, en ejecución de sus atribuciones legales y, especialmente las que le confieren los artículos 11, numérales 1° y 3° de la ley 80 de 1993 Y

CONSIDERANDO

Que el Municipio de Iza (Boyacá), celebro CONTRATO DE OBRA NO. MI-SAMC-004-2024 con ALFREDO VARGAS MARTINEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 74.182.148 Expedida en Sogamoso, cuyo objeto es OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO E INSTALACION DE VALVULA REDUCTORA DE PRESION DEL MUNICIPIO DE IZA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

Que el contratista construye unas garantías a favor del Municipio de Iza (Boyacá) y presentada la póliza de cumplimiento No 51-44-101028702 Anexo 5, expedida 13/03/2025 por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT No. 860.009.578-6 la cual garantiza: cumplimiento del contrato, según lo siguiente.

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	07/01/2025	15/09/2025	$21.014.700,40
CALIDAD DEL SERVICIO	07/01/2025	15/09/2025	$21.014.700,40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	07/01/2025	15/03/2028	$10.507.384,20
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	28/02/2025	28/02/2030	$21.014.700,40

Igualmente el contratista presenta la poliza de responsabilidad civil extracontractual No. 51-40-101009671 Anexo 04, expedida el dia 13/03/2025 por SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT No. 860009578-6 la cual garantiza:

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	07/01/2025	15/03/2025	$284.700.000
CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS	07/01/2025	15/03/2025	$142.350.000
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	07/01/2025	15/03/2025	$142.350.000

Que las pólizas en mención cumplen los requisitos de ley por lo que se hace necesario su aprobación por parte de este Despacho.

Que en caso de modificación de las condiciones del contrato se debe actualizar las pólizas.

Que en caso de incumplimiento del objeto contractual se debe requerir a la entidad Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S A. NIT No. 860 009.578-6.

Scanned with OKEN Scanner

Por lo expuesto anteriormente este Despacho

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la póliza de cumplimiento No. 51-44-101026702 Anexo 5 expedida 13/03/2025 por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT No 860.009.578-6 la cual garantiza cumplimiento del contrato, segun lo siguiente

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	07/01/2025	13/09/2025	$21.014.766,40
CALIDAD DEL SERVICIO	07/01/2025	13/09/2025	$21.014.766,40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	07/01/2025	15/03/2028	$10.507.383,20
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	28/02/2025	28/02/2030	$21.014.766,40

Igualmente el contratista presenta la poliza de responsabilidad civil extracontractual No. 51-40-101009671 Anexo 4, expedida el dia 13/03/2025 por SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT No 860009578-6 la cual garantiza:

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	07/01/2025	15/03/2025	$284.700.000
CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS	07/01/2025	15/03/2025	$142.350.000
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	07/01/2025	15/03/2025	$142.350.000

Aclaraciones: mediante el presente y según acta de adicion y prorroga de fecha 7/03/2025 se amplia el valor del contrato en $70.023.800,38 y se ptorroga la vigencia en 45 dias mas.

ARTICULO SEGUNDO La presente rige a partir de la fecha de su expedicion.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Iza – Boyaca a los trece (13) dias del mes de marzo de dos Mil veinticinco (2025).

EDGAR ALEXANDER AVELLA FLOREZ
Alcalde Municipal

	NOMBRE	CARGO
ELABORÓ	[illegible]	CONTRATISTA
REVISÓ	[illegible]	ALCALDE MUNICIPAL
APROBÓ	[illegible]	ALCALDE MUNICIPAL

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
SOGAMOSO	AGENCIA SOGAMOSO	51	51-40-101009671	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
13	03	2025	07	01	2025	00:00	15	03	2025	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
VARGAS MARTINEZ, ALFREDO			CC: 74.182.142
DIRECCIÓN: CALLE 18 NO 84-18	CIUDAD: SOGAMOSO, BOYACA		TELÉFONO: 3133937930

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACION	
MUNICIPIO DE IZA			NIT: 891.856.077-3
DIRECCION: KR 4 NRO 4 - 10	CIUDAD: IZA, BOYACA		TELÉFONO: 7790190

BENEFICIARIO 891856077 - MUNICIPIO DE IZA

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	07/01/2025	15/03/2025	$142,350,000.00	$138,000,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	07/01/2025	15/03/2025	$142,350,000.00	$138,000,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	07/01/2025	15/03/2025	$142,350,000.00	$138,000,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 10 NO. 14-130 L104 - TELEFONO: 7731957 - SOGAMOSO

51-40-101009671

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Scanned with OKEN Scanner

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
SOGAMOSO	AGENCIA SOGAMOSO	51	51-40-101009671	4

FECHA EXPEDICION DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
13	03	2025	07	01	2025	00 00	15	03	2025	23 59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
VARGAS MARTINEZ, ALFREDO			CC: 74.182.148
DIRECCIÓN: CALLE 18 NO 84-18	CIUDAD: SOGAMOSO, BOYACA		TELÉFONO: 3133937930

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
MUNICIPIO DE IZA			NIT: 891.856.077-3
DIRECCIÓN: KR 4 NRO 4 - 10	CIUDAD: IZA, BOYACA		TELÉFONO: 7790190

BENEFICIARIO 891856077 - MUNICIPIO DE IZA

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 10 NO. 14-130 L104 - TELEFONO: 7731957 - SOGAMOSO

51-40-101009671

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF190214A

VIGILADO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO PÓLIZA	ANEXO
SOGAMOSO	AGENCIA SOGAMOSO	51	51-44-101028702	5

FECHA EXPEDICIÓN DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
13	03	2025	07	01	2025	00:00	28	02	2030	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	VARGAS MARTINEZ, ALFREDO		CC: 74.182.148
DIRECCIÓN: CALLE 18 NO 84-18	CIUDAD: SOGAMOSO, BOYACA		TELÉFONO: 3133937930

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE IZA		NIT: 891.856.077-3
DIRECCIÓN: KR 4 NRO 4 - 10	CIUDAD: IZA, BOYACA		TELÉFONO 7790190

ADICIONAL

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASION DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO DE SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No MI-SAMC-004-2024 CUYO OBJETO ES: OBRAS DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO E INSTALACION DE VALVULA REDUCTORA DE PRESION DEL MUNICIPIO DE IZA DEPARTAMENTO DE BOYACA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	07/01/2025	13/09/2025	$21,014,768.40	$14,012,388.36
CALIDAD DEL SERVICIO	07/01/2025	13/09/2025	$21,014,768.40	$14,012,388.36
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	07/01/2025	15/03/2028	$10,507,384.20	$7,006,194.18
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	28/02/2025	28/02/2030	$21,014,768.40	$14,012,388.36

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE Y SEGUN ACTA DE ADICION Y PRORROGA DE FECHA 7/03/2025 SE AMPLIA EL VALOR DEL CONTRATO EN $70.023.800,38 Y SE PRORROGA LA VIGENCIA EN 41 DIAS MAS

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******158,330.00	$ *******8,000.00	$ ******31,602.00	$ **********197,933.00	$ *******73,551,689.40	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART	VALOR ASEGURADO
MOTTA FISHER CHAPARRO SALINAS	195214	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

51-44-101028702

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Finanzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Scanned with OKEN Scanner

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT 860 009 578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD SUC	No POLIZA	ANEXO
SOGAMOSO	AGENCIA SOGAMOSO	51	51-44-101028702	0

FECHA EXPEDICION DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
13	03	2025	07	01	2025	00:00	26	02	2030	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACION	
VARGAS MARTINEZ ALFREDO		CC 74.182.148	
DIRECCION: CALLE 18 NO 84 18	CIUDAD: SOGAMOSO BOYACA	TELEFONO: 3108337551	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO		IDENTIFICACION	
MUNICIPIO DE IZA		NIT 891.856.577-5	
DIRECCION: KR 4 NRO 4 - 10	CIUDAD: IZA BOYACA	TELEFONO: 7715157	

ADICIONAL

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 10 NO. 14-130 L104 - TELEFONO: 7731957 - SOGAMOSO

51-44-101028702

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Finanzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Scanned with OKEN Scanner

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT 860 009 578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO PÓLIZA	ANEXO
SOGAMOSO	AGENCIA SOGAMOSO	61	61-40-101009671	4

FECHA EXPEDICIÓN DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
13	03	2025	07	01	2025	00:00	15	03	2025	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: VARGAS MARTINEZ, ALFREDO — IDENTIFICACIÓN: CC 74.182.148

DIRECCIÓN: CALLE 18 NO 64-16 — CIUDAD: SOGAMOSO, BOYACA — TELÉFONO: 3133937939

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: MUNICIPIO DE IZA — IDENTIFICACIÓN: NIT: 891.856.077-2

DIRECCIÓN: KR 4 NRO 4 - 10 — CIUDAD: IZA, BOYACA — TELÉFONO: 7750150

BENEFICIARIO: 891856077 MUNICIPIO DE IZA

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1339-P-06-00000-E-RCE-0938-0001 / 31-01-22 -1339-P-06-00000-E-RCE-0015-0001, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LIMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA EL TOMADOR/ASEGURADO DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, POR DAÑOS MATERIALES COMO RESULTADO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. MI-SASC-564-2024 CUYO OBJETO ES: OBRAS DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE PISOS EN ACCESOS E INSTALACION DE VALVULA REDUCTORA DE PRESION DEL MUNICIPIO DE IZA DEPARTAMENTO DE BOYACA

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPARO	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	07/01/2025	15/03/2025	$284,700,000.00	$240,000,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	07/01/2025	15/03/2025	$142,350,000.00	$120,000,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	07/01/2025	15/03/2025	$142,350,000.00	$120,000,000.00

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE Y CUERDO ACTA DE ADICION Y PRORROGA DE FECHA 7/01/2025 SE AMPLIA EL VALOR ASEGURADO SEGUN SMMLV AÑO 2025 Y SE PRORROGA LA VIGENCIA EN 45 DIAS MAS

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *******5,000.00	$ *******3,000.00	$ *******1,520.00	$ **********9,520.00	$ *******284,700,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			(S) TRABAJO (COASEGURO)		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
BETTY JINET CHAPARRO SALINAS	195214	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 10 NO. 14-130 L104 - TELEFONO: 7731997 - SOGAMOSO

61-40-101009671

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Scanned with OKEN Scanner

A.V.M. INGENIERÍA

ALFREDO VARGAS MARTINEZ
NIT 74182148-0
Regimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Natural
CL 18 8 A 18, Sogamoso, Boyacá, Colombia
Tel. 3208093334
Email: ing2008alfredov@yahoo.es
Autorizacion factura electronica de venta No. 18764081706764 valida desde 2024-10-17 hasta 2025-04-17 rango desde AVM06 hasta AVM100.

Razon Social:	MUNICIPIO DE IZA
NIT :	891855077
Direccion:	Cra. 4 Nro. 4 7 10, Iza, Boyacá, Colombia
Telefono:	3218682258
Email:	ventanilla.unica@iza-boyaca.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	04/04/2025
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	AVM43
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	12:29:48-05:00
FECHA FIRMADO:	31/03/2025 12:29:51

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	ANO	DIA	MES	ANO
31	03	2025	04	04	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL.	MONTO		
1	1	PAGO PARCIAL No. 2 CONTRATO No. MI-SAMC-004-2024 OBJETO: OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO E INSTALACION DE VALVULA REDUCTORA DE PRESION DEL MUNICIPIO DE IZA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.	LS	1.00	$50.505.042,10				0.00	$50.505.042,10

Notas:

SON: (cincuenta millones quinientos cinco mil cuarenta y dos pesos diez centavos)
CUFE: 97b42bbb773d10bf7a53346bcf4eec1638145bc244bcbd3038acda54413f45496c9668e50a1fba91159714a65f3110

Subtotal:	$50.505.042,10
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$50.505.042,10

Firma Digital: [illegible]

Esta factura es un titulo valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software e-Factura Proveedor tecnologico: cadena. Nit. 830.959.131-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

facturatech

Scanned with OKEN Scanner
