PROYECTO COLEGIO MAYOR SOL CCTV

INFORME DE ENTREGA

Preparado por

SELTIC

OBJETO:
Adquisición a título de compraventa equipos tecnológicos de cómputo y periféricos para la dotación de los salones pertenecientes a la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia y sede de comuna 1-Santo Domingo en el Distrito de Medellín

MARZO DE 2025

ÍNDICE DE MODIFICACIONES

ÍNDICE DE REVISIÓN	SECCIÓN MODIFICADA	FECHA DE MODIFICACIÓN	OBSERVACIONES
00	N.A	8/02/2020	Primera emisión
01	N.A	26/02/2024	Implementación

REVISIÓN Y APROBACIÓN FINAL

Número de revisión		**0**	**1**	**2**	**3**
Responsable elaboración:	Nombre:	Juan López Bermúdez			
	Firma:	Juan López			
Responsable revisión:	Nombre:	Mario Pedraza.			
	Firma:	Mario P.			
Responsable aprobación:	Nombre:				
	Firma:				
Fecha:					

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

ENTIDAD	**# COPIAS**

CONTENIDO

1. ASPECTOS GENERALES 4
2. ALCANCE 4
3. INTRODUCCIÓN 4
4. ACTIVIDADES REALIZADAS 4
4.1 Suministro de quipos 5
4.2 Fechas de suministro 6
4.3 Instalación del sistema de CCTV Sede popular 1 14
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 25

1. ASPECTOS GENERALES

Realizar las actividades necesarias para el cumplimiento del contrato número 0175 DE 2025 entre Seltic y el COLGIO MAYOR DE ANTIOQUIA.

2. ALCANCE

Realizar el suministro de equipos y la instalación del circuito cerrado de televisión (CCTV) para los sistemas electrónicos de seguridad, ubicados en el en la sede del Colegio Mayor perteneciente a la comuna Popular 1

3. INTRODUCCIÓN

El suministro y la implementación para este proyecto fue determinado para el periodo que comprende **hasta el 27/12/2024.**

4. ACTIVIDADES REALIZADAS

Este informe detalla las actividades realizadas durante el periodo en relación con el suministro y la implementación del sistema de CCTV en la sede Popular 1.

4.1 Suministro de quipos

ID	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO $	VALOR TOTAL $
1	**Licencias Access point** por 3 años Meraki MR Enterprise License, 3YR garantía 3 años	und	6	1.292.042,50	7.752.255
2	Equipos **Access point Meraki** MR36 Wi-Fi 6 Indoor AP garantía 1 año	und	6	2.112.845,00	12.677.070
3	**OneScreen TouchScreen T7- 75"**: Pantalla interactiva LED 4K, tecnología IR Zero-Bounding multitáctil (40 puntos) Con tecnología de rechazo de palma, sistema Android 13 EDLA (Certificado por Google) integrado y Wifi 6 / Incluye OneScreen Write, OneScreen Account y OneScreen Share / 1 año de OneScreen LearningHub, OneScreen QuizWhiz, OneScreen Hype, OneScreen Central, OneScreen Beacons, OneScreen Scribe / Lector NFC, Micrófono integrado, Compatible con cámara Snap-in / Soporte a pared / 3 años de garantía	und	4	13.090.000,00	52.360.000
4	**NVR** Autónomo Crystal basado en Linux, Expandible hasta 128 licencias IP, CPU Intel Core i5. Soporta 8 Discos Duros SATA de hasta 10TB c/u. DS-7616NIQ2(D) **DS-7616NI-Q2**(D) NVR 16 CANALES HD 160MBPS HDMI 4K 2BAHIAS/8TB H265+ 4CH DETECCION 2.0 HIKVISION 303616532 / REEMPLAZA A DS-7616NIQ2. garantía 1 año	und	1	33.974.500,00	33.974.500
5	**DS-2CD2643G2-IZS** (2.8-12mm) DS-2CD2643G2-IZS(2.8-12mm) **CAMARA EXT BALA 4MP** D/N VF 2.8-12MM IR60M 120DB ACUSENSE METAL H265+ IP67 HIKVISION 311312061 / REEMPLAZA A DS2CD2643G1-IZS(2.8-12mm) garantía 1 año	und	10	957.889,79	9.578.898
6	Cámara Movimiento horizontal continuo de 360°, Inclinación de -20 ° a 90 ° (giro automático), **Cámara 360 Grados IP PTZ** 80º/s 4Mpx PoE IR100m Grabación MicroSd HIKVISION TORUM. Garantía 1 año	und	1	3.404.310,35	3.404.310
7	**Licencias** para cámara	und	11	684.250,00	7.526.750
8	**Mano de obra** instalación de cámaras	und	11	327.250,00	3.599.750
9	**Materiales** para instalación cámaras, cables, dictaría, cajas con 4 salidas, garantía 1 año	und	1	16.065.000,00	16.065.000
10	**Swiches de 48** puertos para datacenter, Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP **Swich Aruba** Conmutador de nivel 3 HPE 2930F 48G PoE+ 4SFP, 48 Puertos Gestionable - Gigabit Ethernet - 10/100/1000Base-T, 1000Base-X - 3 Capa compatible - Modular - 4 Ranuras SFP - Par trenzado, Fibra Óptica - 1U Alto - De Escritorio, Montable en bastidor VPN: JL262A SKU: 4506114. garantía 1 año	und	2	12.782.618,84	25.565.238

11	OptiPlex 7420 AIO 65 Plus **Intel® Core™ i7** 14700 vPro® (33 MB cache, 20 cores, 28 threads, up to 5.3 GHz Turbo) Windows 11 Home, English, Brazilian Portuguese, French, Spanish 16 GB: 1 x 16 GB, DDR5 512 GB, M.2 2230, PCIe NVMe, SSD, Class 35 Spanish nonbacklit keyboard KB216 MS116 Wired Mouse Black Height Ajustables Stand for OptiPlex All-in-One Plus Intel® Wi-Fi 6E AX211, 2x2, 802.11ax, Bluetooth® wireless card OptiPlex All-in-One Plus 7420, 65W CPU, Non-touch, FHD HDR cam, UMA, 160W Bronze EPEAT 2018 Registered (Silver) 5Y Basic Onsite Service after remote diagnosis with Hardware-Only Support. garantía 5 años	und	28	6.637.820,00	185.858.960
12	Sistema de Sonido Sistema de audio: 2 x cabinas para exteriores para anuncios al público (Altavoz autopotenciado 15") + consola – **MEZCLADORA DE 24 CANALES.** garantía 1 año	und	1	9.520.000,00	9.520.000
	TOTAL				**367.882.731**


4.2 Fechas de suministro

Resumen de fechas de entrega

ITEM	NOMBRE RESUMIDO	FECHA DE ENTREGA
1	Licencias AP	04/02/25
2	AP	04/02/25
3	TV 75"	27/12/24
4	NVR_16ch	04/02/25
5	CAM	26/12/24
6	PTZ	26/12/24
7	Licencias CAM	13/01/25
10	Sw	04/02/25
11	PCs	23/12/24
12	Sonido	17/02/25

Se relaciona detalle y evidencias de cada entrega

Item 11_Fecha de entrega: 23-12-24

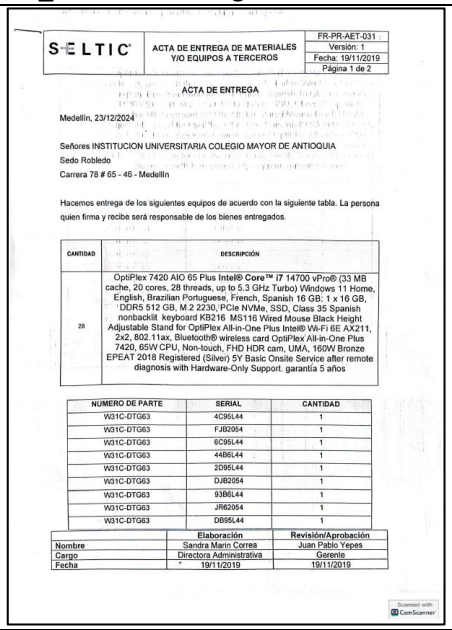

SELTIC | ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES Y/O EQUIPOS A TERCEROS | FR-PR-AET-031 Versión: 1 Fecha: 19/11/2019 Página 1 de 2

ACTA DE ENTREGA

Medellín, 23/12/2024


Señores INSTITUCION UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA
Sedo Robledo
Carrera 78 # 65 - 46 - Medellín

Hacemos entrega de los siguientes equipos de acuerdo con la siguiente tabla. La persona quien firma y recibe será responsable de los bienes entregados.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
28	OptiPlex 7420 AIO 65 Plus Intel® Core™ i7 14700 vPro® (33 MB cache, 20 cores, 28 threads, up to 5.3 GHz Turbo) Windows 11 Home, English, Brazilian Portuguese, French, Spanish 16 GB: 1 x 16 GB, DDR5 512 GB, M.2 2230, PCIe NVMe, SSD, Class 35 Spanish nonbacklit keyboard KB216 MS116 Wired Mouse Black Height Adjustable Stand for OptiPlex All-in-One Plus Intel® Wi-Fi 6E AX211, 2x2, 802.11ax, Bluetooth® wireless card OptiPlex All-in-One Plus 7420, 65W CPU, Non-touch, FHD HDR cam, UMA, 160W Bronze EPEAT 2018 Registered (Silver) 5Y Basic Onsite Service after remote diagnosis with Hardware-Only Support. garantía 5 años

NUMERO DE PARTE	SERIAL	CANTIDAD
W31C-DTG63	4C95L44	1
W31C-DTG63	FJB2054	1
W31C-DTG63	6C95L44	1
W31C-DTG63	44B6L44	1
W31C-DTG63	2D95L44	1
W31C-DTG63	DJB2054	1
W31C-DTG63	93B6L44	1
W31C-DTG63	JR62054	1
W31C-DTG63	DB95L44	1

	Elaboración	Revisión/Aprobación
Nombre	Sandra Marin Correa	Juan Pablo Yepes
Cargo	Directora Administrativa	Gerente
Fecha	19/11/2019	19/11/2019

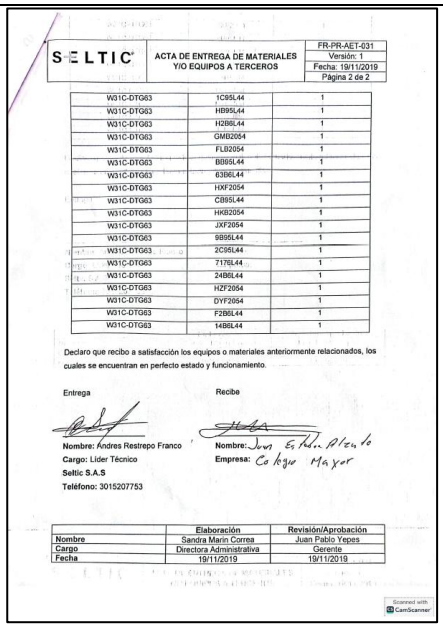

SELTIC | ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES Y/O EQUIPOS A TERCEROS | FR-PR-AET-031 Versión: 1 Fecha: 19/11/2019 Página 2 de 2

W31C-DTG63	1C95L44	1
W31C-DTG63	HB95L44	1
W31C-DTG63	H2B6L44	1
W31C-DTG63	GM02054	1
W31C-DTG63	FL02054	1
W31C-DTG63	B095L44	1
W31C-DTG63	63D6L44	1
W31C-DTG63	HXF2054	1
W31C-DTG63	CB95L44	1
W31C-DTG63	HKB2054	1
W31C-DTG63	JXF2054	1
W31C-DTG63	9B95L44	1
W31C-DTG63	2C95L44	1
W31C-DTG63	7176L44	1
W31C-DTG63	24B6L44	1
W31C-DTG63	HZF2054	1
W31C-DTG63	DYF2054	1
W31C-DTG63	F2B6L44	1
W31C-DTG63	14B6L44	1

Declaro que recibo a satisfacción los equipos o materiales anteriormente relacionados, los cuales se encuentran en perfecto estado y funcionamiento.

Entrega

Nombre: Andres Restrepo Franco
Cargo: Líder Técnico
Seltic S.A.S
Teléfono: 3015207753

Recibe


Nombre: Juan Esteban Alzate
Empresa: Colegio Mayor

	Elaboración	Revisión/Aprobación
Nombre	Sandra Marin Correa	Juan Pablo Yepes
Cargo	Directora Administrativa	Gerente
Fecha	19/11/2019	19/11/2019





Item 5, 6_Fecha de entrega 26-12-2024

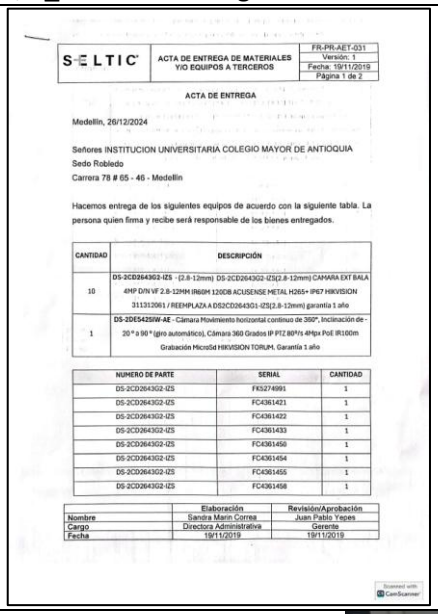

SELTIC | ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES Y/O EQUIPOS A TERCEROS | FR-PR-AET-031 Versión: 1 Fecha: 19/11/2019 Página 1 de 2

ACTA DE ENTREGA

Medellin, 26/12/2024


Señores INSTITUCION UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA
Sedo Robledo
Carrera 78 # 65 - 46 - Medellin

Hacemos entrega de los siguientes equipos de acuerdo con la siguiente tabla. La persona quien firma y recibe será responsable de los bienes entregados.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
10	DS-2CD2643G2-IZS - (2.8-12mm) DS-2CD2643G2-IZS(2.8-12mm) CAMARA EXT BALA 4MP D/N VF 2.8-12MM IR60M 120DB ACUSENSE METAL H265+ IP67 HIKVISION 311312061 / REEMPLAZA A DS2CD2643G1-IZS(2.8-12mm) garantía 1 año
1	DS-2DE5425IW-AE - Cámara Movimiento horizontal continuo de 360°, Inclinación de -20 ° a 90 ° (giro automático), Cámara 360 Grados IP PTZ 80*/s 4Mpx PoE IR100m Grabación MicroSd HIKVISION TORUM, Garantía 1 año

NUMERO DE PARTE	SERIAL	CANTIDAD
DS-2CD2643G2-IZS	FK5274991	1
DS-2CD2643G2-IZS	FC4361421	1
DS-2CD2643G2-IZS	FC4361422	1
DS-2CD2643G2-IZS	FC4361433	1
DS-2CD2643G2-IZS	FC4361458	1
DS-2CD2643G2-IZS	FC4361454	1
DS-2CD2643G2-IZS	FC4361455	1
DS-2CD2643G2-IZS	FC4361456	1

	Elaboración	Revisión/Aprobación
Nombre	Sandra Marin Correa	Juan Pablo Yepes
Cargo	Directora Administrativa	Gerente
Fecha	19/11/2019	19/11/2019

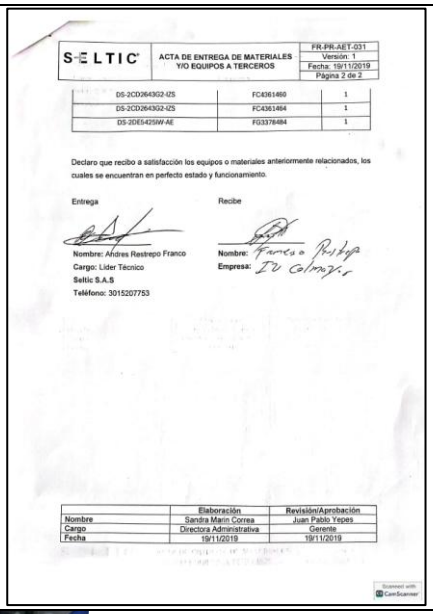

SELTIC | ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES Y/O EQUIPOS A TERCEROS | FR-PR-AET-031 Versión: 1 Fecha: 19/11/2019 Página 2 de 2

DS-2CD2643G2-IZS	FC4361460	1
DS-2CD2643G2-IZS	FC4361464	1
DS-2DE5425IW-AE	FG3376484	1

Declaro que recibo a satisfacción los equipos o materiales anteriormente relacionados, los cuales se encuentran en perfecto estado y funcionamiento.

Entrega

Nombre: Andres Restrepo Franco
Cargo: Lider Técnico
Seltic S.A.S
Teléfono: 3015207753


Recibe

Nombre: Francisco Ruiz Yepes
Empresa: IU Colmayor

	Elaboración	Revisión/Aprobación
Nombre	Sandra Marin Correa	Juan Pablo Yepes
Cargo	Directora Administrativa	Gerente
Fecha	19/11/2019	19/11/2019



Item 3_Fecha de entrega 27-12-2024

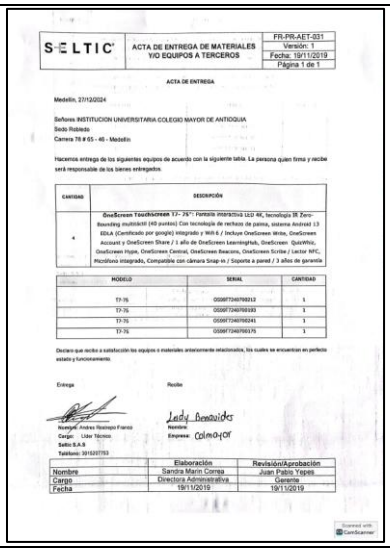

SELTIC — ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES Y/O EQUIPOS A TERCEROS

FR-PR-AET-031 | Versión: 1 | Fecha: 19/11/2019 | Página 1 de 1

ACTA DE ENTREGA

Medellín, 27/12/2024

Señores INSTITUCION UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA
Sede Robledo
Carrera 78 # 65 - 46 - Medellín

Hacemos entrega de los siguientes equipos de acuerdo con la siguiente tabla. La persona quien firma y recibe será responsable de los bienes entregados.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
4	OneScreen Touchscreen T7- 75": Pantalla interactiva LED 4K, tecnología IR Zero-Bounding multitáctil (40 puntos) Con tecnología de rechazo de palma, sistema Android 13 EDLA (Certificado por google) integrado y Wifi 6 / Incluye OneScreen Write, OneScreen Account y OneScreen Share / 1 año de OneScreen LearningHub, OneScreen QuizWhiz, OneScreen Hype, OneScreen Control, OneScreen Beacons, OneScreen Scribe / Lector NFC, Micrófono integrado, Compatible con cámara Snap-in / Soporte a pared / 3 años de garantía

MODELO	SERIAL	CANTIDAD
T7-75	GS09T7340700213	1
T7-75	GS09T7340700193	1
T7-75	GS09T7340700241	1
T7-75	GS09T7340700175	1

Declaro que recibo a satisfacción los equipos o materiales anteriormente relacionados, los cuales se encuentran en perfecto estado y funcionamiento.

Entrega

Nombre: Andres Restrepo Franco
Cargo: Lider Técnico
Sello: S.A.S
Teléfono: 3015207753

Recibe

Nombre: Lady Fernanda
Empresa: Colmayor

	Elaboración	Revisión/Aprobación
Nombre	Sandra Marin Correa	Juan Pablo Yepes
Cargo	Directora Administrativa	Gerente
Fecha	19/11/2019	19/11/2019

Scanned with CamScanner

Item 7 Fecha de entrega 13-01-25


RE: Prefactura contrato N. CMA-SIP042-56-22984-2024

FR-FI-P...01-25.pdf LICENCI...MARAS.pdf

Juan Carlos López Bermúdez
Para: Francisco Javier Restrepo Naranjo <tecnologia@colmayor.edu.co>
CC: Alejandra Pérez Ricardo; Vicente Eduardo Márquez Verde; Mario Pedraza Montaez
Lun 13/01/2025 10:00

FR-FI-PF-036 Prefactura SUMINIST... 80 KB
LICENCIAS CAMARAS.pdf 458 KB

2 archivos adjuntos (538 KB) Guardar todo en OneDrive - Seltic SAS Guardar todos los datos adjuntos

Buenas días


Adjunto prefactura actualizada para su Visto Bueno.
Nota: Se adjunta las licencias de las camaras Item_7

Juan Carlos López Bermúdez
Ingeniero de proyectos

Cra 43 B No 16-95 OF. 1301
Ed. Camara Colombiana de la Infraestructura
(4) 479 6160 -3163960363
juan.lopez@seltic.com.co
www.seltic.com.co

SELTIC BIENPISO EN POSITIVO

CUCULUS cisco Partner Cambium Networks


HIKVISION


HikCentral Professional License

Thank you for choosing HikCentral Professional.

License Performance

Activation Code	890f-b5a6-28bb-4677-b063-59bb-0188-948b	
Purchase Order	CO2501011290-3	
Expiry Date	2099-12-31	
License Basis	Package Type	Basal
Maintenance Service	Primary Service(SUP)	36 Months
	SUP Channel	0 Channels
V5S	Video Management Module	Yes
	Video Management	16 Channels
Third-Party Integration	OpenAPI	Yes

* The Software Upgrade Period and Software Service Period starts from the day when License is activated

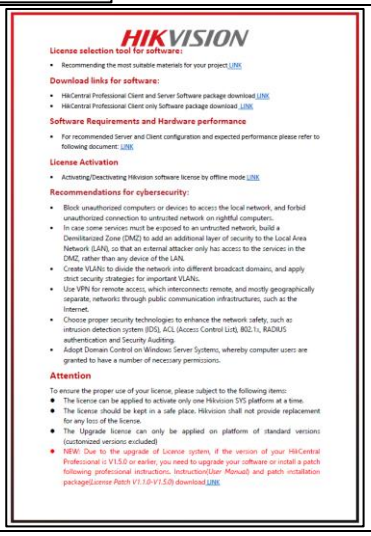
HIKVISION

License selection tool for software:
- Recommending the most suitable materials for your project LINK

Download links for software:
- HikCentral Professional Client and Server Software package download LINK
- HikCentral Professional Client only Software package download LINK

Software Requirements and Hardware performance
- For recommended Server and Client configuration and expected performance please refer to following document: LINK


License Activation
- Activating/Deactivating Hikvision software license by offline mode LINK

Recommendations for cybersecurity:
- Block unauthorized computers or devices to access the local network, and forbid unauthorized connection to untrusted network on rightful computers.
- In case some services must be exposed to an untrusted network, build a Demilitarized Zone (DMZ) to add an additional layer of security to the Local Area Network (LAN), so that an external attacker only has access to the services in the DMZ, rather than any device of the LAN.
- Create VLANs to divide the network into different broadcast domains, and apply strict security strategies for important VLANs.
- Use VPN for remote access, which interconnects remote, and mostly geographically separate, networks through public communication infrastructures, such as the Internet.
- Choose proper security technologies to enhance the network safety, such as intrusion detection system (IDS), ACL (Access Control List), 802.1x, RADIUS authentication and Security Auditing.
- Adopt Domain Control on Windows Server Systems, whereby computer users are granted to have a number of necessary permissions.

Attention

To ensure the proper use of your license, please subject to the following items:
- The license can be applied to activate only one Hikvision SYS platform at a time.
- The license should be kept in a safe place. Hikvision shall not provide replacement for any loss of the license.
- The Upgrade license can only be applied on platform of standard versions (customized versions excluded)
- NEW! Due to the upgrade of License system, if the version of your HikCentral Professional is V1.5.0 or earlier, you need to upgrade your software or install a patch following professional instructions. Instruction(*User Manual*) and patch installation package(*License Patch V1.1.0-V1.5.0*) download LINK

Item 1,2,4 y 10 _Fecha de entrega: 4-2-25

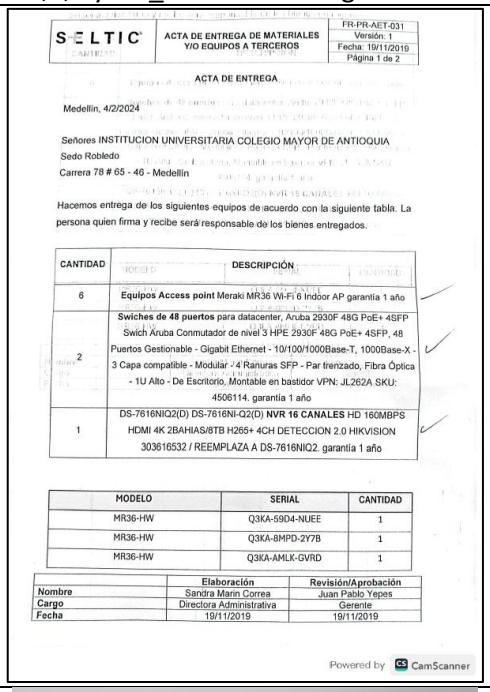

SELTIC | ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES Y/O EQUIPOS A TERCEROS | FR-PR-AET-031 Versión: 1 Fecha: 19/11/2019 Página 1 de 2

ACTA DE ENTREGA

Medellín, 4/2/2024

Señores INSTITUCION UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA
Sedo Robledo
Carrera 78 # 65 - 46 - Medellín


Hacemos entrega de los siguientes equipos de acuerdo con la siguiente tabla. La persona quien firma y recibe será responsable de los bienes entregados.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
6	**Equipos Access point** Meraki MR36 Wi-Fi 6 Indoor AP garantía 1 año
2	**Swiches de 48 puertos** para datacenter, Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP Swich Aruba Conmutador de nivel 3 HPE 2930F 48G PoE+ 4SFP, 48 Puertos Gestionable - Gigabit Ethernet - 10/100/1000Base-T, 1000Base-X - 3 Capa compatible - Modular - 4 Ranuras SFP - Par trenzado, Fibra Óptica - 1U Alto - De Escritorio, Montable en bastidor VPN: JL262A SKU: 4506114. garantía 1 año
1	DS-7616NIQ2(D) DS-7616NI-Q2(D) **NVR 16 CANALES** HD 160MBPS HDMI 4K 2BAHIAS/8TB H265+ 4CH DETECCION 2.0 HIKVISION 30361653 2 / REEMPLAZA A DS-7616NIQ2. garantía 1 año

MODELO	SERIAL	CANTIDAD
MR36-HW	Q3KA-59D4-NUEE	1
MR36-HW	Q3KA-8MPD-2Y7B	1
MR36-HW	Q3KA-AMLK-GVRD	1

	Elaboración	Revisión/Aprobación
Nombre	Sandra Marin Correa	Juan Pablo Yepes
Cargo	Directora Administrativa	Gerente
Fecha	19/11/2019	19/11/2019

Powered by CamScanner

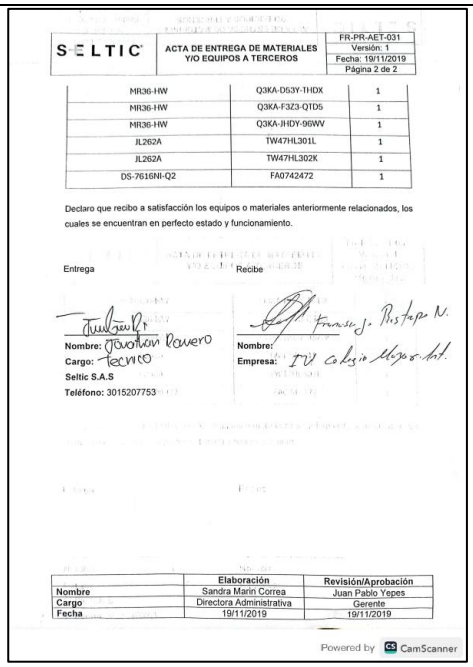

SELTIC | ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES Y/O EQUIPOS A TERCEROS | FR-PR-AET-031 Versión: 1 Fecha: 19/11/2019 Página 2 de 2

MR36-HW	Q3KA-D53Y-THDX	1
MR36-HW	Q3KA-F3Z3-QTD5	1
MR36-HW	Q3KA-JHDY-96WV	1
JL262A	TW47HL301L	1
JL262A	TW47HL302K	1
DS-7616NI-Q2	FA0742472	1

Declaro que recibo a satisfacción los equipos o materiales anteriormente relacionados, los cuales se encuentran en perfecto estado y funcionamiento.

Entrega | Recibe

Nombre: Jonathan Powero
Cargo: Tecnico
Seltic S.A.S
Teléfono: 3015207753


Nombre: Francisco J. Restrepo N.
Empresa: IU Colegio Mayor de Ant.

	Elaboración	Revisión/Aprobación
Nombre	Sandra Marin Correa	Juan Pablo Yepes
Cargo	Directora Administrativa	Gerente
Fecha	19/11/2019	19/11/2019

Powered by CamScanner







Licencias

Item 4. **NVR** Autónomo Crystal basado en Linux, Expandible hasta 128 licencias IP, CPU Intel Core i5. Soporta 8 Discos Duros SATA de hasta 10TB c/u



De: Vicente Eduardo Márquez Verde
Enviado el: viernes, 10 de enero de 2025 10:14 a. m.
Para: bryan.granados@mem.net.co; Cesar Useche <cesar.useche@mem.net.co>
CC: Mario Pedraza Montaez <mario.pedraza@seltic.com.co>; Juan Carlos López Bermúdez <juan.lopez@seltic.com.co>; Juan Pablo Yepes Quintero <juan.yepes@seltic.com.co>
Asunto: OC 2079 - MEM

Buen día,
Adjunto **O/C – O/S # 2079** , por favor proceder con el despacho.

Por favor tener en cuenta el **proceso de entrega de mercancía y recepción de facturación electrónica:**

Al momento de la entrega - recepción de mercancía deben de entregar documentos a continuación:

3. Copia de factura y/o remisión numerada y valorizada
4. Copia de orden de compra o Numero de O/C u O/S

La facturación electrónica debe enviarse al correo al correo habilitado para tal fin **facturacionelectronica@seltic.com.co**

- Recuerden que todas las facturas son recibidas hasta **el día 25 de cada mes o el día hábil anterior.**
- La factura debe indicar el numero de O/C u O/S

Atento a sus comentarios,

Saludos cordiales,

VICENTE EDUARDO MARQUÉZ VERDE
Coordinador de Compras
Cra 43 B No 16-95 OF. 1301
Ed. Camara Colombiana de la Infraestructura
(4) 479 6160
vicente.marquez@seltic.com.co
www.seltic.com.co

Orden de compra



mem | INSTRUCTIVO VENTAS POLITICA DE VENTA | CODIGO: PD-VEN-002 | VERSIÓN:05 | EDICIÓN: 04/10/2019

ANEXO 1. Notificación de Productos Bajo Pedido y/o Productos de Importación bajo necesidad del cliente

Actualizado 12 de Junio de 2020

Notificación de Productos Bajo Pedido y/o Productos de Importación bajo necesidad del Cliente

Apreciado Cliente

El siguiente comunicado tiene como objetivo informarle(s) que los productos que nos ordena ofertar y/o despachar no son de nuestro inventario habitual, motivo por el cual no podemos aceptar cancelaciones de su orden de compra y/o pedido, cambio(s) y/o devoluciones del material requerido. Para lo cual quedamos atentos de la aceptación del presente manejo, que aplicarán para el (los) siguiente(s) producto(s) correspondientes a la cotización 313692 mencionada y/o los productos relacionados a continuación:

Referencia	*Cantidad*	*Disponibilidad*	*fecha Aproximada de entrega*
DS-9632NI-M16 NVR 128 CH HASTA 32MP - 8K 400MBPS 16 BAHIAS/16 TB 100-240VAC H.265+ 2 RJ54 3RU HIKVISION 303617493	1	importación	12/05/2025

Con la aceptación de la notificación adjunta procesaremos su orden de compra y/o pedido n°4208del material en mención.
Nota: *Los tiempos ofrecidos están sujetos a un proceso normal en el transporte y/o trámites aduaneros, cualquier novedad en el proceso de importación se comunicará con anterioridad, por lo cual, NO se permite cancelación de pedido de forma unilateral, se debe evaluar entre ambas partes.

Aceptado,


Nombre de la empresa:		Firma y Sello:
Nombre del contacto:		
Cargo:		

Cordialmente,
Materiales Eléctricos y Mecánicos SAS
Nit. 860.030.723-5
www.mem.net.co

Página 1 de 1

Carta de notificación de entrega de equipos bajo pedido

Item 12_Fecha de entrega: 17-02-25

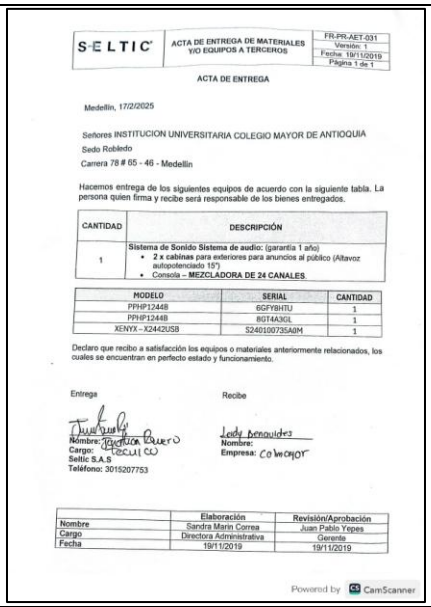

SELTIC — ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES Y/O EQUIPOS A TERCEROS — FR-PR-AET-031 Versión: 1 Fecha: 19/11/2019 Página 1 de 1

ACTA DE ENTREGA

Medellín, 17/2/2025

Señores INSTITUCION UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA
Sedo Robledo
Carrera 78 # 65 - 46 - Medellín

Hacemos entrega de los siguientes equipos de acuerdo con la siguiente tabla. La persona quien firma y recibe será responsable de los bienes entregados.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	**Sistema de Sonido Sistema de audio:** (garantía 1 año) • **2 x cabinas** para exteriores para anuncios al público (Altavoz autopotenciado 15") • Consola – **MEZCLADORA DE 24 CANALES.**

MODELO	SERIAL	CANTIDAD
PPHP1244B	6GFYBHTU	1
PPHP1244B	8GT4A3GL	1
XENYX - X2442USB	S240100735A0M	1


Declaro que recibo a satisfacción los equipos o materiales anteriormente relacionados, los cuales se encuentran en perfecto estado y funcionamiento.

Entrega
Nombre: Tecnico Equipo
Cargo: Tecnico
Seltic S.A.S
Teléfono: 3015207753

Recibe
Nombre:
Empresa: Colegio

	Elaboración	Revisión/Aprobación
Nombre	Sandra Marin Correa	Juan Pablo Yepes
Cargo	Directora Administrativa	Gerente
Fecha	19/11/2019	19/11/2019

Powered by CamScanner





4.3 Instalación del sistema de CCTV Sede popular 1

Debido a que la sede se encontraba en adecuaciones se espera a que se de la autorización para la instalación de los dispositivos de CCTV de la sede.

Item_8	Mano Obra	26/03/25
Item_9	Materiales	26/03/25

Cámara 1 - Entrada Principal D77

















Cámara 2 - Piso 2 ID67



















Cámara 3 – Piso 2 ID73

















Cámara 4 – Piso 3 ID52

















Cámara 5 – Aula de sistemas 4 ID83











Cámara 6 – Aula de sistemas 5 ID84











Cámara 7 – Ingreso cuarto técnico ID28











18 de marzo de 2025
Altitud:1744.1m
Colegio Mayor Cuarto técnico D28


WARNING
HOT SURFACE
DO NOT TOUCH
18 de marzo de 2025
6°17'51"N 75°32'44"W
112° E
109-24 Carrera 37
Santo Domingo Savio I
Medellín
Antioquia
Altitud:1746.5m
Colegio Mayor Cuarto técnico D28


18 de marzo de 2025
6°17'52"N 75°32'44"W
215° SW
Altitud:1765.8m
Velocidad:0.0km/h
Colegio Mayor Cuarto técnico D28


18 de marzo de 2025
6°17'52"N 75°32'44"W
206° SW
Altitud:1744.1m
Colegio Mayor Cuarto técnico D28

Cámara 8 – PTZ

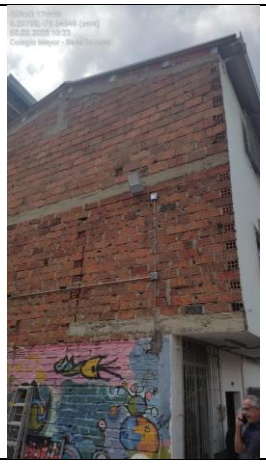















Cuarto técnico













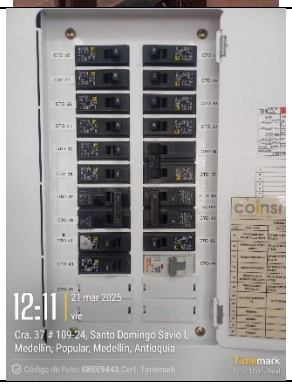


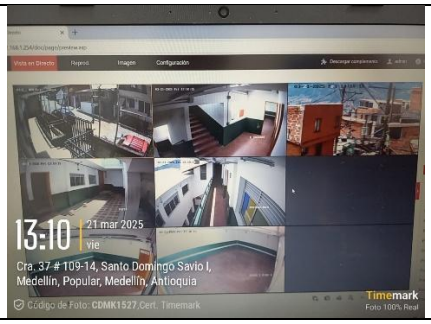

Configuraciones

ID	TIPO ELEMENTO	NOMBRE/UBICACIÓN	NUMERO DE PARTE	SERIAL	PUERTO DE DATOS PACH PANEL SEDE (ID)	DIRECCIONAMIENTO IP	USUARIO	PASSWORD
1	CAM TIPO BALA	DISPONIBLE/LIBRE	DS-2CD2643G2-IZS	FK5274991	-	-	-	-
2	CAM TIPO BALA	2DO PISO PASILLO	DS-2CD2643G2-IZS	FC4361421	73	192.168.1.6	admin	Seltic2025
3	CAM TIPO BALA	CUARTO TECNICO	DS-2CD2643G2-IZS	FC4361422	28	192.168.1.5	admin	Seltic2025
4	CAM TIPO BALA	DISPONIBLE/LIBRE	DS-2CD2643G2-IZS	FC4361433	-	-	-	-
5	CAM TIPO BALA	AULA SISTEMAS N.4	DS-2CD2643G2-IZS	FC4361450	84	192.168.1.8	admin	Seltic2025
6	CAM TIPO BALA	2DO PISO PATIO	DS-2CD2643G2-IZS	FC4361454	67	192.168.1.4	admin	Seltic2025
7	CAM TIPO BALA	AULA SISTEMAS N.4	DS-2CD2643G2-IZS	FC4361455	83	192.168.1.7	admin	Seltic2025
8	CAM TIPO BALA	DISPONIBLE/LIBRE	DS-2CD2643G2-IZS	FC4361458	-	-	-	-
9	CAM TIPO BALA	3ER PISO BAÑOS	DS-2CD2643G2-IZS	FC4361460	52	192.168.1.2	admin	Seltic2025
10	CAM TIPO BALA	ENTRADA PRINCIPAL	DS-2CD2643G2-IZS	FC4361464	77	192.168.1.1	admin	Seltic2025
11	CAM PTZ	FACHADA CANCHA	DS-2DE5425IW-AE	FG3378484	23	192.168.1.3	admin	Seltic2025
12	NVR	CUARTO TECNICO	DS-7616NI-Q2	FA0742472	-	192.168.1.254	admin	Seltic2025

Validación equipos en línea con aplicación Hikvision

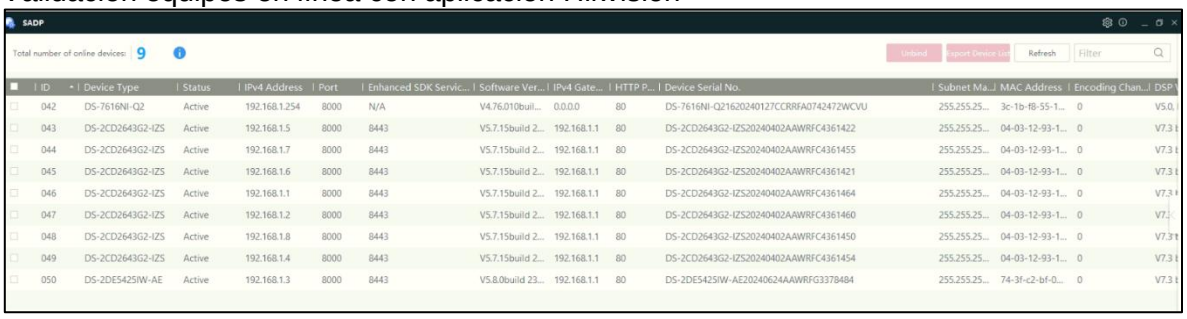

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se llevó a cabo el suministro de equipos y se realizó instalación del sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV) en la sede del Colegio Mayor de la comuna Popular 1, cumpliendo con los requisitos técnicos y operativos establecidos en el contrato.

La instalación se realizó conforme a los estándares de calidad y normativas vigentes, garantizando la correcta operación de los sistemas electrónicos de seguridad.

Se realizaron las pruebas de funcionamiento y verificación de operatividad, asegurando que el sistema CCTV cumple con los objetivos de vigilancia y control establecidos por la entidad contratante.

La supervisión y control del proceso por parte de la entidad contratante permitieron validar que los equipos instalados cumplen con las especificaciones técnicas y necesidades de seguridad del Colegio Mayor.

Como parte del cumplimiento contractual, se entregó la documentación técnica y las garantías de los equipos suministrados.

El único elemento pendiente de entrega corresponde a la unidad de grabación en red (NVR) de 128 canales (***DS-96128NI-M16 NVR 128 CH HASTA 32MP - 8K 400MBPS 16 BAHIAS/16 TB 100-240VAC H.265+ 2 RJ54 3RU HIKVISION 303617493***), cuya fabricación se realiza bajo pedido debido a sus especificaciones técnicas particulares. En este sentido, se ha proporcionado la documentación correspondiente, incluyendo la orden de compra y la certificación del fabricante, en la cual se establece la fecha estimada de entrega del equipo.
