CÓDIGO	FORMATO	VERSIÓN	
FO-AC-029	RECEPCIÓN DE REQUERIMIENTOS CIUDADANOS	2.0	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
www.idu.gov.co
correo electrónico: atnciudadano@idu.gov.co
Calle 22 No.6-27 Tel.: 3386660-3387555-3412214 -Fax 4443037

RADICADO IDU No 20205260545262

Fecha de Radicado:	2020-07-17	**Canal de recepción:**	Virtual

Remitente:	DESARROLLO EN INGENIERIA DIN SAS ( )	**C.C / NIT:**	
Dirección de correspondencia:	CARRERA 28 BIS 49A 13 PISO 2 (D.C./BOGOTA)	**Teléfonos:**	2124300 3125239514
Nombre Ciudadano (a):	-.-	**C.C / NIT:**	
Dirección de correspondencia:	-.-	**Teléfonos:**	
Cta / Contrato / RQ:	DIN IDU1546 414 2020	**Sector:**	
TRD:	//	**Causal/Tipología:**	/

Descripción del requerimiento:

CONTRATO IDU-1593-2019 - SOLICITUD DE ADICION Y PRORROGA DEL CONTRATO DE OBRA 1591 DE 2019 - interventoria.1593@gmail.com

Atendido por:	Punto de atención:
ALAS DE COLOMBIA - MARTHA ROCIO RUBIO	

Fwd: DIN-IDU1593-414-2019 SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA DEL CONTRATO DE OBRA 1591 DE 2019

17 de julio de 2020 | 08:04 | 562 KB

De:

Alas De Colombia Express S.A.S <alas.express@idu.gov.co>

Para:

Martha rubio <Digitalizador1@alasdecolombia.net>

Mostrar imágenes externas

---------- Forwarded message ---------
De: Correspondencia IDU <correspondencia@idu.gov.co>
Date: vie., 17 jul. 2020 a las 7:59
Subject: Fwd: DIN-IDU1593-414-2019 SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA DEL CONTRATO DE OBRA 1591 DE 2019
To: Alas De Colombia Express S.A.S <alas.express@idu.gov.co>

Buenos días, reenvío para radicar.
Cordial saludo,

---------- Forwarded message ---------
De: Interventoria IDU 1593 <interventoria.1593@gmail.com>
Date: jue., 16 jul. 2020 a las 22:59
Subject: DIN-IDU1593-414-2019 SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA DEL CONTRATO DE OBRA 1591 DE 2019
To: <correspondencia@idu.gov.co>
Cc: Diego Ferney Hernandez Oviedo <diego.hernandez@idu.gov.co>, <hdovillota@gmail.com>, DIN S.A. <dinltda@gmail.com>, Mauricio Puyo <m.puyo@infercal.com>

Señores
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU.
Dirección de Mantenimiento Subsistema Vial.
Ing Diego Hernández-Supervisor
Calle 22 No. 6-27.
Bogotá D.C.

REFERENCIA: Contrato No. **1593 de 2019** cuyo objeto es **INTERVENTORÍA A LA BRIGADA DE REACCIÓN VIAL PARA EJECUTAR ACTIVIDADES PUNTUALES A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EN LA MALLA VIAL ARTERIAL (MVA) NO TRONCAL.**

Asunto: DIN-IDU1593-414-2019 SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA DEL CONTRATO DE OBRA 1591 DE 2019

Adjuntamos Oficio remisorio y link en Google Drive

https://drive.google.com/drive/folders/1rmZIemm6bZ9yrBr0qOrcs4cxx4gzgF4b?usp=sharing

Agradecemos la atención prestada.
--

Cordialmente;
Claudia Pedraza
Residente de Interventoria

Interventoria
Desarrollo en Ingeniería - DIN S.A.S.
Carrera 28 Bis No 49 A 13. Piso 2 - Bogotá. Colombia
Tels (57-1) 2124300

--
CORRESPONDENCIA
Subdirección Técnica de Recursos Físicos
Instituto de Desarrollo Urbano - IDU
Calle 22 # 6 27 – CP: 110311
Teléfono: (57) (1) PBX 3386660 ext. 1105-1119-1147
correspondencia@idu.gov.co
https://sites.google.com/a/bogota.gov.co/plantilla-firmas/firmaIDU.jpg

Archivos adjuntos:

DIN-IDU1593-414-2019....pdf

Bogotá D.C., 16 de Julio de 2020.
DIN-IDU1593-414-2019

Señores
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
Dirección de Mantenimiento del Subsistema Vial
Calle 22 No. 6-27
Bogotá D.C.

REFERENCIA: Contrato No. **1593 de 2019** cuyo objeto es **INTERVENTORÍA A LA BRIGADA DE REACCIÓN VIAL PARA EJECUTAR ACTIVIDADES PUNTUALES A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EN LA MALLA VIAL ARTERIAL (MVA) NO TRONCAL.**

Asunto: SOLICITUD DE ADICION Y PRORROGA DEL CONTRATO DE OBRA 1591 DE 2019

Una vez recibida la solicitud de adición y prórroga por parte del contratista INFERCAL S.A, mediante comunicación INFER-BOG-2019-458 del 16 de julio de 2020 donde solicita prorrogar el contrato No. 1591 de 2019 por cuatro (04) meses, así como una adición al contrato por un valor de $3.942.428.000 con sus respectivos soportes, documentos que fueron revisados y aprobados por esta interventoría.


En consecuencia, esta interventoría una vez revisada y analizada la solicitud, avala la adición y prórroga solicitada por INFERCAL S.A, con el fin de mitigar el riesgo de accidentalidad y mejorar la movilidad en los corredores viales priorizados.

La prórroga de 4 meses y la adición por un valor de $3.942.428.000 del contrato de obra No. 1591 de 2019, tiene como proyección la intervención de 30.300 m2 es decir 8.66 km/carril.

Adicionalmente, considerando la Emergencia sanitaria por el COVID-19 vigente en el territorio nacional y la cual específicamente en la ciudad de Bogotá ha llevado a la adopción de medidas estrictas de confinamiento, las cuales han sido intermitentes desde el pasado 20 de Marzo de 2020, así como la construcción y aplicación de los protocolos de bioseguridad necesarios para mitigar la propagación del virus en el personal del contrato y las zonas en las que se tiene intervención, afectando los tiempos de ejecución de las actividades y rendimientos en obra.

De acuerdo a lo anterior, se solicita prórroga por cuatro (4) meses y adición por un valor de $3.942.428.000 al contrato de obra No. 1591 de 2019, cumpliendo con el objeto del contrato bajo los estándares de calidad y normatividad existente.

Cordialmente,



HERNANDO VILLOTA POSSO
Director de Interventoría Desarrollo en Ingeniería DIN S.A.S
Copia: Archivo
Anexo: Presupuestos de la prioridades 25 a la 34 en formato PDF
Levantamiento de fallas de las prioridades 25 a la 34 en formato PDF
Programación actualizada en formato Project y PDF

INFER-BOG-1591-2019-0458

Bogotá D.C., julio 16 de 2020

Señores
DESARROLLO EN INGENIERIA SAS
ATN. Dr. HERNANDO VILLOTA
Director Interventoría
Ciudad

REFERENCIA: Contrato 1591 de 2019 “BRIGADA DE REACCION VIAL PARA EJECUTAR ACTIVIDADES PUNTUALES A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EN LA MALLA VIAR ARTERIAL (MVA) NO TRONCAL”

Asunto: **Solicitud de adición y prorroga.**

Cordial Saludo.

Una vez realizado la etapa de inventario de fallas acorde al contrato de la referencia el cual establece en la CLÁUSULA 5 - PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

> “Finalizado el tercer mes (3) del plazo de la FASE DE EJECUCIÓN del contrato el contratista debe efectuar el inventario de daños de los corredores preseleccionados de forma tal que se agote el 100% el valor del contrato, respetando el orden de intervención definido por el IDU.”

Situación advertida y superada mediante oficio INFER-BOG-1591-2019-0111, en la cual se manifestaba que para los presupuestos entregados hasta el corredor 34 el presupuesto era insuficiente. Posteriormente se concertaron presupuestos con Interventoria mediante múltiples jornadas de trabajo y se procedió a comunicarse el resultado final mediante oficio INFER-BOG-1591-2019-0164, en la cual se envían el presupuesto concertado con la Interventoria hasta el tramo 16. Para posteriormente mediante oficio INFER-BOG-1591-2019-0237 entregar la totalidad del inventario de daños y presupuestos conciliados.

De la anterior situación y siguiendo órdenes de Interventoria e IDU se da alcance a los recursos hasta el tramo orden de prioridad 25 de los 34 ya inventariados en concordancia con el anexo técnico.

Por tanto, solicitamos ante el inventario de daños ya realizado y presupuestado tener en cuenta una adición al contrato de la referencia por un valor de $ 3.942.428.000 para dar alcance a una mayor cobertura de reparación de la malla vial en acciones movilidad de la malla vial que como se ha registrado en las intervenciones ya realizadas, esta se encuentra en mal estado. Ahora Bien, el anexo técnico establecía una meta aproximada de 34.200 m2

de intervención meta que con los recursos invertidos en la actualidad de ya supera la meta establecida en un valor de 204 m2 a falta de recursos por invertir.

Para lo anterior el contratista solicita un plazo adicional al plazo actual de 4 meses ante la notable disminución de rendimiento de las labores contractuales por los mecanismos adoptados para combatir y mitigar la expansión del COVID – 19, situación que según todos los pronunciamientos oficiales se extenderá hasta tanto no exista una vacuna eficaz y definitiva para luchar contra la pandemia. Situación que está aún lejos de darse. Situación que ya había sido advertida en comunicaciones anteriores y que radica que ante la disminución del número de personas en los frentes de obra a mínimo 10, no permiten realizar simultaneidad de tareas ante los escases o poco recurso humano disponible para múltiples tareas. Por lo cual los cronogramas aquí entregados serán sujetos de ajuste y verificación constante ante las continuas situaciones cambiantes acorde a factores externos.


En concordancia con lo anterior se adjuntan inventarios hasta el orden de prioridad 34. Con lo cual se pretenden atender aproximadamente 30.300 m2 de vía y 8.66 km/carril, acorde a los inventarios de daños que ya habían sido presentados.

Adjuntamos:


- Inventario de fallas de las prioridades 26 a 34.
- Presupuestos Inventario de fallas de las prioridades 26 a 34.
- Cronograma de Obra.

Cordialmente,


HERNAN MAURICIO PUYO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA
INFERCAL S.A.
C.C.: Archivo
Anexos: 3 Archivos digitales
Elaborado por: HMPG

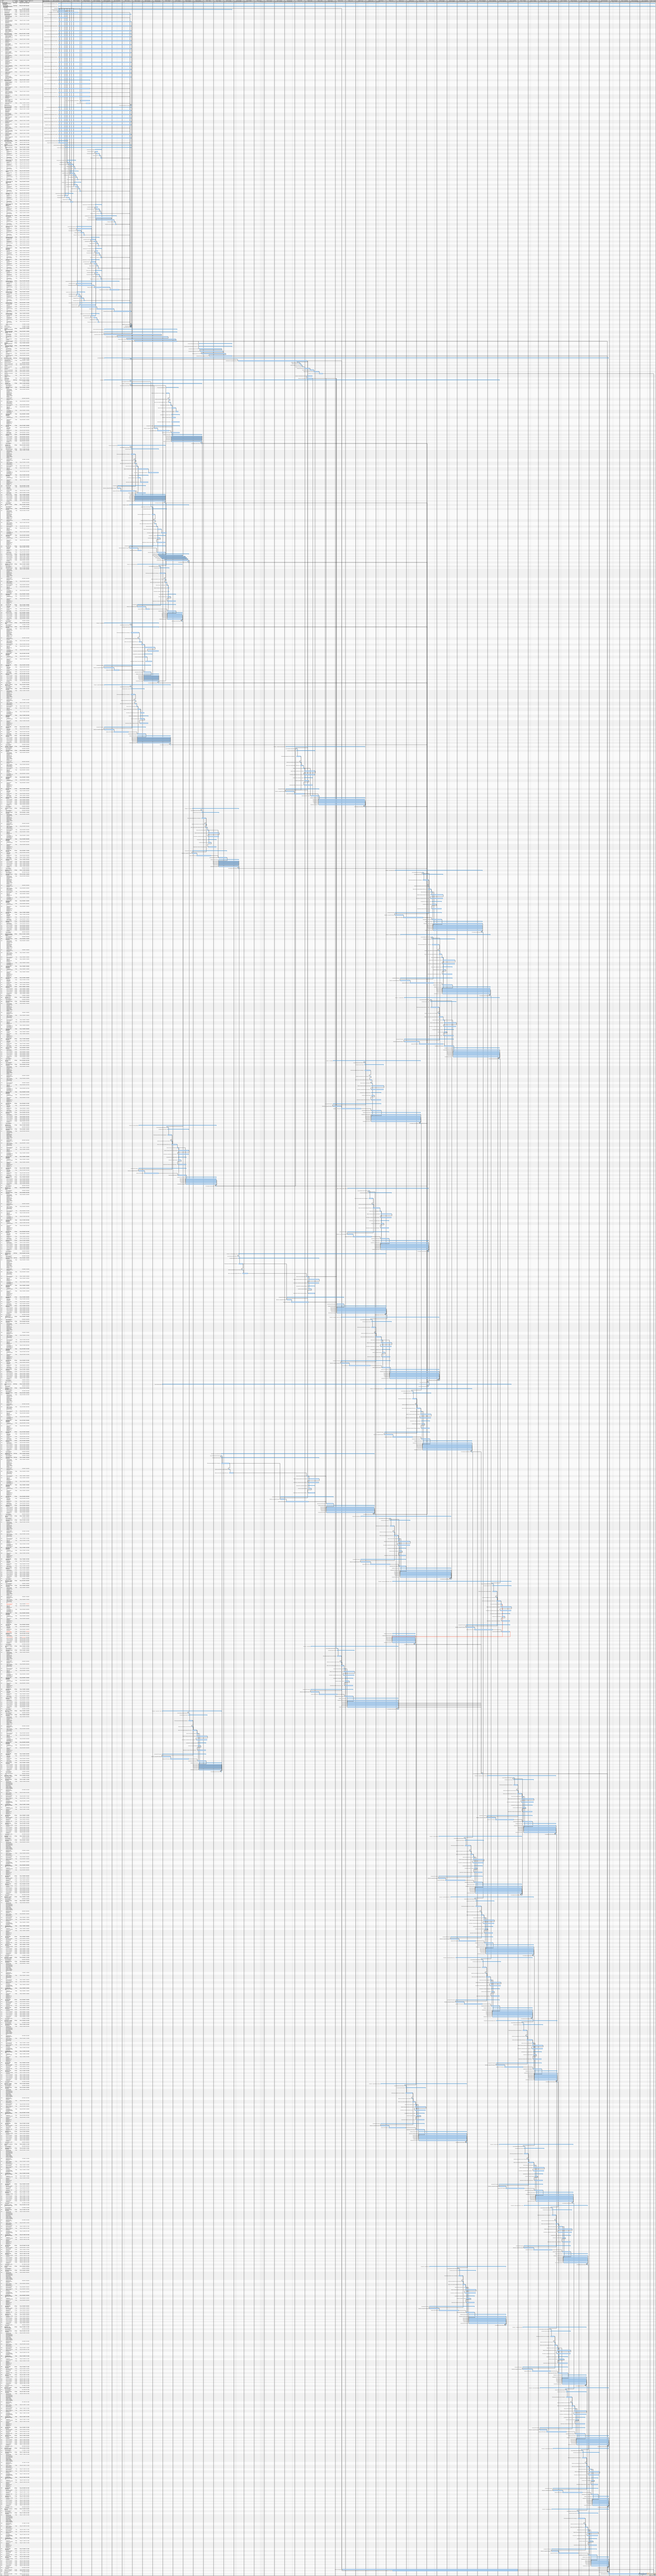


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	Sucesoras
1	**IDU-1591-2020-REACCIONMVANOTRONCAL-CLB-20200203**	**373.75 días**	**vie 22/11/19**	**mié 6/01/21**	**$ 12,841,997,3...**		
2	Acta de Inicio	0 días	vie 22/11/19	vie 22/11/19	$ 0		4,27,22,40,36,33
3	**ACTIVIDADES PREVIAS**	**112 días**	**vie 22/11/19**	**vie 20/03/20**	**$ 0**		
4	Recorrido de Obra	4 días	vie 22/11/19	mar 26/11/19	$ 0	2	5CC,66,51,56,61
5	Recopilación de Información SIG	13 días	vie 22/11/19	jue 5/12/19	$ 0	4CC	127
6	**Documentación Previa Componente SST**	**45 días**	**vie 22/11/19**	**sáb 11/01/20**	**$ 0**		
11	**Documentación Previa Componente Ambiental**	**45 días**	**vie 22/11/19**	**sáb 11/01/20**	**$ 0**		
23	**Documentación Previa Componente Social**	**21 días**	**vie 22/11/19**	**vie 13/12/19**	**$ 0**		
30	Autorizacion para elaboracion de volantes	0 días	sáb 11/01/20	sáb 11/01/20	$ 0	29,12,8,42	
31	**Documentación Previa Componente Técnico**	**45 días**	**vie 22/11/19**	**sáb 11/01/20**	**$ 0**		
41	**Documentación Previa Plan de Manejo de Tráfico**	**6 días**	**vie 22/11/19**	**jue 28/11/19**	**$ 0**		
43	**Inventario Georeferenciado primera etapa**	**41 días**	**mar 26/11/19**	**sáb 11/01/20**	**$ 0**		
44	**Inventario del 20% del Total**	**41 días**	**mar 26/11/19**	**sáb 11/01/20**	**$ 0**		
126	Reunión de inicio	0 días	sáb 11/01/20	sáb 11/01/20	$ 0	7,8,9,10,12,13,14	
127	Fin Actividades Previas	0 días	sáb 11/01/20	sáb 11/01/20	$ 0	5,40,36,33,32,42	141
128	**Inventario Georeferenciado segunda etapa**	**45 días**	**lun 23/12/19**	**mar 11/02/20**	**$ 0**		
134	**Inventario Georeferenciado tercera etapa**	**22 días**	**jue 27/02/20**	**vie 20/03/20**	**$ 0**		
140	**ACTIVIDADES DE OBRA**	**337.75 días**	**lun 23/12/19**	**mar 29/12/20**	**$ 12,841,997,3...**		
141	Inicio Actividades de Obra	0 días	sáb 11/01/20	sáb 11/01/20	$ 0	127	154,142
142	SUSPENSIÓN POR CUARENTENA COVID-19	41 días	mié 25/03/20	lun 11/05/20	$ 0	141	561,568FC-16 día
143	Entrega de protocolo	0 días	mar 5/05/20	mar 5/05/20	$ 0	142FC-6 días	144FC+1 día
144	Remision de observaciones	1 día	mié 6/05/20	mié 6/05/20	$ 0	143FC+1 día	145
145	Atencion de observaciones y remision	1 día	jue 7/05/20	jue 7/05/20	$ 0	144	146FC+1 día
146	Aprobacion de protocolo	0 días	vie 8/05/20	vie 8/05/20	$ 0	145FC+1 día	147FC+1 día
147	Presentacion NP protocolos	3 días	sáb 9/05/20	mié 13/05/20	$ 0	146FC+1 día	148
148	Remision de observaciones	3 días	mié 13/05/20	vie 15/05/20	$ 0	147	149
149	Atencion de observaciones y remision	3 días	sáb 16/05/20	mar 19/05/20	$ 0	148	150
150	Aprobacion e Incorporacion Contractual	3 días	mar 19/05/20	vie 22/05/20	$ 0	149	990
151	Adquisicion e Implementacion de medidas	4 días	lun 11/05/20	vie 15/05/20	$ 0	142	152CC
152	Verificacion de Implementacion	4 días	lun 11/05/20	vie 15/05/20	$ 0	151CC	308FC-1 día,570F
153	**Tramos fase 1**	**246.75 días**	**lun 23/12/19**	**lun 21/09/20**	**$ 5,485,408,317**		
154	Inicio Actividades Primera Fase	0 días	sáb 11/01/20	sáb 11/01/20	$ 0	141	156,271,248,202
155	**Prioridad 1 - Av Caracas Tramo 4**	**47 días**	**sáb 11/01/20**	**vie 28/02/20**	**$ 429,662,198**		
156	Inicio Actividades de Obra Prioridad 1	0 días	sáb 11/01/20	sáb 11/01/20	$ 0	154	158,168
157	**Actividades Sociales Prioridad 1**	**8 días**	**mar 4/02/20**	**mié 12/02/20**	**$ 395,522**		
158	Preliminares para desarrollo reunion inicio (Espacio para la reunión, programacion de reuniones de Inicio, diseño pieza de invitación, diseño invitación entidades públicas y divulgacion de	2 días	mar 4/02/20	jue 6/02/20	$ 237,314	268FC+5 días,156	159
159	Aprobación para desarrollo de reunion Prioridad 1	0 días	jue 6/02/20	jue 6/02/20	$ 0	158	160
160	Diseño y envio de volante socialización PMT (una vez se apruebe) Prioridad 1	1 día	jue 6/02/20	vie 7/02/20	$ 39,552	159	161
161	Reunion de Inicio de Obra Prioridad 1	1 día	vie 7/02/20	sáb 8/02/20	$ 39,552	160	162,165,166,168
162	Registro de inspección preliminar de vías Prioridad 1	2 días	sáb 8/02/20	lun 10/02/20	$ 39,552	161	163
163	Convocatoria y Levantamiento actas de vecindad SI APLICA Priorid	2 días	lun 10/02/20	mié 12/02/20	$ 39,552	162	
164	**Actividades SST y Ambientales Prioridad 1**	**5 días**	**sáb 8/02/20**	**jue 13/02/20**	**$ 3,544,517**		
165	Inventario de sumideros Prioridad 1	2 días	sáb 8/02/20	lun 10/02/20	$ 354,452	161	
166	Implementacion Ambiental, Protecciones Sumideros, Arboles, Elementos de protección y otros Prioridad 1	5 días	sáb 8/02/20	jue 13/02/20	$ 3,190,065	161	
167	**Actividades PMT prioridad 1**	**17 días**	**lun 27/01/20**	**jue 13/02/20**	**$ 10,703,981**		
168	Elaboración y entrega PMT Prioridad 1	2 días	lun 27/01/20	mié 29/01/20	$ 1,070,398	161FC-12 días,15	169
169	Aprobación PMT Prioridad 1	8 días	mié 29/01/20	jue 6/02/20	$ 0	168	170
170	Implementacion PMT Prioridad 1	5 días	sáb 8/02/20	jue 13/02/20	$ 9,633,583	169,161	
171	**Actidades de Obra prioridad 1**	**20 días**	**sáb 8/02/20**	**vie 28/02/20**	**$ 415,018,178**		
172	Parcheo Prioridad 1	20 días	sáb 8/02/20	vie 28/02/20	$ 228,634,333	161	173FC-20 días
173	Bacheo Prioridad 1	20 días	sáb 8/02/20	vie 28/02/20	$ 184,521,047	172FC-20 días	174FC-20 días
174	Carpeta Prioridad 1	20 días	sáb 8/02/20	vie 28/02/20	$ 0	173FC-20 días	175FC-20 días
175	Losas Prioridad 1	20 días	sáb 8/02/20	vie 28/02/20	$ 0	174FC-20 días	176FC-20 días
176	Complementarias Prioridad 1	20 días	sáb 8/02/20	vie 28/02/20	$ 1,862,798	175FC-20 días	317,177
177	Fin Actividades de Obra Prioridad 1	0 días	vie 28/02/20	vie 28/02/20	$ 0	176	528
178	**Prioridad 2 - Av Laureano Gomez**	**30 días**	**jue 2/01/20**	**lun 3/02/20**	**$ 432,781,302**		
179	Inicio Actividades de Obra Prioridad 2	0 días	sáb 11/01/20	sáb 11/01/20	$ 0	154	181
180	**Actividades Sociales**	**18 días**	**sáb 11/01/20**	**jue 30/01/20**	**$ 395,522**		
181	Preliminares para desarrollo reunion inicio (Espacio para la reunión, programacion de reuniones de Inicio, diseño pieza de invitación, diseño invitación entidades públicas y divulgacion de	2 días	sáb 11/01/20	lun 13/01/20	$ 237,314	179	182,191FC-10 días
182	Aprobación para desarrollo de reunion Prioridad 2	0 días	lun 13/01/20	lun 13/01/20	$ 0	181	183

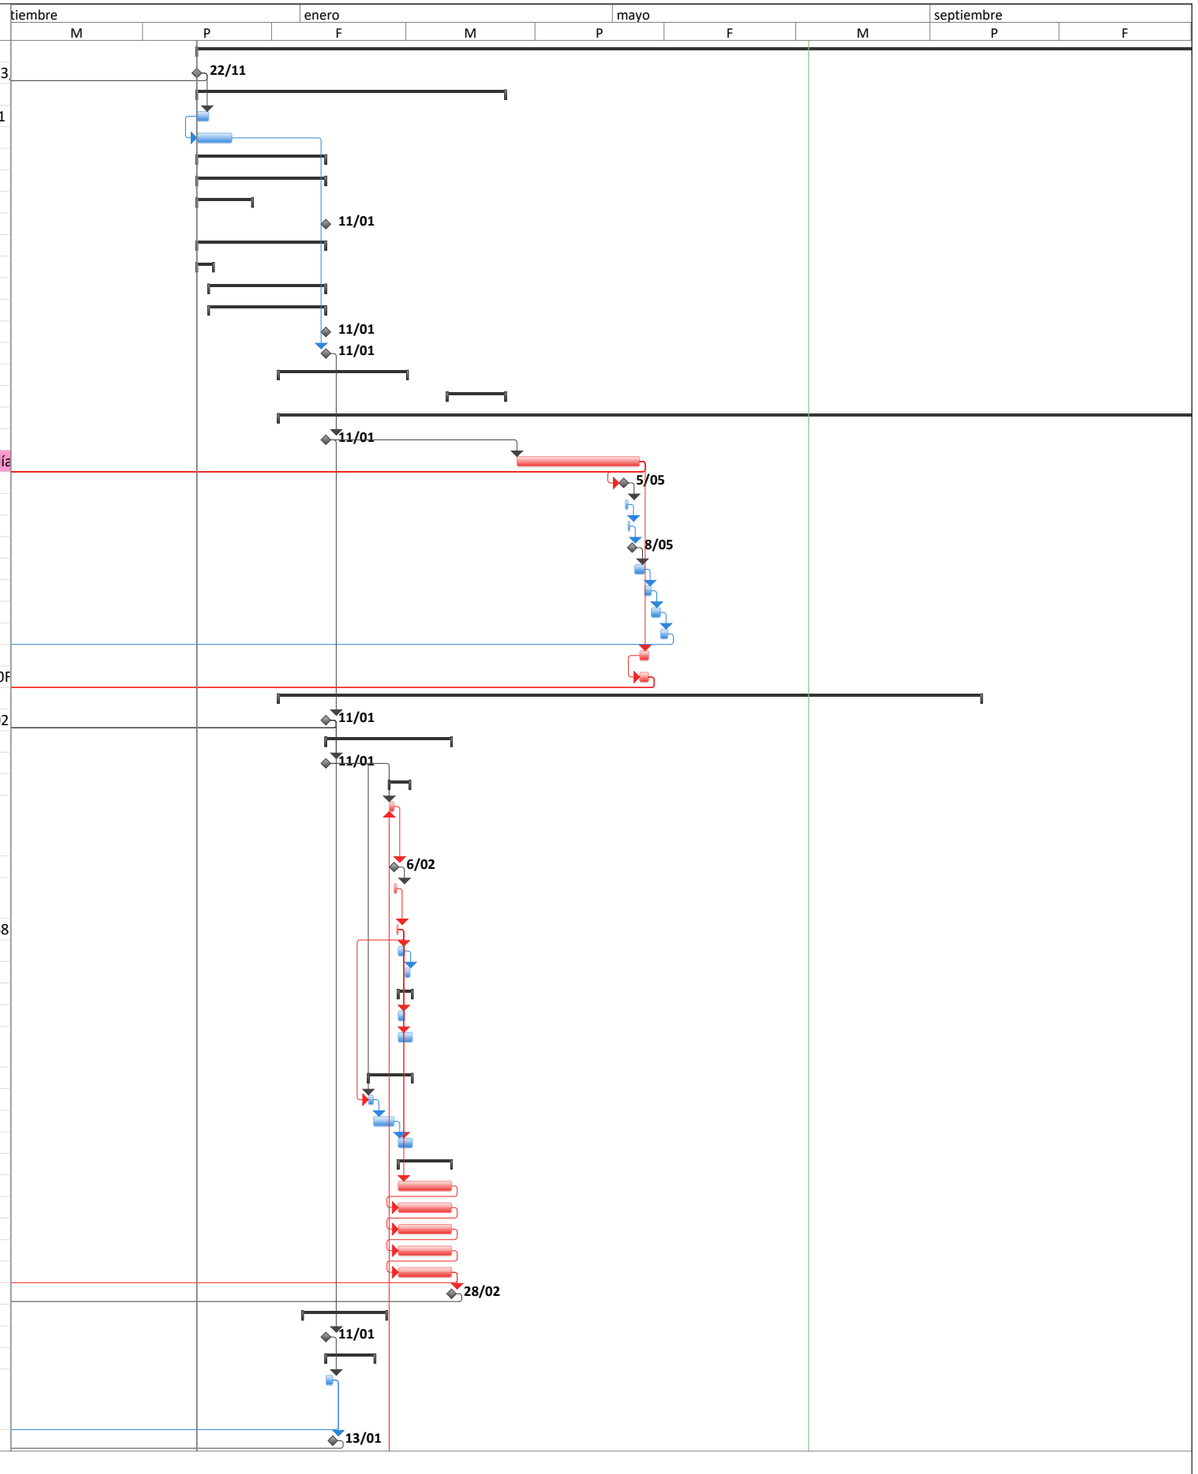


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	Sucesoras
183	Diseño y envio de volante socialización PMT (una vez se apruebe) Prioridad 2	1 día	lun 13/01/20	mar 14/01/20	$ 39,552	182	184
184	Reunion de Inicio de Obra Prioridad 2	1 día	mar 14/01/20	mié 15/01/20	$ 39,552	183	185,188,193
185	Registro de inspección preliminar de vías Prioridad 2	7 días	mié 15/01/20	mié 22/01/20	$ 39,552	184	186
186	Convocatoria y Levantamiento actas de vecindad SI APLICA Prioridad 2	7 días	mié 22/01/20	jue 30/01/20	$ 39,552	185	
187	**Actividades SST y Ambientales**	**7 días**	**mié 15/01/20**	**mié 22/01/20**	**$ 3,544,517**		
188	Inventario de sumideros Prioridad 2	2 días	mié 15/01/20	vie 17/01/20	$ 354,452	184	189
189	Implementacion Ambiental, Protecciones Sumideros, Arboles, Elementos de protección y otros Prioridad 2	5 días	vie 17/01/20	mié 22/01/20	$ 3,190,065	188	
190	**Actividades PMT**	**17 días**	**jue 2/01/20**	**mar 21/01/20**	**$ 10,703,981**		
191	Elaboracion y entrega PMT Prioridad 2 Av Laureano Gomez	2 días	jue 2/01/20	vie 3/01/20	$ 1,070,398	181FC-10 días	192
192	Aprobacion PMT Prioridad 2	8 días	vie 3/01/20	lun 13/01/20	$ 0	191	193,195
193	Implementacion PMT Prioridad 2	5 días	mié 15/01/20	mar 21/01/20	$ 9,633,583	184,192	
194	**Actidades de Obra**	**20 días**	**lun 13/01/20**	**lun 3/02/20**	**$ 418,137,282**		
195	Parcheo Prioridad 2	20 días	lun 13/01/20	lun 3/02/20	$ 216,571,048	192	196FC-20 días
196	Bacheo Prioridad 2	20 días	lun 13/01/20	lun 3/02/20	$ 160,600,636	195FC-20 días	197FC-20 días
197	Carpeta Prioridad 2	20 días	lun 13/01/20	lun 3/02/20	$ 34,445,896	196FC-20 días	198FC-20 días
198	Losas Prioridad 2	20 días	lun 13/01/20	lun 3/02/20	$ 0	197FC-20 días	199FC-20 días
199	Complementarias Prioridad 2	20 días	lun 13/01/20	lun 3/02/20	$ 6,519,702	198FC-20 días	200
200	Fin Actividades de Obra Prioridad 2	0 días	lun 3/02/20	lun 3/02/20	$ 0	199	528,225FC-3 días
201	**Prioridad 3 - Av Pablo VI**	**39 días**	**vie 10/01/20**	**mié 19/02/20**	**$ 74,298,501**		
202	Inicio Actividades de Obra Prioridad 3	0 días	sáb 25/01/20	sáb 25/01/20	$ 0	154FC+14 días	204,214FC-15 días
203	**Actividades Sociales prioridad 3**	**9 días**	**sáb 25/01/20**	**mar 4/02/20**	**$ 395,522**		
204	Preliminares para desarrollo reunion inicio (Espacio para la reunión, programacion de reuniones de Inicio, diseño pieza de invitación, diseño invitación entidades públicas y divulgacion de	1 día	sáb 25/01/20	lun 27/01/20	$ 237,314	202	205
205	Aprobación para desarrollo de reunion Prioridad 3	0 días	lun 27/01/20	lun 27/01/20	$ 0	204	206
206	Diseño y envio de volante socialización PMT (una vez se apruebe) Prioridad 3	1 día	lun 27/01/20	mar 28/01/20	$ 39,552	205	207
207	Reunion de Inicio de Obra Prioridad 3	1 día	mar 28/01/20	mié 29/01/20	$ 39,552	206	208,211,216
208	Registro de inspección preliminar de vías Prioridad 3	3 días	mié 29/01/20	vie 31/01/20	$ 39,552	207	209
209	Convocatoria y Levantamiento actas de vecindad SI APLICA Prioridad 3	3 días	vie 31/01/20	mar 4/02/20	$ 39,552	208	
210	**Actividades SST y Ambientales**	**5 días**	**mié 29/01/20**	**lun 3/02/20**	**$ 1,729,246**		
211	Inventario de sumideros Prioridad 3	2 días	mié 29/01/20	jue 30/01/20	$ 172,925	207	212FC-2 días
212	Implementacion Ambiental, Protecciones Sumideros, Arboles, Elementos de protección y otros Prioridad 3	5 días	mié 29/01/20	lun 3/02/20	$ 1,556,321	211FC-2 días	
213	**Actividades PMT**	**23 días**	**vie 10/01/20**	**lun 3/02/20**	**$ 3,384,706**		
214	Elaboracion y entrega PMT Prioridad 3	5 días	vie 10/01/20	mié 15/01/20	$ 338,471	202FC-15 días	215,216
215	Aprobacion PMT Prioridad 3	3 días	mié 15/01/20	sáb 18/01/20	$ 0	214	
216	Implementacion PMT Prioridad 3	5 días	mié 29/01/20	lun 3/02/20	$ 3,046,235	214,207	218FC-4 días
217	**Actidades de Obra**	**20 días**	**jue 30/01/20**	**mié 19/02/20**	**$ 68,789,027**		
218	Parcheo Prioridad 3	16 días	jue 30/01/20	sáb 15/02/20	$ 66,267,367	216FC-4 días	219FC-15 días
219	Bacheo Prioridad 3	16 días	vie 31/01/20	lun 17/02/20	$ 768,872	218FC-15 días	220FC-15 días
220	Carpeta Prioridad 3	16 días	vie 31/01/20	mar 18/02/20	$ 0	219FC-15 días	221FC-15 días
221	Losas Prioridad 3	16 días	sáb 1/02/20	mar 18/02/20	$ 0	220FC-15 días	222FC-15 días
222	Complementarias Prioridad 3	16 días	lun 3/02/20	mié 19/02/20	$ 1,752,788	221FC-15 días	651,223
223	Fin Actividades de Obra Prioridad 3	0 días	mié 19/02/20	mié 19/02/20	$ 0	222	528
224	**Prioridad 4 - Av Gabriel Andrade Lleras**	**30 días**	**mié 15/01/20**	**sáb 15/02/20**	**$ 392,293,473**		
225	Inicio Actividades de Obra Prioridad 4	0 días	vie 31/01/20	vie 31/01/20	$ 0	200FC-3 días	227,237FC-15 días
226	**Actividades Sociales**	**6 días**	**vie 31/01/20**	**jue 6/02/20**	**$ 395,522**		
227	Preliminares para desarrollo reunion inicio (Espacio para la reunión, programacion de reuniones de Inicio, diseño pieza de invitación, diseño invitación entidades públicas y divulgacion de	3 días	vie 31/01/20	lun 3/02/20	$ 237,314	225	228
228	Aprobación para desarrollo de reunion Prioridad 4	0 días	lun 3/02/20	lun 3/02/20	$ 0	227	229
229	Diseño y envio de volante socialización PMT (una vez se apruebe) Prioridad 4	1 día	lun 3/02/20	mar 4/02/20	$ 39,552	228	230
230	Reunion de Inicio de Obra Prioridad 4	1 día	mar 4/02/20	mié 5/02/20	$ 39,552	229	231,232,234,239
231	Registro de inspección preliminar de vías Prioridad 4	1 día	mié 5/02/20	jue 6/02/20	$ 39,552	230	
232	Convocatoria y Levantamiento actas de vecindad SI APLICA Prioridad 4	1 día	mié 5/02/20	jue 6/02/20	$ 39,552	230	
233	**Actividades SST y Ambientales**	**5 días**	**mié 5/02/20**	**lun 10/02/20**	**$ 1,729,246**		
234	Inventario de sumideros Prioridad 4	2 días	mié 5/02/20	vie 7/02/20	$ 172,925	230	235FC-2 días
235	Implementacion Ambiental, Protecciones Sumideros, Arboles, Elementos de protección y otros Prioridad 4	5 días	mié 5/02/20	lun 10/02/20	$ 1,556,321	234FC-2 días	
236	**Actividades PMT**	**25 días**	**mié 15/01/20**	**lun 10/02/20**	**$ 3,384,706**		
237	Elaboracion y entrega PMT Prioridad 4	5 días	mié 15/01/20	mar 21/01/20	$ 338,471	225FC-15 días	238
238	Aprobacion PMT Prioridad 4	3 días	mar 21/01/20	jue 23/01/20	$ 0	237	239
239	Implementacion PMT Prioridad 4	5 días	mié 5/02/20	lun 10/02/20	$ 3,046,235	230,238	241FC-5 días
240	**Actidades de Obra**	**10 días**	**mié 5/02/20**	**sáb 15/02/20**	**$ 386,783,999**		

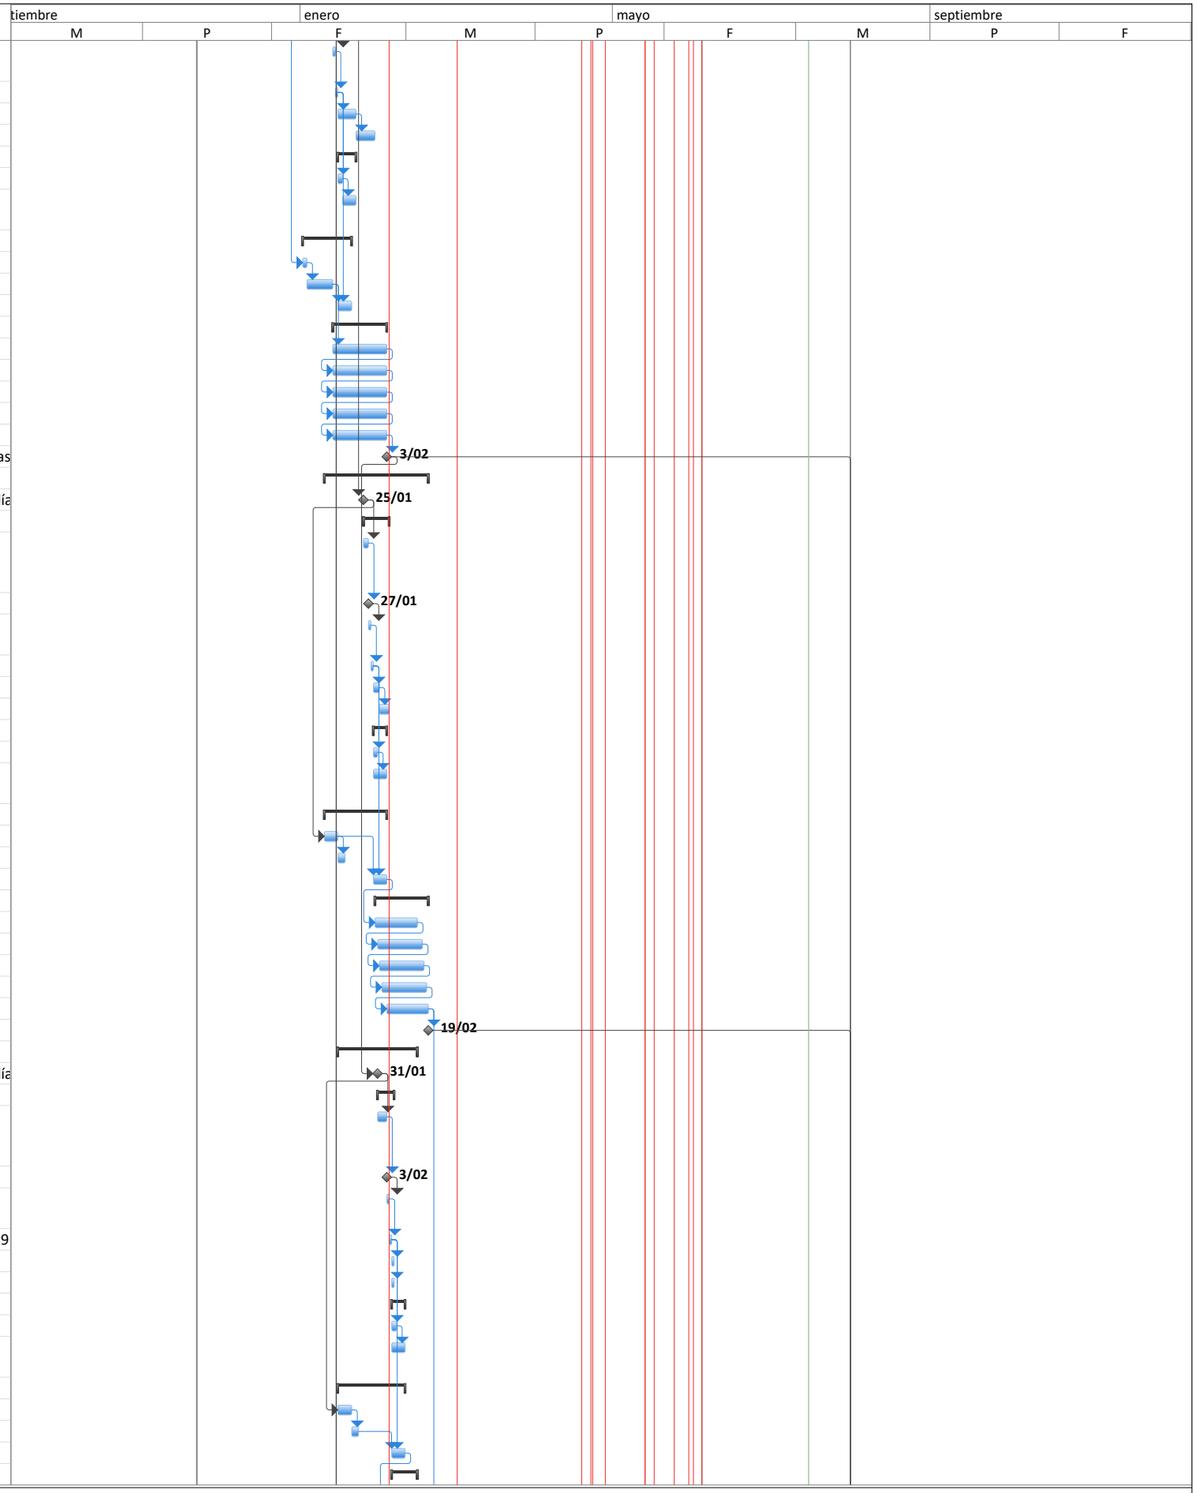


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	Sucesoras
241	Parcheo Prioridad 4	10 días	mié 5/02/20	sáb 15/02/20	$ 231,162,845	239FC-5 días	242CC,243CC,244
242	Bacheo Prioridad 4	10 días	mié 5/02/20	sáb 15/02/20	$ 121,639,640	241CC	246
243	Carpeta Prioridad 4	10 días	mié 5/02/20	sáb 15/02/20	$ 25,079,573	241CC	246
244	Losas Prioridad 4	10 días	mié 5/02/20	sáb 15/02/20	$ 0	241CC	246
245	Complementarias Prioridad 4	10 días	mié 5/02/20	sáb 15/02/20	$ 8,901,941	241CC	246
246	Fin Actividades de Obra Prioridad 4	0 días	sáb 15/02/20	sáb 15/02/20	$ 0	245,244,243,242	435FC-10 días
247	**Prioridad 5 - Av de las Villas**	**33 días**	**lun 23/12/19**	**jue 30/01/20**	**$ 451,249,720**		
248	Inicio Actividades de Obra Prioridad 5	0 días	sáb 11/01/20	sáb 11/01/20	$ 0	154	250,260FC-15 día
249	**Actividades Sociales Prioridad 5**	**18 días**	**sáb 11/01/20**	**jue 30/01/20**	**$ 395,522**		**528**
250	Preliminares para desarrollo reunion inicio (Espacio para la reunión, programacion de reuniones de Inicio, diseño pieza de invitación, diseño invitación entidades públicas y divulgacion de	5 días	sáb 11/01/20	jue 16/01/20	$ 237,314	248	251
251	Aprobación para desarrollo de reunion Prioridad 5	0 días	jue 16/01/20	jue 16/01/20	$ 0	250	252
252	Diseño y envio de volante socialización PMT (una vez se apruebe) Prioridad 5	2 días	jue 16/01/20	sáb 18/01/20	$ 39,552	251	253
253	Reunion de Inicio de Obra Prioridad 5	1 día	sáb 18/01/20	lun 20/01/20	$ 39,552	252	254,257,262
254	Registro de inspección preliminar de vías Prioridad 5	7 días	lun 20/01/20	lun 27/01/20	$ 39,552	253	255FC-4 días
255	Convocatoria y Levantamiento actas de vecindad SI APLICA Priorid	7 días	mié 22/01/20	jue 30/01/20	$ 39,552	254FC-4 días	
256	**Actividades SST y Ambientales Prioridad 5**	**6 días**	**lun 20/01/20**	**sáb 25/01/20**	**$ 3,544,517**		
257	Inventario de sumideros Prioridad 5	2 días	lun 20/01/20	mar 21/01/20	$ 354,452	253	258FC-1 día
258	Implementacion Ambiental, Protecciones Sumideros, Arboles, Elementos de protección y otros Prioridad 5	5 días	mar 21/01/20	sáb 25/01/20	$ 3,190,065	257FC-1 día	
259	**Actividades PMT Prioridad 5**	**28 días**	**lun 23/12/19**	**vie 24/01/20**	**$ 2,682,714**		
260	Elaboracion y entrega PMT Prioridad 5	5 días	lun 23/12/19	lun 30/12/19	$ 268,271	248FC-15 días	261
261	Aprobacion PMT Prioridad 5	3 días	lun 30/12/19	jue 2/01/20	$ 0	260	262
262	Implementacion PMT Prioridad 5	5 días	lun 20/01/20	vie 24/01/20	$ 2,414,443	261,253	264FC-5 días
263	**Actidades de Obra Prioridad 5**	**10 días**	**lun 20/01/20**	**jue 30/01/20**	**$ 444,626,967**		
264	Parcheo Prioridad 5	10 días	lun 20/01/20	jue 30/01/20	$ 214,169,536	262FC-5 días	265FC-10 días
265	Bacheo Prioridad 5	10 días	lun 20/01/20	jue 30/01/20	$ 74,774,689	264FC-10 días	266FC-10 días
266	Carpeta Prioridad 5	10 días	lun 20/01/20	jue 30/01/20	$ 150,446,308	265FC-10 días	267FC-10 días
267	Losas Prioridad 5	10 días	lun 20/01/20	jue 30/01/20	$ 0	266FC-10 días	268FC-10 días
268	Complementarias Prioridad 5	10 días	lun 20/01/20	jue 30/01/20	$ 5,236,434	267FC-10 días	158FC+5 días,269
269	Fin Actividades de Obra Prioridad 5	0 días	jue 30/01/20	jue 30/01/20	$ 0	268	528
270	**Prioridad 6 - Agoberto Mejia Cifuentes**	**41 días**	**lun 23/12/19**	**vie 7/02/20**	**$ 206,531,929**		
271	Inicio Actividades de Obra prioridad 6	0 días	sáb 11/01/20	sáb 11/01/20	$ 0	154	273,283FC-15 día
272	**Actividades Sociales prioridad 6**	**8 días**	**sáb 11/01/20**	**lun 20/01/20**	**$ 395,522**		
273	Preliminares para desarrollo reunion inicio (Espacio para la reunión, programacion de reuniones de Inicio, diseño pieza de invitación, diseño invitación entidades públicas y divulgacion de	2 días	sáb 11/01/20	lun 13/01/20	$ 237,314	271	274
274	Aprobación para desarrollo de reunion Prioridad 6	0 días	lun 13/01/20	lun 13/01/20	$ 0	273	275
275	Diseño y envio de volante socialización PMT (una vez se apruebe) Prioridad 6	1 día	lun 13/01/20	mar 14/01/20	$ 39,552	274	276
276	Reunion de Inicio de Obra Prioridad 6	1 día	mar 14/01/20	mié 15/01/20	$ 39,552	275	277,285
277	Registro de inspección preliminar de vías Prioridad 6	2 días	mié 15/01/20	vie 17/01/20	$ 39,552	276	278,280
278	Convocatoria y Levantamiento actas de vecindad SI APLICA Priorid	2 días	vie 17/01/20	lun 20/01/20	$ 39,552	277	
279	**Actividades SST y Ambientales prioridad 6**	**5 días**	**vie 17/01/20**	**mié 22/01/20**	**$ 3,544,517**		
280	Inventario de sumideros prioridad 6	2 días	vie 17/01/20	lun 20/01/20	$ 354,452	277	281FC-2 días
281	Implementacion Ambiental, Protecciones Sumideros, Arboles, Elementos de protección y otros Prioridad 6	5 días	vie 17/01/20	mié 22/01/20	$ 3,190,065	280FC-2 días	
282	**Actividades PMT prioridad 6**	**24 días**	**lun 23/12/19**	**mar 21/01/20**	**$ 10,703,981**		
283	Elaboración y entrega PMT Prioridad 6	5 días	lun 23/12/19	lun 30/12/19	$ 1,070,398	271FC-15 días	284
284	Aprobacion PMT Prioridad 6	8 días	lun 30/12/19	jue 9/01/20	$ 0	283	285
285	Implementacion PMT Prioridad 6	5 días	mié 15/01/20	mar 21/01/20	$ 9,633,583	284,276	287FC-5 días
286	**Actidades de Obra prioridad 6**	**22 días**	**mié 15/01/20**	**vie 7/02/20**	**$ 191,887,909**		
287	Parcheo Prioridad 6	22 días	mié 15/01/20	vie 7/02/20	$ 93,963,865	285FC-5 días	288FC-22 días
288	Bacheo Prioridad 6	22 días	mié 15/01/20	vie 7/02/20	$ 16,072,973	287FC-22 días	289FC-22 días
289	Carpeta Prioridad 6	22 días	mié 15/01/20	vie 7/02/20	$ 72,074,722	288FC-22 días	290FC-22 días
290	Losas Prioridad 6	22 días	mié 15/01/20	vie 7/02/20	$ 0	289FC-22 días	291FC-22 días
291	Complementarias Prioridad 6	22 días	mié 15/01/20	vie 7/02/20	$ 9,776,349	290FC-22 días	292
292	Fin Actividades de Obra Prioridad 6	0 días	vie 7/02/20	vie 7/02/20	$ 0	291	528
293	**Prioridad 7 - Avenida de las Americas Tramo 2**	**51 días**	**lun 27/04/20**	**sáb 20/06/20**	**$ 54,117,735**		
294	Inicio Actividades de Obra Prioridad 7	0 días	lun 4/05/20	lun 4/05/20	$ 0	456FC-10 días,14	296
295	**Actividades Sociales Prioridad 7**	**13 días**	**lun 4/05/20**	**sáb 16/05/20**	**$ 395,522**		
296	Preliminares para desarrollo reunion inicio (Espacio para la reunión, programacion de reuniones de Inicio, diseño pieza de invitación, diseño invitación entidades públicas y divulgacion de	3 días	lun 4/05/20	mié 6/05/20	$ 237,314	294	297,306FC-9 días
297	Aprobación para desarrollo de reunion Prioridad 7	0 días	mié 6/05/20	mié 6/05/20	$ 0	296	298

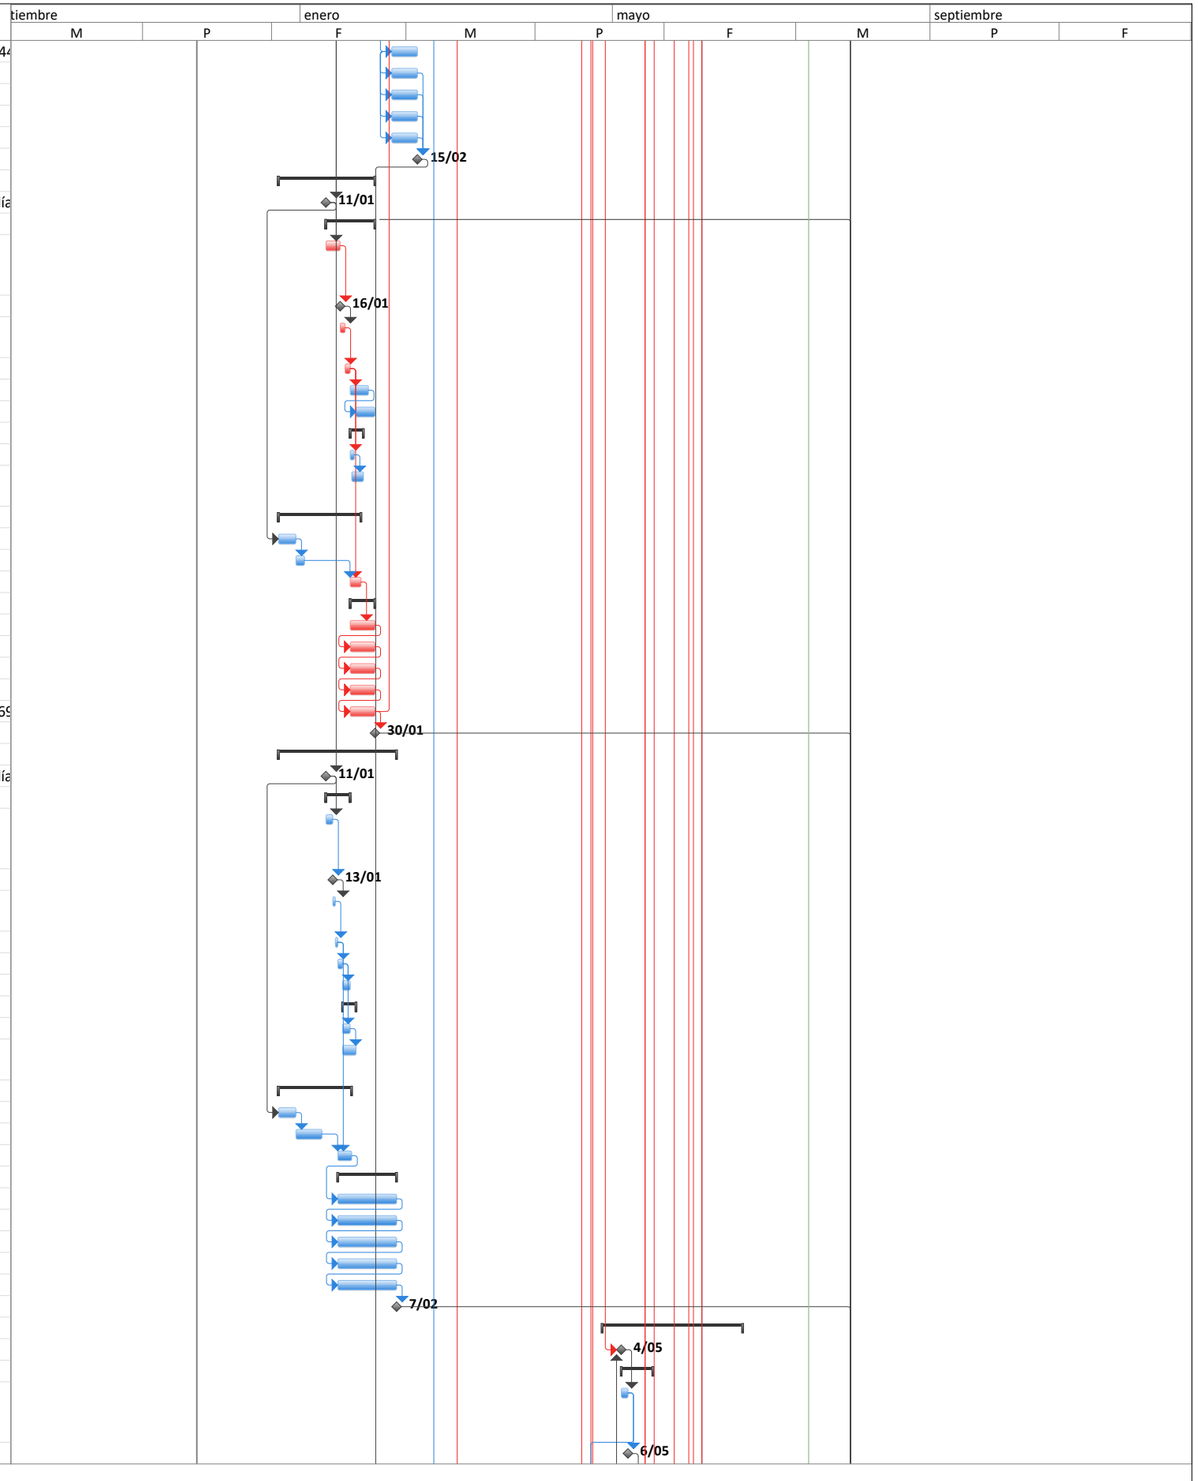


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	Sucesoras
298	Diseño y envio de volante socialización PMT (una vez se apruebe) Prioridad 7	2 días	jue 7/05/20	vie 8/05/20	$ 39,552	297	299
299	Reunion de Inicio de Obra Prioridad 7	1 día	vie 8/05/20	sáb 9/05/20	$ 39,552	298	303,300,308
300	Registro de inspección preliminar de vías Prioridad 7	7 días	sáb 9/05/20	sáb 16/05/20	$ 39,552	299	301FC-7 días
301	Convocatoria y Levantamiento actas de vecindad SI APLICA Priorid	7 días	sáb 9/05/20	sáb 16/05/20	$ 39,552	300FC-7 días	
302	**Actividades SST y Ambientales Prioridad 7**	**5 días**	**sáb 9/05/20**	**vie 15/05/20**	**$ 3,544,517**		
303	Inventario de sumideros Prioridad 7	2 días	sáb 9/05/20	mar 12/05/20	$ 354,452	299	304FC-2 días
304	Implementacion Ambiental, Protecciones Sumideros, Arboles, Elementos de protección y otros Prioridad 7	5 días	sáb 9/05/20	vie 15/05/20	$ 3,190,065	303FC-2 días	
305	**Actividades PMT Prioridad 7**	**21 días**	**lun 27/04/20**	**mar 19/05/20**	**$ 10,703,981**		
306	Elaboracion y entrega PMT Prioridad 7	5 días	lun 27/04/20	sáb 2/05/20	$ 1,070,398	296FC-9 días,142	307
307	Aprobacion PMT Prioridad 7	7 días	sáb 2/05/20	sáb 9/05/20	$ 0	306	308FC+3 días,310
308	Implementacion PMT Prioridad 7	5 días	jue 14/05/20	mar 19/05/20	$ 9,633,583	307FC+3 días,295	310
309	**Actidades de Obra Prioridad 7**	**30 días**	**mar 19/05/20**	**sáb 20/06/20**	**$ 39,473,715**		
310	Parcheo Prioridad 7	30 días	mar 19/05/20	sáb 20/06/20	$ 6,472,137	307,308	311CC,312CC,313
311	Bacheo Prioridad 7	30 días	mar 19/05/20	sáb 20/06/20	$ 20,170,652	310CC	315
312	Carpeta Prioridad 7	30 días	mar 19/05/20	sáb 20/06/20	$ 10,699,987	310CC	315
313	Losas Prioridad 7	30 días	mar 19/05/20	sáb 20/06/20	$ 0	310CC	315
314	Complementarias Prioridad 7	30 días	mar 19/05/20	sáb 20/06/20	$ 2,130,939	310CC	315
315	Fin Actividades de Obra Prioridad 7	0 días	sáb 20/06/20	sáb 20/06/20	$ 0	314,313,312,311	528,411
316	**Prioridad 8 - Av Santa Lucia**	**29 días**	**sáb 22/02/20**	**mié 25/03/20**	**$ 188,204,195**		
317	Inicio Actividades de Obra Prioridad 8	0 días	vie 28/02/20	vie 28/02/20	$ 0	176	319
318	**Actividades Sociales Prioridad 8**	**11 días**	**vie 28/02/20**	**mié 11/03/20**	**$ 391,792**		
319	Preliminares para desarrollo reunion inicio (Espacio para la reunión, programacion de reuniones de Inicio, diseño pieza de invitación, diseño invitación entidades públicas y divulgacion de	2 días	vie 28/02/20	lun 2/03/20	$ 235,076	317	329FC-8 días,320
320	Aprobación para desarrollo de reunion Prioridad 8	0 días	lun 2/03/20	lun 2/03/20	$ 0	319	321
321	Diseño y envio de volante socialización PMT (una vez se apruebe) Prioridad 8	1 día	lun 2/03/20	mar 3/03/20	$ 39,179	320	322
322	Reunion de Inicio de Obra Prioridad 8	1 día	mar 3/03/20	mié 4/03/20	$ 39,179	321	323,326,331
323	Registro de inspección preliminar de vías Prioridad 8	7 días	mié 4/03/20	mié 11/03/20	$ 39,179	322	324FC-7 días
324	Convocatoria y Levantamiento actas de vecindad SI APLICA Priorid	7 días	mié 4/03/20	mié 11/03/20	$ 39,179	323FC-7 días	
325	**Actividades SST y Ambientales Prioridad 8**	**5 días**	**mié 4/03/20**	**lun 9/03/20**	**$ 3,512,088**		
326	Inventario de sumideros Prioridad 8	2 días	mié 4/03/20	vie 6/03/20	$ 351,209	322	327FC-2 días
327	Implementacion Ambiental, Protecciones Sumideros, Arboles, Elementos de protección y otros Prioridad 8.	5 días	mié 4/03/20	lun 9/03/20	$ 3,160,879	326FC-2 días	
328	**Actividades PMT Prioridad 8**	**22 días**	**sáb 22/02/20**	**mar 17/03/20**	**$ 10,587,139**		
329	Elaboración y entrega PMT Prioridad 8	2 días	sáb 22/02/20	mar 25/02/20	$ 1,058,714	319FC-8 días	330
330	Aprobacion PMT Prioridad 8	10 días	mar 25/02/20	vie 6/03/20	$ 0	329	331FC+5 días
331	Implementacion PMT Prioridad 8	5 días	mié 11/03/20	mar 17/03/20	$ 9,528,425	322,330FC+5 días	333FC-5 días
332	**Actidades de Obra Prioridad 8**	**12 días**	**mié 11/03/20**	**mié 25/03/20**	**$ 173,713,176**		
333	Parcheo Prioridad 8	12 días	mié 11/03/20	mié 25/03/20	$ 24,751,278	331FC-5 días	334FC-15 días
334	Bacheo Prioridad 8	12 días	mié 11/03/20	mié 25/03/20	$ 125,952,598	333FC-15 días	335FC-15 días
335	Carpeta Prioridad 8	12 días	mié 11/03/20	mié 25/03/20	$ 0	334FC-15 días	336FC-15 días
336	Losas Prioridad 8	12 días	mié 11/03/20	mié 25/03/20	$ 0	335FC-15 días	337FC-15 días
337	Complementarias Prioridad 8	12 días	mié 11/03/20	mié 25/03/20	$ 23,009,300	336FC-15 días	482,338
338	Fin Actividades de Obra Prioridad 8	0 días	mié 25/03/20	mié 25/03/20	$ 0	337	528
339	**Prioridad 9 - Avenida Gaitán Cortés**	**54 días**	**sáb 11/07/20**	**mié 9/09/20**	**$ 408,671,935**		
340	Inicio Actividades de Obra Prioridad 9	0 días	jue 30/07/20	jue 30/07/20	$ 0	480FC-3 días	342
341	**Actividades Sociales Prioridad 9**	**12 días**	**jue 30/07/20**	**jue 13/08/20**	**$ 395,522**		
342	Preliminares para desarrollo reunion inicio (Espacio para la reunión, programacion de reuniones de Inicio, diseño pieza de invitación, diseño invitación entidades públicas y divulgacion de	3 días	jue 30/07/20	lun 3/08/20	$ 237,314	340	343,352FC-20 días
343	Aprobación para desarrollo de reunion Prioridad 9	0 días	lun 3/08/20	lun 3/08/20	$ 0	342	344
344	Diseño y envio de volante socialización PMT (una vez se apruebe) Prioridad 9	2 días	lun 3/08/20	mar 4/08/20	$ 39,552	343	345,346
345	Reunion de Inicio de Obra Prioridad 9	1 día	mar 4/08/20	mié 5/08/20	$ 39,552	344	349,354,357
346	Registro de inspección preliminar de vías Prioridad 9	7 días	mar 4/08/20	jue 13/08/20	$ 39,552	344	347FC-7 días
347	Convocatoria y Levantamiento actas de vecindad SI APLICA Priorid	7 días	mar 4/08/20	jue 13/08/20	$ 39,552	346FC-7 días	
348	**Actividades SST y Ambientales Prioridad 9**	**5 días**	**mié 5/08/20**	**mié 12/08/20**	**$ 3,544,517**		
349	Inventario de sumideros Prioridad 9	2 días	mié 5/08/20	sáb 8/08/20	$ 354,452	345	350FC-2 días
350	Implementacion Ambiental, Protecciones Sumideros, Arboles, Elementos de protección y otros Prioridad 9	5 días	mié 5/08/20	mié 12/08/20	$ 3,190,065	349FC-2 días	
351	**Actividades PMT Prioridad 9**	**28 días**	**sáb 11/07/20**	**mié 12/08/20**	**$ 10,703,981**		
352	Elaboración y entrega PMT Prioridad 9	5 días	sáb 11/07/20	jue 16/07/20	$ 1,070,398	342FC-20 días	353
353	Aprobacion PMT Prioridad 9	12 días	jue 16/07/20	jue 30/07/20	$ 0	352	354
354	Implementacion PMT Prioridad 9	5 días	mié 5/08/20	mié 12/08/20	$ 9,633,583	345,353	357FC-4 días
355	**Actidades de Obra Prioridad 9**	**30 días**	**jue 6/08/20**	**mié 9/09/20**	**$ 394,027,915**		

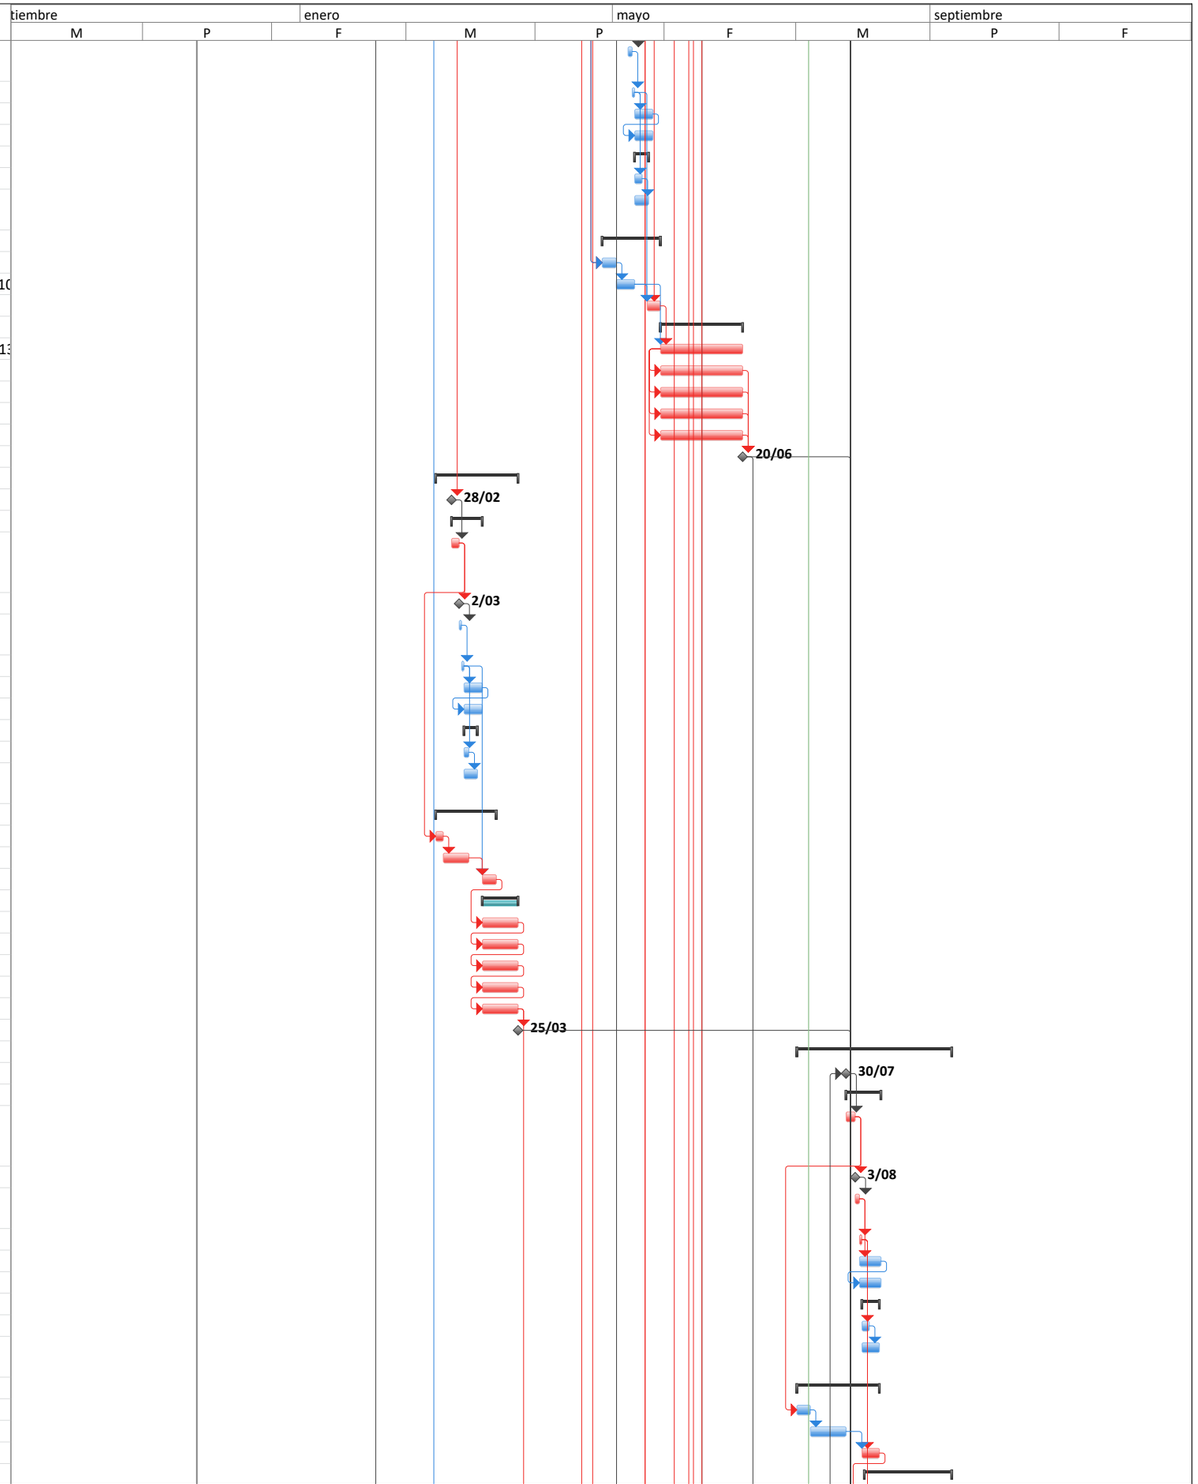


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	Sucesoras
356	Actualización de PKIDs Prioridad 9	30 días	jue 6/08/20	mié 9/09/20	$ 0	357CC	362
357	Parcheo Prioridad 9	30 días	jue 6/08/20	mié 9/09/20	$ 102,575,089	345,354FC-4 días	358CC,359CC,360
358	Bacheo Prioridad 9	30 días	jue 6/08/20	mié 9/09/20	$ 100,524,740	357CC	362
359	Carpeta Prioridad 9	30 días	jue 6/08/20	mié 9/09/20	$ 99,763,062	357CC	362
360	Losas Prioridad 9	30 días	jue 6/08/20	mié 9/09/20	$ 86,826,509	357CC	362
361	Complementarias Prioridad 9	30 días	jue 6/08/20	mié 9/09/20	$ 4,338,515	357CC	362
362	Fin Actividades de Obra Prioridad 9	0 días	mié 9/09/20	mié 9/09/20	$ 0	361,360,359,358	673,723FC-4 días
363	**Prioridad 10 - Avenida Ciudad de Villavicencio - Tramo 2**	**56 días**	**mié 15/07/20**	**lun 14/09/20**	**$ 715,624,765**		
364	Inicio Actividades de Obra Prioridad 10	0 días	mié 5/08/20	mié 5/08/20	$ 0	527FC-3 días	366,376FC-20 día
365	**Actividades Sociales Prioridad 10**	**13 días**	**mié 5/08/20**	**vie 21/08/20**	**$ 391,792**		
366	Preliminares para desarrollo reunion inicio (Espacio para la reunión, programacion de reuniones de Inicio, diseño pieza de invitación, diseño invitación entidades públicas y divulgacion de	3 días	mié 5/08/20	lun 10/08/20	$ 235,076	364	367
367	Aprobación para desarrollo de reunion Prioridad 10	0 días	lun 10/08/20	lun 10/08/20	$ 0	366	368
368	Diseño y envio de volante socialización PMT (una vez se apruebe) Prioridad 10	2 días	lun 10/08/20	mié 12/08/20	$ 39,179	367	369
369	Reunion de Inicio de Obra Prioridad 10	1 día	mié 12/08/20	jue 13/08/20	$ 39,179	368	370,373,380,378
370	Registro de inspección preliminar de vías Prioridad 10	7 días	jue 13/08/20	vie 21/08/20	$ 39,179	369	371FC-7 días
371	Convocatoria y Levantamiento actas de vecindad SI APLICA Priorid	7 días	jue 13/08/20	vie 21/08/20	$ 39,179	370FC-7 días	
372	**Actividades SST y Ambientales Prioridad 10**	**5 días**	**jue 13/08/20**	**mié 19/08/20**	**$ 1,713,942**		
373	Inventario de sumideros Prioridad 10	2 días	jue 13/08/20	vie 14/08/20	$ 171,394	369	374FC-2 días
374	Implementacion Ambiental, Protecciones Sumideros, Arboles, Elementos de protección y otros Prioridad 10	5 días	jue 13/08/20	mié 19/08/20	$ 1,542,548	373FC-2 días	
375	**Actividades PMT Prioridad 10**	**31 días**	**mié 15/07/20**	**mié 19/08/20**	**$ 4,454,519**		
376	Elaboración y entrega PMT Prioridad 10	5 días	mié 15/07/20	mar 21/07/20	$ 445,452	364FC-20 días	377
377	Aprobacion PMT Prioridad 10	16 días	mar 21/07/20	jue 6/08/20	$ 0	376	378
378	Implementacion PMT Prioridad 10	5 días	jue 13/08/20	mié 19/08/20	$ 4,009,067	377,369	380FC-5 días
379	**Actidades de Obra Prioridad 10**	**30 días**	**jue 13/08/20**	**lun 14/09/20**	**$ 709,064,512**		
380	Parcheo Prioridad 10	30 días	jue 13/08/20	lun 14/09/20	$ 661,657,988	369,378FC-5 días	381CC,382CC,383
381	Bacheo Prioridad 10	30 días	jue 13/08/20	lun 14/09/20	$ 37,679,954	380CC	385
382	Carpeta Prioridad 10	30 días	jue 13/08/20	lun 14/09/20	$ 0	380CC	385
383	Losas Prioridad 10	30 días	jue 13/08/20	lun 14/09/20	$ 5,122,131	380CC	385
384	Complementarias Prioridad 10	30 días	jue 13/08/20	lun 14/09/20	$ 4,604,439	380CC	385
385	Fin Actividades de Obra Prioridad 10	0 días	lun 14/09/20	lun 14/09/20	$ 0	384,383,382,381	747FC-5 días
386	**Prioridad 11 - Av Caracas Tramo 3**	**59 días**	**vie 17/07/20**	**lun 21/09/20**	**$ 279,324,434**		
387	Inicio Actividades de Obra Prioridad 11	0 días	mar 4/08/20	mar 4/08/20	$ 0	601FC-11 días	389
388	**Actividades Sociales Prioridad 11**	**15 días**	**mar 4/08/20**	**sáb 22/08/20**	**$ 391,792**		
389	Preliminares para desarrollo reunion inicio (Espacio para la reunión, programacion de reuniones de Inicio, diseño pieza de invitación, diseño invitación entidades públicas y divulgacion de	4 días	mar 4/08/20	lun 10/08/20	$ 235,076	387	390,399FC-20 días
390	Aprobación para desarrollo de reunion Prioridad 11	0 días	lun 10/08/20	lun 10/08/20	$ 0	389	391
391	Diseño y envio de volante socialización PMT (una vez se apruebe) Prioridad 11	3 días	lun 10/08/20	jue 13/08/20	$ 39,179	390	392
392	Reunion de Inicio de Obra Prioridad 11	1 día	jue 13/08/20	jue 13/08/20	$ 39,179	391	393,396,401,404
393	Registro de inspección preliminar de vías Prioridad 11	7 días	vie 14/08/20	sáb 22/08/20	$ 39,179	392	394FC-7 días
394	Convocatoria y Levantamiento actas de vecindad SI APLICA Priorid	7 días	vie 14/08/20	sáb 22/08/20	$ 39,179	393FC-7 días	
395	**Actividades SST y Ambientales Prioridad 11**	**5 días**	**vie 14/08/20**	**jue 20/08/20**	**$ 1,713,942**		
396	Inventario de sumideros	2 días	vie 14/08/20	sáb 15/08/20	$ 171,394	392	397FC-2 días
397	Implementacion Ambiental, Protecciones Sumideros, Arboles, Elen	5 días	vie 14/08/20	jue 20/08/20	$ 1,542,548	396FC-2 días	
398	**Actividades PMT Prioridad 11**	**29 días**	**vie 17/07/20**	**jue 20/08/20**	**$ 6,452,739**		
399	Elaboracion y entrega PMT Prioridad 11	8 días	vie 17/07/20	lun 27/07/20	$ 645,274	389FC-20 días	400
400	Aprobacion PMT Prioridad 11	15 días	lun 27/07/20	jue 13/08/20	$ 0	399	401
401	Implementacion PMT Prioridad 11	5 días	vie 14/08/20	jue 20/08/20	$ 5,807,465	392,400	404
402	**Actidades de Obra Prioridad 11**	**30 días**	**jue 20/08/20**	**lun 21/09/20**	**$ 270,765,961**		
403	Actualización de PKIDs Prioridad 11	30 días	jue 20/08/20	lun 21/09/20	$ 0	404CC	409
404	Parcheo Prioridad 11	30 días	jue 20/08/20	lun 21/09/20	$ 0	401,392	405CC,403CC,406
405	Bacheo Prioridad 11	30 días	jue 20/08/20	lun 21/09/20	$ 0	404CC	409
406	Carpeta Prioridad 11	30 días	jue 20/08/20	lun 21/09/20	$ 58,930,316	404CC	409
407	Losas Prioridad 11	30 días	jue 20/08/20	lun 21/09/20	$ 206,126,544	404CC	409
408	Complementarias Prioridad 11	30 días	jue 20/08/20	lun 21/09/20	$ 5,709,101	404CC	409
409	Fin Actividades de Obra Prioridad 11	0 días	lun 21/09/20	lun 21/09/20	$ 0	403,405,406,407	603FC-4 días
410	**Prioridad 12 - Av Colombia**	**53 días**	**vie 29/05/20**	**mar 28/07/20**	**$ 232,830,201**		
411	Inicio Actividades de Obra Prioridad 12	0 días	sáb 20/06/20	sáb 20/06/20	$ 0	315	413,423FC-20 día
412	**Actividades Sociales Prioridad 12**	**10 días**	**sáb 20/06/20**	**vie 3/07/20**	**$ 391,792**		
413	Preliminares para desarrollo reunion inicio (Espacio para la reunión, programacion de reuniones de Inicio, diseño pieza de invitación, diseño invitación entidades públicas y divulgacion de	2 días	sáb 20/06/20	mié 24/06/20	$ 235,076	411	414

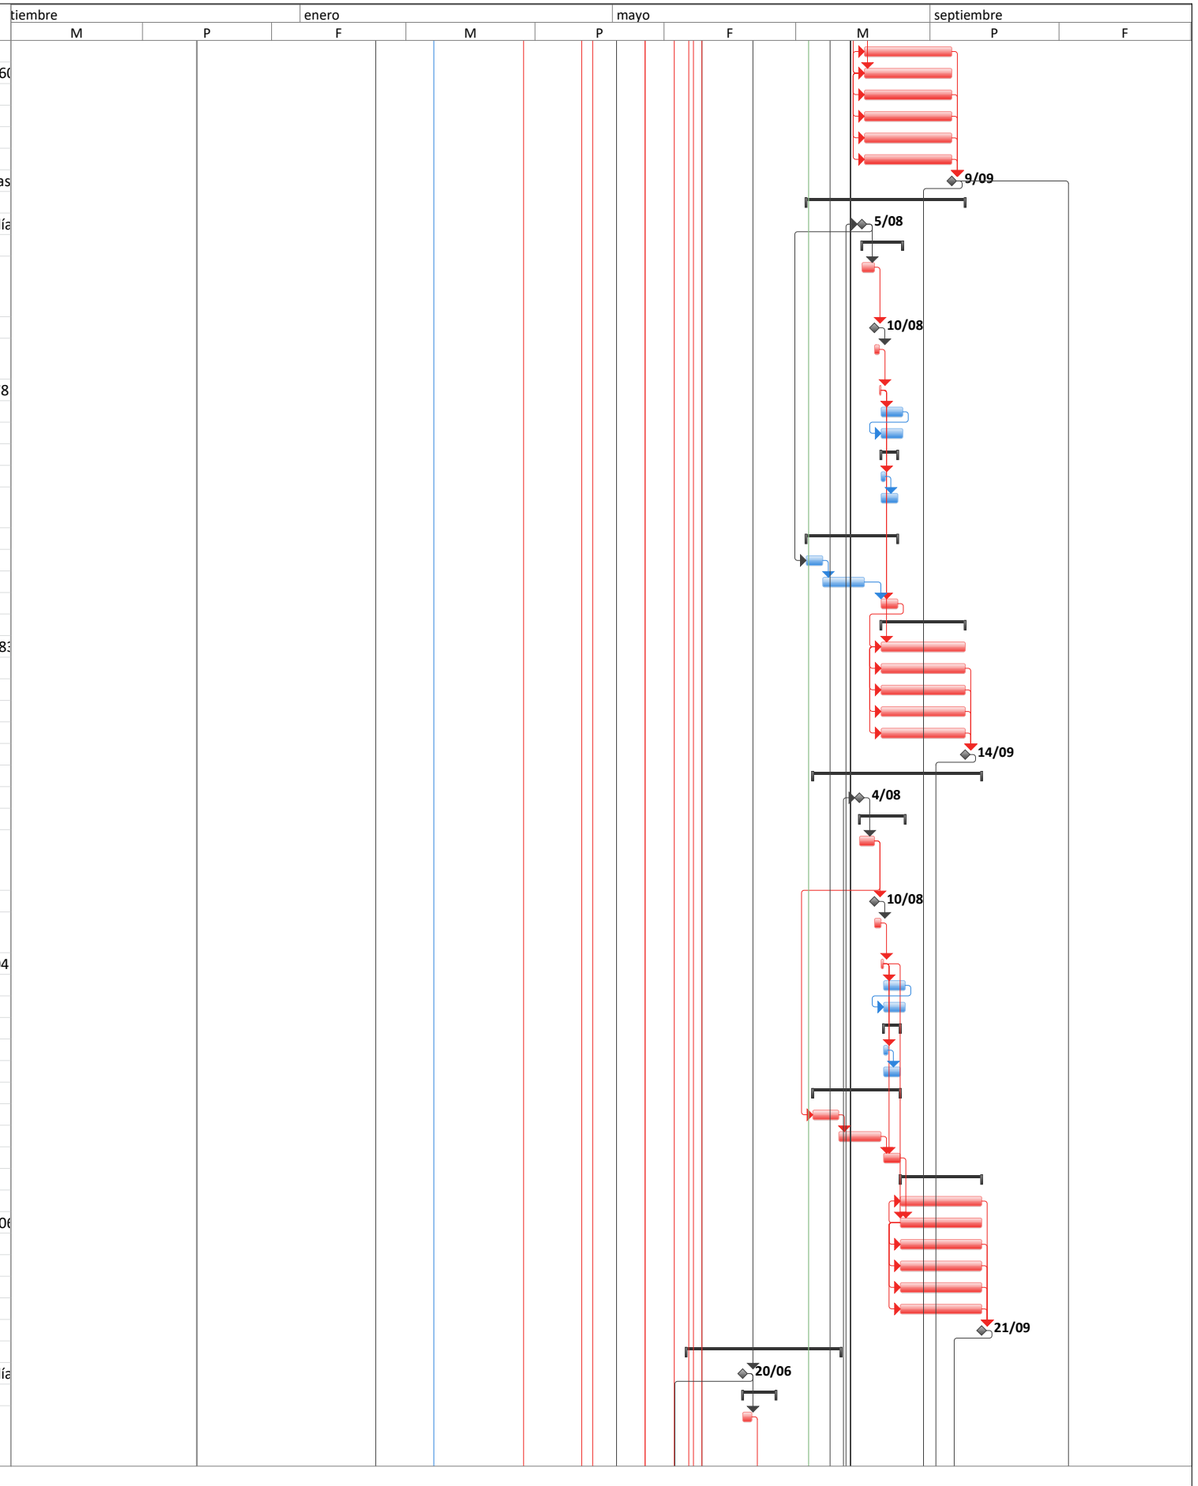


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	Sucesoras
414	Aprobación para desarrollo de reunion Prioridad 12	0 días	mié 24/06/20	mié 24/06/20	$ 0	413	415
415	Diseño y envio de volante socialización PMT (una vez se apruebe) Prioridad 12	1 día	mié 24/06/20	mié 24/06/20	$ 39,179	414	416
416	Reunion de Inicio de Obra Prioridad 12	0 días	mié 24/06/20	mié 24/06/20	$ 39,179	415	417,420,428,425
417	Registro de inspección preliminar de vías Prioridad 12	7 días	jue 25/06/20	vie 3/07/20	$ 39,179	416	418FC-7 días
418	Convocatoria y Levantamiento actas de vecindad SI APLICA Priorid	7 días	jue 25/06/20	vie 3/07/20	$ 39,179	417FC-7 días	
419	**Actividades SST y Ambientales Prioridad 12**	**5 días**	**jue 25/06/20**	**mié 1/07/20**	**$ 1,713,942**		
420	Inventario de sumideros Prioridad 12	2 días	jue 25/06/20	vie 26/06/20	$ 171,394	416	421FC-2 días
421	Implementacion Ambiental, Protecciones Sumideros, Arboles, Elementos de protección y otros Prioridad 12	5 días	jue 25/06/20	mié 1/07/20	$ 1,542,548	420FC-2 días	
422	**Actividades PMT Prioridad 12**	**28 días**	**vie 29/05/20**	**mié 1/07/20**	**$ 10,587,139**		
423	Elaboracion y entrega PMT Prioridad 12	5 días	vie 29/05/20	mié 3/06/20	$ 1,058,714	411FC-20 días	424
424	Aprobacion PMT Prioridad 12	12 días	jue 4/06/20	mié 17/06/20	$ 0	423	425
425	Implementacion PMT Prioridad 12	5 días	jue 25/06/20	mié 1/07/20	$ 9,528,425	424,416	428FC-5 días
426	**Actidades de Obra Prioridad 12**	**30 días**	**jue 25/06/20**	**mar 28/07/20**	**$ 220,137,328**		
427	Actualización de PKIDs Prioridad 12	30 días	jue 25/06/20	mar 28/07/20	$ 0	428CC	433
428	Parcheo Prioridad 12	30 días	jue 25/06/20	mar 28/07/20	$ 137,890,991	425FC-5 días,416	429CC,430CC,43
429	Bacheo Prioridad 12	30 días	jue 25/06/20	mar 28/07/20	$ 51,927,437	428CC	433
430	Carpeta Prioridad 12	30 días	jue 25/06/20	mar 28/07/20	$ 27,641,065	428CC	433
431	Losas Prioridad 12	30 días	jue 25/06/20	mar 28/07/20	$ 0	428CC	433
432	Complementarias Prioridad 12	30 días	jue 25/06/20	mar 28/07/20	$ 2,677,835	428CC	433
433	Fin Actividades de Obra Prioridad 12	0 días	mar 28/07/20	mar 28/07/20	$ 0	432,431,430,429	528,532FC-5 días
434	**Prioridad 13 - Av Francisco Miranda**	**51 días**	**jue 16/01/20**	**lun 9/03/20**	**$ 151,259,272**		
435	Inicio Actividades de Obra Prioridad 13	0 días	mié 5/02/20	mié 5/02/20	$ 0	246FC-10 días	437
436	**Actividades Sociales Prioridad 13**	**14 días**	**mié 5/02/20**	**mié 19/02/20**	**$ 391,792**		
437	Preliminares para desarrollo reunion inicio (Espacio para la reunión, programacion de reuniones de Inicio, diseño pieza de invitación, diseño invitación entidades públicas y divulgacion de	3 días	mié 5/02/20	sáb 8/02/20	$ 235,076	435	438,447FC-22 días
438	Aprobación para desarrollo de reunion Prioridad 13	0 días	sáb 8/02/20	sáb 8/02/20	$ 0	437	439
439	Diseño y envio de volante socialización PMT (una vez se apruebe) Prioridad 13	3 días	sáb 8/02/20	mar 11/02/20	$ 39,179	438	440
440	Reunion de Inicio de Obra Prioridad 13	1 día	mar 11/02/20	mié 12/02/20	$ 39,179	439	441,444,449,451
441	Registro de inspección preliminar de vías Prioridad 13	7 días	mié 12/02/20	mié 19/02/20	$ 39,179	440	442FC-7 días
442	Convocatoria y Levantamiento actas de vecindad SI APLICA Priorid	7 días	mié 12/02/20	mié 19/02/20	$ 39,179	441FC-7 días	
443	**Actividades SST y Ambientales Prioridad 13**	**5 días**	**mié 12/02/20**	**mar 18/02/20**	**$ 1,713,942**		
444	Inventario de sumideros Prioridad 13	2 días	mié 12/02/20	vie 14/02/20	$ 171,394	440	445FC-2 días
445	Implementacion Ambiental, Protecciones Sumideros, Arboles, Elementos de protección y otros Prioridad 13	5 días	mié 12/02/20	mar 18/02/20	$ 1,542,548	444FC-2 días	
446	**Actividades PMT Prioridad 13**	**31 días**	**jue 16/01/20**	**mar 18/02/20**	**$ 10,587,139**		
447	Elaboración y entrega PMT Prioridad 13	3 días	jue 16/01/20	lun 20/01/20	$ 1,058,714	437FC-22 días	448
448	Aprobacion PMT Prioridad 13	10 días	lun 20/01/20	jue 30/01/20	$ 0	447	449
449	Implementacion PMT Prioridad 13	5 días	mié 12/02/20	mar 18/02/20	$ 9,528,425	448,440	451
450	**Actidades de Obra Prioridad 13**	**20 días**	**mar 18/02/20**	**lun 9/03/20**	**$ 138,566,399**		
451	Parcheo Prioridad 13	20 días	mar 18/02/20	lun 9/03/20	$ 102,697,687	449,440	452CC,453CC,45
452	Bacheo Prioridad 13	20 días	mar 18/02/20	lun 9/03/20	$ 26,300,149	451CC	456
453	Carpeta Prioridad 13	20 días	mar 18/02/20	lun 9/03/20	$ 3,532,538	451CC	456
454	Losas Prioridad 13	20 días	mar 18/02/20	lun 9/03/20	$ 0	451CC	456
455	Complementarias Prioridad 13	20 días	mar 18/02/20	lun 9/03/20	$ 6,036,025	451CC	456
456	Fin Actividades de Obra Prioridad 13	0 días	lun 9/03/20	lun 9/03/20	$ 0	455,452,453,454	528,294FC-10 día
457	**Prioridad 14 - Av Primera de mayo - Tramo 1**	**49 días**	**lun 8/06/20**	**lun 3/08/20**	**$ 152,940,777**		
458	Inicio Actividades de Obra Prioridad 14	0 días	mar 23/06/20	mar 23/06/20	$ 0	577FC-4 días	460
459	**Actividades Sociales Prioridad 14**	**14 días**	**mar 23/06/20**	**mié 8/07/20**	**$ 391,792**		
460	Preliminares para desarrollo reunion inicio (Espacio para la reunión, programacion de reuniones de Inicio, diseño pieza de invitación, diseño invitación entidades públicas y divulgacion de	3 días	mar 23/06/20	jue 25/06/20	$ 235,076	458	461,470FC-15 días
461	Aprobación para desarrollo de reunion Prioridad 14	0 días	jue 25/06/20	jue 25/06/20	$ 0	460	462
462	Diseño y envio de volante socialización PMT (una vez se apruebe) Prioridad 14	3 días	jue 25/06/20	mar 30/06/20	$ 39,179	461	463
463	Reunion de Inicio de Obra Prioridad 14	1 día	mar 30/06/20	mié 1/07/20	$ 39,179	462	464,467,472,475
464	Registro de inspección preliminar de vías Prioridad 14	7 días	mié 1/07/20	mié 8/07/20	$ 39,179	463	465FC-7 días
465	Convocatoria y Levantamiento actas de vecindad SI APLICA Priorid	7 días	mié 1/07/20	mié 8/07/20	$ 39,179	464FC-7 días	
466	**Actividades SST y Ambientales Prioridad 14**	**5 días**	**mié 1/07/20**	**lun 6/07/20**	**$ 1,713,942**		
467	Inventario de sumideros Prioridad 14	2 días	mié 1/07/20	vie 3/07/20	$ 171,394	463	468FC-2 días
468	Implementacion Ambiental, Protecciones Sumideros, Arboles, Elementos de protección y otros Prioridad 14	5 días	mié 1/07/20	lun 6/07/20	$ 1,542,548	467FC-2 días	
469	**Actividades PMT Prioridad 14**	**24 días**	**lun 8/06/20**	**lun 6/07/20**	**$ 10,587,139**		
470	Elaboración y entrega PMT Prioridad 14	4 días	lun 8/06/20	vie 12/06/20	$ 1,058,714	460FC-15 días	471
471	Aprobacion PMT Prioridad 14	10 días	vie 12/06/20	mié 24/06/20	$ 0	470	472

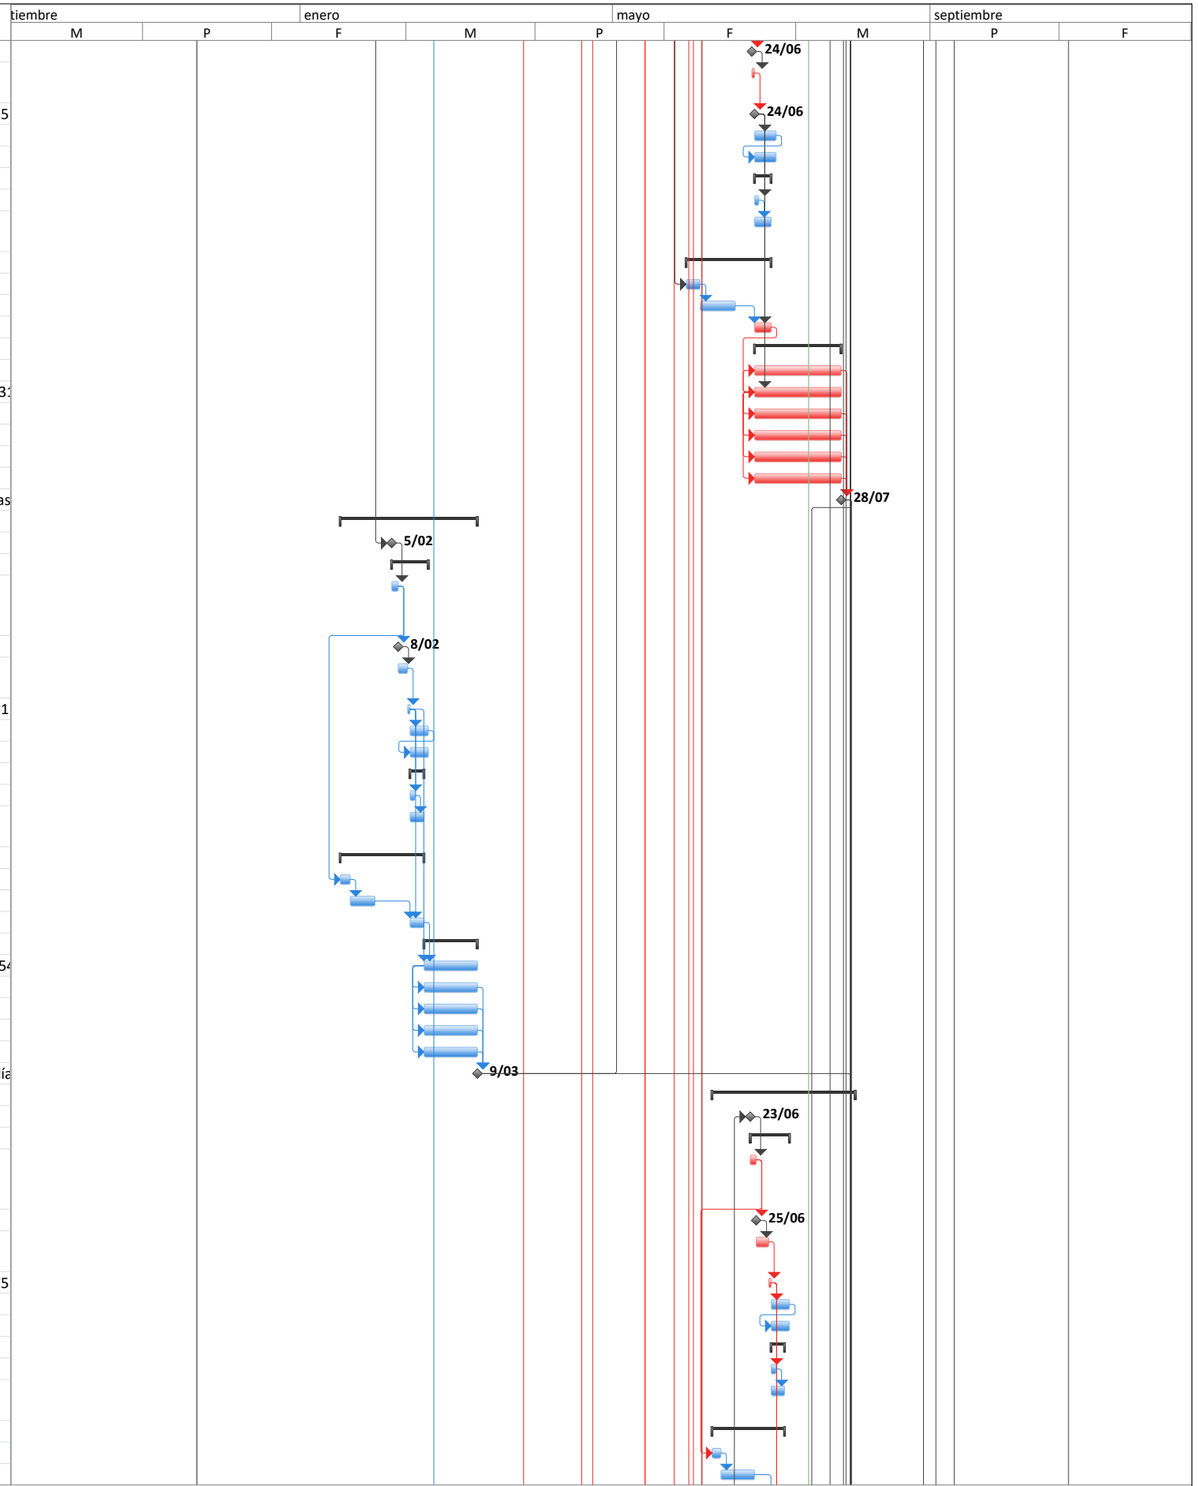


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	Sucesoras
472	Implementacion PMT Prioridad 14	5 días	mié 1/07/20	lun 6/07/20	$ 9,528,425	471,463	475FC-5 días
473	**Actidades de Obra Prioridad 14**	**30 días**	**mié 1/07/20**	**lun 3/08/20**	**$ 140,247,904**		
474	Actualización de PKIDs Prioridad 14	30 días	mié 1/07/20	lun 3/08/20	$ 0	475CC	480
475	Parcheo Prioridad 14	30 días	mié 1/07/20	lun 3/08/20	$ 103,410,154	472FC-5 días,463	476CC,477CC,478
476	Bacheo Prioridad 14	30 días	mié 1/07/20	lun 3/08/20	$ 35,205,783	475CC	480
477	Carpeta Prioridad 14	30 días	mié 1/07/20	lun 3/08/20	$ 186,159	475CC	480
478	Losas Prioridad 14	30 días	mié 1/07/20	lun 3/08/20	$ 0	475CC	480
479	Complementarias Prioridad 14	30 días	mié 1/07/20	lun 3/08/20	$ 1,445,808	475CC	480
480	Fin Actividades de Obra Prioridad 14	0 días	lun 3/08/20	lun 3/08/20	$ 0	476,477,478,479	528,340FC-3 días
481	**Prioridad 15 - Av Primera de mayo - Tramo 2**	**90.75 días**	**mié 25/03/20**	**sáb 4/07/20**	**$ 348,501,218**		
482	Inicio Actividades de Obra Prioridad 15	0 días	mié 25/03/20	mié 25/03/20	$ 0	337	484
483	**Actividades Sociales Prioridad 15**	**48.75 días**	**mié 25/03/20**	**mar 19/05/20**	**$ 391,792**		
484	Preliminares para desarrollo reunion inicio (Espacio para la reunión, programacion de reuniones de Inicio, diseño pieza de invitación, diseño invitación entidades públicas y divulgacion de	3 días	mié 25/03/20	vie 27/03/20	$ 235,076	482	485,494FC-12 días
485	Aprobación para desarrollo de reunion Prioridad 15	0 días	vie 27/03/20	vie 27/03/20	$ 0	484	486
486	Diseño y envio de volante socialización PMT (una vez se apruebe) Prioridad 15	3 días	sáb 28/03/20	mar 31/03/20	$ 39,179	485	487
487	Reunion de Inicio de Obra Prioridad 15	1 día	lun 11/05/20	mar 12/05/20	$ 39,179	486,142	488,498,491
488	Registro de inspección preliminar de vías Prioridad 15	7 días	mar 12/05/20	mar 19/05/20	$ 39,179	487	489FC-7 días
489	Convocatoria y Levantamiento actas de vecindad SI APLICA Priorid	7 días	mar 12/05/20	mar 19/05/20	$ 39,179	488FC-7 días	
490	**Actividades SST y Ambientales Prioridad 15**	**5 días**	**mar 12/05/20**	**sáb 16/05/20**	**$ 1,713,942**		
491	Inventario de sumideros Prioridad 15	2 días	mar 12/05/20	jue 14/05/20	$ 171,394	487	492FC-2 días
492	Implementacion Ambiental, Protecciones Sumideros, Arboles, Elementos de protección y otros Prioridad 15	5 días	mar 12/05/20	sáb 16/05/20	$ 1,542,548	491FC-2 días	
493	**Actividades PMT Prioridad 15**	**37 días**	**lun 27/04/20**	**vie 5/06/20**	**$ 10,587,139**		
494	Elaboración y entrega PMT Prioridad 15	3 días	lun 27/04/20	jue 30/04/20	$ 1,058,714	484FC-12 días,14	495
495	Aprobacion PMT Prioridad 15	10 días	jue 30/04/20	mar 12/05/20	$ 0	494	496
496	Implementacion PMT Prioridad 15	5 días	lun 1/06/20	vie 5/06/20	$ 9,528,425	495,152FC+16 dí	498FC-5 días
497	**Actidades de Obra Prioridad 15**	**30 días**	**lun 1/06/20**	**sáb 4/07/20**	**$ 335,808,345**		
498	Parcheo Prioridad 15	30 días	lun 1/06/20	sáb 4/07/20	$ 203,272,865	487,496FC-5 días	499CC,500CC,501
499	Bacheo Prioridad 15	30 días	lun 1/06/20	sáb 4/07/20	$ 106,250,981	498CC	503
500	Carpeta Prioridad 15	30 días	lun 1/06/20	sáb 4/07/20	$ 12,901,844	498CC	503
501	Losas Prioridad 15	30 días	lun 1/06/20	sáb 4/07/20	$ 0	498CC	503
502	Complementarias Prioridad 15	30 días	lun 1/06/20	sáb 4/07/20	$ 13,382,655	498CC	503
503	Fin Actividades de Obra Prioridad 15	0 días	sáb 4/07/20	sáb 4/07/20	$ 0	502,501,500,499	505FC-9 días
504	**Prioridad 16 - Av primera de Mayo Tramo 3**	**59 días**	**jue 4/06/20**	**lun 10/08/20**	**$ 967,116,662**		
505	Inicio Actividades de Obra Prioridad 16	0 días	jue 25/06/20	jue 25/06/20	$ 0	503FC-9 días	507
506	**Actividades Sociales Prioridad 16**	**12 días**	**jue 25/06/20**	**mié 8/07/20**	**$ 391,792**		
507	Preliminares para desarrollo reunion inicio (Espacio para la reunión, programacion de reuniones de Inicio, diseño pieza de invitación, diseño invitación entidades públicas y divulgacion de	3 días	jue 25/06/20	sáb 27/06/20	$ 235,076	505	508,517FC-21 días
508	Aprobación para desarrollo de reunion Prioridad 16	0 días	sáb 27/06/20	sáb 27/06/20	$ 0	507	509
509	Diseño y envio de volante socialización PMT (una vez se apruebe) Prioridad 16	2 días	sáb 27/06/20	mié 1/07/20	$ 39,179	508	510,511
510	Reunion de Inicio de Obra Prioridad 16	1 día	mié 1/07/20	jue 2/07/20	$ 39,179	509	514,519,522
511	Registro de inspección preliminar de vías Prioridad 16	7 días	mié 1/07/20	mié 8/07/20	$ 39,179	509	512FC-7 días
512	Convocatoria y Levantamiento actas de vecindad SI APLICA Priorid	7 días	mié 1/07/20	mié 8/07/20	$ 39,179	511FC-7 días	
513	**Actividades SST y Ambientales Prioridad 16**	**5 días**	**jue 2/07/20**	**mar 7/07/20**	**$ 1,713,942**		
514	Inventario de sumideros Prioridad 16	2 días	jue 2/07/20	sáb 4/07/20	$ 171,394	510	515FC-2 días
515	Implementacion Ambiental, Protecciones Sumideros, Arboles, Elementos de protección y otros Prioridad 16	5 días	jue 2/07/20	mar 7/07/20	$ 1,542,548	514FC-2 días	
516	**Actividades PMT Prioridad 16**	**29 días**	**jue 4/06/20**	**mar 7/07/20**	**$ 10,587,139**		
517	Elaboración y entrega PMT Prioridad 16	5 días	jue 4/06/20	mar 9/06/20	$ 1,058,714	507FC-21 días	518
518	Aprobacion PMT Prioridad 16	12 días	mar 9/06/20	mié 24/06/20	$ 0	517	519
519	Implementacion PMT Prioridad 16	5 días	jue 2/07/20	mar 7/07/20	$ 9,528,425	518,510	522
520	**Actidades de Obra Prioridad 16**	**30 días**	**mar 7/07/20**	**lun 10/08/20**	**$ 954,423,789**		
521	Actualización de PKIDs Prioridad 16	30 días	mar 7/07/20	lun 10/08/20	$ 0	522CC	527
522	Parcheo Prioridad 16	30 días	mar 7/07/20	lun 10/08/20	$ 670,780,813	510,519	523CC,524CC,525
523	Bacheo Prioridad 16	30 días	mar 7/07/20	lun 10/08/20	$ 102,803,802	522CC	527
524	Carpeta Prioridad 16	30 días	mar 7/07/20	lun 10/08/20	$ 163,313,749	522CC	527
525	Losas Prioridad 16	30 días	mar 7/07/20	lun 10/08/20	$ 0	522CC	527
526	Complementarias Prioridad 16	30 días	mar 7/07/20	lun 10/08/20	$ 17,525,425	522CC	527
527	Fin Actividades de Obra Prioridad 16	0 días	lun 10/08/20	lun 10/08/20	$ 0	526,525,524,523	364FC-3 días
528	Fin Actividades Primera Fase	0 días	lun 3/08/20	lun 3/08/20	$ 0	480,456,433,577	530
529	**Tramos Construccion fase 2**	**243.75 días**	**sáb 1/02/20**	**lun 26/10/20**	**$ 1,908,093,078**		
530	Inicio Actividades Segunda Fase	0 días	lun 3/08/20	lun 3/08/20	$ 0	528	

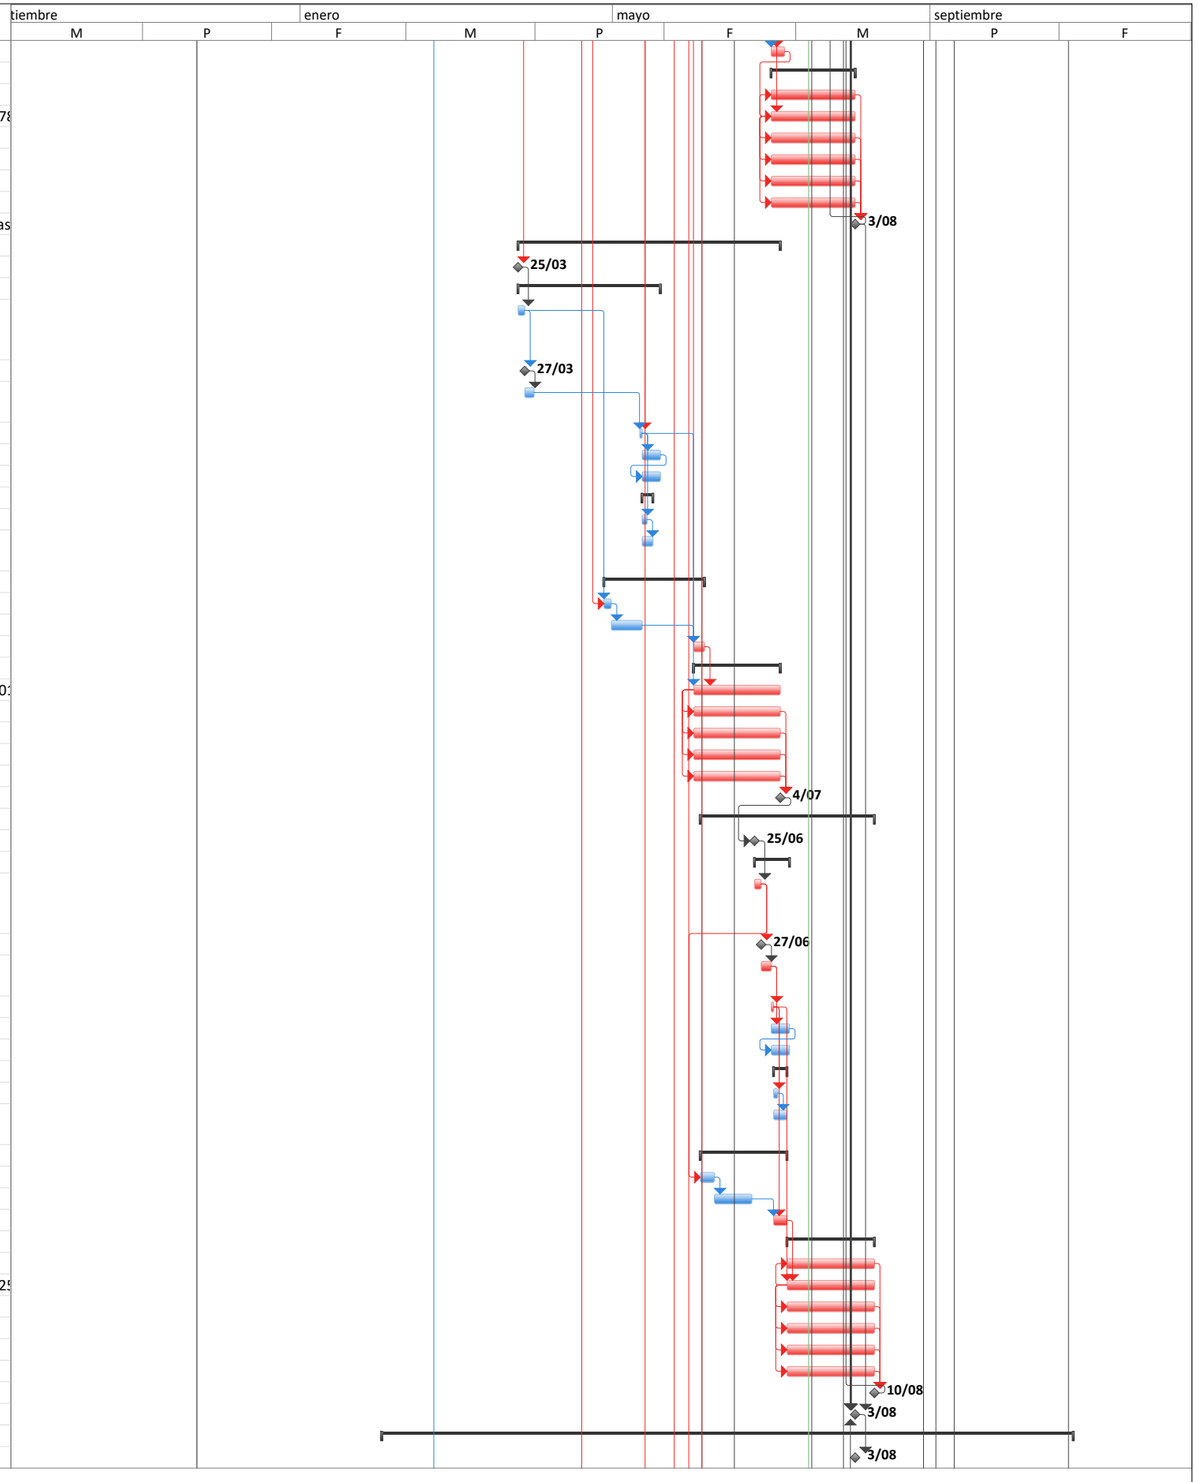


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	Sucesoras
531	**Prioridad 17 - Avenida del Congreso Eucarístico - Tramo 4**	**54 días**	**sáb 4/07/20**	**mié 2/09/20**	**$ 150,894,999**		
532	Inicio Actividades de Obra Prioridad 17	0 días	jue 23/07/20	jue 23/07/20	$ 0	433FC-5 días	534
533	**Actividades Sociales Prioridad 17**	**12 días**	**jue 23/07/20**	**mar 4/08/20**	**$ 391,792**		
534	Preliminares para desarrollo reunion inicio (Espacio para la reunión, programacion de reuniones de Inicio, diseño pieza de invitación, diseño invitación entidades públicas y divulgacion de	3 días	jue 23/07/20	sáb 25/07/20	$ 235,076	532	535,544FC-20 días
535	Aprobación para desarrollo de reunion Prioridad 17	0 días	sáb 25/07/20	sáb 25/07/20	$ 0	534	536
536	Diseño y envio de volante socialización PMT (una vez se apruebe) Prioridad 17	2 días	sáb 25/07/20	mar 28/07/20	$ 39,179	535	537,538
537	Reunion de Inicio de Obra Prioridad 17	1 día	mar 28/07/20	mié 29/07/20	$ 39,179	536	541,546,549
538	Registro de inspección preliminar de vías Prioridad 17	7 días	mar 28/07/20	mar 4/08/20	$ 39,179	536	539FC-7 días
539	Convocatoria y Levantamiento actas de vecindad SI APLICA Priorid	7 días	mar 28/07/20	mar 4/08/20	$ 39,179	538FC-7 días	
540	**Actividades SST y Ambientales Prioridad 17**	**5 días**	**mié 29/07/20**	**lun 3/08/20**	**$ 1,713,942**		
541	Inventario de sumideros Prioridad 17	2 días	mié 29/07/20	vie 31/07/20	$ 171,394	537	542FC-2 días
542	Implementacion Ambiental, Protecciones Sumideros, Arboles, Elementos de protección y otros Prioridad 17	5 días	mié 29/07/20	lun 3/08/20	$ 1,542,548	541FC-2 días	
543	**Actividades PMT Prioridad 17**	**28 días**	**sáb 4/07/20**	**lun 3/08/20**	**$ 10,587,139**		
544	Elaboración y entrega PMT Prioridad 17	5 días	sáb 4/07/20	jue 9/07/20	$ 1,058,714	534FC-20 días	545
545	Aprobacion PMT Prioridad 17	12 días	jue 9/07/20	jue 23/07/20	$ 0	544	546
546	Implementacion PMT Prioridad 17	5 días	mié 29/07/20	lun 3/08/20	$ 9,528,425	537,545	549FC-4 días
547	**Actidades de Obra Prioridad 17**	**30 días**	**jue 30/07/20**	**mié 2/09/20**	**$ 138,202,126**		
548	Actualización de PKIDs Prioridad 17	30 días	jue 30/07/20	mié 2/09/20	$ 0	549CC	554
549	Parcheo Prioridad 17	30 días	jue 30/07/20	mié 2/09/20	$ 12,634,121	537,546FC-4 días	550CC,548CC,551
550	Bacheo Prioridad 17	30 días	jue 30/07/20	mié 2/09/20	$ 64,307,682	549CC	554
551	Carpeta Prioridad 17	30 días	jue 30/07/20	mié 2/09/20	$ 0	549CC	554
552	Losas Prioridad 17	30 días	jue 30/07/20	mié 2/09/20	$ 0	549CC	554
553	Complementarias Prioridad 17	30 días	jue 30/07/20	mié 2/09/20	$ 61,260,323	549CC	554
554	Fin Actividades de Obra Prioridad 17	0 días	mié 2/09/20	mié 2/09/20	$ 0	548,550,551,552	673,699FC-4 días
555	**Prioridad 18 - Av Jose Celestino Mutis**	**93.75 días**	**vie 13/03/20**	**vie 26/06/20**	**$ 476,075,673**		
556	Inicio Actividades de Obra Prioridad 18	0 días	vie 13/03/20	vie 13/03/20	$ 0	671	558
557	**Actividades Sociales Prioridad 18**	**58.75 días**	**vie 13/03/20**	**mar 19/05/20**	**$ 391,792**		
558	Preliminares para desarrollo reunion inicio (Espacio para la reunión, programacion de reuniones de Inicio, diseño pieza de invitación, diseño invitación entidades públicas y divulgacion de	5 días	vie 13/03/20	mié 18/03/20	$ 235,076	556	559,568FC-15 días
559	Aprobación para desarrollo de reunion Prioridad 18	0 días	mié 18/03/20	mié 18/03/20	$ 0	558	560
560	Diseño y envio de volante socialización PMT (una vez se apruebe) Prioridad 18	3 días	mié 18/03/20	sáb 21/03/20	$ 39,179	559	561
561	Reunion de Inicio de Obra Prioridad 18	1 día	lun 11/05/20	mar 12/05/20	$ 39,179	560,142	562,565,570
562	Registro de inspección preliminar de vías Prioridad 18	7 días	mar 12/05/20	mar 19/05/20	$ 39,179	561	563FC-7 días
563	Convocatoria y Levantamiento actas de vecindad SI APLICA Priorid	7 días	mar 12/05/20	mar 19/05/20	$ 39,179	562FC-7 días	
564	**Actividades SST y Ambientales Prioridad 18**	**5 días**	**mar 12/05/20**	**sáb 16/05/20**	**$ 1,713,942**		
565	Inventario de sumideros Prioridad 18	2 días	mar 12/05/20	jue 14/05/20	$ 171,394	561	566FC-2 días
566	Implementacion Ambiental, Protecciones Sumideros, Arboles, Elementos de protección y otros Prioridad 18	5 días	mar 12/05/20	sáb 16/05/20	$ 1,542,548	565FC-2 días	
567	**Actividades PMT Prioridad 18**	**34 días**	**jue 23/04/20**	**vie 29/05/20**	**$ 10,587,139**		
568	Elaboración y entrega PMT Prioridad 18	3 días	jue 23/04/20	sáb 25/04/20	$ 1,058,714	558FC-15 días,14	569
569	Aprobacion PMT Prioridad 18	14 días	lun 27/04/20	mar 12/05/20	$ 0	568	570
570	Implementacion PMT Prioridad 18	5 días	lun 25/05/20	vie 29/05/20	$ 9,528,425	569,561,152FC+5	572FC-5 días
571	**Actidades de Obra Prioridad 18**	**30 días**	**lun 25/05/20**	**vie 26/06/20**	**$ 463,382,800**		
572	Parcheo Prioridad 18	30 días	lun 25/05/20	vie 26/06/20	$ 165,085,437	570FC-5 días	573CC,574CC,575
573	Bacheo Prioridad 18	30 días	lun 25/05/20	vie 26/06/20	$ 166,852,514	572CC	577
574	Carpeta Prioridad 18	30 días	lun 25/05/20	vie 26/06/20	$ 122,734,121	572CC	577
575	Losas Prioridad 18	30 días	lun 25/05/20	vie 26/06/20	$ 0	572CC	577
576	Complementarias Prioridad 18	30 días	lun 25/05/20	vie 26/06/20	$ 8,710,728	572CC	577
577	Fin Actividades de Obra Prioridad 18	0 días	vie 26/06/20	vie 26/06/20	$ 0	576,575,574,573	528,458FC-4 días
578	**Prioridad 19 - Avenida Morisca**	**54 días**	**mié 17/06/20**	**mar 18/08/20**	**$ 435,906,505**		
579	Inicio Actividades de Obra Prioridad 19	0 días	mar 7/07/20	mar 7/07/20	$ 0	649FC-5 días	581
580	**Actividades Sociales Prioridad 19**	**12 días**	**mar 7/07/20**	**mar 21/07/20**	**$ 391,792**		
581	Preliminares para desarrollo reunion inicio (Espacio para la reunión, programacion de reuniones de Inicio, diseño pieza de invitación, diseño invitación entidades públicas y divulgacion de	3 días	mar 7/07/20	vie 10/07/20	$ 235,076	579	582,591FC-20 días
582	Aprobación para desarrollo de reunion Prioridad 19	0 días	vie 10/07/20	vie 10/07/20	$ 0	581	583
583	Diseño y envio de volante socialización PMT (una vez se apruebe) Prioridad 19	2 días	vie 10/07/20	lun 13/07/20	$ 39,179	582	584,585
584	Reunion de Inicio de Obra Prioridad 19	1 día	lun 13/07/20	mar 14/07/20	$ 39,179	583	588,593,596
585	Registro de inspección preliminar de vías Prioridad 19	7 días	lun 13/07/20	mar 21/07/20	$ 39,179	583	586FC-7 días
586	Convocatoria y Levantamiento actas de vecindad SI APLICA Priorid	7 días	lun 13/07/20	mar 21/07/20	$ 39,179	585FC-7 días	
587	**Actividades SST y Ambientales Prioridad 19**	**5 días**	**mar 14/07/20**	**sáb 18/07/20**	**$ 1,713,942**		

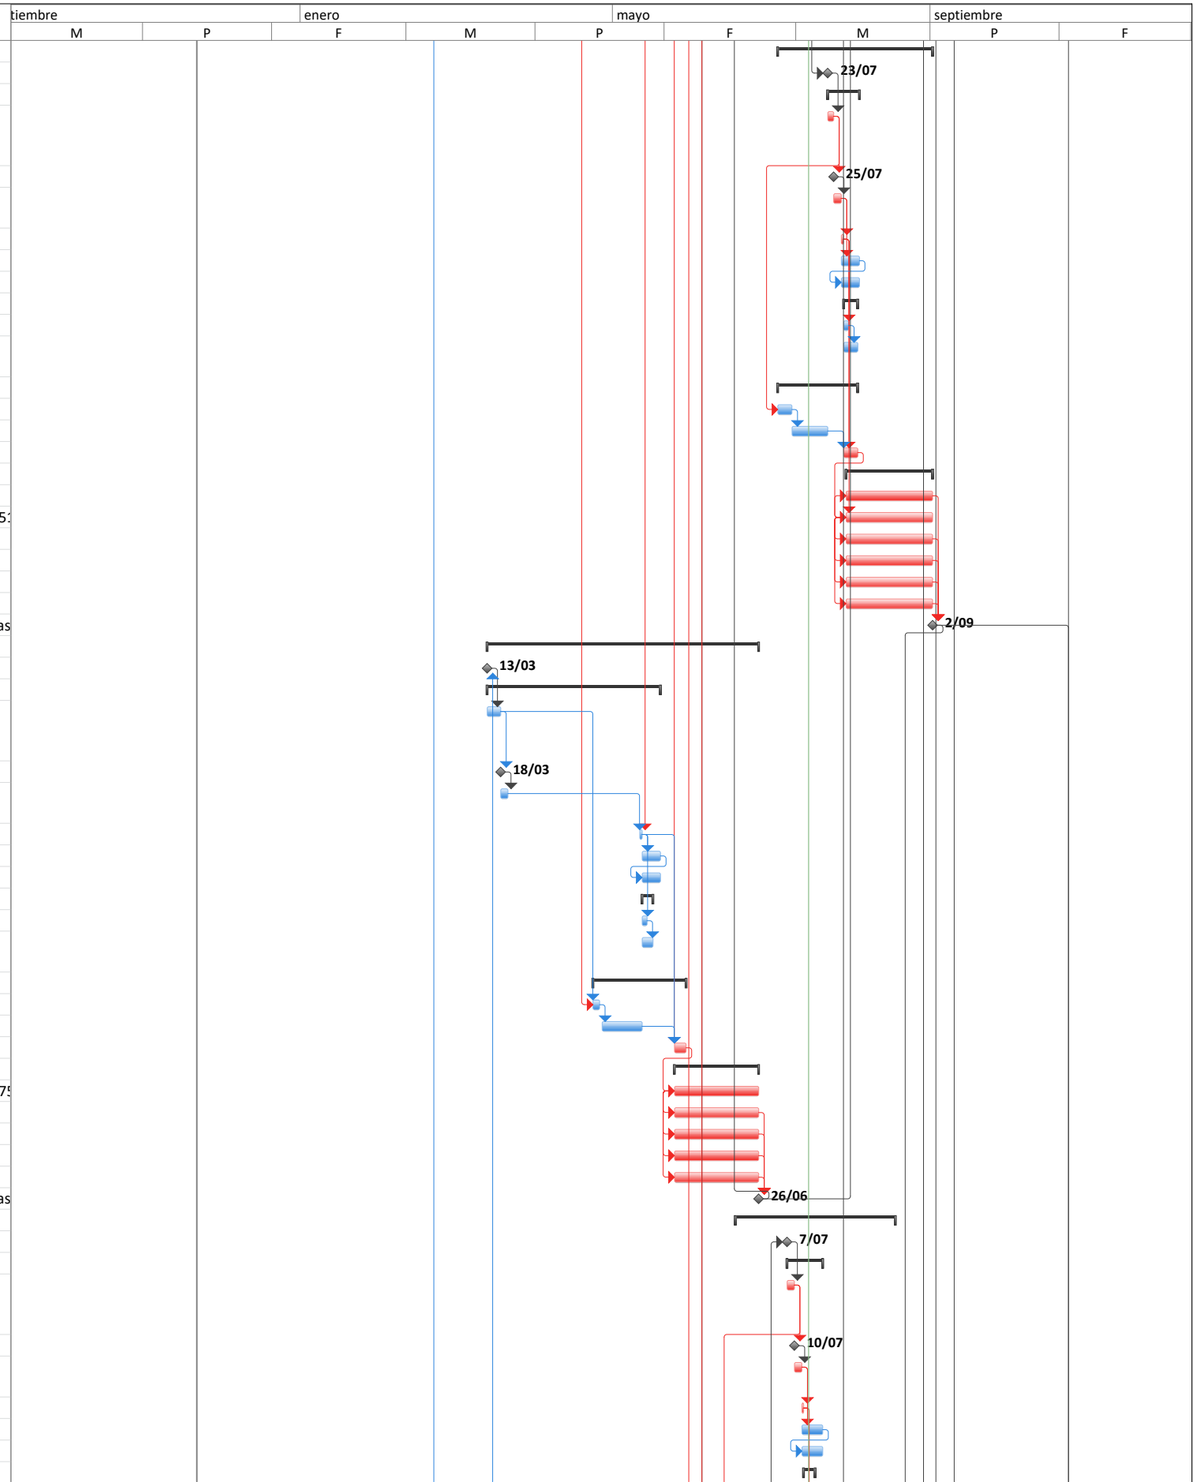


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	Sucesoras
588	Inventario de sumideros Prioridad 19	2 días	mar 14/07/20	mié 15/07/20	$ 171,394	584	589FC-2 días
589	Implementacion Ambiental, Protecciones Sumideros, Arboles, Elementos de protección y otros Prioridad 19	5 días	mar 14/07/20	sáb 18/07/20	$ 1,542,548	588FC-2 días	
590	**Actividades PMT Prioridad 19**	**28 días**	**mié 17/06/20**	**sáb 18/07/20**	**$ 10,587,139**		
591	Elaboración y entrega PMT Prioridad 19	5 días	mié 17/06/20	mié 24/06/20	$ 1,058,714	581FC-20 días	592
592	Aprobacion PMT Prioridad 19	12 días	mié 24/06/20	mar 7/07/20	$ 0	591	593
593	Implementacion PMT Prioridad 19	5 días	mar 14/07/20	sáb 18/07/20	$ 9,528,425	584,592	596FC-4 días
594	**Actidades de Obra Prioridad 19**	**30 días**	**mié 15/07/20**	**mar 18/08/20**	**$ 423,213,632**		
595	Actualización de PKIDs Prioridad 19	30 días	mié 15/07/20	mar 18/08/20	$ 0	596CC	601
596	Parcheo Prioridad 19	30 días	mié 15/07/20	mar 18/08/20	$ 320,937,190	584,593FC-4 días	597CC,598CC,599
597	Bacheo Prioridad 19	30 días	mié 15/07/20	mar 18/08/20	$ 86,245,700	596CC	601
598	Carpeta Prioridad 19	30 días	mié 15/07/20	mar 18/08/20	$ 8,828,812	596CC	601
599	Losas Prioridad 19	30 días	mié 15/07/20	mar 18/08/20	$ 0	596CC	601
600	Complementarias Prioridad 19	30 días	mié 15/07/20	mar 18/08/20	$ 7,201,930	596CC	601
601	Fin Actividades de Obra Prioridad 19	0 días	mar 18/08/20	mar 18/08/20	$ 0	600,599,598,597	387FC-11 días
602	**Prioridad 20 - Avenida José Celestino Mutis - Tramo 1**	**100 días**	**jue 9/07/20**	**lun 26/10/20**	**$ 652,439,999**		
603	Inicio Actividades de Obra Prioridad 20	0 días	mié 16/09/20	mié 16/09/20	$ 0	409FC-4 días	605
604	**Actividades Sociales Prioridad 20**	**12 días**	**mié 16/09/20**	**mar 29/09/20**	**$ 391,792**		
605	Preliminares para desarrollo reunion inicio (Espacio para la reunión, programacion de reuniones de Inicio, diseño pieza de invitación, diseño invitación entidades públicas y divulgacion de	3 días	mié 16/09/20	sáb 19/09/20	$ 235,076	603	606,615FC-20 días
606	Aprobación para desarrollo de reunion Prioridad 20	0 días	sáb 19/09/20	sáb 19/09/20	$ 0	605	607
607	Diseño y envio de volante socialización PMT (una vez se apruebe) Prioridad 20	2 días	sáb 19/09/20	lun 21/09/20	$ 39,179	606	608,609
608	Reunion de Inicio de Obra Prioridad 20	1 día	mar 22/09/20	mar 22/09/20	$ 39,179	607	612,617,620
609	Registro de inspección preliminar de vías Prioridad 20	7 días	mar 22/09/20	mar 29/09/20	$ 39,179	607	610FC-7 días
610	Convocatoria y Levantamiento actas de vecindad SI APLICA Priorid	7 días	mar 22/09/20	mar 29/09/20	$ 39,179	609FC-7 días	
611	**Actividades SST y Ambientales Prioridad 20**	**5 días**	**mar 22/09/20**	**lun 28/09/20**	**$ 1,713,942**		
612	Inventario de sumideros Prioridad 20	2 días	mar 22/09/20	jue 24/09/20	$ 171,394	608	613FC-2 días
613	Implementacion Ambiental, Protecciones Sumideros, Arboles, Elementos de protección y otros Prioridad 20	5 días	mar 22/09/20	lun 28/09/20	$ 1,542,548	612FC-2 días	
614	**Actividades PMT Prioridad 20**	**28 días**	**sáb 29/08/20**	**lun 28/09/20**	**$ 10,587,139**		
615	Elaboración y entrega PMT Prioridad 20	5 días	sáb 29/08/20	jue 3/09/20	$ 1,058,714	605FC-20 días	616
616	Aprobacion PMT Prioridad 20	12 días	jue 3/09/20	mié 16/09/20	$ 0	615	617
617	Implementacion PMT Prioridad 20	5 días	mar 22/09/20	lun 28/09/20	$ 9,528,425	608,616	620FC-4 días
618	**Actidades de Obra Prioridad 20**	**14 días**	**jue 9/07/20**	**vie 24/07/20**	**$ 639,747,126**		
619	Actualización de PKIDs Prioridad 20	30 días	mié 23/09/20	lun 26/10/20	$ 0	620CC	625
620	Parcheo Prioridad 20	30 días	mié 23/09/20	lun 26/10/20	$ 472,307,756	608,617FC-4 días	621CC,619CC,622
621	Bacheo Prioridad 20	30 días	mié 23/09/20	lun 26/10/20	$ 162,687,175	620CC	625
622	Carpeta Prioridad 20	30 días	mié 23/09/20	lun 26/10/20	$ 0	620CC	625
623	Losas Prioridad 20	30 días	mié 23/09/20	lun 26/10/20	$ 0	620CC	625
624	Complementarias Prioridad 20	30 días	mié 23/09/20	lun 26/10/20	$ 4,752,195	620CC	625
625	Fin Actividades de Obra Prioridad 20	0 días	lun 26/10/20	lun 26/10/20	$ 0	619,621,622,623	673,795FC-5 días
626	**Prioridad 21 - Avenida Bosa**	**54 días**	**jue 14/05/20**	**lun 13/07/20**	**$ 65,514,044**		
627	Inicio Actividades de Obra Prioridad 21	0 días	lun 1/06/20	lun 1/06/20	$ 0	152FC+16 días	629
628	**Actividades Sociales Prioridad 21**	**12 días**	**lun 1/06/20**	**vie 12/06/20**	**$ 391,792**		
629	Preliminares para desarrollo reunion inicio (Espacio para la reunión, programacion de reuniones de Inicio, diseño pieza de invitación, diseño invitación entidades públicas y divulgacion de	3 días	lun 1/06/20	mié 3/06/20	$ 235,076	627	630,639FC-20 días
630	Aprobación para desarrollo de reunion Prioridad 21	0 días	mié 3/06/20	mié 3/06/20	$ 0	629	631
631	Diseño y envio de volante socialización PMT (una vez se apruebe) Prioridad 21	2 días	jue 4/06/20	vie 5/06/20	$ 39,179	630	632,633
632	Reunion de Inicio de Obra Prioridad 21	1 día	vie 5/06/20	sáb 6/06/20	$ 39,179	631	636,641,644
633	Registro de inspección preliminar de vías Prioridad 21	7 días	vie 5/06/20	vie 12/06/20	$ 39,179	631	634FC-7 días
634	Convocatoria y Levantamiento actas de vecindad SI APLICA Priorid	7 días	vie 5/06/20	vie 12/06/20	$ 39,179	633FC-7 días	
635	**Actividades SST y Ambientales Prioridad 21**	**5 días**	**sáb 6/06/20**	**vie 12/06/20**	**$ 1,713,942**		
636	Inventario de sumideros Prioridad 21	2 días	sáb 6/06/20	mar 9/06/20	$ 171,394	632	637FC-2 días
637	Implementacion Ambiental, Protecciones Sumideros, Arboles, Elementos de protección y otros Prioridad 21	5 días	sáb 6/06/20	vie 12/06/20	$ 1,542,548	636FC-2 días	
638	**Actividades PMT Prioridad 21**	**28 días**	**jue 14/05/20**	**vie 12/06/20**	**$ 10,587,139**		
639	Elaboración y entrega PMT Prioridad 21	5 días	jue 14/05/20	mar 19/05/20	$ 1,058,714	629FC-20 días	640
640	Aprobacion PMT Prioridad 21	12 días	mar 19/05/20	lun 1/06/20	$ 0	639	641
641	Implementacion PMT Prioridad 21	5 días	sáb 6/06/20	vie 12/06/20	$ 9,528,425	632,640	644FC-4 días
642	**Actidades de Obra Prioridad 21**	**30 días**	**lun 8/06/20**	**lun 13/07/20**	**$ 52,821,171**		
643	Actualización de PKIDs Prioridad 21	30 días	lun 8/06/20	lun 13/07/20	$ 0	644CC	649
644	Parcheo Prioridad 21	30 días	lun 8/06/20	lun 13/07/20	$ 29,434,550	632,641FC-4 días	645CC,646CC,647
645	Bacheo Prioridad 21	30 días	lun 8/06/20	lun 13/07/20	$ 18,398,079	644CC	673
646	Carpeta Prioridad 21	30 días	lun 8/06/20	lun 13/07/20	$ 0	644CC	673

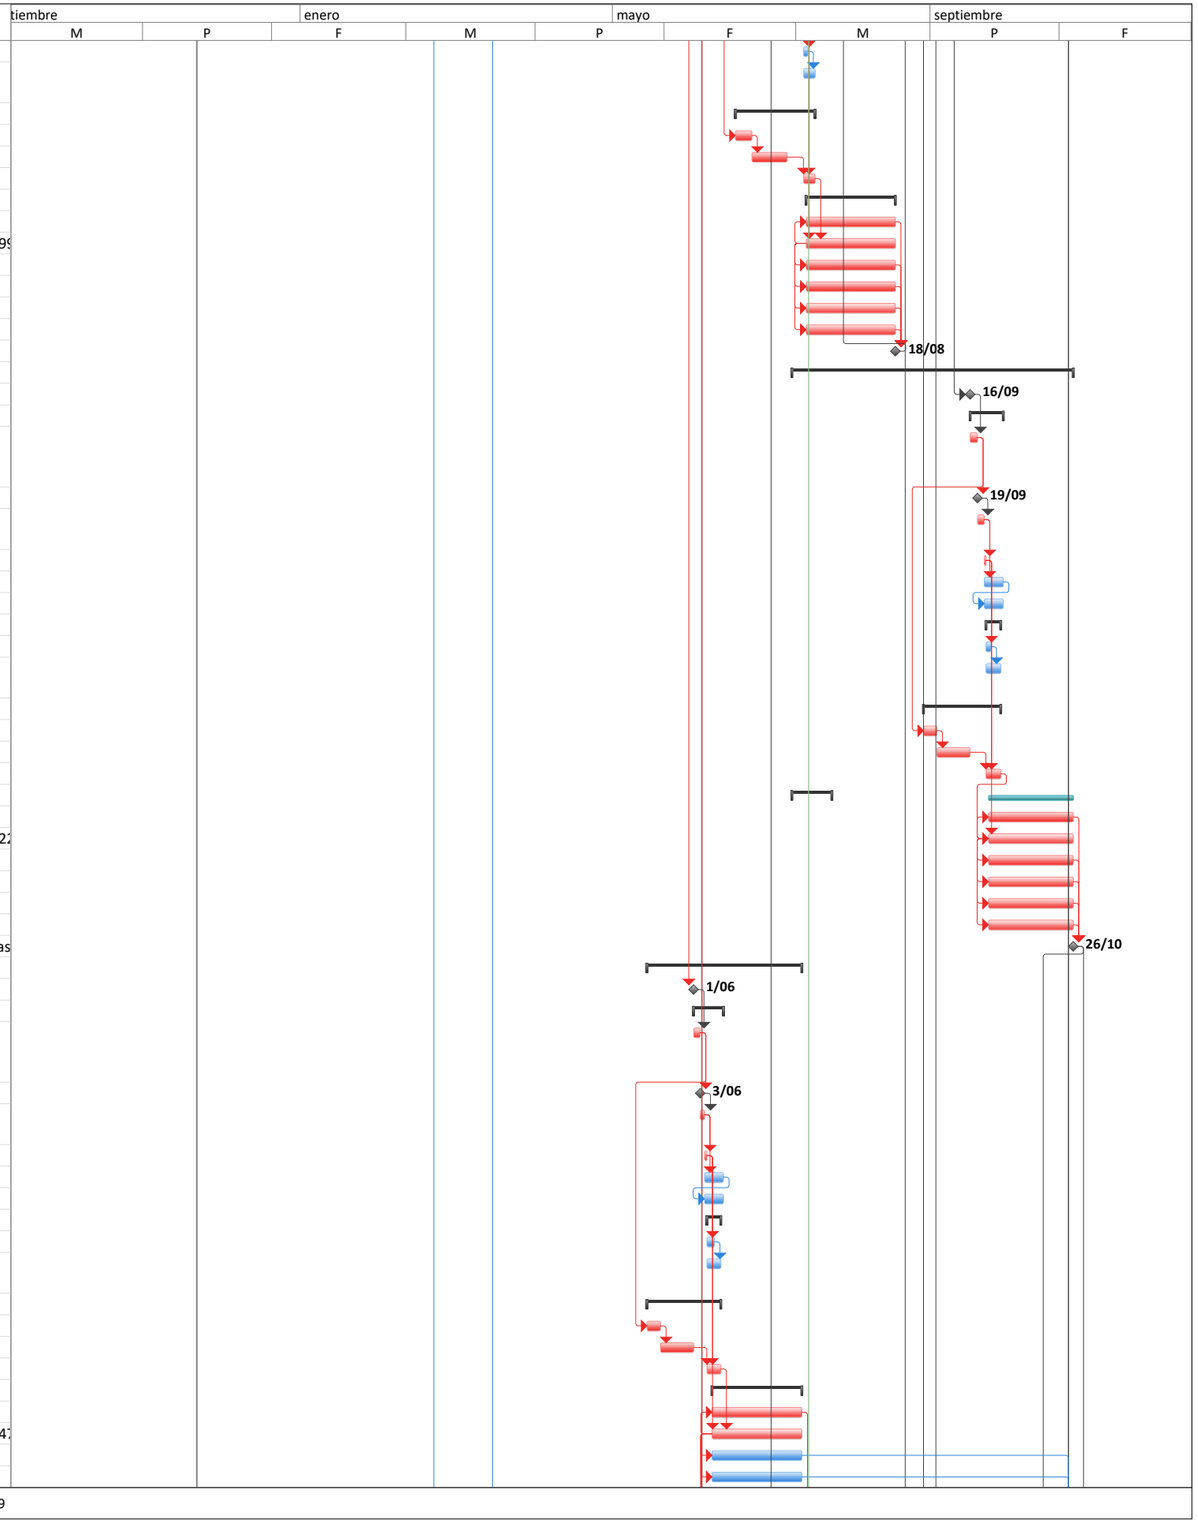


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	Sucesoras
647	Losas Prioridad 21	30 días	lun 8/06/20	lun 13/07/20	$ 0	644CC	673
648	Complementarias Prioridad 21	30 días	lun 8/06/20	lun 13/07/20	$ 4,988,542	644CC	673
649	Fin Actividades de Obra Prioridad 21	0 días	lun 13/07/20	lun 13/07/20	$ 0	643	579FC-5 días
650	**Prioridad 22 - Avenida Chile - Tramo 1**	**39 días**	**sáb 1/02/20**	**vie 13/03/20**	**$ 127,261,858**		
651	Inicio Actividades de Obra Prioridad 22	0 días	mié 19/02/20	mié 19/02/20	$ 0	222	653
652	**Actividades Sociales Prioridad 22**	**12 días**	**mié 19/02/20**	**mar 3/03/20**	**$ 391,792**		
653	Preliminares para desarrollo reunion inicio (Espacio para la reunión, programacion de reuniones de Inicio, diseño pieza de invitación, diseño invitación entidades públicas y divulgacion de	3 días	mié 19/02/20	sáb 22/02/20	$ 235,076	651	654,663FC-20 días
654	Aprobación para desarrollo de reunion Prioridad 22	0 días	sáb 22/02/20	sáb 22/02/20	$ 0	653	655
655	Diseño y envio de volante socialización PMT (una vez se apruebe) Prioridad 22	2 días	sáb 22/02/20	mar 25/02/20	$ 39,179	654	656,657
656	Reunion de Inicio de Obra Prioridad 22	1 día	mar 25/02/20	mié 26/02/20	$ 39,179	655	660,665,667
657	Registro de inspección preliminar de vías Prioridad 22	7 días	mar 25/02/20	mar 3/03/20	$ 39,179	655	658FC-7 días
658	Convocatoria y Levantamiento actas de vecindad SI APLICA Prioridad	7 días	mar 25/02/20	mar 3/03/20	$ 39,179	657FC-7 días	
659	**Actividades SST y Ambientales Prioridad 22**	**5 días**	**mié 26/02/20**	**lun 2/03/20**	**$ 1,713,942**		
660	Inventario de sumideros Prioridad 22	2 días	mié 26/02/20	jue 27/02/20	$ 171,394	656	661FC-2 días
661	Implementacion Ambiental, Protecciones Sumideros, Arboles, Elementos de protección y otros Prioridad 22	5 días	mié 26/02/20	lun 2/03/20	$ 1,542,548	660FC-2 días	
662	**Actividades PMT Prioridad 22**	**28 días**	**sáb 1/02/20**	**lun 2/03/20**	**$ 10,587,139**		
663	Elaboración y entrega PMT Prioridad 22	5 días	sáb 1/02/20	vie 7/02/20	$ 1,058,714	653FC-20 días	664
664	Aprobacion PMT Prioridad 22	12 días	vie 7/02/20	mié 19/02/20	$ 0	663	665
665	Implementacion PMT Prioridad 22	5 días	mié 26/02/20	lun 2/03/20	$ 9,528,425	656,664	667FC-4 días
666	**Actidades de Obra Prioridad 22**	**15 días**	**jue 27/02/20**	**vie 13/03/20**	**$ 114,568,985**		
667	Parcheo Prioridad 22	15 días	jue 27/02/20	vie 13/03/20	$ 94,255,448	656,665FC-4 días	668FC-15 días,67
668	Bacheo Prioridad 22	15 días	jue 27/02/20	vie 13/03/20	$ 14,773,700	667FC-15 días	669FC-15 días,67
669	Carpeta Prioridad 22	15 días	jue 27/02/20	vie 13/03/20	$ 0	668FC-15 días	670FC-15 días,67
670	Losas Prioridad 22	15 días	jue 27/02/20	vie 13/03/20	$ 0	669FC-15 días	671FC-15 días,67
671	Complementarias Prioridad 22	15 días	jue 27/02/20	vie 13/03/20	$ 5,539,837	670FC-15 días	556,672
672	Fin Actividades de Obra Prioridad 22	0 días	vie 13/03/20	vie 13/03/20	$ 0	667,668,669,670	
673	Fin Actividades Segunda Fase	0 días	lun 26/10/20	lun 26/10/20	$ 0	625,648,647,646	988
674	**Prioridad 23 - Avenida Mariscal Sucre - Tramo 2**	**44 días**	**sáb 12/09/20**	**jue 29/10/20**	**$ 484,127,719**		
675	Inicio Actividades de Obra Prioridad 23	0 días	jue 1/10/20	jue 1/10/20	$ 0	721FC-5 días	677
676	**Actividades Sociales Prioridad 23**	**12 días**	**jue 1/10/20**	**mié 14/10/20**	**$ 391,792**		
677	Preliminares para desarrollo reunion inicio (Espacio para la reunión, programacion de reuniones de Inicio, diseño pieza de invitación, diseño invitación entidades públicas y divulgacion de piezas)	3 días	jue 1/10/20	sáb 3/10/20	$ 235,076	675	678,687FC-20 días
678	Aprobación para desarrollo de reunion Prioridad 23	0 días	sáb 3/10/20	sáb 3/10/20	$ 0	677	679
679	Diseño y envio de volante socialización PMT (una vez se apruebe) Prioridad 23	2 días	sáb 3/10/20	mar 6/10/20	$ 39,179	678	680,681
680	Reunion de Inicio de Obra Prioridad 23	1 día	mar 6/10/20	mié 7/10/20	$ 39,179	679	684,689,692
681	Registro de inspección preliminar de vías Prioridad 23	7 días	mar 6/10/20	mié 14/10/20	$ 39,179	679	682FC-7 días
682	Convocatoria y Levantamiento actas de vecindad SI APLICA Prioridad	7 días	mar 6/10/20	mié 14/10/20	$ 39,179	681FC-7 días	
683	**Actividades SST y Ambientales Prioridad 23**	**5 días**	**mié 7/10/20**	**mar 13/10/20**	**$ 1,713,942**		
684	Inventario de sumideros Prioridad 23	2 días	mié 7/10/20	vie 9/10/20	$ 171,394	680	685FC-2 días
685	Implementacion Ambiental, Protecciones Sumideros, Arboles, Elementos de protección y otros Prioridad 23	5 días	mié 7/10/20	mar 13/10/20	$ 1,542,548	684FC-2 días	
686	**Actividades PMT Prioridad 23**	**28 días**	**sáb 12/09/20**	**mar 13/10/20**	**$ 10,587,139**		
687	Elaboración y entrega PMT Prioridad 23	5 días	sáb 12/09/20	vie 18/09/20	$ 1,058,714	677FC-20 días	688
688	Aprobacion PMT Prioridad 23	12 días	vie 18/09/20	mié 30/09/20	$ 0	687	689
689	Implementacion PMT Prioridad 23	5 días	mié 7/10/20	mar 13/10/20	$ 9,528,425	680,688	692FC-4 días
690	**Actidades de Obra Prioridad 23**	**20 días**	**jue 8/10/20**	**jue 29/10/20**	**$ 471,434,846**		
691	Actualización de PKIDs Prioridad 23	20 días	jue 8/10/20	jue 29/10/20	$ 273,432,211	692CC	697
692	Parcheo Prioridad 23	20 días	jue 8/10/20	jue 29/10/20	$ 174,430,893	680,689FC-4 días	693CC,691CC,694
693	Bacheo Prioridad 23	20 días	jue 8/10/20	jue 29/10/20	$ 0	692CC	697
694	Carpeta Prioridad 23	20 días	jue 8/10/20	jue 29/10/20	$ 0	692CC	697
695	Losas Prioridad 23	20 días	jue 8/10/20	jue 29/10/20	$ 23,571,742	692CC	697
696	Complementarias Prioridad 23	20 días	jue 8/10/20	jue 29/10/20	$ 0	692CC	697
697	Fin Actividades de Obra Prioridad 23	0 días	jue 29/10/20	jue 29/10/20	$ 0	691,696,695,694	891FC-4 días
698	**Prioridad 24 - Avenida Teusaquillo**	**54 días**	**lun 10/08/20**	**mar 6/10/20**	**$ 100,423,706**		
699	Inicio Actividades de Obra Prioridad 24	0 días	vie 28/08/20	vie 28/08/20	$ 0	554FC-4 días	701
700	**Actividades Sociales Prioridad 24**	**12 días**	**vie 28/08/20**	**jue 10/09/20**	**$ 391,792**		
701	Preliminares para desarrollo reunion inicio (Espacio para la reunión, programacion de reuniones de Inicio, diseño pieza de invitación, diseño invitación entidades públicas y divulgacion de piezas)	3 días	vie 28/08/20	mar 1/09/20	$ 235,076	699	702,711FC-20 días
702	Aprobación para desarrollo de reunion Prioridad 24	0 días	mar 1/09/20	mar 1/09/20	$ 0	701	703
703	Diseño y envio de volante socialización PMT (una vez se apruebe) Prioridad 24	2 días	mar 1/09/20	mié 2/09/20	$ 39,179	702	704,705

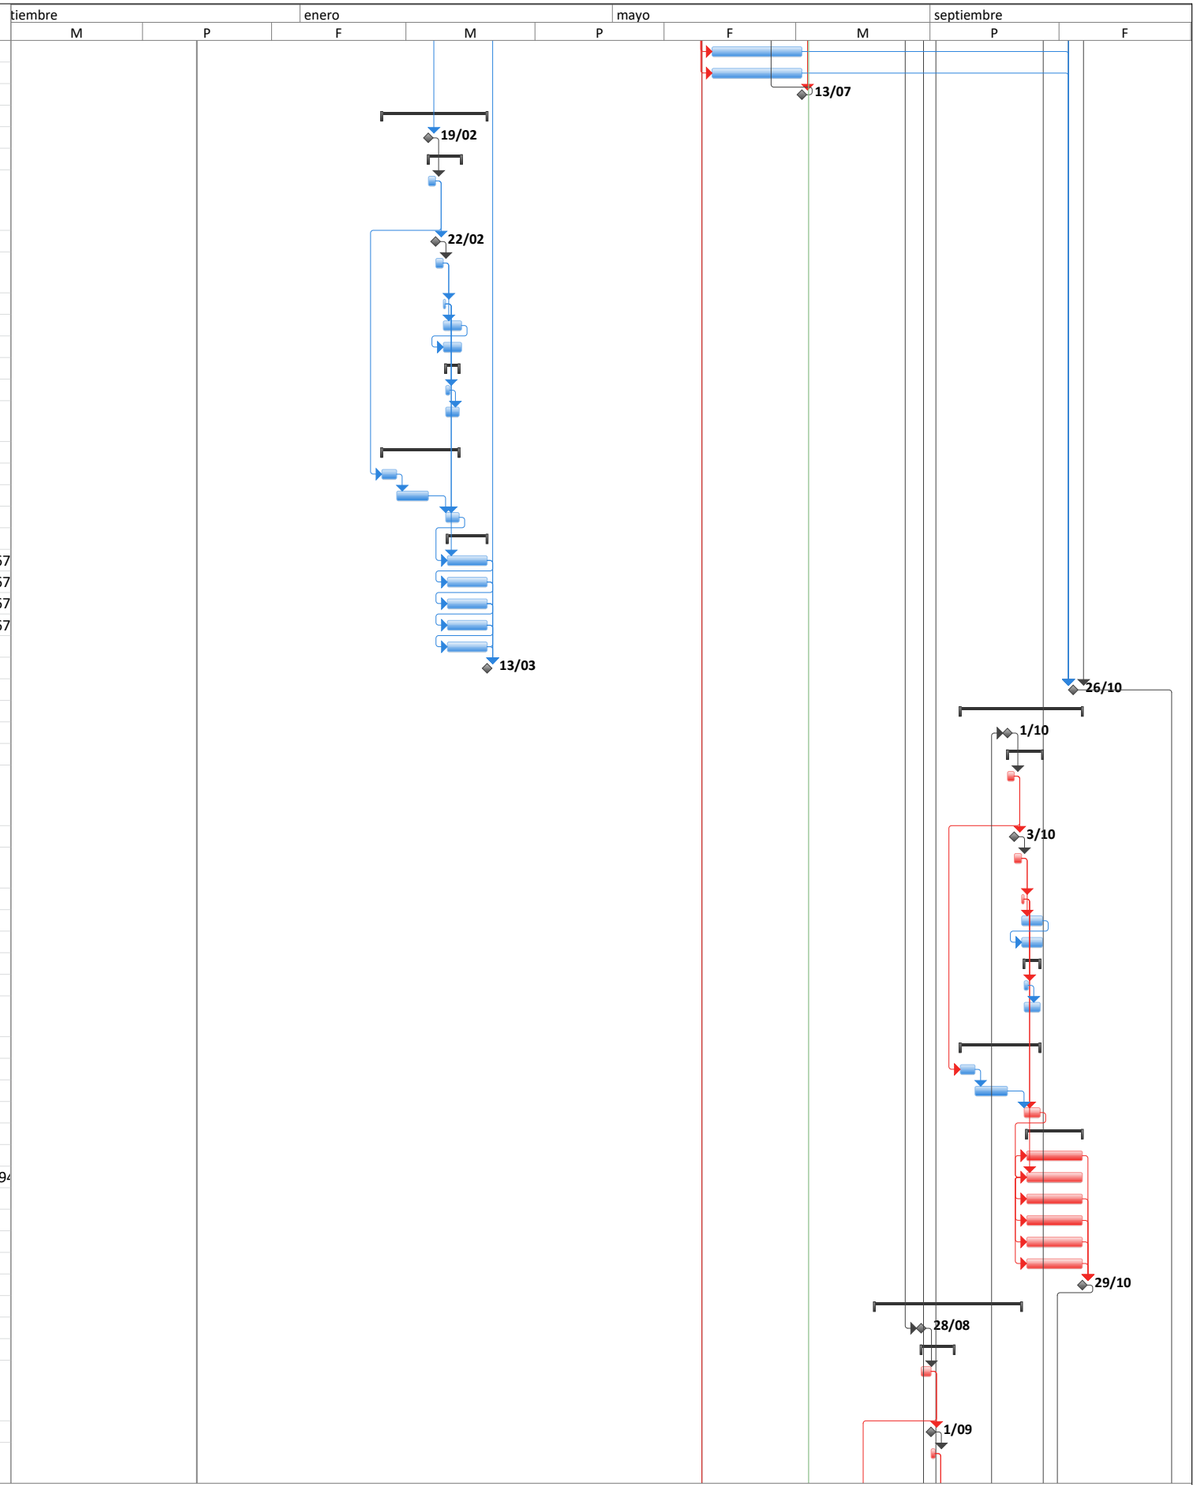


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	Sucesoras
704	Reunion de Inicio de Obra Prioridad 24	1 día	jue 3/09/20	jue 3/09/20	$ 39,179	703	708,713,716
705	Registro de inspección preliminar de vías Prioridad 24	7 días	jue 3/09/20	jue 10/09/20	$ 39,179	703	706FC-7 días
706	Convocatoria y Levantamiento actas de vecindad SI APLICA Prioridad	7 días	jue 3/09/20	jue 10/09/20	$ 39,179	705FC-7 días	
707	**Actividades SST y Ambientales Prioridad 24**	**5 días**	**jue 3/09/20**	**mié 9/09/20**	**$ 1,713,942**		
708	Inventario de sumideros Prioridad 24	2 días	jue 3/09/20	sáb 5/09/20	$ 171,394	704	709FC-2 días
709	Implementacion Ambiental, Protecciones Sumideros, Arboles, Elementos de protección y otros Prioridad 24	5 días	jue 3/09/20	mié 9/09/20	$ 1,542,548	708FC-2 días	
710	**Actividades PMT Prioridad 24**	**28 días**	**lun 10/08/20**	**mié 9/09/20**	**$ 10,587,139**		
711	Elaboración y entrega PMT Prioridad 24	5 días	lun 10/08/20	vie 14/08/20	$ 1,058,714	701FC-20 días	712
712	Aprobacion PMT Prioridad 24	12 días	vie 14/08/20	vie 28/08/20	$ 0	711	713
713	Implementacion PMT Prioridad 24	5 días	jue 3/09/20	mié 9/09/20	$ 9,528,425	704,712	716FC-4 días
714	**Actidades de Obra Prioridad 24**	**30 días**	**vie 4/09/20**	**mar 6/10/20**	**$ 87,730,833**		
715	Actualización de PKIDs Prioridad 24	30 días	vie 4/09/20	mar 6/10/20	$ 0	716CC	721
716	Parcheo Prioridad 24	30 días	vie 4/09/20	mar 6/10/20	$ 50,883,883	704,713FC-4 días	717CC,715CC,718
717	Bacheo Prioridad 24	30 días	vie 4/09/20	mar 6/10/20	$ 32,460,408	716CC	721
718	Carpeta Prioridad 24	30 días	vie 4/09/20	mar 6/10/20	$ 0	716CC	721
719	Losas Prioridad 24	30 días	vie 4/09/20	mar 6/10/20	$ 0	716CC	721
720	Complementarias Prioridad 24	30 días	vie 4/09/20	mar 6/10/20	$ 4,386,542	716CC	721
721	Fin Actividades de Obra Prioridad 24	0 días	mar 6/10/20	mar 6/10/20	$ 0	715,720,719,718	675FC-5 días
722	**Prioridad 25 - Avenida Pepe Sierra Tramo 1**	**54 días**	**mar 18/08/20**	**mié 14/10/20**	**$ 337,465,870**		
723	Inicio Actividades de Obra Prioridad 25	0 días	vie 4/09/20	vie 4/09/20	$ 0	362FC-4 días	725
724	**Actividades Sociales Prioridad 25**	**12 días**	**vie 4/09/20**	**jue 17/09/20**	**$ 391,792**		
725	Preliminares para desarrollo reunion inicio (Espacio para la reunión, programacion de reuniones de Inicio, diseño pieza de invitación, diseño invitación entidades públicas y divulgacion de piezas)	3 días	vie 4/09/20	mar 8/09/20	$ 235,076	723	726,735FC-20 días
726	Aprobación para desarrollo de reunion Prioridad 25	0 días	mar 8/09/20	mar 8/09/20	$ 0	725	727
727	Diseño y envio de volante socialización PMT (una vez se apruebe) Prioridad 25	2 días	mar 8/09/20	jue 10/09/20	$ 39,179	726	728,729
728	Reunion de Inicio de Obra Prioridad 25	1 día	jue 10/09/20	vie 11/09/20	$ 39,179	727	732,737,740
729	Registro de inspección preliminar de vías Prioridad 25	7 días	jue 10/09/20	jue 17/09/20	$ 39,179	727	730FC-7 días
730	Convocatoria y Levantamiento actas de vecindad SI APLICA Prioridad	7 días	jue 10/09/20	jue 17/09/20	$ 39,179	729FC-7 días	
731	**Actividades SST y Ambientales Prioridad 25**	**5 días**	**vie 11/09/20**	**mié 16/09/20**	**$ 1,713,942**		
732	Inventario de sumideros Prioridad 25	2 días	vie 11/09/20	sáb 12/09/20	$ 171,394	728	733FC-2 días
733	Implementacion Ambiental, Protecciones Sumideros, Arboles, Elementos de protección y otros Prioridad 25	5 días	vie 11/09/20	mié 16/09/20	$ 1,542,548	732FC-2 días	
734	**Actividades PMT Prioridad 25**	**28 días**	**mar 18/08/20**	**mié 16/09/20**	**$ 10,587,139**		
735	Elaboración y entrega PMT Prioridad 25	5 días	mar 18/08/20	lun 24/08/20	$ 1,058,714	725FC-20 días	736
736	Aprobacion PMT Prioridad 25	12 días	lun 24/08/20	vie 4/09/20	$ 0	735	737
737	Implementacion PMT Prioridad 25	5 días	vie 11/09/20	mié 16/09/20	$ 9,528,425	728,736	740FC-4 días
738	**Actidades de Obra Prioridad 25**	**30 días**	**sáb 12/09/20**	**mié 14/10/20**	**$ 324,772,997**		
739	Actualización de PKIDs Prioridad 25	30 días	sáb 12/09/20	mié 14/10/20	$ 0	740CC	745
740	Parcheo Prioridad 25	30 días	sáb 12/09/20	mié 14/10/20	$ 188,368,338	728,737FC-4 días	741CC,739CC,742
741	Bacheo Prioridad 25	30 días	sáb 12/09/20	mié 14/10/20	$ 120,166,009	740CC	745
742	Carpeta Prioridad 25	30 días	sáb 12/09/20	mié 14/10/20	$ 0	740CC	745
743	Losas Prioridad 25	30 días	sáb 12/09/20	mié 14/10/20	$ 0	740CC	745
744	Complementarias Prioridad 25	30 días	sáb 12/09/20	mié 14/10/20	$ 16,238,650	740CC	745
745	Fin Actividades de Obra Prioridad 25	0 días	mié 14/10/20	mié 14/10/20	$ 0	739,741,742,743	819FC-5 días
746	**Prioridad 26.1 - Avenida Santa Barbara Tramo 1**	**49 días**	**sáb 22/08/20**	**mar 13/10/20**	**$ 218,111,014**		
747	Inicio Actividades de Obra Prioridad 26.1	0 días	mié 9/09/20	mié 9/09/20	$ 0	385FC-5 días	749
748	**Actividades Sociales Prioridad 26.1**	**12 días**	**mié 9/09/20**	**lun 21/09/20**	**$ 391,792**		
749	Preliminares para desarrollo reunion inicio (Espacio para la reunión, programacion de reuniones de Inicio, diseño pieza de invitación, diseño invitación entidades públicas y divulgacion de piezas)	3 días	mié 9/09/20	vie 11/09/20	$ 235,076	747	750,759FC-20 días
750	Aprobación para desarrollo de reunion Prioridad 26.1	0 días	vie 11/09/20	vie 11/09/20	$ 0	749	751
751	Diseño y envio de volante socialización PMT (una vez se apruebe) Prioridad 26.1	2 días	sáb 12/09/20	lun 14/09/20	$ 39,179	750	752,753
752	Reunion de Inicio de Obra Prioridad 26.1	1 día	lun 14/09/20	mar 15/09/20	$ 39,179	751	756,761,764
753	Registro de inspección preliminar de vías Prioridad 26.1	7 días	lun 14/09/20	lun 21/09/20	$ 39,179	751	754FC-7 días
754	Convocatoria y Levantamiento actas de vecindad SI APLICA Prioridad	7 días	lun 14/09/20	lun 21/09/20	$ 39,179	753FC-7 días	
755	**Actividades SST y Ambientales Prioridad 26.1**	**5 días**	**mar 15/09/20**	**lun 21/09/20**	**$ 1,713,942**		
756	Inventario de sumideros Prioridad 26.1	2 días	mar 15/09/20	jue 17/09/20	$ 171,394	752	757FC-2 días
757	Implementacion Ambiental, Protecciones Sumideros, Arboles, Elementos de protección y otros Prioridad 26.1	5 días	mar 15/09/20	lun 21/09/20	$ 1,542,548	756FC-2 días	
758	**Actividades PMT Prioridad 26.1**	**28 días**	**sáb 22/08/20**	**lun 21/09/20**	**$ 10,587,139**		
759	Elaboración y entrega PMT Prioridad 26.1	5 días	sáb 22/08/20	jue 27/08/20	$ 1,058,714	749FC-20 días	760
760	Aprobacion PMT Prioridad 26.1	12 días	jue 27/08/20	mié 9/09/20	$ 0	759	761
761	Implementacion PMT Prioridad 26.1	5 días	mar 15/09/20	lun 21/09/20	$ 9,528,425	752,760	764FC-4 días
762	**Actidades de Obra Prioridad 26.1**	**25 días**	**mié 16/09/20**	**mar 13/10/20**	**$ 205,418,141**		

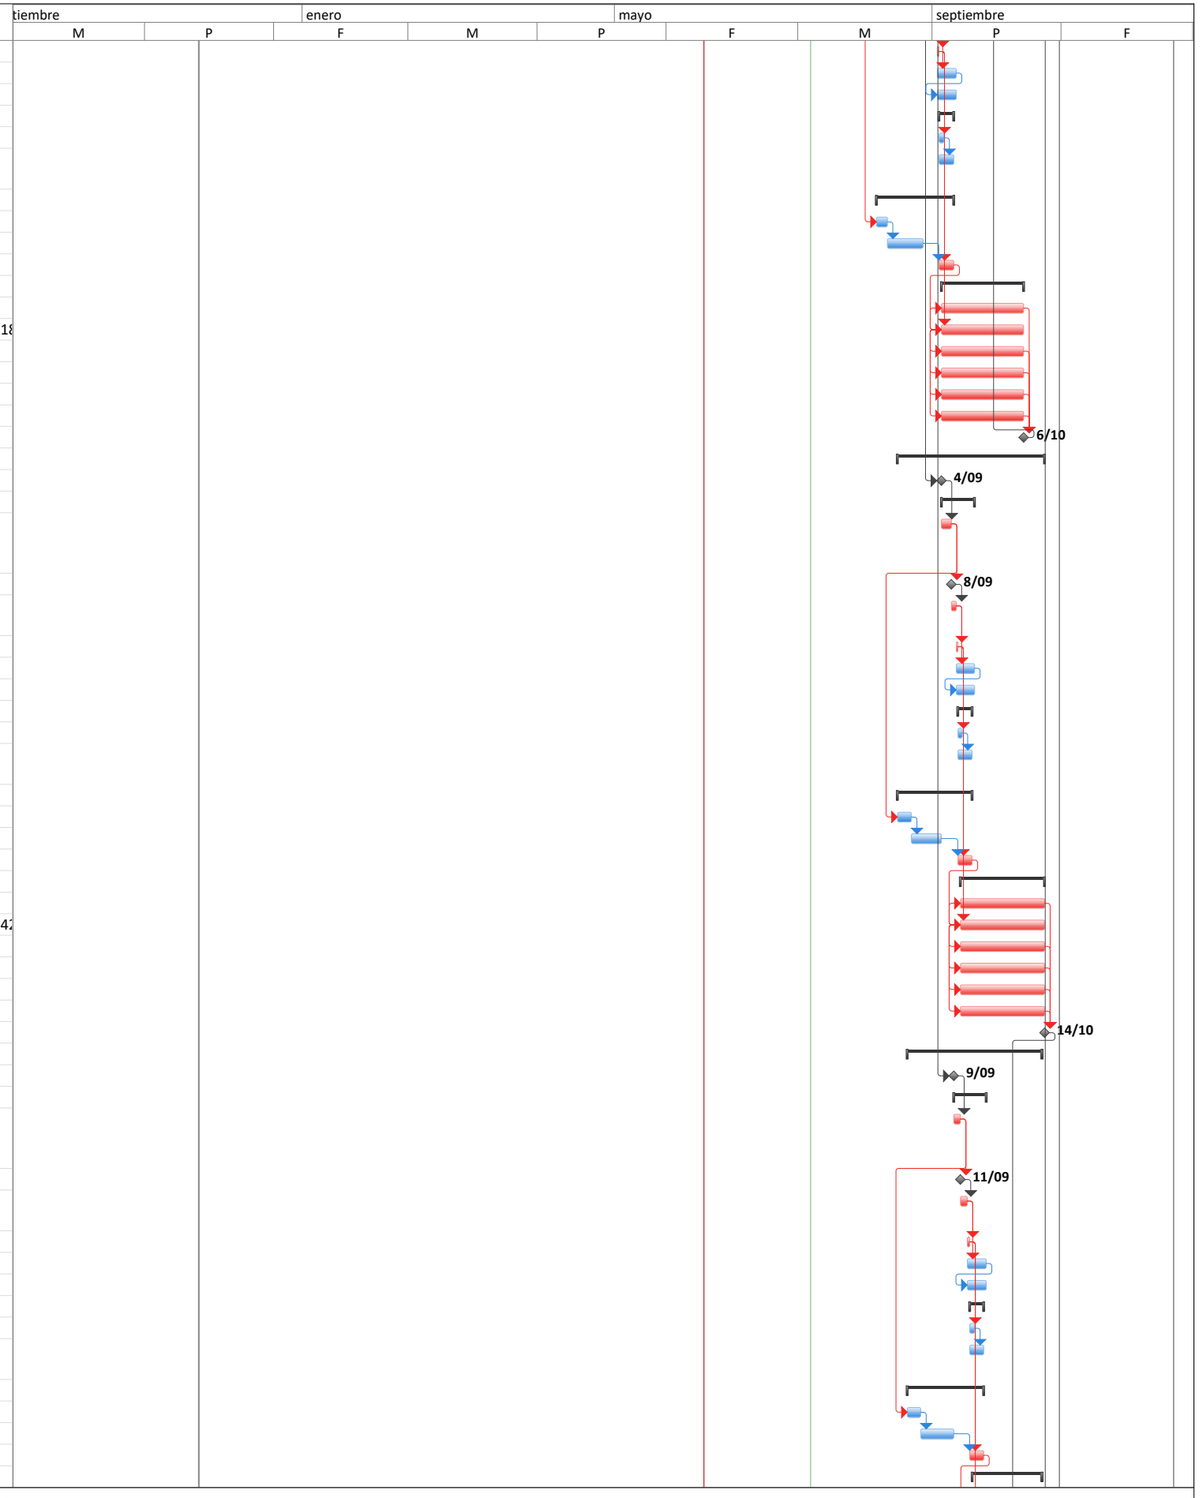


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	Sucesoras
763	Actualización de PKIDs Prioridad 26.1	25 días	mié 16/09/20	mar 13/10/20	$ 0	764CC	769
764	Parcheo Prioridad 26.1	25 días	mié 16/09/20	mar 13/10/20	$ 119,142,522	752,761FC-4 días	765CC,763CC,766
765	Bacheo Prioridad 26.1	25 días	mié 16/09/20	mar 13/10/20	$ 76,004,712	764CC	769
766	Carpeta Prioridad 26.1	25 días	mié 16/09/20	mar 13/10/20	$ 0	764CC	769
767	Losas Prioridad 26.1	25 días	mié 16/09/20	mar 13/10/20	$ 0	764CC	769
768	Complementarias Prioridad 26.1	25 días	mié 16/09/20	mar 13/10/20	$ 10,270,907	764CC	769
769	Fin Actividades de Obra Prioridad 26.1	0 días	mar 13/10/20	mar 13/10/20	$ 0	763,768,767,766	771FC-5 días
770	**Prioridad 26.2 - Avenida Santa Barbara Tramo 2**	**39 días**	**sáb 19/09/20**	**vie 30/10/20**	**$ 73,126,001**		
771	Inicio Actividades de Obra Prioridad 26.2	0 días	mié 7/10/20	mié 7/10/20	$ 0	769FC-5 días	773
772	**Actividades Sociales Prioridad 26.2**	**12 días**	**mié 7/10/20**	**mar 20/10/20**	**$ 391,792**		
773	Preliminares para desarrollo reunion inicio (Espacio para la reunión, programacion de reuniones de Inicio, diseño pieza de invitación, diseño invitación entidades públicas y divulgacion de piezas)	3 días	mié 7/10/20	vie 9/10/20	$ 235,076	771	774,783FC-20 días
774	Aprobación para desarrollo de reunion Prioridad 26.2	0 días	vie 9/10/20	vie 9/10/20	$ 0	773	775
775	Diseño y envio de volante socialización PMT (una vez se apruebe) Prioridad 26.2	2 días	sáb 10/10/20	mar 13/10/20	$ 39,179	774	776,777
776	Reunion de Inicio de Obra Prioridad 26.2	1 día	mar 13/10/20	mié 14/10/20	$ 39,179	775	780,785,788
777	Registro de inspección preliminar de vías Prioridad 26.2	7 días	mar 13/10/20	mar 20/10/20	$ 39,179	775	778FC-7 días
778	Convocatoria y Levantamiento actas de vecindad SI APLICA Prioridad	7 días	mar 13/10/20	mar 20/10/20	$ 39,179	777FC-7 días	
779	**Actividades SST y Ambientales Prioridad 26.2**	**5 días**	**mié 14/10/20**	**mar 20/10/20**	**$ 1,713,942**		
780	Inventario de sumideros Prioridad 26.2	2 días	mié 14/10/20	vie 16/10/20	$ 171,394	776	781FC-2 días
781	Implementacion Ambiental, Protecciones Sumideros, Arboles, Elementos de protección y otros Prioridad 26.2	5 días	mié 14/10/20	mar 20/10/20	$ 1,542,548	780FC-2 días	
782	**Actividades PMT Prioridad 26.2**	**28 días**	**sáb 19/09/20**	**mar 20/10/20**	**$ 10,587,139**		
783	Elaboración y entrega PMT Prioridad 26.2	5 días	sáb 19/09/20	jue 24/09/20	$ 1,058,714	773FC-20 días	784
784	Aprobacion PMT Prioridad 26.2	12 días	jue 24/09/20	mié 7/10/20	$ 0	783	785
785	Implementacion PMT Prioridad 26.2	5 días	mié 14/10/20	mar 20/10/20	$ 9,528,425	776,784	788FC-4 días
786	**Actidades de Obra Prioridad 26.2**	**15 días**	**jue 15/10/20**	**vie 30/10/20**	**$ 60,433,128**		
787	Actualización de PKIDs Prioridad 26.2	15 días	jue 15/10/20	vie 30/10/20	$ 0	788CC	793
788	Parcheo Prioridad 26.2	15 días	jue 15/10/20	vie 30/10/20	$ 35,051,214	776,785FC-4 días	787CC,789CC,790
789	Bacheo Prioridad 26.2	15 días	jue 15/10/20	vie 30/10/20	$ 22,360,258	788CC	793
790	Carpeta Prioridad 26.2	15 días	jue 15/10/20	vie 30/10/20	$ 0	788CC	793
791	Losas Prioridad 26.2	15 días	jue 15/10/20	vie 30/10/20	$ 0	788CC	793
792	Complementarias Prioridad 26.2	15 días	jue 15/10/20	vie 30/10/20	$ 3,021,656	788CC	793
793	Fin Actividades de Obra Prioridad 26.2	0 días	vie 30/10/20	vie 30/10/20	$ 0	787,789,790,791	843FC-4 días
794	**Prioridad 27 - Avenida Pedro Leon Trabuchy**	**54 días**	**jue 1/10/20**	**lun 30/11/20**	**$ 181,501,825**		
795	Inicio Actividades de Obra Prioridad 27	0 días	mié 21/10/20	mié 21/10/20	$ 0	625FC-5 días	797
796	**Actividades Sociales Prioridad 27**	**12 días**	**mié 21/10/20**	**mar 3/11/20**	**$ 391,792**		
797	Preliminares para desarrollo reunion inicio (Espacio para la reunión, programacion de reuniones de Inicio, diseño pieza de invitación, diseño invitación entidades públicas y divulgacion de piezas)	3 días	mié 21/10/20	vie 23/10/20	$ 235,076	795	798,807FC-20 días
798	Aprobación para desarrollo de reunion Prioridad 27	0 días	vie 23/10/20	vie 23/10/20	$ 0	797	799
799	Diseño y envio de volante socialización PMT (una vez se apruebe) Prioridad 27	2 días	vie 23/10/20	lun 26/10/20	$ 39,179	798	800,801
800	Reunion de Inicio de Obra Prioridad 27	1 día	lun 26/10/20	mar 27/10/20	$ 39,179	799	804,809,812
801	Registro de inspección preliminar de vías Prioridad 27	7 días	lun 26/10/20	mar 3/11/20	$ 39,179	799	802FC-7 días
802	Convocatoria y Levantamiento actas de vecindad SI APLICA Prioridad	7 días	lun 26/10/20	mar 3/11/20	$ 39,179	801FC-7 días	
803	**Actividades SST y Ambientales Prioridad 27**	**5 días**	**mar 27/10/20**	**sáb 31/10/20**	**$ 1,713,942**		
804	Inventario de sumideros Prioridad 27	2 días	mar 27/10/20	jue 29/10/20	$ 171,394	800	805FC-2 días
805	Implementacion Ambiental, Protecciones Sumideros, Arboles, Elementos de protección y otros Prioridad 27	5 días	mar 27/10/20	sáb 31/10/20	$ 1,542,548	804FC-2 días	
806	**Actividades PMT Prioridad 27**	**28 días**	**jue 1/10/20**	**sáb 31/10/20**	**$ 10,587,139**		
807	Elaboración y entrega PMT Prioridad 27	5 días	jue 1/10/20	mié 7/10/20	$ 1,058,714	797FC-20 días	808
808	Aprobacion PMT Prioridad 27	12 días	mié 7/10/20	mar 20/10/20	$ 0	807	809
809	Implementacion PMT Prioridad 27	5 días	mar 27/10/20	sáb 31/10/20	$ 9,528,425	800,808	812FC-4 días
810	**Actidades de Obra Prioridad 27**	**30 días**	**mié 28/10/20**	**lun 30/11/20**	**$ 168,808,952**		
811	Actualización de PKIDs Prioridad 27	30 días	mié 28/10/20	lun 30/11/20	$ 0	812CC	817
812	Parcheo Prioridad 27	30 días	mié 28/10/20	lun 30/11/20	$ 97,909,192	800,809FC-4 días	813CC,811CC,814
813	Bacheo Prioridad 27	30 días	mié 28/10/20	lun 30/11/20	$ 62,459,312	812CC	817
814	Carpeta Prioridad 27	30 días	mié 28/10/20	lun 30/11/20	$ 0	812CC	817
815	Losas Prioridad 27	30 días	mié 28/10/20	lun 30/11/20	$ 0	812CC	817
816	Complementarias Prioridad 27	30 días	mié 28/10/20	lun 30/11/20	$ 8,440,448	812CC	817
817	Fin Actividades de Obra Prioridad 27	0 días	lun 30/11/20	lun 30/11/20	$ 0	816,815,814,813	867FC-6 días
818	**Prioridad 28 - Avenida La Victoria**	**47 días**	**lun 21/09/20**	**mar 10/11/20**	**$ 929,353,847**		
819	Inicio Actividades de Obra Prioridad 28	0 días	jue 8/10/20	jue 8/10/20	$ 0	745FC-5 días	821
820	**Actividades Sociales Prioridad 28**	**12 días**	**jue 8/10/20**	**mié 21/10/20**	**$ 391,792**		

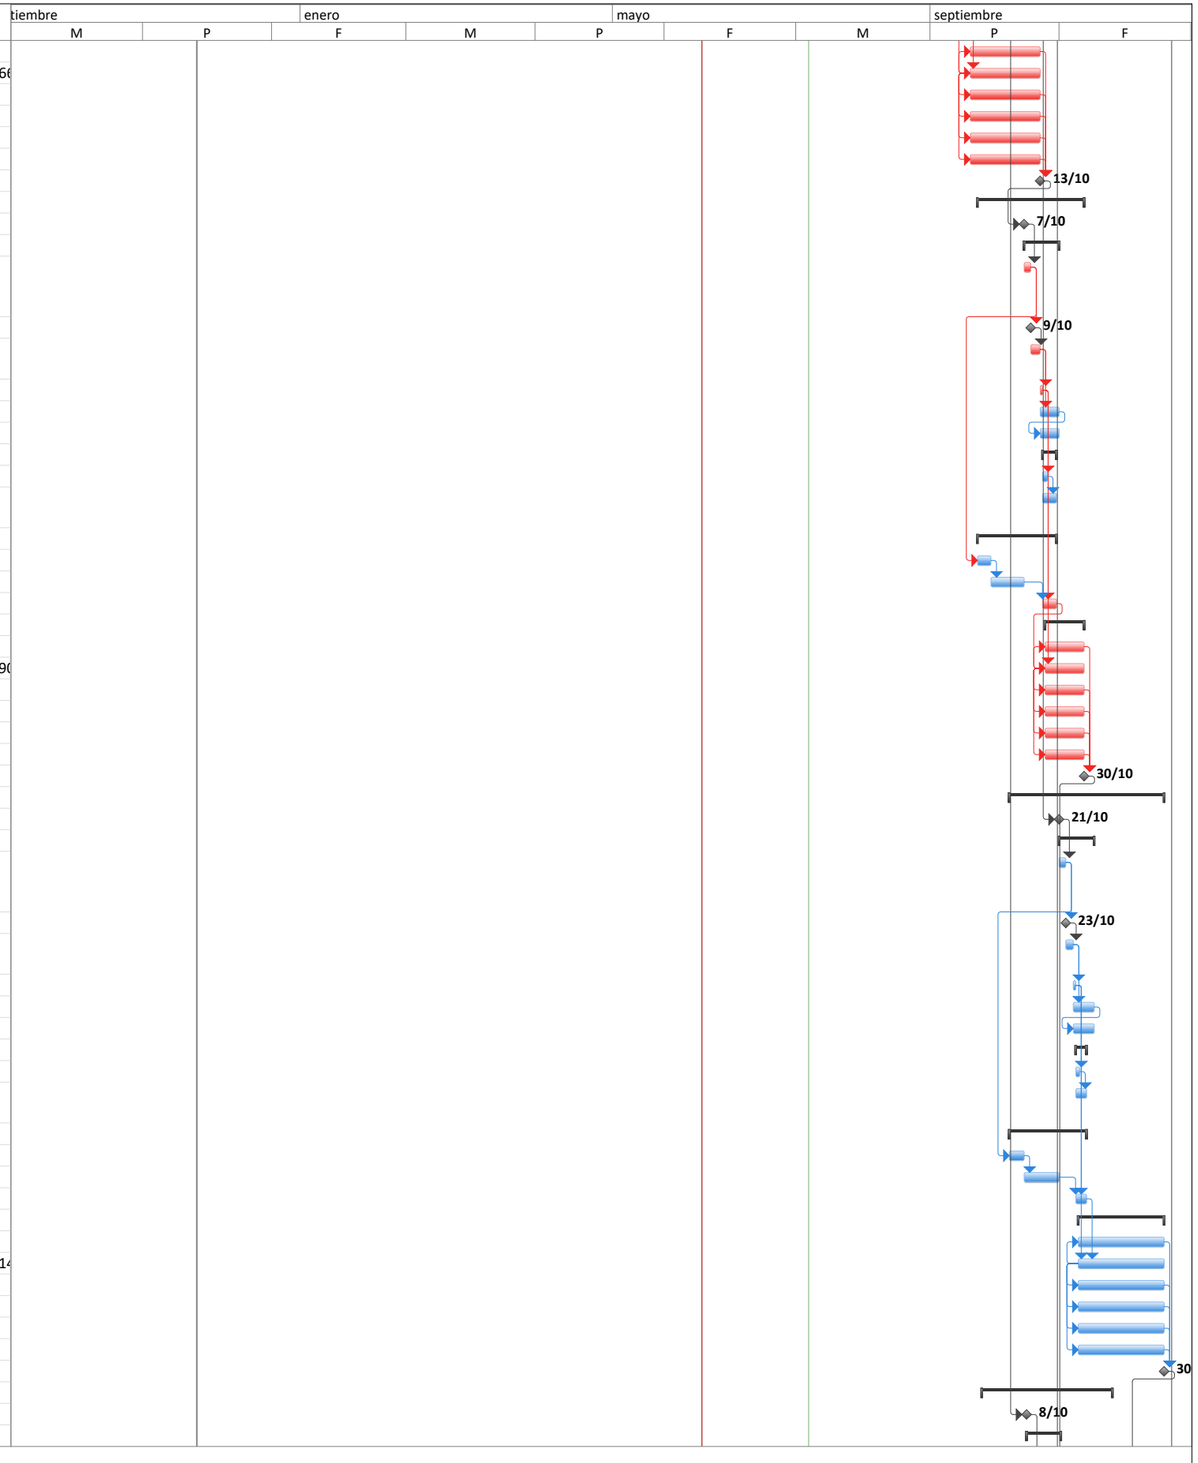


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	Sucesoras
821	Preliminares para desarrollo reunion inicio (Espacio para la reunión, programacion de reuniones de Inicio, diseño pieza de invitación, diseño invitación entidades públicas y divulgacion de piezas)	3 días	jue 8/10/20	sáb 10/10/20	$ 235,076	819	822,831FC-20 días
822	Aprobación para desarrollo de reunion Prioridad 28	0 días	sáb 10/10/20	sáb 10/10/20	$ 0	821	823
823	Diseño y envio de volante socialización PMT (una vez se apruebe) Prioridad 28	2 días	sáb 10/10/20	mié 14/10/20	$ 39,179	822	824,825
824	Reunion de Inicio de Obra Prioridad 28	1 día	mié 14/10/20	jue 15/10/20	$ 39,179	823	828,833,836
825	Registro de inspección preliminar de vías Prioridad 28	7 días	mié 14/10/20	mié 21/10/20	$ 39,179	823	826FC-7 días
826	Convocatoria y Levantamiento actas de vecindad SI APLICA Prioridad	7 días	mié 14/10/20	mié 21/10/20	$ 39,179	825FC-7 días	
827	**Actividades SST y Ambientales Prioridad 28**	**5 días**	**jue 15/10/20**	**mar 20/10/20**	**$ 1,713,942**		
828	Inventario de sumideros Prioridad 28	2 días	jue 15/10/20	sáb 17/10/20	$ 171,394	824	829FC-2 días
829	Implementacion Ambiental, Protecciones Sumideros, Arboles, Elementos de protección y otros Prioridad 28	5 días	jue 15/10/20	mar 20/10/20	$ 1,542,548	828FC-2 días	
830	**Actividades PMT Prioridad 28**	**28 días**	**lun 21/09/20**	**mar 20/10/20**	**$ 10,587,139**		
831	Elaboración y entrega PMT Prioridad 28	5 días	lun 21/09/20	vie 25/09/20	$ 1,058,714	821FC-20 días	832
832	Aprobacion PMT Prioridad 28	12 días	vie 25/09/20	jue 8/10/20	$ 0	831	833
833	Implementacion PMT Prioridad 28	5 días	jue 15/10/20	mar 20/10/20	$ 9,528,425	824,832	836FC-4 días
834	**Actidades de Obra Prioridad 28**	**23 días**	**vie 16/10/20**	**mar 10/11/20**	**$ 916,660,974**		
835	Actualización de PKIDs Prioridad 28	23 días	vie 16/10/20	mar 10/11/20	$ 0	836CC	841
836	Parcheo Prioridad 28	23 días	vie 16/10/20	mar 10/11/20	$ 531,663,365	824,833FC-4 días	837CC,835CC,838
837	Bacheo Prioridad 28	23 días	vie 16/10/20	mar 10/11/20	$ 339,164,560	836CC	841
838	Carpeta Prioridad 28	23 días	vie 16/10/20	mar 10/11/20	$ 0	836CC	841
839	Losas Prioridad 28	23 días	vie 16/10/20	mar 10/11/20	$ 0	836CC	841
840	Complementarias Prioridad 28	23 días	vie 16/10/20	mar 10/11/20	$ 45,833,049	836CC	841
841	Fin Actividades de Obra Prioridad 28	0 días	mar 10/11/20	mar 10/11/20	$ 0	835,840,839,838	915FC-4 días
842	**Prioridad 29 - Avenida Laureano Gómez - Tramo 1**	**39 días**	**jue 8/10/20**	**vie 20/11/20**	**$ 2,001,617**		
843	Inicio Actividades de Obra Prioridad 29	0 días	mar 27/10/20	mar 27/10/20	$ 0	793FC-4 días	845
844	**Actividades Sociales Prioridad 29**	**12 días**	**mar 27/10/20**	**lun 9/11/20**	**$ 391,792**		
845	Preliminares para desarrollo reunion inicio (Espacio para la reunión, programacion de reuniones de Inicio, diseño pieza de invitación, diseño invitación entidades públicas y divulgacion de piezas)	3 días	mar 27/10/20	jue 29/10/20	$ 235,076	843	846,855FC-20 días
846	Aprobación para desarrollo de reunion Prioridad 29	0 días	jue 29/10/20	jue 29/10/20	$ 0	845	847
847	Diseño y envio de volante socialización PMT (una vez se apruebe) Prioridad 29	2 días	vie 30/10/20	sáb 31/10/20	$ 39,179	846	848,849
848	Reunion de Inicio de Obra Prioridad 29	1 día	sáb 31/10/20	mar 3/11/20	$ 39,179	847	852,857,860
849	Registro de inspección preliminar de vías Prioridad 29	7 días	sáb 31/10/20	lun 9/11/20	$ 39,179	847	850FC-7 días
850	Convocatoria y Levantamiento actas de vecindad SI APLICA Prioridad	7 días	sáb 31/10/20	lun 9/11/20	$ 39,179	849FC-7 días	
851	**Actividades SST y Ambientales Prioridad 29**	**5 días**	**mar 3/11/20**	**lun 9/11/20**	**$ 54,901**		
852	Inventario de sumideros Prioridad 29	2 días	mar 3/11/20	jue 5/11/20	$ 5,490	848	853FC-2 días
853	Implementacion Ambiental, Protecciones Sumideros, Arboles, Elementos de protección y otros Prioridad 29	5 días	mar 3/11/20	lun 9/11/20	$ 49,411	852FC-2 días	
854	**Actividades PMT Prioridad 29**	**28 días**	**jue 8/10/20**	**lun 9/11/20**	**$ 179,904**		
855	Elaboración y entrega PMT Prioridad 29	5 días	jue 8/10/20	mié 14/10/20	$ 17,990	845FC-20 días	856
856	Aprobacion PMT Prioridad 29	12 días	mié 14/10/20	mar 27/10/20	$ 0	855	857
857	Implementacion PMT Prioridad 29	5 días	mar 3/11/20	lun 9/11/20	$ 161,914	848,856	860FC-4 días
858	**Actidades de Obra Prioridad 29**	**15 días**	**mié 4/11/20**	**vie 20/11/20**	**$ 1,375,020**		
859	Actualización de PKIDs Prioridad 29	15 días	mié 4/11/20	vie 20/11/20	$ 0	860CC	865
860	Parcheo Prioridad 29	15 días	mié 4/11/20	vie 20/11/20	$ 797,512	848,857FC-4 días	861CC,859CC,862
861	Bacheo Prioridad 29	15 días	mié 4/11/20	vie 20/11/20	$ 508,757	860CC	865
862	Carpeta Prioridad 29	15 días	mié 4/11/20	vie 20/11/20	$ 0	860CC	865
863	Losas Prioridad 29	15 días	mié 4/11/20	vie 20/11/20	$ 0	860CC	865
864	Complementarias Prioridad 29	15 días	mié 4/11/20	vie 20/11/20	$ 68,751	860CC	865
865	Fin Actividades de Obra Prioridad 29	0 días	vie 20/11/20	vie 20/11/20	$ 0	859,864,863,862	939FC-4 días
866	**Prioridad 30 - Avenida Cordoba**	**49 días**	**jue 5/11/20**	**mar 29/12/20**	**$ 42,940,432**		
867	Inicio Actividades de Obra Prioridad 30	0 días	mar 24/11/20	mar 24/11/20	$ 0	817FC-6 días	869
868	**Actividades Sociales Prioridad 30**	**12 días**	**mar 24/11/20**	**lun 7/12/20**	**$ 391,792**		
869	Preliminares para desarrollo reunion inicio (Espacio para la reunión, programacion de reuniones de Inicio, diseño pieza de invitación, diseño invitación entidades públicas y divulgacion de piezas)	3 días	mar 24/11/20	vie 27/11/20	$ 235,076	867	870,879FC-20 días
870	Aprobación para desarrollo de reunion Prioridad 30	0 días	vie 27/11/20	vie 27/11/20	$ 0	869	871
871	Diseño y envio de volante socialización PMT (una vez se apruebe) Prioridad 30	2 días	vie 27/11/20	sáb 28/11/20	$ 39,179	870	872,873
872	Reunion de Inicio de Obra Prioridad 30	1 día	lun 30/11/20	lun 30/11/20	$ 39,179	871	876,881,884
873	Registro de inspección preliminar de vías Prioridad 30	7 días	lun 30/11/20	lun 7/12/20	$ 39,179	871	874FC-7 días
874	Convocatoria y Levantamiento actas de vecindad SI APLICA Prioridad	7 días	lun 30/11/20	lun 7/12/20	$ 39,179	873FC-7 días	
875	**Actividades SST y Ambientales Prioridad 30**	**5 días**	**lun 30/11/20**	**sáb 5/12/20**	**$ 1,713,942**		
876	Inventario de sumideros Prioridad 30	2 días	lun 30/11/20	mié 2/12/20	$ 171,394	872	877FC-2 días

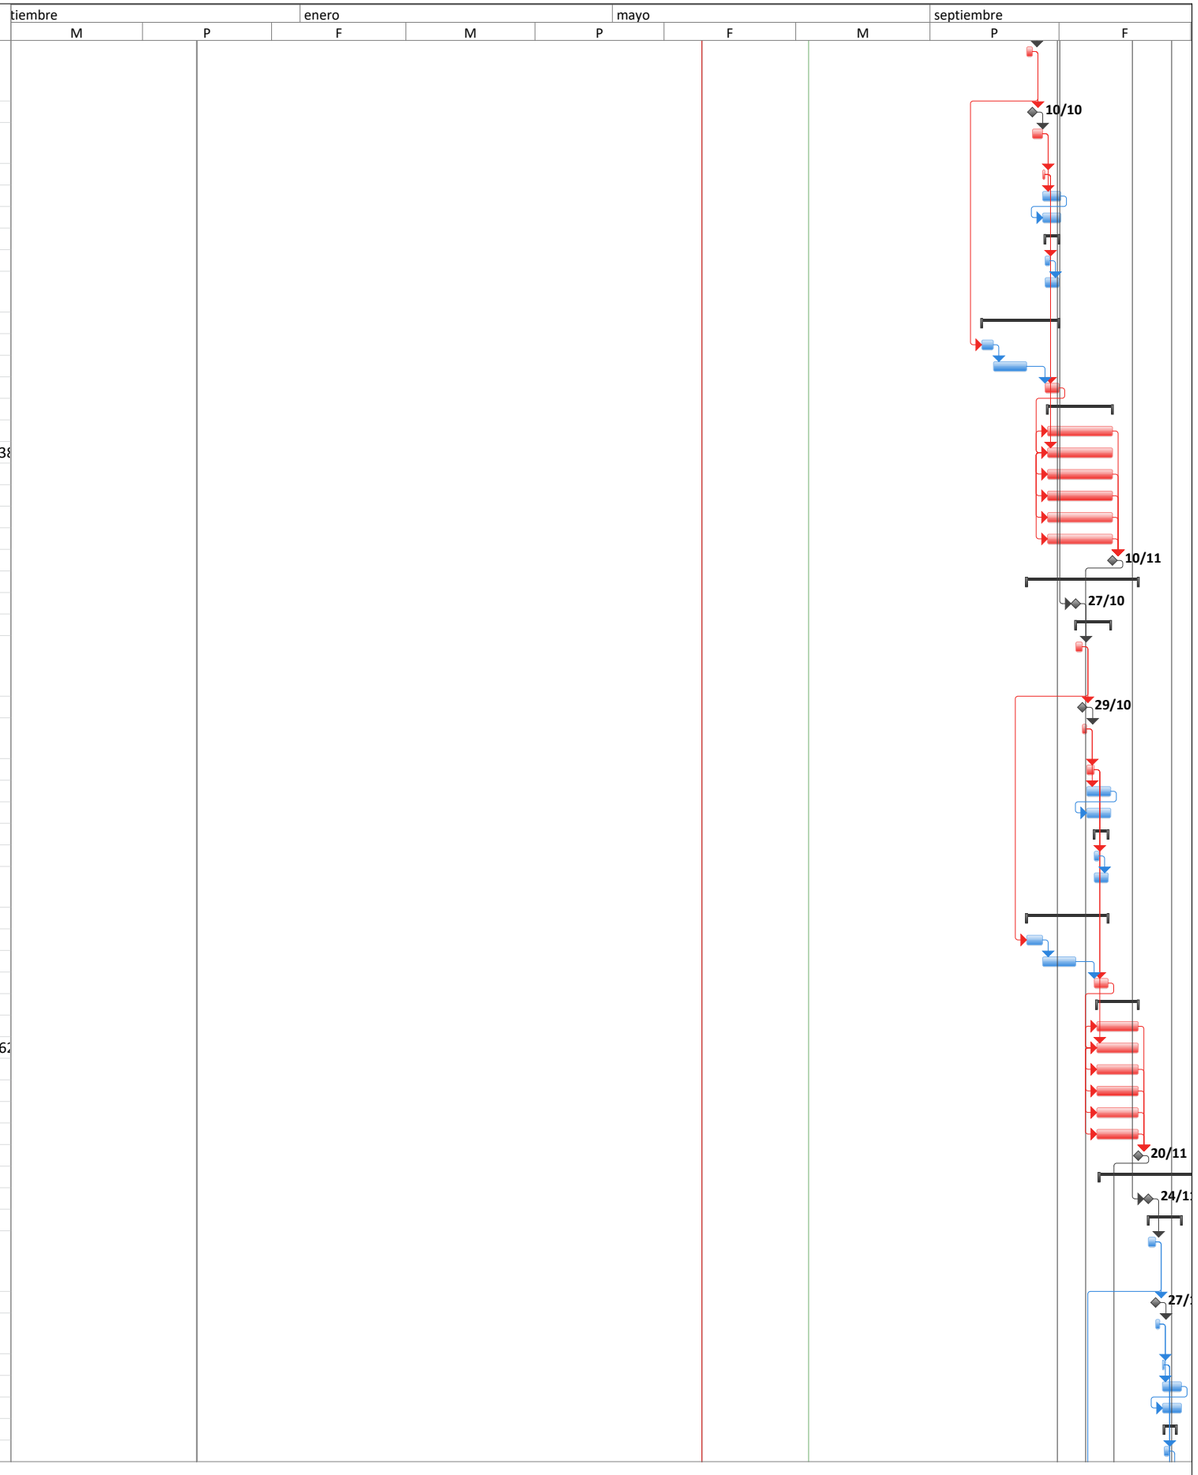

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	Sucesoras
877	Implementacion Ambiental, Protecciones Sumideros, Arboles, Elementos de protección y otros Prioridad 30	5 días	lun 30/11/20	sáb 5/12/20	$ 1,542,548	876FC-2 días	
878	**Actividades PMT Prioridad 30**	**28 días**	**jue 5/11/20**	**sáb 5/12/20**	**$ 10,587,139**		
879	Elaboración y entrega PMT Prioridad 30	5 días	jue 5/11/20	mar 10/11/20	$ 1,058,714	869FC-20 días	880
880	Aprobacion PMT Prioridad 30	12 días	mar 10/11/20	mar 24/11/20	$ 0	879	881
881	Implementacion PMT Prioridad 30	5 días	lun 30/11/20	sáb 5/12/20	$ 9,528,425	872,880	884FC-4 días
882	**Actidades de Obra Prioridad 30**	**25 días**	**mar 1/12/20**	**mar 29/12/20**	**$ 30,247,559**		
883	Actualización de PKIDs Prioridad 30	25 días	mar 1/12/20	mar 29/12/20	$ 0	884CC	889
884	Parcheo Prioridad 30	25 días	mar 1/12/20	mar 29/12/20	$ 17,543,584	872,881FC-4 días	885CC,883CC,886
885	Bacheo Prioridad 30	25 días	mar 1/12/20	mar 29/12/20	$ 11,191,597	884CC	889
886	Carpeta Prioridad 30	25 días	mar 1/12/20	mar 29/12/20	$ 0	884CC	889
887	Losas Prioridad 30	25 días	mar 1/12/20	mar 29/12/20	$ 0	884CC	889
888	Complementarias Prioridad 30	25 días	mar 1/12/20	mar 29/12/20	$ 1,512,378	884CC	889
889	Fin Actividades de Obra Prioridad 30	0 días	mar 29/12/20	mar 29/12/20	$ 0	883,888,887,886	
890	**Prioridad 31 - AV. BATALLON CALDAS**	**39 días**	**mié 7/10/20**	**jue 19/11/20**	**$ 605,653,619**		
891	Inicio Actividades de Obra Prioridad 31	0 días	lun 26/10/20	lun 26/10/20	$ 0	697FC-4 días	893
892	**Actividades Sociales Prioridad 31**	**12 días**	**lun 26/10/20**	**lun 9/11/20**	**$ 391,792**		
893	Preliminares para desarrollo reunion inicio (Espacio para la reunión, programacion de reuniones de Inicio, diseño pieza de invitación, diseño invitación entidades públicas y divulgacion de piezas)	3 días	lun 26/10/20	jue 29/10/20	$ 235,076	891	894,903FC-20 días
894	Aprobación para desarrollo de reunion Prioridad 31	0 días	jue 29/10/20	jue 29/10/20	$ 0	893	895
895	Diseño y envio de volante socialización PMT (una vez se apruebe) Prioridad 31	2 días	jue 29/10/20	vie 30/10/20	$ 39,179	894	896,897
896	Reunion de Inicio de Obra Prioridad 31	1 día	vie 30/10/20	sáb 31/10/20	$ 39,179	895	900,905,908
897	Registro de inspección preliminar de vías Prioridad 31	7 días	vie 30/10/20	lun 9/11/20	$ 39,179	895	898FC-7 días
898	Convocatoria y Levantamiento actas de vecindad SI APLICA Prioridad	7 días	vie 30/10/20	lun 9/11/20	$ 39,179	897FC-7 días	
899	**Actividades SST y Ambientales Prioridad 31**	**5 días**	**sáb 31/10/20**	**sáb 7/11/20**	**$ 1,713,942**		
900	Inventario de sumideros Prioridad 31	2 días	sáb 31/10/20	mié 4/11/20	$ 171,394	896	901FC-2 días
901	Implementacion Ambiental, Protecciones Sumideros, Arboles, Elementos de protección y otros Prioridad 31	5 días	sáb 31/10/20	sáb 7/11/20	$ 1,542,548	900FC-2 días	
902	**Actividades PMT Prioridad 31**	**28 días**	**mié 7/10/20**	**sáb 7/11/20**	**$ 10,587,139**		
903	Elaboración y entrega PMT Prioridad 31	5 días	mié 7/10/20	mar 13/10/20	$ 1,058,714	893FC-20 días	904
904	Aprobacion PMT Prioridad 31	12 días	mar 13/10/20	lun 26/10/20	$ 0	903	905
905	Implementacion PMT Prioridad 31	5 días	sáb 31/10/20	sáb 7/11/20	$ 9,528,425	896,904	908FC-4 días
906	**Actidades de Obra Prioridad 31**	**15 días**	**mar 3/11/20**	**jue 19/11/20**	**$ 592,960,746**		
907	Actualización de PKIDs Prioridad 31	15 días	mar 3/11/20	jue 19/11/20	$ 0	908CC	913
908	Parcheo Prioridad 31	15 días	mar 3/11/20	jue 19/11/20	$ 343,917,233	896,905FC-4 días	907CC,909CC,910
909	Bacheo Prioridad 31	15 días	mar 3/11/20	jue 19/11/20	$ 219,395,476	908CC	913
910	Carpeta Prioridad 31	15 días	mar 3/11/20	jue 19/11/20	$ 0	908CC	913
911	Losas Prioridad 31	15 días	mar 3/11/20	jue 19/11/20	$ 0	908CC	913
912	Complementarias Prioridad 31	15 días	mar 3/11/20	jue 19/11/20	$ 29,648,037	908CC	913
913	Fin Actividades de Obra Prioridad 31	0 días	jue 19/11/20	jue 19/11/20	$ 0	907,909,910,911	963FC-4 días
914	**Prioridad 32 - Avenida General Santander**	**44 días**	**lun 19/10/20**	**sáb 5/12/20**	**$ 376,767,211**		
915	Inicio Actividades de Obra Prioridad 32	0 días	vie 6/11/20	vie 6/11/20	$ 0	841FC-4 días	917
916	**Actividades Sociales Prioridad 32**	**12 días**	**vie 6/11/20**	**jue 19/11/20**	**$ 391,792**		
917	Preliminares para desarrollo reunion inicio (Espacio para la reunión, programacion de reuniones de Inicio, diseño pieza de invitación, diseño invitación entidades públicas y divulgacion de piezas)	3 días	vie 6/11/20	lun 9/11/20	$ 235,076	915	918,927FC-20 días
918	Aprobación para desarrollo de reunion Prioridad 32	0 días	lun 9/11/20	lun 9/11/20	$ 0	917	919
919	Diseño y envio de volante socialización PMT (una vez se apruebe) Prioridad 32	2 días	mar 10/11/20	mié 11/11/20	$ 39,179	918	920,921
920	Reunion de Inicio de Obra Prioridad 32	1 día	mié 11/11/20	jue 12/11/20	$ 39,179	919	924,929,932
921	Registro de inspección preliminar de vías Prioridad 32	7 días	mié 11/11/20	jue 19/11/20	$ 39,179	919	922FC-7 días
922	Convocatoria y Levantamiento actas de vecindad SI APLICA Prioridad	7 días	mié 11/11/20	jue 19/11/20	$ 39,179	921FC-7 días	
923	**Actividades SST y Ambientales Prioridad 32**	**5 días**	**jue 12/11/20**	**jue 19/11/20**	**$ 1,713,942**		
924	Inventario de sumideros Prioridad 32	2 días	jue 12/11/20	sáb 14/11/20	$ 171,394	920	925FC-2 días
925	Implementacion Ambiental, Protecciones Sumideros, Arboles, Elementos de protección y otros Prioridad 32	5 días	jue 12/11/20	jue 19/11/20	$ 1,542,548	924FC-2 días	
926	**Actividades PMT Prioridad 32**	**28 días**	**lun 19/10/20**	**jue 19/11/20**	**$ 10,587,139**		
927	Elaboración y entrega PMT Prioridad 32	5 días	lun 19/10/20	vie 23/10/20	$ 1,058,714	917FC-20 días	928
928	Aprobacion PMT Prioridad 32	12 días	vie 23/10/20	vie 6/11/20	$ 0	927	929
929	Implementacion PMT Prioridad 32	5 días	jue 12/11/20	jue 19/11/20	$ 9,528,425	920,928	932FC-4 días
930	**Actidades de Obra Prioridad 32**	**20 días**	**vie 13/11/20**	**sáb 5/12/20**	**$ 364,074,338**		
931	Actualización de PKIDs Prioridad 32	20 días	vie 13/11/20	sáb 5/12/20	$ 0	932CC	937
932	Parcheo Prioridad 32	20 días	vie 13/11/20	sáb 5/12/20	$ 211,163,116	920,929FC-4 días	931CC,933CC,934
933	Bacheo Prioridad 32	20 días	vie 13/11/20	sáb 5/12/20	$ 134,707,505	932CC	937
934	Carpeta Prioridad 32	20 días	vie 13/11/20	sáb 5/12/20	$ 0	932CC	937
935	Losas Prioridad 32	20 días	vie 13/11/20	sáb 5/12/20	$ 0	932CC	937

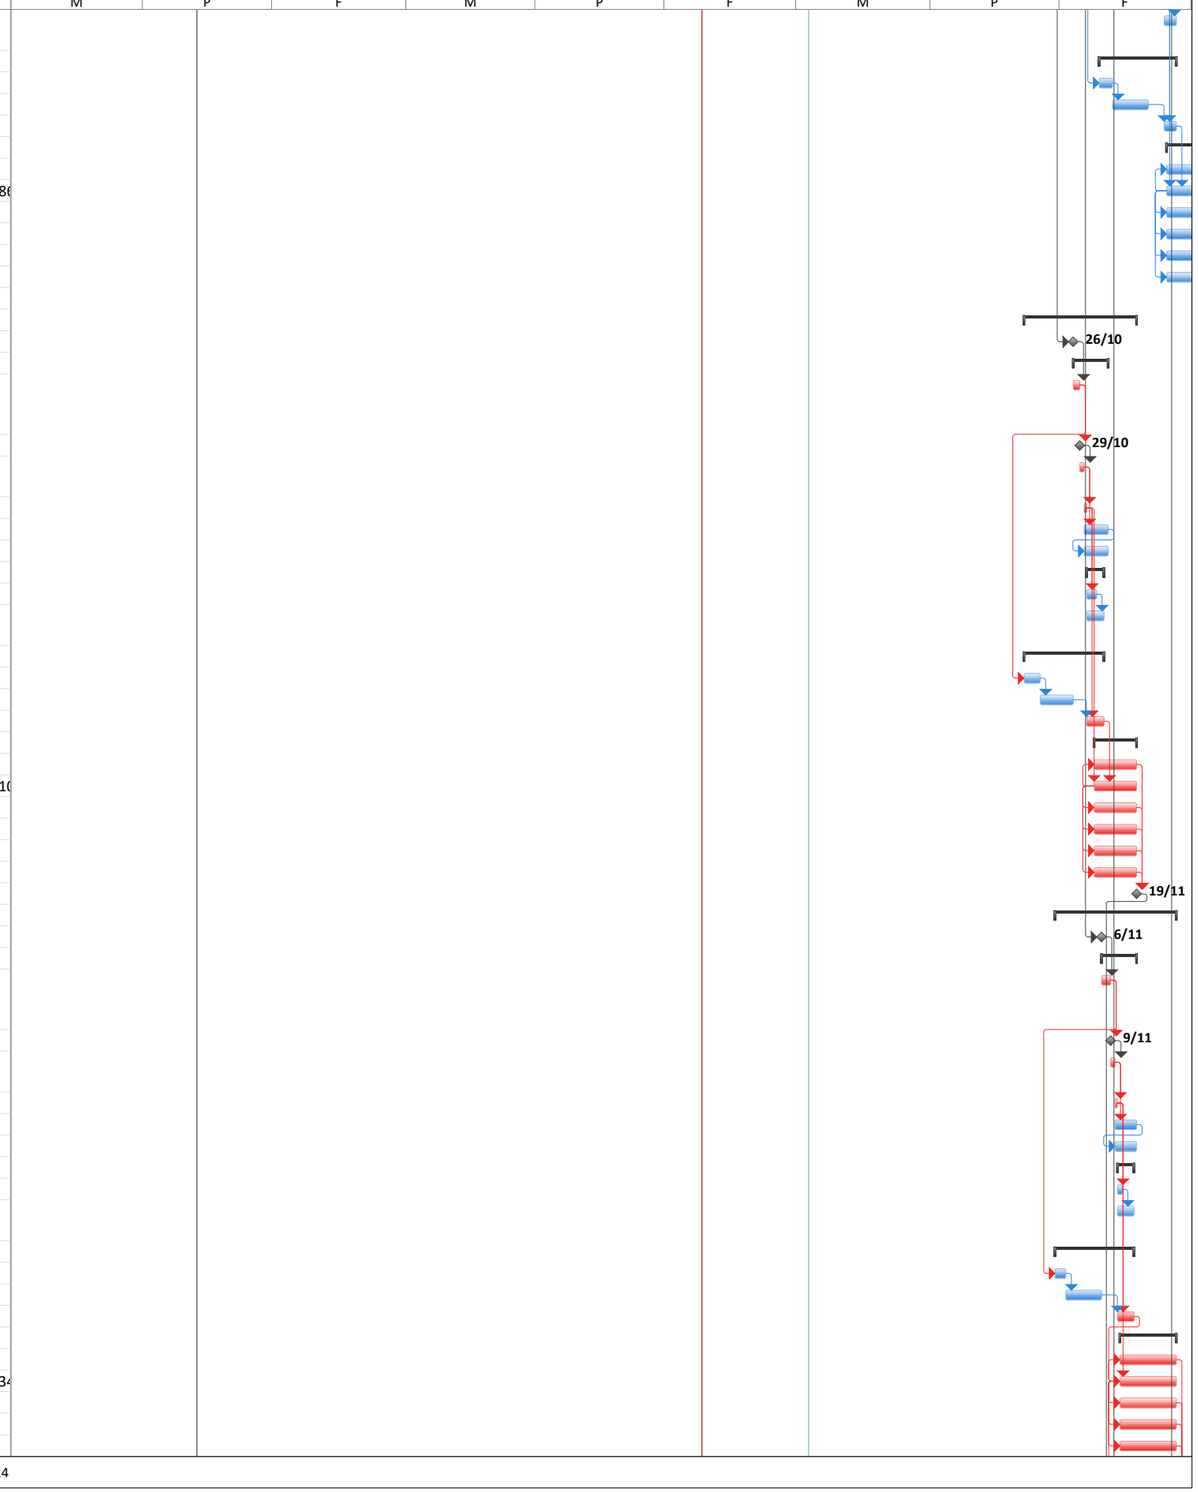

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	Sucesoras
936	Complementarias Prioridad 32	20 días	vie 13/11/20	sáb 5/12/20	$ 18,203,717	932CC	937
937	Fin Actividades de Obra Prioridad 32	0 días	sáb 5/12/20	sáb 5/12/20	$ 0	931,933,934,935	988
938	**Prioridad 33 - Avenida Transversal de Suba**	**35 días**	**mié 28/10/20**	**sáb 5/12/20**	**$ 33,692,150**		
939	Inicio Actividades de Obra Prioridad 33	0 días	mar 17/11/20	mar 17/11/20	$ 0	865FC-4 días	941
940	**Actividades Sociales Prioridad 33**	**12 días**	**mar 17/11/20**	**sáb 28/11/20**	**$ 391,792**		
941	Preliminares para desarrollo reunion inicio (Espacio para la reunión, programacion de reuniones de Inicio, diseño pieza de invitación, diseño invitación entidades públicas y divulgacion de piezas)	3 días	mar 17/11/20	jue 19/11/20	$ 235,076	939	942,951FC-20 días
942	Aprobación para desarrollo de reunion Prioridad 33	0 días	jue 19/11/20	jue 19/11/20	$ 0	941	943
943	Diseño y envio de volante socialización PMT (una vez se apruebe) Prioridad 33	2 días	vie 20/11/20	sáb 21/11/20	$ 39,179	942	944,945
944	Reunion de Inicio de Obra Prioridad 33	1 día	sáb 21/11/20	lun 23/11/20	$ 39,179	943	948,953,956
945	Registro de inspección preliminar de vías Prioridad 33	7 días	sáb 21/11/20	sáb 28/11/20	$ 39,179	943	946FC-7 días
946	Convocatoria y Levantamiento actas de vecindad SI APLICA Prioridad	7 días	sáb 21/11/20	sáb 28/11/20	$ 39,179	945FC-7 días	
947	**Actividades SST y Ambientales Prioridad 33**	**5 días**	**lun 23/11/20**	**sáb 28/11/20**	**$ 1,713,942**		
948	Inventario de sumideros Prioridad 33	2 días	lun 23/11/20	mié 25/11/20	$ 171,394	944	949FC-2 días
949	Implementacion Ambiental, Protecciones Sumideros, Arboles, Elementos de protección y otros Prioridad 33	5 días	lun 23/11/20	sáb 28/11/20	$ 1,542,548	948FC-2 días	
950	**Actividades PMT Prioridad 33**	**28 días**	**mié 28/10/20**	**sáb 28/11/20**	**$ 10,587,139**		
951	Elaboración y entrega PMT Prioridad 33	5 días	mié 28/10/20	mar 3/11/20	$ 1,058,714	941FC-20 días	952
952	Aprobacion PMT Prioridad 33	12 días	mar 3/11/20	mar 17/11/20	$ 0	951	953
953	Implementacion PMT Prioridad 33	5 días	lun 23/11/20	sáb 28/11/20	$ 9,528,425	944,952	956FC-4 días
954	**Actidades de Obra Prioridad 33**	**11 días**	**mar 24/11/20**	**sáb 5/12/20**	**$ 20,999,277**		
955	Actualización de PKIDs Prioridad 33	11 días	mar 24/11/20	sáb 5/12/20	$ 0	956CC	961
956	Parcheo Prioridad 33	11 días	mar 24/11/20	sáb 5/12/20	$ 12,179,581	944,953FC-4 días	955CC,957CC,958
957	Bacheo Prioridad 33	11 días	mar 24/11/20	sáb 5/12/20	$ 7,769,732	956CC	961
958	Carpeta Prioridad 33	11 días	mar 24/11/20	sáb 5/12/20	$ 0	956CC	961
959	Losas Prioridad 33	11 días	mar 24/11/20	sáb 5/12/20	$ 0	956CC	961
960	Complementarias Prioridad 33	11 días	mar 24/11/20	sáb 5/12/20	$ 1,049,964	956CC	961
961	Fin Actividades de Obra Prioridad 33	0 días	sáb 5/12/20	sáb 5/12/20	$ 0	955,957,958,959	988
962	**Prioridad 34 - Avenida la Esperanza**	**36 días**	**mar 27/10/20**	**sáb 5/12/20**	**$ 779,131,209**		
963	Inicio Actividades de Obra Prioridad 34	0 días	sáb 14/11/20	sáb 14/11/20	$ 0	913FC-4 días	965
964	**Actividades Sociales Prioridad 34**	**12 días**	**sáb 14/11/20**	**sáb 28/11/20**	**$ 391,792**		
965	Preliminares para desarrollo reunion inicio (Espacio para la reunión, programacion de reuniones de Inicio, diseño pieza de invitación, diseño invitación entidades públicas y divulgacion de piezas)	3 días	sáb 14/11/20	jue 19/11/20	$ 235,076	963	966,975FC-20 días
966	Aprobación para desarrollo de reunion Prioridad 34	0 días	jue 19/11/20	jue 19/11/20	$ 0	965	967
967	Diseño y envio de volante socialización PMT (una vez se apruebe) Prioridad 34	2 días	jue 19/11/20	vie 20/11/20	$ 39,179	966	968,969
968	Reunion de Inicio de Obra Prioridad 34	1 día	vie 20/11/20	sáb 21/11/20	$ 39,179	967	972,977,980
969	Registro de inspección preliminar de vías Prioridad 34	7 días	vie 20/11/20	sáb 28/11/20	$ 39,179	967	970FC-7 días
970	Convocatoria y Levantamiento actas de vecindad SI APLICA Prioridad	7 días	vie 20/11/20	sáb 28/11/20	$ 39,179	969FC-7 días	
971	**Actividades SST y Ambientales Prioridad 34**	**5 días**	**sáb 21/11/20**	**vie 27/11/20**	**$ 1,713,942**		
972	Inventario de sumideros Prioridad 34	2 días	sáb 21/11/20	mar 24/11/20	$ 171,394	968	973FC-2 días
973	Implementacion Ambiental, Protecciones Sumideros, Arboles, Elementos de protección y otros Prioridad 34	5 días	sáb 21/11/20	vie 27/11/20	$ 1,542,548	972FC-2 días	
974	**Actividades PMT Prioridad 34**	**28 días**	**mar 27/10/20**	**vie 27/11/20**	**$ 10,587,139**		
975	Elaboración y entrega PMT Prioridad 34	5 días	mar 27/10/20	sáb 31/10/20	$ 1,058,714	965FC-20 días	976
976	Aprobacion PMT Prioridad 34	12 días	sáb 31/10/20	sáb 14/11/20	$ 0	975	977
977	Implementacion PMT Prioridad 34	5 días	sáb 21/11/20	vie 27/11/20	$ 9,528,425	968,976	980FC-4 días
978	**Actidades de Obra Prioridad 34**	**12 días**	**lun 23/11/20**	**sáb 5/12/20**	**$ 766,438,336**		
979	Actualización de PKIDs Prioridad 34	12 días	lun 23/11/20	sáb 5/12/20	$ 0	980CC	985
980	Parcheo Prioridad 34	12 días	lun 23/11/20	sáb 5/12/20	$ 444,534,235	968,977FC-4 días	979CC,981CC,982
981	Bacheo Prioridad 34	12 días	lun 23/11/20	sáb 5/12/20	$ 283,582,184	980CC	985
982	Carpeta Prioridad 34	12 días	lun 23/11/20	sáb 5/12/20	$ 0	980CC	985
983	Losas Prioridad 34	12 días	lun 23/11/20	sáb 5/12/20	$ 0	980CC	985
984	Complementarias Prioridad 34	12 días	lun 23/11/20	sáb 5/12/20	$ 38,321,917	980CC	985
985	Fin Actividades de Obra Prioridad 34	0 días	sáb 5/12/20	sáb 5/12/20	$ 0	979,981,982,983	988
986	Atención de Emergencias	110 días	jue 4/06/20	sáb 3/10/20	$ 1,274,199,775	142FC+24 días,2	990,987CC+30 dí
987	Señalizacion Horizontal	80 días	jue 9/07/20	sáb 3/10/20	$ 10,000,000	986CC+30 días	988
988	Fin Actividades de Construcción	0 días	sáb 5/12/20	sáb 5/12/20	$ 0	133,139,673,987	989
989	FASE DE RECIBO DE OBRA	27 días	sáb 5/12/20	mié 6/01/21	$ 0	988	990
990	Fin del Contrato	0 días	mié 6/01/21	mié 6/01/21	$ 0	989,986,150	

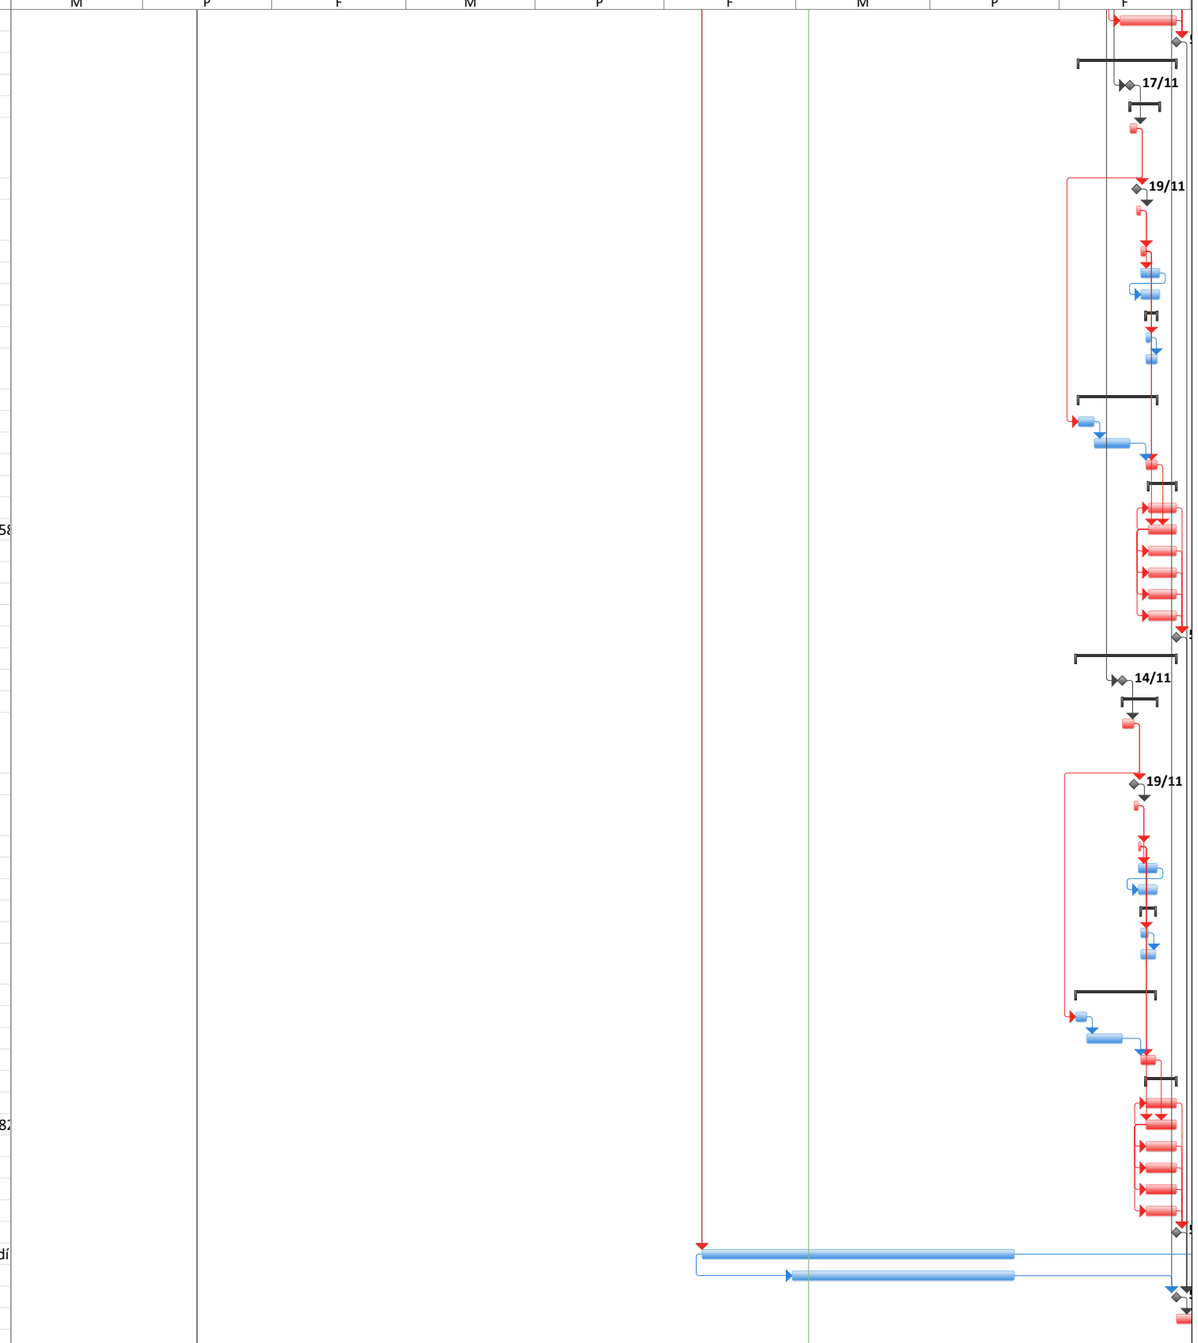

FORMATO		
HOJA TESTIGO Y/O REFERENCIA CRUZADA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-DO-25	Gestión Documental	2

NÚMERO RADICADO / DOCUMENTO:	20205260545262
FECHA RADICADO / DOCUMENTO:	7/17/2020
DEPENDENCIA:	
SERIE O SUBSERIE:	
TIPO DOCUMENTAL:	

DESCRIPCIÓN: El contenido relacionado a este folio presenta la siguiente situación:

1	No se encuentra el anexo físico consultar en ORFEO.	
2	Se encuentra en calidad de préstamo (TEMPORAL ____ - INDEFINIDO ____).	
3	El documento original es ilegible y no es posible mejorar la calidad de la imagen.	
4	El contenido relacionado a estos folios corresponde a una factura, la cual debe ser consultada en la orden de pago o solicitarse a la Subdirección Técnica de Tesorería y Recaudo y/o consultarlos en ORFEO.	
5	El contenido relacionado a este folio, corresponde a , que por su formato y/o dimensiones, requiere ser consultado en su medio físico.	
6	El contenido relacionado a este folio corresponde a y se remite al destinatario.	
7	Otros (observaciones)	**X**

CONSULTAR EN: **CAD-IDU** **CAJA No.**

OBSERVACIONES (describir características adicionales)

EL CONTENIDO DE ESTE FOLIO CORRESPONDE A LOS ANEXOS ADJUNTOS MEDIANTE LINK GOOGLE DRIVE
https://drive.google.com/drive/folders/1rmZIemm6bZ9yrBr0qOrcs4cxx4gzgF4b?usp=sharing
