CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN
INFORME PARCIAL DE ACTIVIDADES


CONTRATO No.	CPS-036-2025	**PERIODO**	08 DE MARZO DE 2025 AL 31 DE MARZO DE 2025	
CONTRATISTA	JULIAN ANDRES ESPAÑA COY		**CEDULA.**	1.081.699.223
OBJETO CONTRATO	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EN LA SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA			
SUPERVISOR	CRISTIAN LEANDRO HOYOS IMBACHI	**DEPENDENCIA**	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	

RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Tipo de aporte	Planilla No.	Mes de aporte	Fecha de pago	Valor pagado
Pensión	**32655853**	**Marzo**	**25-03-2025**	**235.200**
Salud	**32655853**	**Marzo**	**25-03-2025**	**183.800**
Riesgo	**32655853**	**Marzo**	**25-03-2025**	**7.700**

No	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	GESTION DESARROLLADA
1.	Prestar los servicios profesionales en el apoyo a la supervisión de los contratos y convenios con alcance de Proyectos de Infraestructura a cargo de la SPDE.	- Proyección Acta de Liquidación del Convenio Solidario No 001 de 2024 "Aunar esfuerzos con la Junta de Acción Comunal de la Vereda Los Pinos para la construcción de cerramiento y unidad sanitaria en la Vereda los Pinos del Municipio de Palestina- Huila".

OBSERVACIONES Y ANEXO

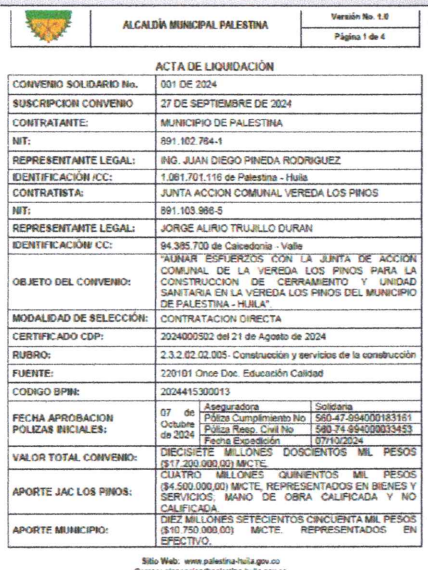


ALCALDÍA MUNICIPAL PALESTINA | Versión No. 1.0 | Página 1 de 4

ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONVENIO SOLIDARIO No.	001 DE 2024
SUSCRIPCION CONVENIO	27 DE SEPTIEMBRE DE 2024
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PALESTINA
NIT:	891.102.764-1
REPRESENTANTE LEGAL:	ING. JUAN DIEGO PINEDA RODRIGUEZ
IDENTIFICACIÓN /CC:	1.081.701.116 de Palestina - Huila
CONTRATISTA:	JUNTA ACCION COMUNAL VEREDA LOS PINOS
NIT:	891.103.986-5
REPRESENTANTE LEGAL:	JORGE ALIRIO TRUJILLO DURAN
IDENTIFICACIÓN/ CC:	94.385.709 de Caicedonia - Valle
OBJETO DEL CONVENIO:	"AUNAR ESFUERZOS CON LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS PINOS PARA LA CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO Y UNIDAD SANITARIA EN LA VEREDA LOS PINOS DEL MUNICIPIO DE PALESTINA - HUILA".
MODALIDAD DE SELECCIÓN:	CONTRATACION DIRECTA
CERTIFICADO CDP:	2024000502 del 21 de Agosto de 2024
RUBRO:	2.3.2.02.02.005- Construcción y servicios de la construcción
FUENTE:	220101 Once Doc. Educación Calidad
CODIGO BPIN:	2024415300013
FECHA APROBACION POLIZAS INICIALES:	07 de Octubre de 2024 — Aseguradora: Solidaria; Póliza Cumplimiento No: 560-47-994000183161; Póliza Resp. Civil No: 560-74-994000033453; Fecha Expedición: 07/10/2024
VALOR TOTAL CONVENIO:	DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($17.200.000,00) MICTE.
APORTE JAC LOS PINOS:	CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000,00) MICTE, REPRESENTADOS EN BIENES Y SERVICIOS; MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA
APORTE MUNICIPIO:	DIEZ MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($10.750.000,00) MICTE. REPRESENTADOS EN EFECTIVO.

Sitio Web: www.palestina-huila.gov.co

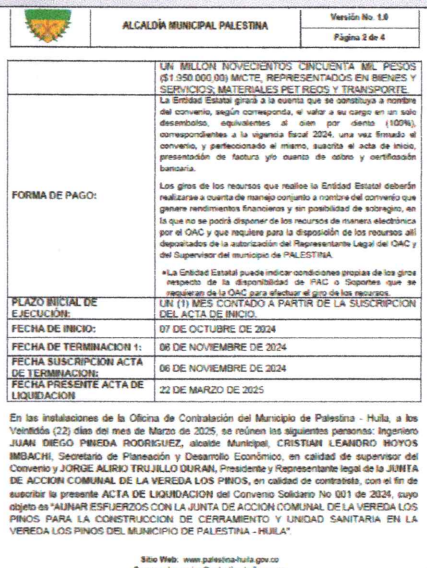

ALCALDÍA MUNICIPAL PALESTINA | Versión No. 1.0 | Página 2 de 4

	UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($1.950.000,00) MICTE, REPRESENTADOS EN BIENES Y SERVICIOS; MATERIALES PET REOS Y TRANSPORTE.
FORMA DE PAGO:	La Entidad Estatal girará a la cuenta que se constituya a nombre del convenio, según corresponda, el valor a su cargo en un solo desembolso, equivalentes al cien por ciento (100%), correspondientes a la vigencia fiscal 2024, una vez firmado el convenio, y perfeccionado el mismo, suscrita el acta de inicio, presentación de factura y/o cuenta de cobro y certificación bancaria. Los giros de los recursos que realice la Entidad Estatal deberán realizarse a cuenta de manejo conjunto a nombre del convenio que genere rendimientos financieros y sin posibilidad de sobregiro, en la que no se podrá disponer de los recursos de manera electrónica por el OAC y que requiere para la disposición de los recursos allí depositados de la autorización del Representante Legal del OAC y del Supervisor del municipio de PALESTINA. *La Entidad Estatal puede indicar condiciones propias de los giros respecto de la disponibilidad de PAC o Soportes que se requieran de la OAC para efectuar el giro de los recursos.
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	UN (1) MES CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DE INICIO:	07 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION 1:	06 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA SUSCRIPCIÓN ACTA DE TERMINACION:	06 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACION	22 DE MARZO DE 2025

En las instalaciones de la Oficina de Contratación del Municipio de Palestina - Huila, a los Veintidós (22) días del mes de Marzo de 2025, se reúnen las siguientes personas: Ingeniero **JUAN DIEGO PINEDA RODRIGUEZ,** alcalde Municipal, **CRISTIAN LEANDRO HOYOS IMBACHI,** Secretario de Planeación y Desarrollo Económico, en calidad de supervisor del Convenio y **JORGE ALIRIO TRUJILLO DURAN,** Presidente y Representante legal de la **JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS PINOS,** en calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACION** del Convenio Solidario No 001 de 2024, cuyo objeto es **"AUNAR ESFUERZOS CON LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS PINOS PARA LA CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO Y UNIDAD SANITARIA EN LA VEREDA LOS PINOS DEL MUNICIPIO DE PALESTINA - HUILA".**

Sitio Web: www.palestina-huila.gov.co
Correo: planeacion@palestina-huila.gov.co

Proyeccion Acta de Liquidacion Convenio Solidario No 001 de 2024


ACTIVIDADES ESPECIFICAS		GESTION DESARROLLADA
2.	Asistir a las reuniones técnicas a las cuales sea convocado y en las que se discutan asuntos relacionados con la ejecución	- Acompañamiento en Mesa Técnica Virtual sobre Disposiciones Generales Sistema General de Regalías SGR.

CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN
INFORME PARCIAL DE ACTIVIDADES

CONTRATO No.	CPS-036-2025	**PERIODO**	08 DE MARZO DE 2025 AL 31 DE MARZO DE 2025	
CONTRATISTA	JULIAN ANDRES ESPAÑA COY		**CEDULA.**	1.081.699.223
OBJETO CONTRATO	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EN LA SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA			
SUPERVISOR	CRISTIAN LEANDRO HOYOS IMBACHI	**DEPENDENCIA**	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	

	de proyectos de infraestructura a cargo de la SPDE.	

OBSERVACIONES Y ANEXO

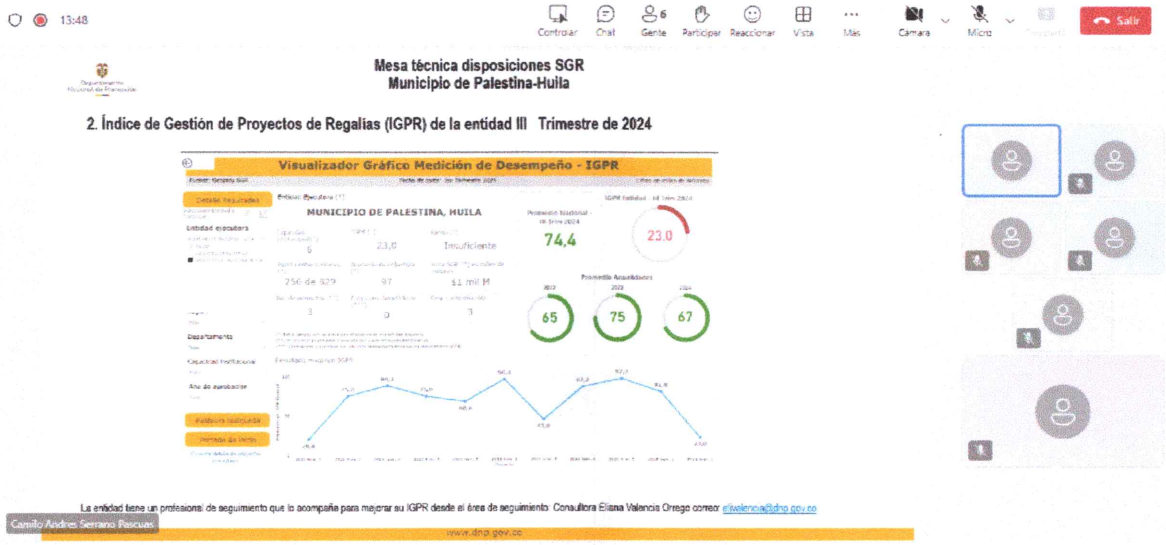

Mesa Tecnica Virtual Disposiciones Generales SGR

ACTIVIDADES ESPECIFICAS		GESTION DESARROLLADA
3.	Realizar visitas técnicas a proyectos de infraestructura a cargo de la SPDE.	- Visita Técnica de Diagnóstico Preliminar tramos de vía en las Veredas Jerusalén y El Tabor para el Proyecto; "Mejoramiento de Vías mediante pavimentación en concreto rígido en zonas rurales del Municipio de Palestina, Departamento del Huila". - Visita Técnica de Acompañamiento a Inspección de Policía para revisión de actividades constructivas sin la respectiva licencia en el Barrio la Floresta. - Acompañamiento Técnico al Barrio la Floresta para el replanteo e inicio de actividades de la red de alcantarillado proyectado desde la Carrera 8 entre calles 5 y 6 hasta la zona baja aledaña al Cementerio Municipal.


CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN
INFORME PARCIAL DE ACTIVIDADES

CONTRATO No.	CPS-036-2025	**PERIODO**	08 DE MARZO DE 2025 AL 31 DE MARZO DE 2025	
CONTRATISTA	JULIAN ANDRES ESPAÑA COY		**CEDULA.**	1.081.699.223
OBJETO CONTRATO	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EN LA SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA			
SUPERVISOR	CRISTIAN LEANDRO HOYOS IMBACHI	**DEPENDENCIA**	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	

OBSERVACIONES Y ANEXO




Visita Técnica Tramos Viales en las Veredas El Tabor y Jerusalén

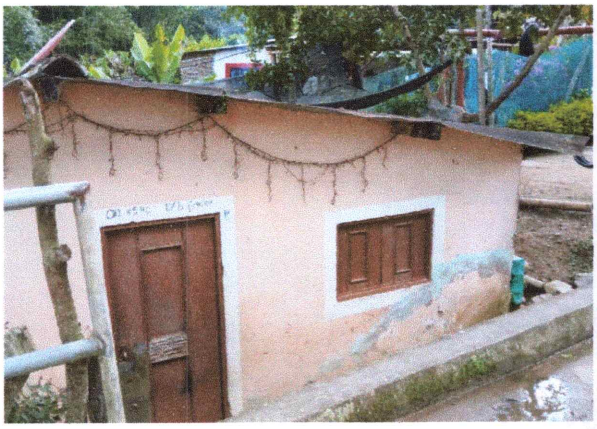


Acompañamiento a Inspección Policía para revisión de Actividades Constructivas en Vivienda




Replanteo e inicio de actividades de construcción Alcantarillado Barrio La Floresta

CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN
INFORME PARCIAL DE ACTIVIDADES

CONTRATO No.	CPS-036-2025	**PERIODO**	08 DE MARZO DE 2025 AL 31 DE MARZO DE 2025	
CONTRATISTA	JULIAN ANDRES ESPAÑA COY		**CEDULA.**	1.081.699.223
OBJETO CONTRATO	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EN LA SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA			
SUPERVISOR	CRISTIAN LEANDRO HOYOS IMBACHI	**DEPENDENCIA**	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	

ACTIVIDADES ESPECIFICAS		**GESTION DESARROLLADA**
4.	Rendir y elaborar informes que se le soliciten en el desarrollo del contrato, según el alcance de las obligaciones específicas, en los que se consignen los resultados de cada una de esas actividades	- Elaboración Informe Resumen Proyecto "Construccion Obras de Drenaje en vías terciarias del Municipio de Palestina, Departamento del Huila"

OBSERVACIONES Y ANEXO

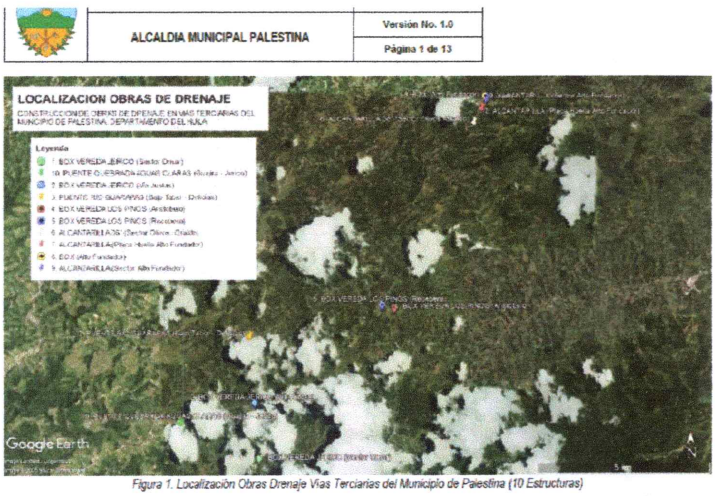


Figura 1. Localización Obras Drenaje Vias Terciarias del Municipio de Palestina (10 Estructuras)

Sitio Web: www.palestina-huila.gov.co
Correo: planeacion@palestina-huila.gov.co

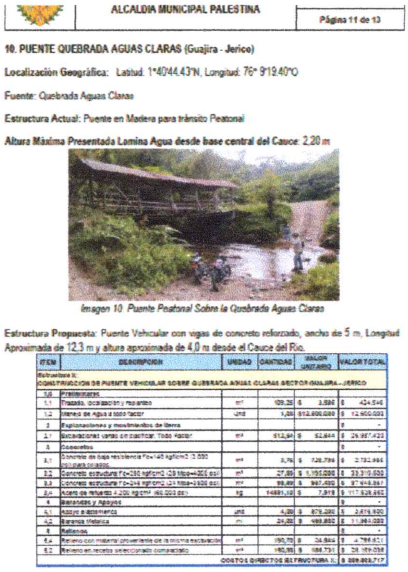


Imagen 10 Puente Peatonal Sobre la Quebrada Aguas Claras

Estructura Propuesta: Puente Vehicular con vigas de concreto reforzado, ancho de 5 m, Longitud Aproximada de 12,3 m y altura aproximada de 4,0 m desde el Cauce del Rio.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Estructura 1: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE QUEBRADA AGUAS CLARAS SECTOR GUAJIRA - JERICO					
1.0	Preliminares				$ -
1.1	Trazado, localización y replanteo	m²	109,20	$ 3.898	$ 424.546
1.2	Manejo de agua a bajo caudal	Und	1,00	$12.600.000	$ 12.600.000
2	Explanaciones y movimientos de tierra				$ -
2.1	Excavaciones varias en cauce/ar. Todo Hacer	m³	612,64	$ 53.844	$ 29.997.423
3	Concretos				$ -
3.1	Concreto de baja resistencia f'c=140 kg/cm2, 3.000 psi para cimientos	m³	8,76	$ 126.784	$ 2.793.994
3.2	Concreto estructura f'c=280 kg/cm2, 28 Mpa=4000 psi	m³	27,69	$ 1.195.000	$ 33.310.830
3.3	Concreto estructura f'c=210 kg/cm2, 21 Mpa=3000 psi	m³	99,49	$ 967.400	$ 97.419.341
3.4	Acero de refuerzo Fy=4200 kg/cm² (60.000 psi)	kg	14891,00	$ 7.818	$ 117.526.443
4	Barandas y Apoyos				$ -
4.1	Apoyo elastomerico	und	4,00	$ 879.200	$ 3.516.800
4.2	Baranda metalica	m	24,00	$ 489.852	$ 11.756.285
5	Rellenos				$ -
5.4	Relleno con material proveniente de la misma excavación	m³	190,75	$ 24.844	$ 4.739.431
5.5	Relleno en recebo seleccionado compactado	m³	160,88	$ 184.731	$ 29.719.734
				COSTOS DIRECTOS ESTRUCTURA 1:	$ 369.853.717

Elaboración Informe Resumen Proyecto Obras de Drenaje

ACTIVIDADES ESPECIFICAS		**GESTION DESARROLLADA**
5.	Responsable del concepto estructural en la revisión de licencias de construcción en sus diferentes tipos y modalidades según la normatividad municipal y nacional, así como Responsable de su expedición.	- Proyección Constancia de Firmeza licencia de Construcción en Modalidad de Obra Nueva con destinación Residencial – Multifamiliar a Nombre de Yamile Samboni Gaviria. - Proyección Constancia de Firmeza licencia de Construcción en Modalidad de Obra Nueva con destinación Residencial – Unifamiliar a Nombre de Víctor Manuel Gómez. - Notificación Valla Amarilla a solicitud de licencia de Construcción en Modalidad de Obra Nueva a Nombre de Álvaro Arley Mora Anacona.

CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN
INFORME PARCIAL DE ACTIVIDADES

CONTRATO No.	CPS-036-2025	**PERIODO**	08 DE MARZO DE 2025 AL 31 DE MARZO DE 2025
CONTRATISTA	JULIAN ANDRES ESPAÑA COY	**CEDULA.**	1.081.699.223
OBJETO CONTRATO	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EN LA SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA		
SUPERVISOR	CRISTIAN LEANDRO HOYOS IMBACHI	**DEPENDENCIA**	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO

OBSERVACIONES Y ANEXO

	ALCALDIA MUNICIPAL PALESTINA	Versión No. 1.0 Página 1 de 1

CONSTANCIA DE FIRMEZA Y EJECUTORÍA

En la fecha, el suscrito Secretario de Planeación y Desarrollo Económico, deja constancia que el acto Administrativo constituido por la **RESOLUCION No 027 DEL 21 DE FEBRERO DE 2025, "POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN LA MODALIDAD DE OBRA NUEVA, CON DESTINACION RESIDENCIAL - MULTIFAMILIAR, CON UN AREA TOTAL A CONSTRUIR DE 152,08 M2, EN EL LOTE UBICADO EN LA CARRERA 9 No 3 SUR - 16, URBANIZACION CARLOS ELIECER MOTTA, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PALESTINA, IDENTIFICADO CON MATRÍCULA INMOBILIARIA No. 206-106480 A NOMBRE DE YAMILE SAMBONI GAVIRIA"**, Quedo en Firme y ejecutoriado el día 11 de Marzo de 2025, conforme a lo establecido en la Ley.

Dado en Palestina (Huila), a los Once (11) días del mes de Marzo de 2025

CRISTIAN LEANDRO HOYOS IMBACHI
Secretario de Planeación y desarrollo Económico

Proyectó: Julian Andrés España Profesional de apoyo Secretario de planeación y Desarrollo Económico Firma:	Revisó: Cristian Leandro Hoyos Imbachi Secretario de Planeación y D. E. Firma:	Aprobó: Cristian Leandro Hoyos Imbachi Secretario de Planeación y D. E. Firma:

	ALCALDIA MUNICIPAL PALESTINA	Versión No. 1.0 Página 1 de 1

CONSTANCIA DE FIRMEZA Y EJECUTORÍA

En la fecha, el suscrito Secretario de Planeación y Desarrollo Económico, deja constancia que el acto Administrativo constituido por la **RESOLUCION No 040 DEL 05 DE MARZO DE 2025, "POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN LA MODALIDAD DE OBRA NUEVA, CON DESTINACION RESIDENCIAL – UNIFAMILIAR, CON UN AREA TOTAL A CONSTRUIR DE 195,60 M2, EN EL PREDIO UBICADO EN LA CALLE 1 No 2-47, BARRIO JOSE ANTONIO GALAN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PALESTINA, A NOMBRE DE VICTOR MANUEL GOMEZ FAJARDO"**, Quedo en Firme y ejecutoriado el día 20 de Marzo de 2025, conforme a lo establecido en la Ley.

Dado en Palestina (Huila), a los Veinte (20) días del mes de Marzo de 2025

CRISTIAN LEANDRO HOYOS IMBACHI
Secretario de Planeación y desarrollo Económico

Proyectó: Julián Andrés España Profesional de apoyo Secretario de planeación y Desarrollo Económico Firma:	Revisó: Cristian Leandro Hoyos Imbachi Secretario de Planeación y D. E. Firma:	Aprobó: Cristian Leandro Hoyos Imbachi Secretario de Planeación y D. E. Firma:

Elaboracion Constancia Firmeza y Ejecutoria Licencias de Construccion.

	ALCALDIA MUNICIPAL PALESTINA	Versión No. 1.0 Página 1 de 2

Palestina Huila, 31 de Marzo de 2025

Señor:
ALVARO ARLEY MORA ANACONA
Ciudad

ASUNTO: NOTIFICACION VALLA AMARILLA.

Cordial y atento saludo;

La Secretaria de Planeación y Desarrollo Económico Municipal se sirve de notificarle la Valla Informativa con el fin de que realice la radicación de la impresión de dos (02) fotografías a color de la valla instalada en el predio objeto de la solicitud en nuestra Oficina, el usuario deberá allegar dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes contados a partir de la presente notificación, so pena de entenderse desistida tal como lo dispone el Art 2.2.6.1.2.2.4 y Art 2.2.6.1.2.3.4 del DECRETO 1077 DE 2015, En consecuencia se adjunta copia de la Valla Informativa

Cordialmente,

CRISTIAN LEANDRO HOYOS IMBACHI
Secretario de Planeación y desarrollo Económico

Proyectó: Julian Andres España Profesional de apoyo Secretaria de planeación y Desarrollo Económico Firma:	Revisó: Cristian Leandro Hoyos Imbachi Secretario de Planeación y D. E. Firma:	Aprobó: Cristian Leandro Hoyos Imbachi Secretario de Planeación y D. E. Firma:

EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
CRISTIAN LEANDRO HOYOS IMBACHI

INFORMA QUE:

SE SOLICITÓ LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN LA MODALIDAD DE OBRA NUEVA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

FECHA DE SOLICITUD:	**28 DE MARZO DE 2025**
TITULAR:	**ALVARO ARLEY MORA ANACONA**
DIRECCIÓN:	**PREDIO LOTE ARLEY, VEREDA SINAI PALESTINA – HUILA.**
USO:	**COMERCIAL**
ÁREA DE LOTE:	**15.000,00 M2**
PISOS:	**UNO (01)**
PROF. RESPONSABLE:	**ARQ. ALEXANDER TORRES CUBILLOS**

ESTA VALLA ADVIERTE A TERCEROS LA INICIACIÓN DEL TRAMITE ADMINISTRATIVO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 2.2.6.1.2.2.1 DEL DECRETO 1077 DE 2015.
NOTA: LA VALLA NO AUTORIZA LA EJECUCIÓN DE OBRAS, EL INICIO DE LAS MISMAS ACARREARA LAS SANCIONES DE LA LEY 388 / 97

Notificacion Valla Amarilla, Alvaro Arley Mora Anacona.

CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN
INFORME PARCIAL DE ACTIVIDADES

CONTRATO No.	CPS-036-2025	**PERIODO**	08 DE MARZO DE 2025 AL 31 DE MARZO DE 2025		
CONTRATISTA	JULIAN ANDRES ESPAÑA COY			**CEDULA.**	1.081.699.223
OBJETO CONTRATO	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EN LA SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA				
SUPERVISOR	CRISTIAN LEANDRO HOYOS IMBACHI	**DEPENDENCIA**	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO		

ACTIVIDADES ESPECIFICAS		**GESTION DESARROLLADA**
6.	Apoyo en la Estructuración y seguimiento de convocatorias públicas para la adjudicación de subsidios de mejoramiento de vivienda	- No se adelantaron actividades en el presente Periodo, se reprograman para el siguiente

OBSERVACIONES Y ANEXO

ACTIVIDADES ESPECIFICAS		**GESTION DESARROLLADA**
7.	Apoyo en la elaboración de Diseños y Presupuestos para la Estructuración de proyectos de infraestructura de baja escala	- Ajustes Presupuesto del Proyecto: "Construcción Obras de Drenaje en vías terciarias del Municipio de Palestina, Departamento del Huila".

OBSERVACIONES Y ANEXO

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE PALESTINA, DEPARTAMENTO DEL HUILA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN BOX COULVERT, ALCANTARILLAS DE 36" EN CONCRETO REFORZADO Y PUENTE VEHICULAR.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Capitulo I: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR (SOBRE RIO GUARAPAS SECTOR BAJO TABOR - DELICIAS (1) Y SOBRE QUEBRADA AGUAS CLARAS SECTOR GUAJIRA - JERICO (1)					
1	**Preliminares**				
1.1	Trazado, localización y replanteo	m²	294,65	$ 3.886	$ 1.145.010
1.2	Manejo de Agua a todo factor Rio	Und	1,00	$ 15.500.000	$ 15.500.000
1.3	Manejo de Agua a todo factor Quebrada	Und	1,00	$ 12.500.000	$ 12.500.000
2	**Explanaciones y movimientos de tierra**				
2.1	Excavaciones varias sin clasificar. Todo Factor.	m³	1328,70	$ 52.644	$ 69.948.214
3	**Concretos**				$ -
3,1	Concreto de baja resistencia f'c=140 kgf/cm2 (2.000 psi) para solados.	m³	7,95	$ 728.796	$ 5.793.928
3,2	Concreto estructural f'c=280 kgf/cm2 (28 Mpa=4000 psi)	m³	75,50	$ 1.195.000	$ 90.222.500
3,3	Concreto estructural f'c=246 kgf/cm2 (24 Mpa=3500 psi)	m³	264,04	$ 987.400	$ 260.715.071
3,4	Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi)	kg	38950,40	$ 7.918	$ 308.409.267
4	**Barandas y Apoyos**				
4,1	Apoyo elastomerico	und	8,00	$ 879.200	$ 7.033.600
4,2	Baranda Metalica	ml	60,00	$ 498.500	$ 29.910.000
5	**Rellenos**				$ -

CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN
INFORME PARCIAL DE ACTIVIDADES

CONTRATO No.	CPS-036-2025	**PERIODO**	08 DE MARZO DE 2025 AL 31 DE MARZO DE 2025		
CONTRATISTA	JULIAN ANDRES ESPAÑA COY			**CEDULA.**	1.081.699.223
OBJETO CONTRATO	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EN LA SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA				
SUPERVISOR	CRISTIAN LEANDRO HOYOS IMBACHI	**DEPENDENCIA**	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO		

5,4	Relleno con material proveniente de la misma excavación.	m³	477,40	$ 24.944	$ 11.908.266
5,2	Relleno en recebo seleccionado compactado.	m³	339,30	$ 186.731	$ 63.357.828
				COSTOS DIRECTOS CAPITULO I:	**$ 876.443.684**
Capitulo II:CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS DE 36" (VEREDA LOS OLIVOS (1) Y FUNDADOR (2)					
1	**PRELIMINARES**				
1.1	Trazado, localización y replanteo	m²	38,19	$ 3.886	$ 148.406
2	**EXPLANACIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA**				
2.1	Excavaciones varias sin clasificar. Todo factor	m³	132	$ 52.644	$ 6.949.008
3	**DRENAJE**				$ -
3,1	Concreto de baja resistencia f'c=140 kgf/cm2 (2.000 psi) para solados.	m³	2,4	$ 728.796	$ 1.749.110
3,4	Concreto estructural f'c=246 kgf/cm2 (24 Mpa=3500 psi)	m³	23,4	$ 987.400	$ 23.105.160
3,2	Acero de refuerzo A60000 psi	kilo	2345,22	$ 7.918	$ 18.569.452
3,3	Tubo de 36" PVC alcantarillado	ml	19	$ 720.000	$ 13.680.000
4	**RELLENOS**				$ -
4,1	Relleno con material proveniente de la misma excavación.	m³	76,8	$ 24.944	$ 1.915.699
4,2	Relleno en recebo seleccionado compactado.	m³	36	$ 186.731	$ 6.722.316
				COSTOS DIRECTOS CAPITULO II:	**$ 72.839.152**
Capitulo III: CONSTRUCCION DE BOX COULVERT (VEREDA JERICO (2), LOS PINOS (2) Y ALTO FUNDADOR (1))					
1	**PRELIMINARES**				
1.1	Trazado, localización y replanteo	m²	162	$ 3.886	$ 629.532
2	**MOVIMIENTOS DE TIERRA / EXCAVACIONES DE CAUCE**				
2.1	Excavación mecanica sin clasificar de explanaciones y canales.	m³	159	$ 52.644	$ 8.370.396
3	**ESTRUCTURAS DE CONCRETO**				$ -
3,1	Concreto simple f'c=140 kgf/cm2 (2000 psi), para solados de estructuras.	m³	12,8	$ 728.796	$ 9.328.589
3,2	Concreto estructural f'c=246 kgf/cm2 (24 Mpa=3500 psi)	m³	138,98	$ 987.400	$ 137.228.852
3,3	Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi)	kg	15966,17	$ 7.918	$ 126.420.134
4	**RELLENOS**				$ -
4,1	Relleno compacto material de misma excavacion.	m³	312,00	$ 24.944	$ 7.782.528
4,2	Relleno material seleccionado compacto	m³	108,00	$ 186.731	$ 20.166.948
				COSTOS DIRECTOS CAPITULO III:	**$ 309.926.979**
COSTOS COMPLEMENTARIOS DELPROYECTO:					
* Vallas del Proyecto		Und	4	$ 700.000	$ 2.800.000
* Control Laboratorio		Gl	1	$ 6.000.000	$ 6.000.000
				COSTOS DIRECTOS CAPITULO COSTOS COMPLEMENTARIOS:	$ 8.800.000

CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN
INFORME PARCIAL DE ACTIVIDADES

CONTRATO No.	CPS-036-2025	**PERIODO**	08 DE MARZO DE 2025 AL 31 DE MARZO DE 2025		
CONTRATISTA	JULIAN ANDRES ESPAÑA COY			**CEDULA.**	1.081.699.223
OBJETO CONTRATO	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EN LA SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA				
SUPERVISOR	CRISTIAN LEANDRO HOYOS IMBACHI	**DEPENDENCIA**	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO		

COSTOS FINALES DEL PROYECTO:	
COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO:	**$ 1.268.009.815**
Costos Indirectos del Proyecto:	$ 82.100.000
Costo total Obras Civiles	**$ 1.350.109.815**

Ajuste Presupuesto Proyecto Obras de drenaje en vías terciarias

ACTIVIDADES ESPECIFICAS		**GESTION DESARROLLADA**
8.	Apoyo a la Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico en el área de gestión documental en los diferentes procesos de contratación de la dependencia y en las etapas precontractual, contractual y pos contractual	- Apoyo Gestión Documental del Convenio Solidario No 001 de 2024 "Aunar esfuerzos con la Junta de Acción Comunal de la Vereda Los Pinos para la construcción de cerramiento y unidad sanitaria en la Vereda los Pinos del Municipio de Palestina- Huila". - Apoyo Gestión Documental del Convenio Solidario No 002 de 2024 "Aunar esfuerzos con la Junta de Acción Comunal de la Vereda Los Pinos para la construcción de cerramiento y placa de soporte para la instalación de planta de gas en la Vereda Los Pinos del Municipio de Palestina-Huila". - Apoyo Gestión Documental del Convenio Solidario No 004 de 2024 "Aunar esfuerzos con la Junta de Acción Comunal de la Vereda Sinaí para el mejoramiento de vías en zonas rurales del Municipio de Palestina, Departamento del Huila (tramo Palestina – Sinaí)". - Apoyo Gestión Documental del Convenio Solidario No 005 de 2024 "Aunar esfuerzos con la Junta de Acción Comunal de la Vereda Betania para el mejoramiento de vías en zonas rurales del Municipio de Palestina, Departamento del Huila (tramo Betania – La Esmeralda)". - Apoyo Gestión Documental del Convenio Solidario No 006 de 2024 "Aunar esfuerzos con la Junta de Acción Comunal de la Vereda San Isidro para el mejoramiento de vías en zonas rurales del Municipio de Palestina, Departamento del Huila (tramo San Isidro – Silencio)".

CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN
INFORME PARCIAL DE ACTIVIDADES

CONTRATO No.	CPS-036-2025	**PERIODO**	08 DE MARZO DE 2025 AL 31 DE MARZO DE 2025	
CONTRATISTA	JULIAN ANDRES ESPAÑA COY		**CEDULA.**	1.081.699.223
OBJETO CONTRATO	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EN LA SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA			
SUPERVISOR	CRISTIAN LEANDRO HOYOS IMBACHI	**DEPENDENCIA**	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	

		- Apoyo Gestión Documental del Convenio Solidario No 007 de 2024 "Aunar esfuerzos con la Junta de Acción Comunal de la Vereda El Silencio para el mejoramiento de vías en zonas rurales del Municipio de Palestina, Departamento del Huila (Alcantarilla Vereda El Silencio)".
OBSERVACIONES Y ANEXO		



Apoyo Gestión Documental Expedientes Contractuales

ACTIVIDADES ESPECIFICAS		**GESTION DESARROLLADA**
9.	Brindar apoyo en la elaboración de estudios previos, análisis del sector, e invitaciones públicas y demás documentos del expediente contractual, para los diferentes procesos de contratación.	- No se adelantaron actividades en el presente Periodo, se reprograman para el siguiente
OBSERVACIONES Y ANEXO		

ACTIVIDADES ESPECIFICAS		**GESTION DESARROLLADA**
10.	Revisión Documental de proyectos presentados adscritos a esta dependencia.	- No se adelantaron actividades en el presente Periodo, se reprograman para el siguiente
OBSERVACIONES Y ANEXO		
ACTIVIDADES ESPECIFICAS		**GESTION DESARROLLADA**

CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN
INFORME PARCIAL DE ACTIVIDADES


CONTRATO No.	CPS-036-2025	**PERIODO**	08 DE MARZO DE 2025 AL 31 DE MARZO DE 2025	
CONTRATISTA	JULIAN ANDRES ESPAÑA COY		**CEDULA.**	1.081.699.223
OBJETO CONTRATO	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EN LA SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA			
SUPERVISOR	CRISTIAN LEANDRO HOYOS IMBACHI	**DEPENDENCIA**	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	

11.	Apoyo en la elaboración de las evaluaciones de los procedimientos de contratación cuando se requiera.	- No se adelantaron actividades en el presente Periodo, se reprograman para el siguiente

OBSERVACIONES Y ANEXO

ACTIVIDADES ESPECIFICAS		**GESTION DESARROLLADA**
12.	Llevar y mantener el archivo del área encargada de forma permanente, organizada y actualizada teniendo en cuenta las tablas de retención documental y la normatividad vigente de archivo	- Se mantiene el archivo del área encargada de forma permanente, organizada y actualizada, según tablas de retención documental y normatividad.

OBSERVACIONES Y ANEXO

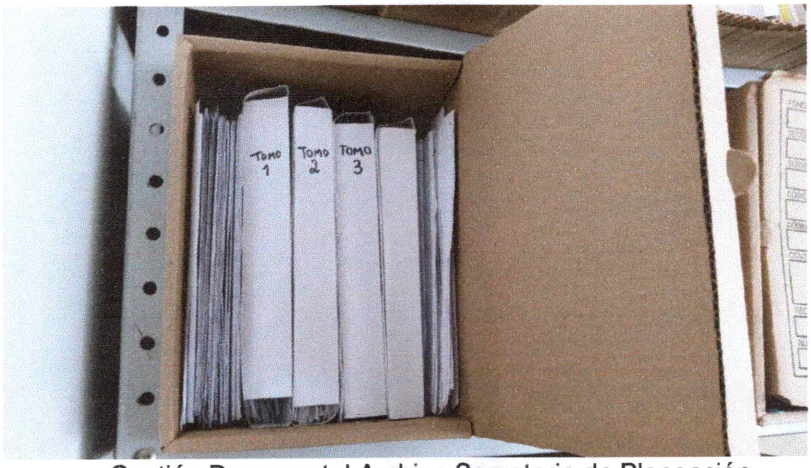


Gestión Documental Archivo Secretaria de Planeación

ACTIVIDADES ESPECIFICAS		**GESTION DESARROLLADA**
13.	Responder por los Bienes del Municipio que por Motivos del Cumplimiento del Contrato queden a su disposición.	- Se responde por los bienes del Municipio utilizados por motivo del cumplimiento del contrato como silla y escritorio.

OBSERVACIONES Y ANEXO

CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN
INFORME PARCIAL DE ACTIVIDADES

CONTRATO No.	CPS-036-2025	**PERIODO**	08 DE MARZO DE 2025 AL 31 DE MARZO DE 2025	
CONTRATISTA	JULIAN ANDRES ESPAÑA COY		**CEDULA.**	1.081.699.223
OBJETO CONTRATO	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EN LA SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA			
SUPERVISOR	CRISTIAN LEANDRO HOYOS IMBACHI	**DEPENDENCIA**	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	

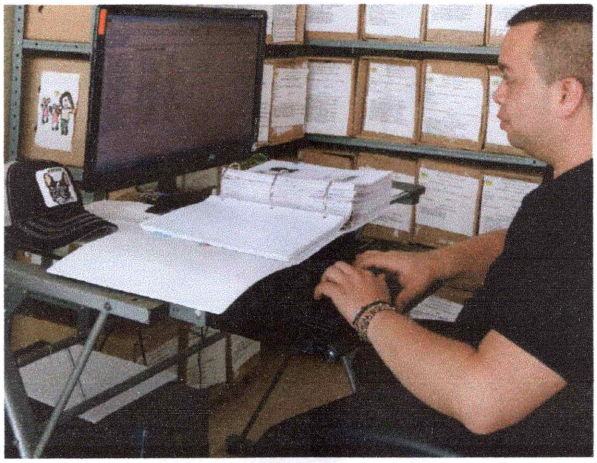

Responder por bienes del Municipio utilizados en labores (Computador, Escritorio y silla)

	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	**GESTION DESARROLLADA**
14.	Guardar la respectiva confidencialidad y reserva sobre la información y documentos que se conozca durante la ejecución del servicio, aun después de su terminación y cualquiera sea la causa de esta.	- Se guarda la respectiva confidencialidad y reserva de la información de los documentos.

OBSERVACIONES Y ANEXO


	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	**GESTION DESARROLLADA**
15.	Brindar apoyo en la reacción y difusión de noticias, eventos, convocarías y servicios a través de los canales de comunicación digitales de la alcaldía del Municipio de palestina.	- Reaccion y Difusion de Noticias, eventos y convocatorias en canales de comunicación digitales de la Alcaldia

OBSERVACIONES Y ANEXO

CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN
INFORME PARCIAL DE ACTIVIDADES

CONTRATO No.	CPS-036-2025	**PERIODO**	08 DE MARZO DE 2025 AL 31 DE MARZO DE 2025	
CONTRATISTA	JULIAN ANDRES ESPAÑA COY		**CEDULA.**	1.081.699.223
OBJETO CONTRATO	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EN LA SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA			
SUPERVISOR	CRISTIAN LEANDRO HOYOS IMBACHI	**DEPENDENCIA**	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	



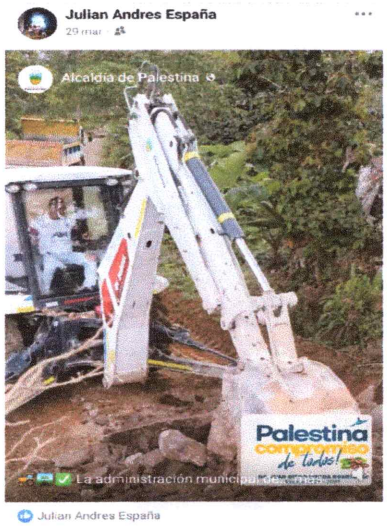



ACTIVIDADES ESPECIFICAS		GESTION DESARROLLADA
16.	Las demás que sean inherentes al Objeto Contractual y las que le sean asignadas por el Alcalde y/o el Supervisor del contrato	- Proyección de oficio de respuesta a la Coordinadora del CDI "Infancia Feliz" Sobre Certificado de Licencia de Construcción para el Funcionamiento de la Sede.

OBSERVACIONES Y ANEXO



ALCALDIA MUNICIPAL PALESTINA — Versión No. 1.0 — Página 1 de 1

Palestina Huila, 13 de Marzo de 2025

Señora
CLAUDIA MARCELA YASNO MOTTA
Coordinadora CDI Infancia Feliz
Presidente@codacin.org
Ciudad

Referencia: Respuesta a Oficio Radicado No GD-CD-C 082

Asunto: Certificado de Licencia de Construcción Funcionamiento CDI Infancia Feliz

Cordial y atento saludo.

En atención a solicitud remitida mediante oficio No GD-CD-C 082, El suscrito Secretario de Planeación y Desarrollo Económico del Municipio de Palestina - Huila, hace constar que para el predio ubicado en la Calle 18 No 8-20, en el Barrio La Independencia, zona urbana del Municipio de Palestina donde actualmente funciona el Centro de Desarrollo Infantil- "Infancia Feliz", se expidió licencia de Construcción en Modalidad de Obra Nueva, según documentos, planos y especificaciones presentadas por el Representante Legal del Municipio de Palestina, previo al inicio de actividades constructivas según lo detallado en el contrato de Obra de Selección Abreviada de Menor cuantía 007 de 2014.

Se expide el presente documento a petición de la interesada como certificado de licencia de construcción para el Funcionamiento del Centro de Desarrollo Infantil "Infancia Feliz", a los Trece (13) días del Mes de Marzo de 2025.

Cordialmente,

CRISTIAN LEANDRO HOYOS IMBACHI
Secretario de Planeación y Desarrollo Económico

Proyectó: Julian Andres España Profesional de apoyo Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico Firma:	Revisó en su texto legal: Ricardo Bertulio Muñoz Asesor jurídico de contratación Firma:	Revisó: Cristian Leandro Hoyos Imbachi Secretario de Planeación y D. E. Firma:

Proyección de oficio Respuesta Coordinadora CDI "Infancia Feliz".

Julian Andres España

JULIAN ANDRES ESPAÑA COY
Contratista
