ACTA DE AMPLIACIÓN No.7 A LA SUSPENSIÓN Nº 01 DEL CONTRATO Nº 4239055 de 2022 – 3908/2022

CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.4239055 del 19 de diciembre de 2022
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE JESÚS MARIA Y FLORIÁN, BENEFICIANDO LOS DE TUNUNGUÁ Y SABOYA (DEPARTAMENTO DE BOYACÁ), ALBANIA, LA BELLEZA, SUCRE Y PUENTE NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR INICIAL:	$ 54.387.636.708,00
VALOR ADICIONAL:	$00.000.00
PLAZO INICIAL:	DIECIOCHO (18) MESES
PLAZO ADICIONAL:	N/A
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO VIAL CI RL JORGE HUMBERTO ARGUELLO BELTRAN; C.C. 91.439.866 de Barrancabermeja. (integrado por: CONYSER S.A.S EN UN 80% Y INGVIAS S.A.S. EN UN 20%)
SUPERVISOR:	ING. MARIA CRISTINA ANGARITA BARON - Acta designación de 18 de enero de 2023
INTERVENTOR CONTRATO:	JUAN CARLOS PLAZAS ROJAS representante legal del CONSORCIO CGB-JET
ANTICIPO (XX%)	N/A
FECHA DE INICIACION:	27-02-2023
ACTA DE SUSPENSIÓN No.1:	27-06-2024
AMPLIACIÓN No.1 A LA SUSPENSIÓN No.1:	09-08-2024
AMPLIACIÓN No.2 A LA SUSPENSIÓN No.1:	09-09-2024
AMPLIACIÓN No.3 A LA SUSPENSIÓN No.1:	08-11-2024
AMPLIACIÓN No.4 A LA SUSPENSIÓN No.1:	09-12-2024
AMPLIACIÓN No.5 A LA SUSPENSIÓN No.1:	09-01-2025
AMPLIACIÓN No.6 A LA SUSPENSIÓN No.1:	07-02-2025
FECHA DE TERMINACION:	26-08-2024
MUNICIPIO:	Florián – Jesús Maria
OFICINA GESTORA:	Secretaria de Infraestructura

En Bucaramanga, a los veinticuatro (24) días del mes de marzo de 2025, se reunieron, JESICA JULIANA MENDOZA RAMIREZ, en calidad de Secretario de Infraestructura, JORGE HUMBERTO ARGUELLO BELTRAN, representante legal de UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO VIAL CI, en calidad de Contratista, el Interventor del contrato JUAN CARLOS PLAZAS ROJAS representante legal del CONSORCIO CGB-JET, el supervisor del contrato MARIA CRISTINA ANGARITA BARON, con el fin de elaborar la presente acta de ampliación No.7 a la suspensión No.01 del Contrato.

CONSIDERANDO

1. Que los considerandos iniciales que dieron origen a la suspensión No.1 aún no han sido superados.

Powered by CamScanner

2. Que a la fecha se han adelantado los avales relacionados en los componentes de estructuras, diseño geométrico, diseño hidráulico y geotécnica para el cambio de los muros de contención a muros en gavión.

3. Que, de acuerdo con la mesa técnica realizada el 11 de marzo de 2025, con la participación del Departamento de Santander, la interventoría y el contratista, se generaron observaciones a los componentes de Pavimentos, remoción de Derrumbes y manto de refuerzo control de erosión.

4. Que, el 21 de marzo de 2025, el contratista de obra realizó la entrega a la interventoría de las subsanaciones correspondientes a las observaciones formuladas durante la mesa técnica del 11 de marzo, las cuales se encuentran en proceso de revisión por parte de la interventoría.

5. Que actualmente el Modificatorio No.2 del contrato de obra continúa en proceso subsanación por parte del contratista, en atención a las observaciones realizadas por los especialistas de la Gobernación de Santander en las áreas de pavimentos, geotecnia y suelos.

6. El contratista renuncia a cualquier tipo de reclamación por efectos de la presente suspensión, teniendo en cuenta que las circunstancias que la generan no son imputables al Depto.

ACUERDAN

1. Ampliar la suspensión por un término de un (01) mes, mientras se superan los hechos anotados en los considerandos anteriores.

2. Reanudar los trabajos, una vez los inconvenientes que generaron la suspensión hayan sido superados.

3. Dar la orden de reanudación de trabajos mediante acta, fijando la nueva fecha de entrega final.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron:

JESICA JULIANA MENDOZA RAMIREZ
Secretario de Infraestructura

JORGE HUMBERTO ARGUELLO B.
Contratista

JUAN CARLOS PLAZAS ROJAS
Interventor

MARIA CRISTINA ANGARITA B.
Supervisora

Proyectó: Cristina Angarita - Supervisora
Reviso: Ing. Lyda Xiomara Peña- Directora Gestión de Infraestructura
Reviso: Dra. Diana Carvajal- CPS Secretaria de Infraestructura

Powered by CamScanner

U.T. MANTENIMIENTO VIAL CI
NIT: 901.660.245-7

"MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE JESUS MARIA Y FLORIÁN, BENEFICIANDO LOS MUNICIPIOS DE TUNNUNGUÁ Y SABOYA (DEPARTAMENTO DE BOYACÁ), ALBANIA, LA BELLEZA, SUCRE Y PUENTE NACIONAL, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER".

Jesús María, Santander 19 de marzo de 2025

OBR-063-2025

Señor(es):
CONSORCIO CGBJET
INTERVENTORÍA

ING. MARÍA CRISTINA ANGARITA BARÓN
SUPERVISORA, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
GOBERNACIÓN DE SANTANDER

REFERENCIA: CONTRATO NO 4239055-2022 CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE JESÚS MARIA Y FLORIÁN, BENEFICIANDO LOS MUNICIPIOS DE TUNUNGUÁ Y SABOYA (DEPARTAMENTO DE BOYACÁ), ALBANIA, LA BELLEZA, SUCRE Y PUENTE NACIONAL, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER".

ASUNTO: SOLICITUD DE AMPLIACIÓN N°7 A LA SUSPENSIÓN N°01 DELCONTRATO DE LA REFERENCIA.

Cordial Saludo,

Cordial saludo, El siguiente oficio es para solicitar formalmente y de la manera más atenta la ampliación N° 07 a la suspensión N°01 del contrato 4239055 del 2022 del proyecto de la referencia por un (01) mes considerando las siguientes razones:


1. Que los considerandos iniciales que dieron origen a la suspensión No.1 aún no han sido superados.
2. Que a la fecha se han adelantado los avales relacionados en los componentes de estructuras, diseño geométrico, diseño hidráulico y geotécnica para el cambio de los muros de contención a muros en gavión.
3. Que, de acuerdo a las entregas realizadas entre el contratista de obra e interventor se requiere de más tiempo para la verificación por parte del especialista en geotecnia y especialista en pavimentos para corroborar los informes técnicos, ensayos de campo, memorias y especificaciones técnicas en estos componentes.
4. Que actualmente, el modificatorio No.2 del contrato de obra continúa en proceso de revisión y subsanación por parte del contratista, en respuesta a observaciones realizadas por los especialistas de la Gobernación de Santander, en relación a la falta de soporte técnico y justificaciones planteadas para los cambios a realizarse.

Sin otro particular, agradecemos su atención e importante colaboración.

Cordialmente,

JORGE HUMBERTO ARGUELLO B.
REPRESENTANTE LEGAL

El centro Ecopetrol
Barrancabermeja-Santander
Tel: 6125629
utmantenimientovialci2023@gmail.com

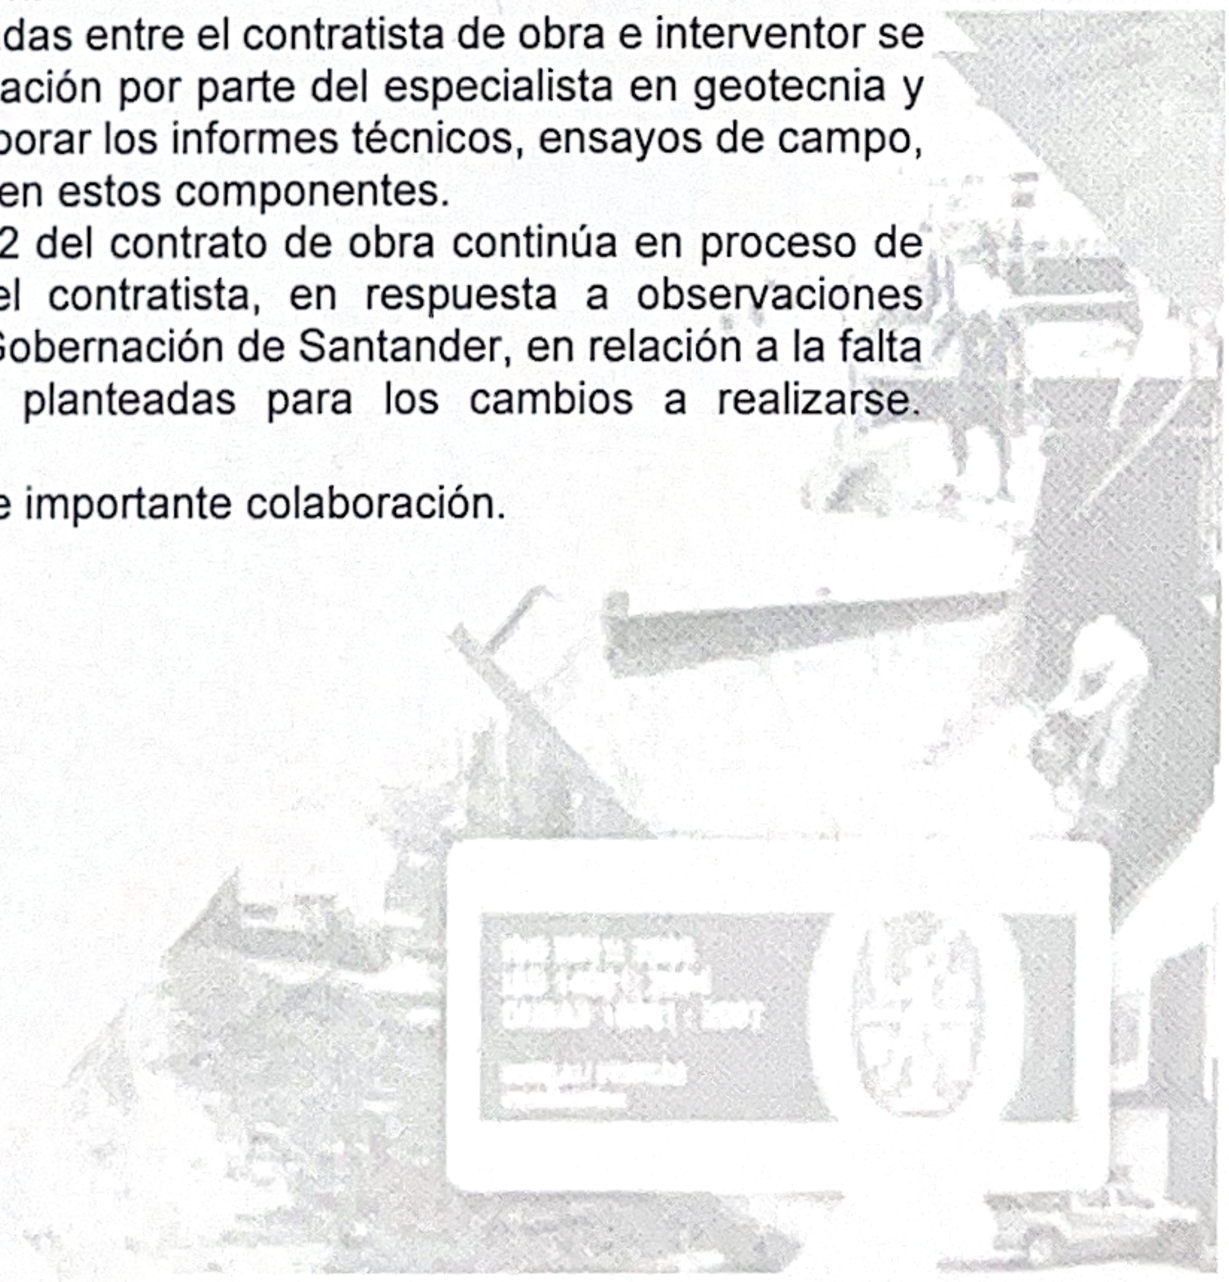

CONSORCIO CGB -JET
INTERVENTORÍA

Bucaramanga, 24 de marzo de 2025

INT – CGBJET – 092B - 2025

Ingeniera:
MARÍA CRISTINA ANGARITA BARÓN
Supervisora Contrato
Gobernación de Santander

REFERENCIA 1: Contrato No. CO1.PCCNTR-4239055. Cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE JESÚS MARIA Y FLORIÁN, BENEFICIANDO LOS DE TUNUNGUÁ Y SABOYA (DEPARTAMENTO DE BOYACÁ), ALBANIA, LA BELLEZA, SUCRE Y PUENTE NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER".

REFERENCIA 2: Contrato No. CO1.PCCNTR-4296800. Cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA., TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE JESÚS MARIA Y FLORIÁN, BENEFICIANDO LOS DE TUNUNGUÁ Y SABOYA (DEPARTAMENTO DE BOYACÁ), ALBANIA, LA BELLEZA, SUCRE Y PUENTE NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER".

ASUNTO: Solicitud de ampliación No.7 a la suspensión No.1 de los contratos de obra e interventoría.

Cordial saludo,

De acuerdo con la solicitud recibida por el contratista de obra la U.T MANTENIMIENTO VIAL CI mediante el comunicado OBR-063-2025, en el que solicita la **AMPLIACIÓN No.7** a la SUSPENSIÓN No.1, nos permitimos solicitar a la GOBERNACIÓN DE SANTANDER la ampliación a los contratos de obra e interventoría en referencia, ya que, a la fecha no se han superado los motivos que dieron lugar a la suspensión No.1, soportado en lo siguiente:

1. Que a la fecha se han adelantado los avales relacionados en los componentes de estructuras, diseño geométrico, diseño hidráulico y geotécnica para el cambio de los muros de contención a muros en gavión.

2. Que, de acuerdo con la mesa técnica realizada el 11 de marzo de 2025, con la participación del Departamento de Santander, la interventoría y el contratista, se generaron observaciones a los componentes de Pavimentos, remoción de Derrumbes y manto de refuerzo control de erosión.

3. Que, el 21 de marzo de 2025, el contratista de obra realizó la entrega de las subsanaciones correspondientes a las observaciones formuladas durante la mesa

técnica del 11 de marzo, las cuales se encuentran en proceso de revisión por parte de la interventoría.

4. Que, actualmente, el Modificatorio No.2 del contrato de obra continúa en proceso de subsanación por parte del contratista, en atención a las observaciones realizadas por los especialistas de la Gobernación de Santander.

En virtud de lo anterior, solicitamos que se tenga en cuenta la solicitud de ampliación No.7 a la suspensión No.1 de los contratos CO1.PCCNTR-4239055 y CO1.PCCNTR-4296800 y se prorrogue por el término de un (1) mes, hasta tanto no se superen las circunstancias que dieron origen a la suspensión.

Se anexa el siguiente documento:

1. Comunicado OBR– 063 – 2025 "Solicitud de ampliación No.7 a la suspensión No.1 del contrato CO1. PCCNTR-4239055.".

Agradezco su atención.

Cordialmente,

JUAN CARLOS PLAZAS ROJAS
R.L CONSORCIO CGB-JET
consorciocgbjet2023@gmail.com
