GOBIERNO DE CALDAS	ACTA DE ORDENACIÓN DEL GASTO No. 14	**Código:** FO-GD-02-018 **Versión:** 1 **Fecha de Modificacion:** 20/11/2021

SECRETARÍA	INFRAESTRUCTURA	FECHA ACTA	jueves, 13 de febrero de 2025

Número Radicado en SECOP: Contrato, Convenio, Proceso o Constancia Art 19 Decreto 1510/2013	SECOP II:L LP-SI-004-2023. CO1.PCCNTR.5268825	Número Radicado Interno del Contrato:	29092023-1456
Numero de identificacion del contratista - NIT	901.740.908-5	No. Ficha BPIN (**Solo para proyectos Regalias Anexar copia**)	

CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL CONFORMADO POR: HARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES S.A.S (PARTICIPACIÓN 10%), GAMA INGENIEROS ARQUITECTOS S.A.S. (PARTICIPACIÓN 45%) Y INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S. (PARTICIPACIÓN 45%)
CONTRATO CEDIDO A:	N/A

CODIGO VIA	5602	NOMBRE DE LA VIA	**LA DORADA - SONSON, MUNICIPIOS DE VICTORIA Y SAMANA, CALDAS**
Actividad Económica	4290	Tipo de Contrato	OBRA PUBLICA

Objeto del Contrato:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

Valor del Contrato	Valor Adición	Valor Anticipo
$ 93.499.614.647,00	N/A	$ 9.349.961.464,00

APORTANTES	%	VALOR	TIPO DE ENTIDAD
Aporte Departamento:	100%	$ 93.499.614.647	DEPARTAMENTAL
Aporte Convenio No			
Aporte Convenio No			

Duración Contrato: SESENTA (60) MESES DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO	Fecha de Iniciación	12/10/2023
	Fecha de Terminación de ejecución	11/10/2028
	Prórrogas	

Nº PEDIDO - RPC	VALOR ORDENADO	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO	FONDO
4500024051	$ 206.422.566,00	$ 206.422.566,00	$ -	2 - 0408
4500025001	$ 1.857.803.094,00		$ 1.857.803.094,00	6 - 0408
			$ -	
VALOR ACTA	$ 2.064.225.660,00	$ 206.422.566,00	$ 1.857.803.094,00	

RESUMEN DEL CONTRATO			RESUMEN DEL ANTICIPO		
Valor del Contrato:		93.499.614.647,00	Valor del Anticipo:		9.349.961.464,00
Adición del Contrato					
Valor Acta Nro. 1	436.314.891,00		Amortización Acta 1	43.631.489,00	
Valor Acta Nro. 2	553.009.668,00		Amortización Acta 2	55.300.967,00	
Valor Acta Nro. 3	443.810.818,00		Amortización Acta 3	44.381.082,00	
Valor Acta Nro. 4	844.483.205,00		Amortización Acta 4	84.448.321,00	
Valor Acta Nro. 5	567.926.924,00		Amortización Acta 5	56.792.692,00	
Valor Acta Nro. 6	267.282.965,00		Amortización Acta 6	26.728.297,00	
Valor Acta Nro. 7	1.346.514.676,00		Amortización Acta 7	134.651.468,00	
Valor Acta Nro. 8	4.116.961.935,00		Amortización Acta 8	411.696.194,00	
Valor Acta Nro. 9	4.775.577.355,00		Amortización Acta 9	477.557.736,00	
Valor Acta Nro. 10	5.374.186.889,00		Amortización Acta 10	537.418.689,00	
Valor Acta Nro. 11	3.384.977.063,00		Amortización Acta 11	338.497.706,00	
Valor Acta Nro. 12	2.725.328.241,00		Amortización Acta 12	272.532.824,00	
Valor Acta Nro. 13	1.953.472.425,00		Amortización Acta 13	195.347.243,00	
Valor Acta Nro. 14	2.064.225.660,00		Amortización Acta 14	206.422.566,00	
Saldo del Contrato:	64.645.541.932,00		Saldo por Amortizar:	6.464.554.190,00	
Sumas iguales	**93.499.614.647,00**	**93.499.614.647,00**	Sumas iguales	**9.349.961.464,00**	**9.349.961.464,00**

OBSERVACION:

Nota: Nota: EL (LA) CONTRATISTA HA ACREDITADO EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES CONFORME A LAS NORMAS VIGENTES , EL CUAL HA SIDO VERIFICADO POR PARTE DEL ORDENADOR, SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 23 DE LA LEY 1150 de 2007 PARAGRAFO 1° ("El servidor público que sin justa causa no verifique el pago de los aportes a que se refiere el presente artículo, incurrirá en causal de mala conducta, que será sancionada con arreglo al régimen disciplinario vigente.") y del articulo 23 del Decreto 1703/2003 Cotizaciones en contratación no laboral para efectos de lo establecido en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, en los contratos en donde este involucrada la ejecución de un servicio por una persona natural en favor de una persona natural o persona jurídica de derecho publico o privado, la parte contratante deberá verificar la afiliación y pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social

Firma

Nombre: JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA
Ordenador del Gasto

Firma

Nombre: JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA
Supervisor

Firma

Nombre: ARIEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTOR EXTERNO
MAB INGENIERIA DE VALOR

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°. FSMC 17

Autorización DIAN 18764080526436 de 30/09/2024

Desde 12 **Hasta** 50 **Vigencia** 30/09/2025 **Prefijo** FSMC

CONSORCIO SAN MIGUEL
CALDAS

Medio de pago	Forma de pago	Orden de compra	Fecha de generación	Fecha emisión	Fecha vencimiento
Acuerdo mutuo	Crédito		13/02/2025 12:00:00	13/02/2025	18/02/2025

Número contrato

Centro de costos
03010121000 CSMIGUEL CALDAS - ADMINISTRATIVO

Tipo de operación
Estándar

Dirección de entrega bien o servicio
CRA 48 48 SUR 75 BG 161

Obra
FACTURACIÓN CAJA MENOR

DEPARTAMENTO DE CALDAS

NIT 890801052 - 1
Régimen Tributario Responsable de IVA
Dirección CR 21 22

Departamento Antioquia
Ciudad Caldas
Teléfono 018000916944
Correos electrónicos Aocampo@caldas.gov.co - analistacontable@intramaq.co

CONSORCIO SAN MIGUEL - CALDAS

NIT 901740908 - 5
Actividad económica 4290
Dirección CRA 48 48 SUR 75 BG 161

Departamento Antioquia
Ciudad Envigado
Teléfono 4483012
Correo Electrónico facturacionelectronica@intramaq.co

No somos responsables de IVA
No pertenecemos al régimen simple de tributación
No somos grandes contribuyentes
No somos Autoretenedores
No somos agentes retenedores de IVA

Ítem	Cod.	Descripción	Cant.	U/M	Precio Unitario	Descuento	IVA	%	INC	%	Valor total
1	8	Acta Parcial N°14 Según Radicado Contrato de Obra 29092023-1456 MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS	1,00	94	1.603.604.636,94	$0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603.604.636,94
2	8	ADMINISTRACION 26%	1,00	94	386.327.309,66	$0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.327.309,66
3	8	UTILIDAD 5%	1,00	94	74.293.713,40	$0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.293.713,40

Notas finales

Descripción
CONSORCIADOS: HARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES S.A.S NIT. 901.262.851-3 (10% PARTICIPACION) E INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S NIT. 900.102.268 (45% PARTICIPACION) GAMA INGENIEROS ARQUITECTOS S A S (45% PARTICIPACION)

Observaciones
Tramo 1 Victoria Caldas $ 1.173.976.115 - Tramo 3 Samaná Caldas $ 524.257.123 – Tramo 4 Nariño Antioquia $ 365.992.422

Resumen totales

Moneda	COP
Tasa de cambio	
Subtotales	$2,064,225,660.00
Total Impuestos	$0.00
Total Más Impuestos	$2,064,225,660.00
Descuentos	$0.00
Anticipos	$0.00
Retención en Garantía	$0.00
Retenciones	
Rte IVA	$0.00
Rte fuente	$0.00
Rte ICA	$0.00
Total a Pagar	**$2,064,225,660.00**

Valor a pagar en letras
DOS MIL SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS

Código único de facturación electrónica
9227b8e7ed29a19385fab2c1f12b2b68e1725a77fc32daf85c1d0a3330d787cd8ba3626288563036f2ec8330d18f9d6

Valor firma digital
OcifiW49UQCd12M32zmk1CPXKmL081pNKZphjeo5tcgYH7plPRzdOG6toNSWmPv46GYg4b0duwh5mVnrrx89HpkY1Rl78nDy7AkHSJPUNSW9EOJlVrlem7+RTSz3j3XejXC7PcmGTeg/xsJDlvlE+l9jZNwbbVxjxWKZGCTlBbGq3GlOxgBAntC12HGNQgkk3PVWWCqyibT66Cq0QinDmAWDlvrSCM41B055Ml7G+llr2uwGVo5i8BY1ENKtiZsmW7myg0wmMaJpiO/U5GmiCPNgh8i0vq9mAb0zCDSVAfcdzc9BMichU2VvhR+NLLovSwT7alplBFqUTOxSkSivQ==

Fecha y hora de expedición
13/02/2025 12:00:00

Nombre fabricante SINCOSOFT S.A.S NIT 830.021.894 - 9

CONSORCIO
SAN MIGUEL

Norcasia, 13 de febrero de 2025

Señores
Gobernación de Caldas
Secretaría de Hacienda

REFERENCIA CONTRATO DE OBRA PUBLICA 29092023-1456 "MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS".

ASUNTO CERTIFICACIÓN MUNICIPIOS EJECUCIÓN DE OBRA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENERO DE 2025.

Cordial saludo,

De acorde al contrato de la referencia, nos permitimos certificar que las obras ejecutadas por el Consocio San Miguel, enmarcadas en Acta parcial de Obra No. 14 se ejecutaron en los municipios de Samana, Victoria Caldas y el Municipio de Nariño en el departamento de Antioquia, de acuerdo a las inversiones que se relacionan en la siguiente tabla.

VALOR DISCRIMINADO POR MUNICIPIOS

	DEPARTAMENTO DE CALDAS			VALOR
	MUNICIPIO 1	MUNICIPIO DE VICTORIA		$ 1.173.976.115,00
	MUNICIPIO 2	MUNICIPIO DE SAMANA		$ 524.257.123,00
	TOTAL DEPARTAMENTO DE CALDAS			$ 1.698.233.238,00

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA			VALOR
	MUNICIPIO 1	MUNICIPIO DE NARIÑO		$ 365.992.422,00
	TOTAL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA			$ 365.992.422,00

Atentamente,

RODRIGO GARCIA CAMPIÑO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO SAN MIGUEL

ARIEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA Y/O APODERADO
MAB INGENIERIA DE VALOR

NIT 890.300.279-4

CERTIFICADO

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que la empresa **INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA** identificada con el número de documento **9001022681** es cliente del BANCO DE OCCIDENTE desde el día 26 de diciembre de 2013 con la Cuenta Corriente 477-005581 la cual se encuentra Activa y vigente

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de la empresa **INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA** es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy **22 de febrero de 2024.**

Ivan Mauricio Ricardo Arias
Vicepresidencia de Empresas

CONSORCIO
SAN MIGUEL

Envigado, 13 de febrero de 2025

Señores
GOBERNACION DE CALDAS
Manizales

Asunto: Certificación pago seguridad social

CARLOS IGNACIO CADAVID MEJÍA, actuando en calidad de Representante Legal del **CONSORCIO SAN MIGUEL**, identificado con Nit. 901.740.908-5, me permito certificar bajo la gravedad de juramento que, a la fecha de suscripción del presente documento, la empresa a la cual represento, ha realizado los pagos de los aportes a seguridad social y parafiscales de acuerdo a lo contenido en el Decreto 780 de 2016.

Atentamente,

CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
Representante Legal
CC. 71.788.628

Carrera 48 # 48sur-75, Bodega 163
Envigado – Antioquia
Teléfono: 604 4483012

INTRAMAQ
INGENIERIA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S

CERTIFICACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Señores
GOBERNACIÓN DE CALDAS
Medellín

Asunto: Carta de Cumplimiento de Aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Referencia: Mejoramiento de la vía Dorada – Sonsón, ruta del renacimiento
Fecha: 13 de febrero de 2025

ZULIMA LOPEZ ARANGO, identificada como aparece al pie de mi firma, en mi condición de Revisora Fiscal de la empresa **INTRAMAQ S.A.S.**, certifico que a la fecha, la sociedad arriba mencionada, se encuentra al día en el cumplimiento del pago de los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-, del personal usado en el contrato de la referencia, de conformidad con lo exigido en el artículo 41 de la ley 80 de 1993, el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y demás normas reglamentarias.

Cordialmente,

Firma: Zulima Lopez Arango.
Nombre: **ZULIMA LOPEZ ARANGO**
Cargo: Revisora Fiscal
Número de identificación: 1.037.579.884 de Envigado
Tarjeta Profesional: 151637-T



INTRA MAQ
INGENIERIA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

151637-T



ZULIMA
LOPEZ ARANGO
C.C. 1037579880
RESOLUCION INSCRIPCION 252 FECHA 12/08/2010
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

PRESIDENTE
LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 16125

FIRMA DEL TITULAR 76798

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo, Junta Central de Contadores.



INTRA MAQ
INGENIERIA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8 9 C F 9 E 3 9 0 7 8 F D 4 8 6

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ZULIMA LOPEZ ARANGO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1037579884 de ENVIGADO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 151637-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

FORMATO 6
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

ANA CAROLINA GALAN RAMIREZ identificada con cedula de ciudadanía No. 52.8662.258 en mi condición de Representante Legal de **GAMA INGENIEROS ARQUITECTOS S.A.S** identificada con NIT 830.136.490 - 1 bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción *(artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983),* pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, **NELLY ESPERANZA MARTINEZ LOPEZ,** identificado con cédula de ciudadanía No. 51.611.736 de Bogotá, y con Tarjeta Profesional No. 78826 – T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisora Fiscal de **GAMA INGENIEROS ARQUITECTOS S.A.S,** identificada con Nit 830.136.490-1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción *(artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983),* pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá, a los 13 días del mes de febrero de 2025.

ANA CAROLINA GALÁN RAMÍREZ
C.C. 52.862.258 de Bogotá
REPRESENTANTE LEGAL

NELLY ESPERANZA MARTIENEZ LOPEZ
M.P. No. 78826-T
REVISORA FISCAL

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



78826-T

NELLY ESPERANZA
MARTINEZ LOPEZ
C.C. 51614736
RESOLUCION INSCRIPCION 64 FECHA 15/05/2001
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

PRESIDENTE JAIME A. HERNANDEZ V.

88010

Creación en 04/2001-25034

FIRMA DEL TITULAR 037911

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

C5B8776DAD30E381

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **NELLY ESPERANZA MARTINEZ LOPEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51611736 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 78826-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

harinsa · navasfalt

CERTIFICADO PARAFISCALES

SANDRA PATRICIA USECHE CONTRERAS identificada con Cedula de Ciudadanía No. 40.189.524 de Villavicencio (Meta)], y con Tarjeta Profesional No. 213515-T, de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **HARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES S.A.S,** sociedad identificada con NIT 901.262.851-3, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de suscripción del presente documento, los cuales se han realizado dentro del tiempo establecido y en debida forma. Se expide la presente certificación para efectos de ejecución del contrato 4600014472, celebrado entre el Consorcio San Miguel y El Departamento de Caldas, cuyo objeto es *"Mejoramiento de la vía Dorada – Sonsón, ruta del renacimiento entre los departamentos de Antioquia y Caldas".*

Nota: Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional delAprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentesdeclarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Bogotá, a los 13 días del mes de febrero de 2025.

SANDRA PATRICIA USECHE
CONTRERASREVISOR FISCAL

TP. 213515-T
HARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES S.A.S

hnv
harinsa · navasfalt

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



213515-T

SANDRA PATRICIA
USECHE CONTRERAS
C.C. 40189524
RESOLUCION INSCRIPCION 12 **FECHA 29/01/2016**
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA 226613

216315

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideas.com

EMAIL: info@hnvi.es

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A1AB12F4D8EF6744

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **SANDRA PATRICIA USECHE CONTRERAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 40189524 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 213515-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901740908	5	CONSORCIO SAN MIGUEL CALDAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	Carrera 48 No 48 Sur -75 BG163	NORCASIA-CALDAS	4483012	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1245830454	9481387858	E	2025/02/05	2025/02/05	BANCO POPULAR	0	$68,645,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombre		ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (86 Afiliados)																						$196,298,615	$31,408,100			$198,573,615	$7,943,800			$206,012,751	$8,229,000			$198,573,615	$12,643,600		$0	$0	$60,224,500
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (1 Afiliados)																						$2,800,000	$448,000			$2,800,000	$112,000			$2,800,000	$112,000			$2,800,000	$14,700		$0	$0	$686,700
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)																						$2,800,000	$448,000			$2,800,000	$112,000			$2,800,000	$112,000			$2,800,000	$14,700		$0	$0	$686,700
1	CC	1010064457	GALINDO CHALA JOHANNA ANDREA	X																	230301	28	$2,800,000	$448,000	EPS005	28	$2,800,000	$112,000	CCF11	28	$2,800,000	$112,000		28	$2,800,000	$14,700	28	$0	$0	$686,700
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$14,400		$0	$0	$356,200
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$14,400		$0	$0	$356,200
2	CC	1036190074	SUAREZ OSPINA DIANA MARCELA							X											230301	29	$1,376,050	$220,200	EPS010	29	$1,376,050	$55,100	CCF11	29	$1,376,050	$55,100		29	$1,376,050	$14,400	29	$0	$0	$344,800
3	CC	1036190074	SUAREZ OSPINA DIANA MARCELA													X					230301	1	$47,450	$7,600	EPS010	1	$47,450	$1,900	CCF11	1	$47,450	$1,900		1	$47,450	$0	1	$0	$0	$11,400
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 3 (5 Afiliados)																						$12,049,797	$1,928,300			$12,049,797	$482,500			$11,961,996	$479,000			$12,049,797	$509,100		$0	$0	$2,999,500
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (4 Afiliados)																						$10,639,399	$1,702,600			$10,639,399	$426,000			$10,569,333	$423,200			$10,639,399	$447,700		$0	$0	$2,999,500
4	CC	1003697685	ARDILA CARLOS ANDRES							X		X									230201	29	$2,424,717	$388,000	EPS002	29	$2,424,717	$97,000	CCF11	29	$2,424,717	$97,000		29	$2,424,717	$105,500	29	$0	$0	$687,500
5	CC	1003697685	ARDILA CARLOS ANDRES													X					230201	1	$87,819	$14,100	EPS002	1	$87,819	$3,600	CCF11	1	$70,071	$2,900		1	$87,819	$0	1	$0	$0	$20,600
6	CC	10182943	DILON LOZANO NELSON							X		X									230301	27	$2,345,190	$375,300	EPS040	27	$2,345,190	$93,900	CCF11	27	$2,345,190	$93,900		27	$2,345,190	$102,100	27	$0	$0	$665,200
7	CC	10182943	DILON LOZANO NELSON													X					230301	3	$265,174	$42,500	EPS040	3	$265,174	$10,700	CCF11	3	$212,856	$8,600		3	$265,174	$0	3	$0	$0	$61,800
8	CC	1058844006	GARCIA ACEVEDO LUIS ALBERTO							X		X									230201	30	$2,630,896	$421,000	EPS008	30	$2,630,896	$105,300	CCF11	30	$2,630,896	$105,300		30	$2,630,896	$114,500	30	$0	$0	$746,100
9	CC	9850660	VALENCIA MURILLO ANDRES							X		X									230301	30	$2,885,603	$461,700	EPS037	30	$2,885,603	$115,500	CCF11	30	$2,885,603	$115,500		30	$2,885,603	$125,600	30	$0	$0	$818,300
Ciudad: NARIÑO Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																						$1,410,398	$225,700			$1,410,398	$56,500			$1,392,663	$55,800			$1,410,398	$61,400		$0	$0	$399,400
10	CC	71310972	SEPULVEDA CANO OSCAR ALEXANDER	X								X									230301	15	$1,410,398	$225,700	EPS037	15	$1,410,398	$56,500	CCF03	15	$1,392,663	$55,800		15	$1,410,398	$61,400	15	$0	$0	$399,400
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4 (2 Afiliados)																						$7,080,848	$1,133,000			$7,080,848	$283,400			$7,080,848	$283,400			$7,080,848	$172,600		$0	$0	$1,872,400
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)																						$3,152,826	$504,500			$3,152,826	$126,200			$3,152,826	$126,200			$3,152,826	$76,900		$0	$0	$833,800
11	CC	1118072693	NIÑO MORA PAULA ANDREA							X		X									230301	30	$3,152,826	$504,500	ESSC62	30	$3,152,826	$126,200	CCF11	30	$3,152,826	$126,200		30	$3,152,826	$76,900	30	$0	$0	$833,800
Ciudad: NARIÑO Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																						$3,928,022	$628,500			$3,928,022	$157,200			$3,928,022	$157,200			$3,928,022	$95,700		$0	$0	$1,038,600
12	CC	1063296383	WILCHES SOTO JUAN DAVID							X		X									230301	30	$3,928,022	$628,500	EPS005	30	$3,928,022	$157,200	CCF03	30	$3,928,022	$157,200		30	$3,928,022	$95,700	30	$0	$0	$1,038,600
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (77 Afiliados)																						$172,944,470	$27,671,000			$175,219,470	$7,008,900			$182,746,407	$7,297,600			$175,219,470	$11,932,800		$0	$0	$53,910,300
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (57 Afiliados)																						$116,696,590	$18,670,600			$116,696,590	$4,667,400			$120,391,843	$4,802,800			$116,696,590	$7,873,900		$0	$0	$36,014,700
13	CC	1054554029	AHUMADA MAHECHA JHONATHAN							X		X									230301	30	$3,298,587	$527,800	EPS037	30	$3,298,587	$132,000	CCF11	30	$3,298,587	$132,000		30	$3,298,587	$229,600	30	$0	$0	$1,021,400
14	CC	1001440186	ALARCON QUINTERO VIVIANA							X		X									230301	29	$1,938,487	$310,200	EPS040	29	$1,938,487	$77,600	CCF11	29	$1,938,487	$77,600		29	$1,938,487	$135,000	29	$0	$0	$600,400
15	CC	1001440186	ALARCON QUINTERO VIVIANA													X					230301	1	$65,887	$10,600	EPS040	1	$65,887	$2,700	CCF11	1	$59,576	$2,400		1	$65,887	$0	1	$0	$0	$15,700
16	CC	1017269107	ALZATE GIRALDO JANCARLO							X		X									231001	30	$1,889,232	$302,300	EPS002	30	$1,889,232	$75,600	CCF11	30	$1,889,232	$75,600		30	$1,889,232	$131,500	30	$0	$0	$585,000
17	CC	1054478908	ALZATE OSPINA JUAN MAURICIO							X		X									230301	29	$1,877,369	$300,400	EPS037	29	$1,877,369	$75,100	CCF11	29	$1,877,369	$75,100		29	$1,877,369	$130,700	29	$0	$0	$581,300
18	CC	1054478908	ALZATE OSPINA JUAN MAURICIO													X					230301	1	$59,805	$9,600	EPS037	1	$59,805	$2,400	CCF11	1	$52,514	$2,200		1	$59,805	$0	1	$0	$0	$14,200
19	CC	1002800584	ARANGO CALDERON EVER							X		X									25-14	29	$1,936,940	$310,000	EPS010	29	$1,936,940	$77,500	CCF11	29	$1,936,940	$77,500		29	$1,936,940	$134,900	29	$0	$0	$599,900
20	CC	1002800584	ARANGO CALDERON EVER													X					25-14	1	$66,237	$10,600	EPS010	1	$66,237	$2,700	CCF11	1	$57,341	$2,300		1	$66,237	$0	1	$0	$0	$15,600
21	CC	1007415075	ARANGO TOBAR JAIDER DIOMEDES							X		X									230201	29	$1,928,429	$308,600	EPS037	29	$1,928,429	$77,200	CCF11	29	$1,928,429	$77,200		29	$1,928,429	$134,300	29	$0	$0	$597,300

2025/02/10 07:53 AM

| | | |

| | | |

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901740908	5	CONSORCIO SAN MIGUEL CALDAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	Carrera 48 No 48 Sur -75 BG163	NORCASIA-CALDAS	4483012	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1245830454	9481387858	E	2025/02/05	2025/02/05	BANCO POPULAR	0	$68,645,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				85	$31,408,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$1,595,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	10	$4,230,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	51	$19,124,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	20	$6,458,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				86	$12,643,600
COLMENA	14-25	800,226,175	3	86	$12,643,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				87	$8,229,000
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	23	$2,707,800
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	64	$5,521,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				86	$7,943,800
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$126,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$184,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$117,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	16	$1,598,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$260,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	34	$2,701,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$75,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	15	$1,482,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$815,000
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	7	$580,800
TOTAL				86	$60,224,500

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900102268	1	INGENIERIA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 48 48SUR -75 BG161	MONTELIBANO-CORDOBA	4483012	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1198325888	9480139865	E	2025/01/17	2025/01/16	BANCO DE OCCIDENTE	0	$337,775,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (19 Afiliados)																						$68,455,400	$11,023,800			$68,455,400	$2,732,200			$68,788,953	$2,695,900			$68,455,400	$3,982,200		$0	$0	$20,434,100
Centro de Trabajo: OBRA AMALFI (7 Afiliados)																						$30,012,126	$4,879,600			$30,012,126	$1,201,100			$30,571,289	$1,223,500			$30,012,126	$1,978,500		$0	$0	$9,282,700
Ciudad: ENVIGADO Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																						$7,700,000	$1,309,000			$7,700,000	$308,000			$7,700,000	$308,000			$7,700,000	$536,000		$0	$0	$2,461,000
1	CC	75088803	GARCIA CAMPIÑO RODRIGO																		25-14	30	$7,700,000	$1,309,000	EPS037	30	$7,700,000	$308,000	CCF03	30	$7,700,000	$308,000		30	$7,700,000	$536,000	30	$0	$0	$2,461,000
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (6 Afiliados)																						$22,312,126	$3,570,600			$22,312,126	$893,100			$22,871,289	$915,500			$22,312,126	$1,442,500		$0	$0	$6,821,700
2	CC	71626463	ARBELAEZ GARCES GONZALO ALONSO																		25-14	24	$2,877,600	$460,500	EPS010	24	$2,877,600	$115,200	CCF03	24	$2,877,600	$115,200		24	$2,877,600	$200,300	24	$0	$0	$891,200
3	CC	71626463	ARBELAEZ GARCES GONZALO ALONSO													X					25-14	5	$599,500	$96,000	EPS010	5	$599,500	$24,000	CCF03	5	$599,500	$24,000		5	$599,500	$0	5	$0	$0	$144,000
4	CC	71626463	ARBELAEZ GARCES GONZALO ALONSO													X					25-14	1	$119,900	$19,200	EPS010	1	$119,900	$4,800	CCF03	1	$119,900	$4,800		1	$119,900	$0	1	$0	$0	$28,800
5	CC	15458150	BETANCUR TABARES ALIRIO OSWALDO DE JESUS									X									25-14	30	$3,621,359	$579,500	EPS010	30	$3,621,359	$144,900	CCF03	30	$3,621,359	$144,900		30	$3,621,359	$252,100	30	$0	$0	$1,121,400
6	CC	71175211	CARDONA VASQUEZ RAUL ADRIAN									X									230301	30	$2,521,631	$403,500	EPS037	30	$2,521,631	$100,900	CCF03	30	$2,521,631	$100,900		30	$2,521,631	$175,600	30	$0	$0	$780,900
7	CC	16457957	DELGADO AVENDAÑO EDGAR									X									230301	27	$3,888,939	$622,300	EPS005	27	$3,888,939	$155,600	CCF03	27	$3,888,939	$155,600		27	$3,888,939	$270,700	27	$0	$0	$1,204,200
8	CC	16457957	DELGADO AVENDAÑO EDGAR													X					230301	3	$420,566	$67,300	EPS005	3	$420,566	$16,900	CCF03	3	$358,119	$14,400		3	$420,566	$0	3	$0	$0	$98,600
9	CC	10184841	LUNA CASTILLO NODIER									X									25-14	28	$3,709,679	$593,600	EPS037	28	$3,709,679	$148,400	CCF03	28	$4,452,768	$178,200		28	$3,709,679	$258,200	28	$0	$0	$1,178,400
10	CC	10184841	LUNA CASTILLO NODIER													X					25-14	1	$142,874	$22,900	EPS037	1	$142,874	$5,800	CCF03	1	$120,585	$4,900		1	$142,874	$0	1	$0	$0	$33,600
11	CC	10184841	LUNA CASTILLO NODIER													X					25-14	1	$142,874	$22,900	EPS037	1	$142,874	$5,800	CCF03	1	$113,334	$4,600		1	$142,874	$0	1	$0	$0	$33,300
12	CC	98661977	VERA CASTRILLON HECTOR ANDRES									X									25-14	29	$4,102,554	$656,500	EPS010	29	$4,102,554	$164,200	CCF03	29	$4,102,554	$164,200		29	$4,102,554	$285,600	29	$0	$0	$1,270,500
13	CC	98661977	VERA CASTRILLON HECTOR ANDRES													X					25-14	1	$164,650	$26,400	EPS010	1	$164,650	$6,600	CCF03	1	$95,000	$3,800		1	$164,650	$0	1	$0	$0	$36,800
Centro de Trabajo: OBRA DONMATIAS (8 Afiliados)																						$26,530,784	$4,238,000			$26,530,784	$1,054,300			$25,758,731	$973,700			$26,530,784	$1,519,900		$0	$0	$7,785,900
Ciudad: AGUA DE DIOS Depto: CUNDINAMARCA (2 Afiliados)																						$6,498,841	$1,032,400			$6,498,841	$252,600			$5,837,818	$176,400			$6,498,841	$180,600		$0	$0	$1,642,000
14	CC	79850925	GOMEZ ARARAT LIZARDO									X									230301	4	$375,361	$60,100	EPS017	4	$375,361	$15,100	CCF21	4	$375,361	$15,100		4	$375,361	$26,200	4	$0	$0	$116,500
15	CC	79850925	GOMEZ ARARAT LIZARDO													X					230301	15	$1,901,018	$304,200	EPS017	15	$1,901,018	$76,100	CCF21	15	$1,230,402	$49,300		15	$1,901,018	$0	15	$0	$0	$429,600
16	CC	79850925	GOMEZ ARARAT LIZARDO												X						230301	11	$1,244,565	$199,200	EPS017	11	$1,244,565	$49,800	CCF21	11	$1,244,565	$0		11	$1,244,565	$0	11	$0	$0	$249,000
17	CC	80157333	TIBAQUIRA VARGAS WILBER DAVID									X									25-14	22	$2,217,897	$354,900	EPS008	22	$2,217,897	$88,800	CCF21	22	$2,217,897	$88,800		22	$2,217,897	$154,400	22	$0	$0	$686,900
18	CC	80157333	TIBAQUIRA VARGAS WILBER DAVID													X					25-14	5	$475,000	$76,000	EPS008	5	$475,000	$19,000	CCF21	5	$484,593	$19,400		5	$475,000	$0	5	$0	$0	$114,400
19	CC	80157333	TIBAQUIRA VARGAS WILBER DAVID													X					25-14	1	$95,000	$15,200	EPS008	1	$95,000	$3,800	CCF21	1	$95,000	$3,800		1	$95,000	$0	1	$0	$0	$22,800
20	CC	80157333	TIBAQUIRA VARGAS WILBER DAVID											X							25-14	2	$190,000	$22,800	EPS008	2	$190,000	$0	CCF21	2	$190,000	$0		2	$190,000	$0	2	$0	$0	$22,800
Ciudad: ENVIGADO Depto: ANTIOQUIA (3 Afiliados)																						$9,620,077	$1,539,600			$9,620,077	$385,100			$9,509,047	$380,700			$9,620,077	$614,500		$0	$0	$2,919,900
21	CC	15274041	ECHEVERRI PULIDO CAMILO ADOLFO									X									25-14	26	$2,520,031	$403,300	EPS010	26	$2,520,031	$100,900	CCF03	26	$2,520,031	$100,900		26	$2,520,031	$175,400	26	$0	$0	$780,500
22	CC	15274041	ECHEVERRI PULIDO CAMILO ADOLFO													X					25-14	4	$380,804	$61,000	EPS010	4	$380,804	$15,300	CCF03	4	$301,279	$12,100		4	$380,804	$0	4	$0	$0	$88,400
23	CC	71684578	MARIN VELASQUEZ ALBEIRO DE JESUS									X									25-14	30	$4,217,691	$674,900	EPS002	30	$4,217,691	$168,800	CCF03	30	$4,217,691	$168,800		30	$4,217,691	$293,600	30	$0	$0	$1,306,100
24	CC	98502450	SEPULVEDA MONSALVE ALEANDRO NICOLAS									X									25-14	25	$2,089,488	$334,400	EPS010	25	$2,089,488	$83,600	CCF03	25	$2,089,488	$83,600		25	$2,089,488	$145,500	25	$0	$0	$647,100
25	CC	98502450	SEPULVEDA MONSALVE ALEANDRO NICOLAS													X					25-14	4	$329,650	$52,800	EPS010	4	$329,650	$13,200	CCF03	4	$307,224	$12,300		4	$329,650	$0	4	$0	$0	$78,300

| | | |

ACTA DE PROTOCOLIZACIÓN CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA – DEPARTAMENTO DE CALDAS

Acta de Protocolización de Cesión de Derechos Económicos del Contrato de Obra Pública derivado de la Licitación Pública No. LP-SI-004-2023 cuyo objeto es: ***MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS.***

Entre los suscritos a saber: **JORGE RICARDO GUTIÉRREZ CARDONA**, mayor de edad y vecino de Manizales, identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.253.209 Secretario de Despacho de la Secretaría de Infraestructura del Departamento de Caldas, cargo para el cual fue nombrado mediante el Decreto No. 296 del 28 de junio de 2024 y posesionado mediante Acta del 02 de julio de 2024, actuando como delegatario del señor Gobernador según la delegación realizada a través del Decreto No. 4 del 2024-01-01 Modificado por el Decreto 174 del 18 de abril de 2024 *"por medio del cual se delegan unas funciones en materia de contratación"*, quien en adelante se denominará **EL DEPARTAMENTO** de una parte, y de otra, el **CONSORCIO SAN MIGUEL** identificado con el NIT número 901.740.908-5 integrado por **HARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES S.A.S.** persona jurídica identificada con NIT 901.262.851-3, **GAMA INGENIEROS ARQUITECTOS S.A.S** identificada con el NIT 830.136.490-1 e **INGENIERÍA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S "INTRAMAQ SAS"** quien se identifica con el NIT 900.102.268-1; Consorcio representado por el señor **CARLOS IGNACIO CADAVID MEJÍA** quien se identifica con la cédula de ciudadanía número 71.788.628 de Medellín, quien para efectos del presente documento se denominará el **CEDENTE** y, el señor **JUAN CAMILO MEJIA LALINDE**, identificado con la cédula de ciudadanía número **71.607.654** quien funge como representante legal Suplente de la Sociedad **INGENIERÍA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S "INTRAMAQ SAS"** persona jurídica identificada con el NIT 900.102.268-1 en adelante el **CESIONARIO;** se suscribe la presente acta de protocolización de Cesión de Derechos Económicos, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES:

I. Que la Secretaría de Infraestructura del Departamento de Caldas suscribió el Contrato de Obra Pública número 29092023-1456 derivado de la Licitación LP-SI-004-2023 con el CONSORCIO SAN MIGUEL el cual tiene por objeto el ***MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS.***

II. Que, el contratista de Obra **CONSORCIO SAN MIGUEL**; mediante oficio fechado el día dieciocho (18) de octubre del año en curso, presentó a través de su representante **CARLOS IGNACIO CADAVID MEJÍA**, documento donde notifica a la Gobernación de Caldas de la Cesión de Derechos Económicos en el marco de la ejecución del proceso contractual antes referido.

Dicha comunicación fue acompañada con el "*Contrato de Cesión de Derechos Económicos"* y copia del *"Certificado Bancario"* emitido por la entidad financiera Banco de Occidente, donde se puede apreciar que la cuenta Corriente número *477-00558* está a nombre de la firma **INGENIERÍA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S "INTRAMAQ SAS";** contrato celebrado el día 18 de octubre de 2024 mediante

documento privado suscrito entre **CARLOS IGNACIO CADAVID MEJÍA** en calidad de CEDENTE, y el señor **JUAN CAMILO MEJIA LALINDE**, identificado con la cédula de ciudadanía número **71.607.654** quien funge como representante legal de la Sociedad **INGENIERÍA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S "INTRAMAQ SAS",** persona jurídica identificada con el NIT 900.102.268-1 en calidad de CESIONARIO.

III. Que, la Cesión de Derechos Económicos deviene del acuerdo civil, privado y particular entre las partes que lo acuerdan, esto se ve reflejado y materializado por Cedente y Cesionario en el acuerdo de voluntades que, para el caso concreto aporta el contratista de obra.

IV. Que, el contrato de Cesión de Derechos Económicos se suscribió como documento privado y fue aportado por el representante del CONSORCIO SAN MIGUEL tal como se puede evidenciar en la copia allegada por el Contratista con el oficio del 18 de octubre.

V. Que, de acuerdo con la ejecución restante del contrato de obra y la meta física pendiente por realizar a la fecha, el valor a pagar del contrato, asciende a la suma de **SETENTA Y CUATRO MIL MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS VEINTE PESOS ($74.773.545.320).**

VI. Que, a propósito de la cesión de Derechos Económicos o cesión de créditos derivados de un contrato estatal, ha manifestado el Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera - Subsección C, con ponencia del Consejero Enrique Gil Botero[1] que:

> ***"En la cesión de crédito derivado de un contrato, el contratista cedente sigue siendo contratista del Estado, y el derecho al pago es el que se traslada a otra persona, que sin duda es un tercero en la negocial (...). La cesión de un crédito contractual no modifica la relación contractual, sino al titular del derecho al pago (...). La cesión de crédito solo transfiere el cesionario el derecho al pago de un crédito, y no se asumen cargas u obligaciones derivadas de la relación contractual de donde proviene la deuda. (...)".***

VII. Que, Respecto al fundamento doctrinario, COLOMBIA COMPRA EFICIENTE emitió concepto No. 4201714000004797 - cesión derechos económicos, 2018-04-17: "(...) en el contrato de cesión de derechos económicos debe quedar expresado el valor a ceder. La cesión de derechos económicos de un contrato estatal está permitida y produce efectos cuando: (i) hay un acuerdo entre el cedente (acreedor del derecho de crédito) y cesionario, y (ii) es aceptada por la Entidad Estatal (...)". Por ende, de los referidos desarrollos doctrinario y jurisprudencial, se puede concluir que un contratista está en capacidad legal de ceder a un tercero los créditos por concepto de honorarios causados a su favor en los términos de los artículos 1959 y siguientes del Código Civil, y que una vez cedido el crédito, el cesionario puede proceder al cobro de dicha acreencia a la entidad deudora presentando el documento a que haya lugar según la normatividad que le aplique.

[1] **Bogotá, veinticinco (25) de abril de dos mil doce (2012). 25000- 23-26-000-1994-09759-01(20817)**

VIII. Que, el Contratista CONSORCIO SAN MIGUEL, hoy en calidad de CEDENTE de los créditos económicos del contrato de Obra Pública derivado de la Licitación No. LP-SI-004-2023, declara con la suscripción del contrato de Cesión de Derechos Económicos, que no se encuentra incurso en demandas o en fallos judiciales donde se ordenen cumplimientos de obligaciones, que puedan defraudar acreedores y terceros con la cesión de los créditos derivados del contrato estatal; de lo contrario, la Gobernación de Caldas representada en la Secretaría de Infraestructura, no asumirá responsabilidades y anulará la aceptación de la Cesión de los Derechos Económicos aquí materializada.

IX. Que el supervisor del contrato, mediante oficio del 28 de octubre de 2024 solicitó al Secretario de Infraestructura, aprobar la Cesión de Derechos Económicos presentada por el señor CARLOS IGNACIO CADAVID MEJÍA corroborando que a la fecha, el contratista se encuentra ejecutando el objeto contractual y que existen pagos pendientes de realizar, sujetos al avance y a la ejecución del contrato.

X. Que, la Gobernación de Caldas contempla en el Manual de Contratación - Decreto 633 del 29 de noviembre de 2022, subnumeral 8.5, las modificaciones durante la ejecución contractual incluyendo la Cesión de los Derechos Económicos, estableciendo que será la entidad contratante quien autorice previa verificación, dicha Cesión de Derechos Económicos, advirtiendo que en ningún caso el contratista se sustraerá de sus obligaciones primigenias.

XI. Que, en virtud de la Cesión de Derechos Económicos realizada por el **CONSORCIO SAN MIGUEL** quien se identifica con el NIT número 901.740.908-5 y está representado legalmente por el señor CARLOS IGNACIO CADAVID MEJÍA, **identificado con cedula de ciudadanía número 71.788.628 Medellín, al señor JUAN** CAMILO MEJIA LALINDE identificado con la cédula de ciudadanía número 71.607.654 quien funge como representante legal Suplente de la Sociedad **INGENIERÍA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S "INTRAMAQ SAS"** persona jurídica identificada con el NIT 900.102.268-1; la Secretaría de Infraestructura del Departamento de Caldas, realiza las siguientes constancias:

A. Que de acuerdo al documento privado suscrito entre los particulares, se realiza la Cesión de Derechos Económicos del 18 de octubre de 2024, la cual en ningún momento puede entenderse como la Cesión de la Posición Contractual ni como la Cesión plena del Contrato de obra, mismo que fuere adjudicado al **CONSORCIO SAN MIGUEL** en el la Licitación Pública No. LP-SI-004-2023 de la cual derivó el Contrato 29092023-1456.

B. Que, el **CONSORCIO SAN MIGUEL** quien se identifica con el NIT número 901.740.908-5 y está representado por el señor **CARLOS IGNACIO CADAVID MEJÍA** identificado con la cédula de ciudadanía 71.788.628, es el responsable de las obligaciones contractuales que le asisten en virtud del contrato de Obra Pública No. 29092023-1456 derivado de la Licitación LP-SI-004-2023.

C. Que, la Gobernación de Caldas – Secretaría de Infraestructura, en su condición de deudor cedido, conserva la potestad de oponer al cesionario o nuevo acreedor de las prestaciones económicas derivadas de la ejecución y cumplimiento del contrato 29092023-1456, las mismas excepciones que

hubiera podido oponer al Contratista cedente, que se encuentren fundamentadas en la falta de cumplimiento, cumplimiento defectuoso o cumplimiento tardío por su parte, de las obligaciones derivadas de dicho Contrato.

D. Se precisa que la cesión de derechos económicos realizada por el **CONSORCIO SAN MIGUEL.**, es sin perjuicio de eventuales multas o sanciones que se pudieran imponer al contratista por incumplimientos dentro del negocio jurídico celebrado con la entidad estatal, las cuales le serán descontadas del saldo pendiente de ejecutar dentro del contrato, y tendrán alcance sobre los derechos del Cesionario de los derechos económicos.

E. Bajo las condiciones señaladas, la Secretaría de Infraestructura de Caldas tramita la Cesión de Derechos Económicos correspondiente a **SETENTA Y CUATRO MIL MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE. ($74.773.545.320)** del valor total del Contrato de Obra, y en favor del Cesionario JUAN CAMILO MEJIA LALINDE identificado con la cédula de ciudadanía número 71.607.654 quien funge como representante legal Suplente de la Sociedad **INGENIERÍA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S "INTRAMAQ SAS".**

Para constancia se suscribe el presente documento a los treinta y un (31) días del mes de octubre de dos mil veinticuatro (2024).

JORGE RICARDO GUTIÉRREZ CARDONA
Secretario de Despacho
Secretaría de Infraestructura de Caldas

CARLOS IGNACIO CADAVID MEJÍA
R.L. CONSORCIO SAN MIGUEL
Cedente

JUAN CAMILO MEJIA LALINDE
R.L. INGENIERIA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S. "INTRAMAQ SAS"
Cesionario

Proyectó: *Juan Carlos Velásquez Franco*
Profesional Universitario – Secretaría de Infraestructura

Revisó y Complementó: *Laura Viviana Ramírez Rey*
Profesional Especializada – Secretaría Jurídica

Envigado, 18 de octubre de 2024

Señores
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
Gobernación de Caldas
Atn. Ingeniero Juan David Duque Pedraza
Supervisor Contrato
Manizales

Asunto: Notificación - Cesión de Derechos Económicos

Respetados Señores:

Obrando en condición de representante legal del **CONSORCIO SAN MIGUEL**, con NIT. 901.740.908-5, me permito notificar a ustedes, que hemos CEDIDO DE MANERA IRREVOCABLE, en favor de la sociedad **INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA SAS - INTRAMAQ** con NIT. 900.102.268-1, todos los derechos de carácter económico que de la calidad de Contratista se derivan para mi representada del contrato No. LP-SI-004-2023 de 2023, cuyo objeto consiste en "**MEJORAMIENTO DE LA VIA DORADA – SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS**", sus otrosí, adiciones y modificaciones.

En razón de lo anterior, me permito instruirlos para que, a partir de la fecha, la totalidad de los pagos a que haya lugar por todo concepto derivado del citado contrato, sus prórrogas, renovaciones, reclamaciones, retenciones y/o modificaciones, sean cancelados directamente a la compañía cesionaria a la cuenta corriente Nº 477-005581 de Banco de Occidente en la forma con ella definida, así la cesión no conste en el contrato y/o sus modificaciones, actas, facturas o cuentas de cobro y sin que sea necesario trámite adicional alguno.

La presente instrucción irrevocable, estará vigente hasta el día hábil siguiente a la fecha en que, mediante comunicación escrita, la sociedad **INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA SAS - INTRAMAQ,** ponga en su conocimiento que la instrucción que hoy se imparte ha sido suspendida o terminada.

Cualquier pago en desconocimiento de esta instrucción se entenderá por no realizado.

Siguiendo el conducto regular, solicitamos se proceda por su parte a notificar a la secretaria de Hacienda de esa entidad contratante, para los trámites respectivos.

Les agradecemos confirmar la recepción de esta comunicación por escrito, dirigido a **CONSORCIO SAN MIGUEL** y a **INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA SAS – INTRAMAQ.**

Carrera 48 # 48sur-75, Bodega 163
Envigado – Antioquia
Teléfono: 604 4483012

CONSORCIO
SAN MIGUEL
CALDAS

Datos Cesionario:	INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA SAS - INTRAMAQ
Dirección:	Cra 48 # 48Sur 75, Bodega 163, Centro Múltiple Las Vegas
Municipio:	Envigado (Antioquia)
Teléfono:	604 4483012
E-mail:	direccionjuridica@intramaq.co

Datos Cedente:	Consorcio San Miguel
Dirección:	Cra 48 # 48Sur 75, Bodega 163, Centro Múltiple Las Vegas
Municipio:	Envigado (Antioquia)
Teléfono:	3104073291
E-mail:	csanmiguelcaldas@gmail.com

Cordialmente,

CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
Representante Legal
Consorcio San Miguel
CC. 71.788.628
Teléfono: 3104073291

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141125720461

(415)7707212489984(8020) 000014112572046 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 1 0 2 2 6 8	1	Impuestos de Medellín	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INGENIERIA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla
INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S.	INTRAMAQ S.A.S

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Envigado 2 6 6

41. Dirección principal
CR 48 48 SUR 75 BG 163

42. Correo electrónico direccionadministrativa@intramaq.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 4 4 4 8 3 0 1 2	3 1 0 4 6 1 3 5 1 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 0 6 0 7 1 3	4 3 9 0	2 0 0 6 0 7 1 3		4 2 9 0	4 9 2 3		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar 52 - Facturador electrónico
07- Retención en la fuente a título de rent 55 - Informante de Beneficiarios Finales
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código 2 2 2 3	55. Forma 3 / 56. Tipo 1 / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 09 - 16 / 10 : 41: 34

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre CADAVID MEJIA CARLOS IGNACIO
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 16-09-2024 10:42:07AM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141125720461

(415)7707212489984(8020) 000014112572046 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 1 0 2 2 6 8	1	Impuestos de Medellín	1 1	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o insitutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	0 1 6 3 4	4 1
73. Fecha	2 0 0 6 0 7 1 3	2 0 2 0 1 1 1 8
74. Número de notaría	7	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 0 0 2 0 1	2 0 2 0 1 2 2 9
77. No. Matrícula mercantil	0 0 3 6 7 8 7 8 0 4	0 0 1 3 5 8 9 7
78. Departamento	0 5	0 5
79. Ciudad/Municipio	0 2 1	0 5 5
Vigencia		
80. Desde	2 0 0 6 0 7 1 3	2 0 0 6 0 7 1 3
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	2 0 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 9 0 4 1 5		-
2	2 1	2 0 1 5 1 0 2 6		-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 5 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141125720461

(415)7707212489984(8020) 000014112572046 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 1 0 2 2 6 8	1	Impuestos de Medellín	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 2 0 4 1 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 1 7 8 8 6 2 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CADAVID	MEJIA	CARLOS	IGNACIO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 0 2 2 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 1 6 0 7 6 5 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MEJIA	LALINDE	JUAN	CAMILO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 16-09-2024 10:42:07AM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 4 de 5 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141125720461

(415)7707212489984(8020) 000014112572046 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 1 0 2 2 6 8	1	Impuestos de Medellín	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 3 7 5 7 9 8 8 4		1 5 1 6 3 7 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
LOPEZ	ARANGO	ZULIMA	

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada
8 1 1 0 4 4 4 0 6	8	RUSSELL BEDFORD GCT S.A.S.

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 4 0 2 2 1

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 3 7 6 6 7 3 5 8	1	3 1 9 2 0 1 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
ORTIZ	LONDOÑO	ESTEBAN	

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada
8 1 1 0 4 4 4 0 6	8	RUSSELL BEDFORD GCT S.A.S.

147. Fecha de nombramiento
2 0 2 4 0 4 0 5

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 8 2 9 0 6 9 9 3	7	1 8 8 8 1 6 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
BAENA	DIAZ	JUAN	JOSE

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 4 0 3 1 5

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 5 de 5 **Hoja 6**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141125720461

(415)7707212489984(8020) 000014112572046 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 1 0 2 2 6 8	1	Impuestos de Medellín	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Construcción de otras obras de ingeniería civil 4 2 9 0

162. Nombre del establecimiento: INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Antioquia 0 5	Envigado 2 6 6

165. Dirección: CR 48 48 SUR 75 BG 161

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 0 0 0 4 3 2 2 8 0	2 0 0 6 0 8 2 3
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
4 4 8 3 0 1 2	2 0 1 0 0 1 0 5

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Construcción de otras obras de ingeniería civil 4 2 9 0

162. Nombre del establecimiento: INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S A S

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Antioquia 0 5	Envigado 2 6 6

165. Dirección: CR 48 48 SUR 75 BG 161

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 0 1 3 5 9 2 7	2 0 1 0 0 2 0 2
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14992489563

(415)7707212489984(8020) 000001499248956 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 4 0 9 0 8	5	Impuestos de Medellín	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO SAN MIGUEL

36. Nombre comercial	37. Sigla
CONSORCIO SAN MIGUEL - CALDAS	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Envigado 2 6 6

41. Dirección principal
CR 48 48 SUR 75 163

42. Correo electrónico		
analistacontable@intramaq.co		

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 4 4 4 8 3 0 1 2	3 1 0 4 6 1 3 5 1 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 3 0 5 1 2						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 7 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20)	55. Forma 56. Tipo; Servicio 1 2 3; 57. Modo; 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 03 - 15 / 09 : 15: 05

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CADAVID MEJIA CARLOS IGNACIO

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 12-06-2024 02:56:20PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14992489563

(415)7707212489984(8020) 000001499248956 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 4 0 9 0 8	5	Impuestos de Medellín	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 3 0 5 1 2	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	0 5	
79. Ciudad/Municipio	2 6 6	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 3 0 5 1 2	
81. Hasta	2 0 2 9 0 5 1 2	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 2 3 0 8 0 8		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14992489563

(415)7707212489984(8020) 000001499248956 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 7 4 0 9 0 8	5	Impuestos de Medellín	1 1	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 0 5 1 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	7 1 7 8 8 6 2 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CADAVID	MEJIA	CARLOS	IGNACIO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 3 0 5 1 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	5 2 8 6 2 2 5 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GALAN	RAMIREZ	ANA	CAROLINA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14992489563

(415)7707212489984(8020) 000001499248956 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 4 0 9 0 8	5	Impuestos de Medellín	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 31	9 0 0 1 0 2 2 6 8	1	COLOMBIA 169

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: INGENIERIA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	45	2023/05/12	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 31	9 0 1 2 6 2 8 5 1	3	COLOMBIA 169

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: HARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	10	2023/05/15	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 31	8 3 0 1 3 6 4 9 0	1	COLOMBIA 169

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: GAMA INGENIEROS ARQUITECTOS S A S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	45	2023/05/15	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14992489563

(415)7707212489984(8020) 000001499248956 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 4 0 9 0 8	5	Impuestos de Medellín 1 1	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 8 2 9 0 6 9 9 3	7	1 8 8 8 1 6 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
BAENA	DIAZ	JUAN	JOSE

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 4 0 3 1 5

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

CONSORCIO
SAN MIGUEL
CALDAS

CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° LP-SI-004-2023 DE 2023, SUSCRITO CON LA GOBERNACIÓN DE CALDAS - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Entre los suscritos a saber **CARLOS IGNACIO CADAVID MEJÍA,** identificado con cedula de ciudadanía No. **71.788.628,** en representación legal del **CONSORCIO SAN MIGUEL** con NIT. **901.740.908-5,** quien en adelante se denominará **EL CEDENTE,** y **JUAN CAMILO MEJÍA LALINDE**, identificado con cedula de ciudadanía N° **71.607.654**, obrando como representante legal suplente de **INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S. - INTRAMAQ**, con NIT. **900.102.268-1,** quien en adelante se denominará **EL CESIONARIO**, han convenido celebrar el siguiente contrato de cesión de derechos económicos del contrato de obra pública N° **LP-SI-004-2023 de 2023,** cuyo objeto es: "**MEJORAMIENTO DE LA VIA DORADA – SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS",** suscrito con El Departamento de Caldas - Secretaría de Infraestructura, el día 27 de septiembre de 2023. El siguiente contrato de cesión de derechos económicos, está sujeto al sucesivo clausulado:

PRIMERA. OBJETO. EL CEDENTE transfiere de manera total y sin limitación alguna al CESIONARIO, todos los derechos económicos que le corresponden sobre la obra fruto del contrato N° LP-SI-004-2023 de 2023, suscrito con el Departamento de Caldas; por el plazo de ejecución del contrato que establezca esta Entidad Estatal. En virtud de lo anterior, se entiende que el CESIONARIO adquiere exclusivamente los derechos económicos de la totalidad del objeto contractual. A la fecha de celebración de este documento, la cifra asciende a **SETENTA Y CUATRO MIL MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS VEINTE PESOS** ($74.773.545.320), más las adiciones futuras que tenga el contrato, las cuales se entienden y pactan sin límite de valor.

SEGUNDA. OBLIGACIONES CONTRACTUALES. El CEDENTE, solo entrega los derechos económicos, las obligaciones de ejecución emanadas del contrato, continúan en cabeza de este.

TERCERA. LEGITIMIDAD DE LOS DERECHOS. Por virtud de este contrato, EL CEDENTE garantiza que suscribió el contrato N° LP-SI-004-2023 de 2023, con el Departamento de Caldas, Secretaría de Infraestructura, por lo tanto, puede transferir los derechos económicos aquí cedidos sin ningún tipo de limitación. En todo caso, responderá por

CONSORCIO
SAN MIGUEL
CALDAS

cualquier reclamo que en materia de derecho se pueda presentar, exonerando de cualquier responsabilidad al CESIONARIO. Es obligación del CEDENTE realizar todos los trámites necesarios ante la entidad contratante, se deja expresamente aclarado, que, al no ser una cesión de los derechos y obligaciones contractuales, no requerirá aprobación de la entidad contratante.

CUARTA. CONDICIONES. Como contraprestación a la cesión de Derechos económicos, se acepta que el CEDENTE recibió suma de dinero igual para efecto de solventar los gastos generados por la ejecución del contrato.

QUINTA. IRREVOCABILIDAD. EL CEDENTE, dará instrucción a la entidad contratante (Gobernación de Caldas), de girar a la cuenta del CESIONARIO, los valores a pagar por cualquier concepto que se genere con ocasión de la ejecución del LP-SI-004-2023 de 2023, dicha instrucción será irrevocable y subsistirá mientras existan valores a pagar por esa ejecución contractual.

El presente documento presta mérito ejecutivo.

En constancia se firma el presente contrato de cesión de DERECHOS ECONÓMICOS a los 18 días del mes de octubre del año 2024.

CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
Representante legal
CONSORCIO SAN MIGUEL

CEDENTE

JUAN CAMILO MEJIA LALINDE
Representante Legal (s)
INGENIERIA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA SAS - INTRAMAQ
CESIONARIO

Manizales, 28 de octubre de 2024

Doctor:
JORGE RICARDO GUTIÉRREZ CARDONA
Secretario de Infraestructura
Gobernación de Caldas

Asunto: Solicitud de Aval para Cesión de Derechos Económicos.

Referencia: Contrato de Obra No. 29092023-1456.

Respetado Secretario.

En atención del asunto en referencia, me permito solicitar comedidamente sea revisada la posibilidad de avalar la Cesión de Derechos Económicos presentada por el señor Carlos Ignacio Cadavid Mejía quien actúa en calidad de Representante del CONSORCIO SAN MIGUEL; contratista de obra dentro del proyecto que tiene por objeto el ***"MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS"***.

En mi condición de supervisor del contrato de obra en mención, previa revisión de la solicitud realizada por el contratista, y habiendo sido revisado el negocio jurídico celebrado entre Carlos Ignacio Cadavid Mejía identificado con la cédula de ciudadanía número 71.788.628 (Representante Legal Contratista de Obra CONSORCIO SAN MIGUEL) en calidad de Cedente, y el señor Juan Camilo Mejía Lalinde, identificado con la cédula de ciudadanía número 71.607.654 quien funge como representante legal Suplente de la Sociedad **INGENIERIA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S. "INTRAMAQ"**, persona jurídica identificada con el NIT 900.102.268-1 y quien para efectos del Contrato privado sería el Cesionario de los Derechos Económicos o dinerarios a los que tuviere lugar el CONSORCIO SAN MIGUEL; manifiesto que no encuentro situaciones que obstaculicen o impidan aceptar el acuerdo de voluntades que presenta el señor Carlos Ignacio Cadavid Mejía con el señor Juan Camilo Mejía Lalinde, con ocasión del Contrato de Obra Celebrado con el Departamento de Caldas – Secretaría de Infraestructura.

Por lo anterior, recomiendo aceptar la Cesión de Derechos Económicos solicitada, sin perjuicio de las obligaciones endilgables al Cedente y al Cesionario.

Atentamente,

JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA
Jefe Unidad de Ingeniería
Secretaría de Infraestructura

Manizales, 31 de octubre de 2024

Ingeniero
JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA
Jefe Unidad de Ingeniería
Secretaría de Infraestructura

Asunto: Aval solicitud de Cesión de Derechos Económicos dentro del Contrato de Obra Pública 29092023-1456.

Atendiendo la solicitud realizada por el supervisor del contrato, quien, mediante documento del 28 de octubre de 2024, manifestó que era viable autorizar la cesión de derechos económicos presentada por el representante legal del CONSORCIO SAN MIGUEL, contratista de obra que viene desarrollando el contrato 29092023-1456 que tiene por objeto el ***"MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS"***.

Asimismo, analizada la solicitud de revisión y aprobación presentada por el señor Carlos Ignacio Cadavid Mejía, representante del CONSORCIO SAN MIGUEL, solicitud que viene acompañada del "Contrato de Cesión de Derechos Económicos" celebrado con el señor Juan Camilo Mejía Lalinde, identificado con la cédula de ciudadanía número 71.607.654, representante legal de la Sociedad **INGENIERIA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S.** persona jurídica identificada con el NIT 900.102.268-1, quien sería el Cesionario de los Derechos Económicos o dinerarios del CONSORCIO SAN MIGUEL; se observa que es viable avalar dicho negocio jurídico por medio del cual el contratista hace entrega de los derechos dinerarios o económicos a los que tuviere lugar dentro de la ejecución contractual.

Dicho lo anterior, se reitera la viabilidad y aceptación de la Cesión de los Derechos Económicos planteada por el contratista CONSORCIO SAN MIGUEL, advirtiendo que no se podrá sustraer de las obligaciones contractuales a las que se obligó con la suscripción del contrato estatal 29092023-1456.

Atentamente,

JORGE RICARDO GUTIÉRREZ CARDONA
Secretario de Despacho
Secretaría de Infraestructura

Proyectó: Juan Carlos Velásquez Franco
Abogado Contratista – Secretaría Jurídica

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 14935615047

(415)7707212489984(8020) 000001493561504 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 4 0 9 0 8	5	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO SAN MIGUEL

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Envigado 2 6 6

41. Dirección principal
CR 48 48 SUR 75 163

42. Correo electrónico licitaciones@intramaq.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 4 4 4 8 3 0 1 2	3 1 0 4 6 1 3 5 1 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 3 0 5 1 2						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 7	1	4	4	2	4	8	5	5																	

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros										Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código												57. Modo			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 2 61. Fecha 2023 - 08 - 08 / 15 : 22: 02

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre RONCALLO BETANCUR ERIKA PATRICIA
985. Cargo Gestor I

Fecha generación documento PDF: 08-08-2023 03:22:04PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
FOR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 4 **Hoja 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14935615047

(415)7707212489984(8020) 000001493561504 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 4 0 9 0 8	5	Impuestos de Medellín 1 1	

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 3 0 5 1 2	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	0 5	
79. Ciudad/Municipio	2 6 6	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 3 0 5 1 2	
81. Hasta	2 0 2 9 0 5 1 2	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 2 3 0 8 0 8		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 08-08-2023 03:22:04PM

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14935615047

(415)7707212489984(8020) **000001493561504 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 7 4 0 9 0 8	5	Impuestos de Medellín	1 1	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación			
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 0 5 1 2			
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**		**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 1 7 8 8 6 2 8			
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**		**107. Otros nombres**
CADAVID	MEJIA	CARLOS		IGNACIO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**		

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación			
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 3 0 5 1 2			
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**		**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadan 1 3	5 2 8 6 2 2 5 8			
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**		**107. Otros nombres**
GALAN	RAMIREZ	ANA		CAROLINA
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**		

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**		**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**		**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**		

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**		**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**		**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**		

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**		**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**		**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**		

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Página 4 de 4 **Hoja 4**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14935615047

(415)7707212489984(8020) **000001493561504 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 7 4 0 9 0 8	5	Impuestos de Medellín	1 1	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 1 0 2 2 6 8	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: INGENIERIA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	4 5	2 0 2 3 0 5 1 2	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 2 6 2 8 5 1	3	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: HARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	1 0	2 0 2 3 0 5 1 5	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 3 0 1 3 6 4 9 0	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: GAMA INGENIEROS ARQUITECTOS S A S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	4 5	2 0 2 3 0 5 1 5	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14989516799

(415)7707212489984(8020) 000001498951679 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 1 0 2 2 6 8	1	Impuestos de Medellín	1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INGENIERIA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla
INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S.	INTRAMAQ S.A.S

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Envigado 2 6 6

41. Dirección principal
CR 48 48 SUR 75 BG 163

42. Correo electrónico facturacionelectronica@intramaq.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	4 4 8 3 0 1 2	3 1 0 4 6 1 3 5 1 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 0 6 0 7 1 3	4 2 1 0	2 0 0 6 0 7 1 3	4 3 1 2	4 3 9 0		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código 2 2 2 3

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 03 - 08 / 13 : 50: 14

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre CADAVID MEJIA CARLOS IGNACIO
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 08-03-2024 01:51:36PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14989516799

(415)7707212489984(8020) **000001498951679 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 1 0 2 2 6 8	1	Impuestos de Medellín	1 1	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	0 1 6 3 4	3 3
73. Fecha	2 0 0 6 0 7 1 3	2 0 1 7 0 2 0 9
74. Número de notaría	7	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 0 0 2 0 1	2 0 1 7 0 5 0 8
77. No. Matrícula mercantil	0 0 3 6 7 8 7 8 0 4	0 0 1 3 5 8 9 7
78. Departamento	0 5	0 5
79. Ciudad/Municipio	0 2 1	0 5 5
Vigencia		
80. Desde	2 0 0 6 0 7 1 3	2 0 0 6 0 7 1 3
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	2 0 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 9 0 4 1 5		-
2	2 1	2 0 1 5 1 0 2 6		-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 08-03-2024 01:51:36PM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14989516799

(415)7707212489984(8020) **000001498951679 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 1 0 2 2 6 8	1	Impuestos de Medellín	1 1	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 2 0 4 1 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 1 7 8 8 6 2 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CADAVID	MEJIA	CARLOS	IGNACIO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 9 0 4 1 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 1 6 0 7 6 5 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MEJIA	LALINDE	JUAN	CAMILO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14989516799

(415)7707212489984(8020) **000001498951679 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 1 0 2 2 6 8	1	Impuestos de Medellín	1 1	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 1 7 8 8 6 2 8		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
CADAVID	MEJIA	CARLOS	IGNACIO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 5 0 3 2 0	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	3 2 4 8 9 3 2 8		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
MEJIA	DE CADAVID	ANA	MARIA LUISA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 5 0 3 2 0	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	9 8 5 6 2 6 5 2		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
CADAVID	MEJIA	JUAN	FELIPE

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 5 0 3 2 0	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	7 0 5 5 0 1 9 7		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
ECHAVARRIA	SOTO	ROBERTO	ALONSO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 5 0 3 2 0	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	7 1 6 0 7 6 5 4		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
MEJIA	LALINDE	JUAN	CAMILO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 5 0 3 2 0	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14989516799

(415)7707212489984(8020) 000001498951679 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 1 0 2 2 6 8	1	Impuestos de Medellin	1 1	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	4 3 1 5 6 7 1 5		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
GARCIA	HENAO	SANDRA	MARIA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 5 0 3 2 0	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	8 3 1 5 3 4 9		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
CADAVID	RESTREPO	GABRIEL	LORENZO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 5 0 3 2 0	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 5 3 4 9 6 3 1		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
URIBE	DIAZ	JUAN	RAFAEL

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 5 0 3 2 0	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	4 2 8 9 5 3 4 5		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
RESTREPO	PAREJA	DIANA	MARIA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 5 0 3 2 0	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	4 2 9 7 1 6 4 4		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
MEJIA	LALINDE	CLARA	OLGA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 5 0 3 2 0	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 6 de 7 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14989516799

(415)7707212489984(8020) 000001498951679 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 1 0 2 2 6 8	1	Impuestos de Medellin	1 1	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 3 7 5 7 9 8 8 4		1 5 1 6 3 7 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
LOPEZ	ARANGO	ZULIMA	

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada
8 1 1 0 4 4 4 0 6	8	RUSSELL BEDFORD GCT S.A.S.

135. Fecha de nombramiento: 2 0 2 4 0 2 2 1

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 5 2 4 6 3 7 2 5	0	3 0 1 1 0 7 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
MURIEL	MANRIQUE	JUAN	PABLO

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada
8 1 1 0 4 4 4 0 6	8	RUSSELL BEDFORD GCT S.A.S.

147. Fecha de nombramiento: 2 0 2 4 0 2 2 1

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento:

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14989516799

(415)7707212489984(8020) **000001498951679 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 1 0 2 2 6 8	1	Impuestos de Medellin	1 1	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Construcción de otras obras de ingeniería civil 4 2 9 0	

162. Nombre del establecimiento: INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Antioquia 0 5	Envigado 2 6 6	

165. Dirección: CR 48 48 SUR 75 BG 161

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 0 0 0 4 3 2 2 8 0	2 0 0 6 0 8 2 3
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
4 4 8 3 0 1 2	2 0 1 0 0 1 0 5

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Construcción de otras obras de ingeniería civil 4 2 9 0	

162. Nombre del establecimiento: INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S A S

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Antioquia 0 5	Envigado 2 6 6	

165. Dirección: CR 48 48 SUR 75 BG 161

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 0 1 3 5 9 2 7	2 0 1 0 0 2 0 2
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14968923288

(415)7707212489984(8020) 00000149689232 8 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 3 0 1 3 6 4 9 0	1	Impuestos de Bogotá	3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
GAMA INGENIEROS ARQUITECTOS S A S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 140 11 45 TO HHC OF 601

42. Correo electrónico areacontablegama@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 1 4 7 4 6 1	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 1 3 0 3 1 9	7 1 1 2	2 0 1 3 0 3 1 9		4 2 1 0	4 9 2 3		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	8	9	1 4	4 2	4 8	5 2	5 5																	

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 12 - 22 / 12 : 05: 08

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre GALAN RAMIREZ ANA CAROLINA
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 02-02-2024 04:35:33PM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14968923288

(415)7707212489984(8020) **000001496892328 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 3 0 1 3 6 4 9 0	1	Impuestos de Bogotá	3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	
72. Número	2 9 0	
73. Fecha	2 0 0 4 0 2 2 3	
74. Número de notaria	4 4	
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 0 4 0 3 0 4	
77. No. Matrícula mercantil	0 1 3 5 0 7 2 9	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 0 4 0 3 0 4	
81. Hasta	2 0 2 4 0 2 2 3	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14968923288

(415)7707212489984(8020) **000001496892328 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 3 0 1 3 6 4 9 0	1	Impuestos de Bogotá	3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 2 0 6 2 1		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	5 2 8 6 2 2 5 8		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GALAN	RAMIREZ	ANA	CAROLINA
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 2 0 6 2 1		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 2 0 7 3 6 7 1 4		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GALAN	RAMIREZ	CARLOS	MARCELO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14968923288

(415)7707212489984(8020) **000001496892328 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 3 0 1 3 6 4 9 0	1	Impuestos de Bogotá	3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 1 6 1 1 7 3 6		7 8 8 2 6 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
MARTINEZ	LOPEZ	NELLY	ESPERANZA

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento: 2 0 2 3 1 2 2 2

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	3 2 8 3 4 9 5 7	9	1 0 2 5 0 9 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
FONTALVO	MOLINA	DIANA	LUZ

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento: 2 0 2 3 1 2 2 2

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 1 6 0 5 5 2 3 3	5	2 5 6 5 1 8 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
ORTEGA	ACOSTA	IVID	YURANY

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 2 3 0 2 0 3

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto [0 2] Actualización

4. Número de formulario 14849110727

(415)7707212489984(8020) 000001484911072 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 6 2 8 5 1	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
HARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 42 A 9 13 OF 201

42. Correo electrónico contabilidadhnvi.es@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 0 6 8 8 6 6 0 5	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 3 9 0	2 0 1 9 0 3 0 7	4 9 2 2	2 0 1 9 0 3 0 7	4 2 9 0	4 6 6 3		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
5	7	1	4	8	5	2																			

53. Código

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

54. Código

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 08 - 16 / 11 : 49: 57

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre NAVARRO PEROMINGO ALFONSO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 13-04-2023 05:00:13PM

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14849110727

(415)7707212489984(8020) **000001484911072 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 2 6 2 8 5 1	3	Impuestos de Bogotá	3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 9 0 3 0 7	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 9 0 3 0 7	
77. No. Matricula mercantil	0 0 0 3 0 7 9 6 4 9	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 9 0 3 0 7	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 8	2 0 1 9 0 3 0 7		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14849110727

(415)7707212489984(8020) **000001484911072 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 2 6 2 8 5 1	3	Impuestos de Bogotá	3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 9 0 3 0 7		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Pasaporte 4 1	P A I 0 5 7 4 7 4		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
NAVARRO	PEROMINGO	ALFONSO	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 4 de 4 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14849110727

(415)7707212489984(8020) 000001484911072 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 2 6 2 8 5 1	3	Impuestos de Bogotá	3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	4 0 1 8 9 5 2 4		2 1 3 5 1 5 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
USECHE	CONTRERAS	SANDRA	PATRICIA

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 1 9 0 7 0 3

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

GOBIERNO DE CALDAS	GOBERNACION DE CALDAS Secretaria de Infraestructura	Hoja No 1 de 1
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS	

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS**	
PREACTA OBRA No:	14	
PERIODO:	DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 25 DE ENERO DE 2025	
CONTRATO DE OBRA No:	29092023-1456	**CONSORCIO SAN MIGUEL**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA	1071 DE 2022	**MAB INGENIERIA DE VALOR**

ACTIVIDADES PAGA

Codigo Ficha	Programa	Proyecto	Actividad	Cantidad	Valor Reembolso de Gastos	Valor A	Valor Total	Registro de Cumplimiento	Observaciones
PAC-2.5-08	PROGRMA DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	Proyecto de manejo y disposición final de residuos sólidos convencionales	Separación de residuos - Punto ecológico de 3 puestos (ordinarios, plasticos, papel, cartón, Respel)	18 PACAS	$ 526.236,00	$ 136.821,36	$ 663.057,36	Cumplimiento mediante información notificada mediante insumos semanales e informes mensuales, adicional a la factura relacionada.	Sub. 2.5\Factura bolsas.pdf
PBSE-4.1-12	BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMATICOS	Manejo de descapote y la cobertura vegetal	Visita e informe del especialista (Biologo)	1 UND	$ 1.700.000,00	$ 442.000,00	$ 2.142.000,00	Cumplimiento mediante información notificada mediante insumos semanales e informes mensuales, adicional a la factura relacionada.	Sub 4.1\Cuenta de cobro JMPosada.pdf
PGH-3.2-11	GESTION DEL RECURSO HÍDRICO	Manejo de aguas residuales domésticas e industriales	Servicio de disposición final de residuos peligrosos RESPEL	1489 Kg	$ 5.958.000,00	$ 1.549.080,00	$ 7.507.080,00	Cumplimiento mediante información notificada mediante insumos semanales e informes mensuales, adicional a la factura relacionada y certificado correspondiente.	Sub 3.2\Factura BIOTESH.pdf
PGH-3.2-11	GESTION DEL RECURSO HÍDRICO	Manejo de aguas residuales domésticas e industriales	Servicios de mantenimiento de baterias sanitarias	35 Servicios	$ 10.172.250,00	$ 2.644.785,00	$ 12.817.035,00	Cumplimiento mediante información notificada mediante insumos semanales e informes mensuales, adicional a la factura relacionada.	Sub 3.2\Factura diciembre ECOTRAM.pdf
						TOTAL:	$ 23.129.172,36		

RESIDENTE AMBIENTAL CRISTIAN GOMEZ LOPEZ
MAB INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

RESIDENTE AMBIENTAL LYDA VELANDIA ZÁRATE
CONSORCIO SAN MIGUEL CALDAS
CONTRATISTA

Espacio para
Logo Corporativo

EMPRESA DE BIOTRATAMIENTOS Y TRATAMIENTOS TECNICOS ESPECIALES BIOTESH S.A.S. E.S.P
NIT 900.361.711-1
KM 2 VIA AL VALLE FCA GAVIOTAS
Tel: (036) 3507458778
Calarca - Colombia
bioteshsasesp@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 10286

				Fecha y hora Factura	
Señores	CONSORCIO SAN MIGUEL			**Generación**	17/12/2024, 14:28
NIT	901.740.908-5	**Teléfono**	(000) 3104613511 - Ext. 000	**Expedición**	17/12/2024, 14:28
Dirección	CR 48 48 SUR 75 163	**Ciudad**	Envigado - Colombia	**Vencimiento**	17/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	489.5 kilos sólidos contaminados	489.50	1,958,000.00
2	1.000 residuos aceitosos	1,000.00	4,000,000.00

Total items: 2

Total Bruto	5,958,000.00
Total a Pagar	**5,958,000.00**

Valor en Letras:
Cinco millones novecientos cincuenta y ocho mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - Consignación $ 5,958,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764083969784 aprobado en 20241125 prefijo desde el número 10276 al 15000 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 3900 Actividades de saneamiento ambiental y otros servicios de gestión de desechos Tarifa
CUFE: 9f4f30acb1373042643f1a44b69a5dd89e469f2a5b0932ca0641728c4b3dbd33e15eb1c577124c4b2fa1b558abde40ca

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

ECOTRATAMIENTOS Y MONTAJES ESP SAS

NIT. 901104513-2
CAR 4A 56 10 AP 601
3144890088
BOGOTA D. C. - Colombia

FACTURA DE VENTA No. FE 382

Autorización de Facturación No.
18764084754689 prefijo FE
Consecutivo: 369 al 600 Fecha
2024/12/05 hasta 2025/12/05

No Somos Grandes Contribuyentes, No Somos Autorretenedores, Responsable IVA - Agentes de Retención de Industria y Comercio en Bogotá, Contribuyente de Ica en Bogotá D.C. CIIU 3700 Tarifa 0.966%

CUFE:
1dd3b02ee686b61ddfeecbbada28f2416a104c5fc856623ac7dba60914be5961dc7fe33e9631f969867a8c13407fa526

CLIENTE: CONSORCIO SAN MIGUEL
NIT: 901740908-5
DIRECCIÓN: CRA 48 48 SUR 75
CIUDAD: ENVIGADO
TELÉFONO: 6044483012
EMAIL: facturacionelectronica@intramaq.co

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA
17	1	2025	17	1	2025

Su factura para efectos legales llegará al correo registrado.

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	% IVA	% DESCT
...1	TRANSPORTE Y RECOLECCION DE RESIDUOS DE UNIDADES PORTATILES SANITARIAS (MES: DICIEMBRE, 2024 PUENTE LINDA Y TRAMO4) CONDICIONES DE PAGO: ADELANTADO	20.0	390,000	7,800,000	Iva 0	
	TRANSPORTE Y RECOLECCION DE RESIDUOS DE UNIDADES PORTATILES SANITARIAS (MES: DICIEMBRE, 2024 ISAZA) CONDICIONES DE PAGO: ADELANTADO	15.0	165,000	2,475,000	Iva 0	

Obs:

FECHA DE RECIBIDO: _____
NOMBRE: _____
CÉDULA: _____
FIRMA Y SELLO: _____

Se entiende que el firmante diferente del comprador ha sido autorizado por este para recibir la mercancía y aceptar la presente factura.

SUBTOTAL	$	10,275,000
DESCUENTO	$	
NO GRAVADO	$	10,275,000
BASE IVA	$	0
I.V.A.	$	0
RETEFUENTE	$	102,750
RETEIVA	$	0
RETEICA	$	0
TOTAL	$	10,172,250

La mercancía se entrega en Bogotá D.C y viaja por cuenta y riesgo del adquiriente, nos reservamos el derecho del dominio de las mercancías mercancías facturadas hasta su complete pago.

ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR. LEY 1231 DE 17/07/2008 Y SERA TRANSFERIBLE POR EL ENDOSO Y SU ENTREGA.
ESTA FACTURA SE CONSIDERA ACEPTADA SI NO HACE RECLAMACION, DEVOLVIENDO LA FACTURA O MEDIANTE RECLAMO ESCRITO, DENTRO DE LOS 10 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A SU ACEPTACION SEGUN LEY 1231 DE 2008.

FAVOR CONSIGNAR O TRASNFERIAR A Cuenta de Ahorros Bancolombia: 646-815408-71

CONSECUTIVO

Documento electrónico generado por Anjus Software SAS. Nit. 900.347.946-7 - www.anjussoftware.com

Manizales, 20 de noviembre de 2024

CUENTA DE COBRO No 01

Consorcio San Miguel
Nit 9 0 1 7 4 0 9 0 8

DEBE A:

Juan Mauricio Posada Herrera
C.C 1053782274 MZL

La suma de $ 1. 700. 000 COP (un millón setecientos mil)

Por concepto de:	
Determinación taxonómica de 108 individuos arbóreos destinados a aprovechamiento forestal el proyecto MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS – Tramo 3 y tramo 4.	$1.700.000

Firma: Juan Mauricio Posada
Teléfono: 3005477057
Correo Electrónico: juan.posada87@gmail.com
Banco: Nu Colombia
No. de cuenta: 93295606
Clase de Cuenta: Ahorros

GENESIS DISTRIBUCIONES MEDELLIN S.A.S.
NIT 901826723-0
CALLE 23 # 71A-73, Medellín, Antioquia,
Tel: 3006783178-3006571198
genesisdistribucionesmed@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FVE579
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	CONSORCIO SAN MIGUEL		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CR 48 48 SUR 75 LC 163, Colombia, Medellín, Antioquia, 050015		04/12/2024
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	6044483012	**NIT** 901740908-5	03/01/2025

ID	Ítem	Precio	Cantidad	Descuento	Impuesto	Total
1	BOLSA DE BASURA 65X90X100 C1 NEGRA - Ref: 1357	$24,150	3		19%	$72,450.0
2	BOLSA BASURA 90X110 X 50 ROJA - Ref: 1054	$25,572.1	1		19%	$25,572.1
3	BOLSA DE BASURA 65X90 X 100 VERDE - Ref: 1448	$25,116	2		19%	$50,232.0
4	BOLSA NEGRA 55X55 X 100 C 1.4 - Ref: 1455	$22,632	5		19%	$113,160.0
5	BOLSA BASURA 65X90X100 BLANCA - Ref: 1446	$25,116	2		19%	$50,232.0
6	BOLSA 55X55 X100VERDE CAL. 1.4 - Ref: 1449	$26,113.9	5		19%	$130,569.5

Moneda: COP
Generado: 2024-12-04 07:18:19-05:00
Validación DIAN: 2024-12-04 07:19:20-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

PAGAR CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS 331-0000-5986. OC:10000514 Te bendeciré y tu serás de bendición a otros!! Genesis 12-2

CUFE: 6e9a46f2c836b25d5c9e01b22a7360620da45e7367f078da3f03106822392f57055279bf1a41f01c7db9044ab01dab34

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$442,215.6
IVA (19.00%)	$84,021.0
Total	$526,236.6

Total de lineas: 6

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764083257713 de 2024-11-12 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FVE501 hasta FVE3000 con vigencia hasta 2026-11-12

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

GOBERNACIÓN DE CALDAS

Secretaria de Infraestructura

Hoja No 1 de 1

MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA No:	14 CONSOLIDADO TRAMOS 1, 3 Y 4	FECHA:	30/01/2025
PERIODO:	1 AL 30 DE ENERO 2025		
CONTRATO DE OBRA No:	29092023-1456	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1071 DE 2022	INTERVENTORÍA:	MAB INGENIERIA DE VALOR

ITEM		UNIDAD
1	PMT	GLOBAL

CONTROLADORES VIALES

Elemento	unidad	cantidad	Valor Promedio mensual	Valor Total	Observaciones

SEÑALIZACIÓN INSTALADA

Elemento	Unidad	Cantidad	Valor Unidad/Mes	Valor Total	Observaciones
Señal Inicio de obra	Unidad	0,00	$ 0,00	$ 0,00	
Señal Fin de Obra	Unidad	1,00	$ 28.019,00	$ 28.019,00	
Señal Trabajos en la via x 60 cm	Unidad	13,00	$ 25.336,00	$ 329.368,00	
Señal Angostamiento a la derecha x 60 cm	Unidad	13,00	$ 25.115,00	$ 326.495,00	
Señal Angostamiento a la izquierda x 60 cm	Unidad	13,00	$ 24.960,00	$ 324.480,00	
Señal Auxiliar de transito x 60 cm	Unidad	12,00	$ 25.711,00	$ 308.532,00	
Señal Maquinaria en la via x 60 cm	Unidad	15,00	$ 25.336,00	$ 380.040,00	
Señal Barricada	Unidad	3,00	$ 35.700,00	$ 107.100,00	
Señal Bombones (Balizas)	Unidad	985,00	$ 11.321,00	$ 11.151.185,00	
Señal velocidad permitida	Unidad	18,00	$ 25.336,00	$ 456.048,00	
Desvio a 100 m	Unidad	0,00	$ 0,00	$ 0,00	
Paleta Pare y Siga x 45 cm	Unidad	9,00	$ 12.717,00	$ 114.453,00	
Flasher Luminoso	Unidad	0,00	$ 20.230,00	$ 0,00	
Baston Luminoso con cargador (Controlador vial)	Unidad	0,00	$ 20.230,00	$ 0,00	
Conos viales x 70 cm	Unidad	104,00	$ 5.396,00	$ 561.184,00	
Barreras Plasticas (maletines)medianos	Unidad	33,00	$ 57.517,00	$ 1.898.061,00	
			SUB TOTAL	$ 15.984.965,00	

ELEMENTOS CONTRAFACTURA

Elemento	Unidad	Cantidad	Valor Unidad/Mes	Valor Total	Observaciones
Señalización con cinta de demarcación	Metros	15,00	$ 22.700,00	$ 405.195,00	Contra factura de Diciembre
			SUB TOTAL	$ 405.195,00	
			SUB TOTAL	$ 16.390.160,00	
			ADMINISTRACIÓN (26%)	$ 4.261.442,00	
			SUB TOTAL	$ 20.651.602,00	

TOTAL	$ 20.651.602,00

MAB INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

Barranquilla, Colombia - Calle 42 # 46-48 Tel.(5)3671515 preventa.baq@centraldesoldaduras.com
Cartagena, Colombia - Parque Ind. Parquiamerica Bodega K3 Tel.(5)6424220 recepcion.ctgna@centraldesoldaduras.com
Bogota, Colombia - Cll. 12 #79A-25 Bod.11-12 Parque Ind Alsacia Tel.(1)7956070 preventa1.bog@centraldesoldaduras.com
Medellin, Colombia - Cra. 51 # 6 SUR 22 Tel.(4)3200600 preventa2.med@centraldesoldaduras.com

11/12/2024 16:38

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA Nº

PREFIJO	NRODCTO
MED3	60968

CENTRAL DE SOLDADURAS Y PROTECCIÓN INDUSTRIAL S.A.

NIT. 890110294-1

Cliente:

CONSORCIO SAN MIGUEL

CR 48 48 SUR 75 163
6044483012
Envigado

NIT/CC/PASAPORTE	FECHA/HORA GENERACION	FECHA VENCIMIENTO
901740908-5	11/12/2024	11/01/2025
CODIGO VENDEDOR	**ORDEN DE COMPRA Nº**	**FORMA DE PAGO**
1039684306	No. 10000535	CREDITO A 30 DIAS
PEDIDO Nº	**REMISION Nº**	**MEDIO DE PAGO**
PV1-00014810	RM1-00020470	

SOMOS RESPONSABLES DE IVA - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - SOMOS AUTORETENEDORES EN RENTA, SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN 2472 DE MARZO 6/2007 - NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA

ITEM	REF	DESCRIPCION	UND	CANT	IMP	%IMP	VLR UNITARIO	VALOR
1	60183110001	CINTA SEÑALIZACION AMARILLO.NEGRO 500 MT Cant. 1	Und	15,00	IVA	19,00	$ 22.700,00	$ 340.500,00

Enviar a:	CONSORCIO SAN MIGUEL
Dirección:	CR 48 48 SUR 75 163
Ciudad:	Envigado
Teléfono:	6044483012

Practicar retención de ICA en Barranquilla
Somos autoretenedores de ICA en Medellin y Cartagena
Somos grandes contribuyentes de ICA Bogotá
Actividad Económica 4690

VALOR EN LETRAS

CUATROCIENTOS CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE*************

Observaciones:

AUTORIZACION F.E NO.18764061194457, Numeración:HABILITADA Rango desde: MED355347 hasta: MED370000, Vigencia desde: 2023/12/04 hasta: 2025/12/04 - 24 Meses

VALOR MERCANCIA	$ 340.500,00
DESCUENTO	$ 0,00
SUBTOTAL	$ 340.500,00
+ I.V.A.	$ 64.695,00
- RTE. FUENTE	$ 0,00
- RETENCION I.V.A.	$ 0,00
- RETENCION I.C.A.	$ 0,00
VALOR TOTAL $	$ 405.195,00

Esta Factura es un titulo valor en cuanto cumple con los requisitos exigidos por la ley 1231 de 2008 y causará intereses por mora vigentes a la fecha. No aceptamos devoluciones despues de 8 dias de entregada la mercancia.
Favor consignar a nombre de CENTRAL DE SOLDADURAS Y PRORECCION INDUSTRIAL SA en las cuentas:

BANCOLOMBIA: CTA.CTE.: 479-013006-99

BANCO BOGOTA - CTA.CTE.: 292672037

DAVIVIENDA: CTA.CTE.: 0286-69999808

Firma del Emisor

Nombre

C.C #

Fecha de recibo

Acepto el contenido de la presente factura y hago constar el recibido conforme de la mercancia en ella discriminada

Firma y Sello del Cliente

CUFE: f625c25e5f7fa5b48a417d8e70bfc0cb61349b3ee0b37c07f6ae05a6e0a55cdb494fa5e7b34ba9db9010b5eb2fbc5012

pse Pagos seguros en Línea

Fecha Aceptación DIAN: 2024-12-11 16:38:56-05:00

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

GOBIERNO DE CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaria de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS	

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA No:	14 Tramo 1	FECHA:	30/01/2025
PERIODO:	1 AL 30 DE ENERO 2025		
CONTRATO DE OBRA No:	29092023-1456	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1071 DE 2022	INTERVENTORÍA:	MAB INGENIERIA DE VALOR

ITEM	PMT	UNIDAD
1	PMT	GLOBAL

CONTROLADORES VIALES

Elemento	unidad	cantidad	Valor Promedio mensual	Valor Total	Observaciones

SEÑALIZACIÓN INSTALADA

Elemento	Unidad	Cantidad	Valor Unidad/Mes	Valor Total	Observaciones
Señal Inicio de obra	Unidad	0,00	$ 0,00	$ 0,00	
Señal Fin de Obra	Unidad	0,00	$ 28.019,00	$ 0,00	
Señal Trabajos en la via x 60 cm	Unidad	2,00	$ 25.336,00	$ 50.672,00	
Señal Angostamiento a la derecha x 60 cm	Unidad	1,00	$ 25.115,00	$ 25.115,00	
Señal Angostamiento a la izquierda x 60 cm	Unidad	1,00	$ 24.960,00	$ 24.960,00	
Señal Auxiliar de transito x 60 cm	Unidad	2,00	$ 25.711,00	$ 51.422,00	
Señal Maquinaria en la via x 60 cm	Unidad	4,00	$ 25.336,00	$ 101.344,00	
Señal Barricada	Unidad	0,00	$ 35.700,00	$ 0,00	
Señal Bombones (Balizas)	Unidad	34,00	$ 11.321,00	$ 384.914,00	
Señal velocidad permitida	Unidad	6,00	$ 25.336,00	$ 152.016,00	
Desvio a 100 m	Unidad	0,00	$ 0,00	$ 0,00	
Paleta Pare y Siga x 45 cm	Unidad	3,00	$ 12.717,00	$ 38.151,00	
Flasher Luminoso	Unidad	0,00	$ 20.230,00	$ 0,00	
Baston Luminoso con cargador (Controlador vial)	Unidad	0,00	$ 20.230,00	$ 0,00	
Conos viales x 70 cm	Unidad	66,00	$ 5.396,00	$ 356.136,00	
Barreras Plasticas (maletines)medianos	Unidad	4,00	$ 57.517,00	$ 230.068,00	
			SUB TOTAL	$ 1.414.798,00	

ELEMENTOS CONTRAFACTURA

Elemento	Unidad	Cantidad	Valor Unidad/Mes	Valor Total	Observaciones
					Contra factura
					Contra factura
					Contra factura
			SUB TOTAL	$ 0,00	
			SUB TOTAL	$ 1.414.798,00	
			ADMINISTRACIÓN (26%)	$ 367.847,00	
			SUB TOTAL	$ 1.782.645,00	

TOTAL	$ 1.782.645,00

MAB INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

GOBIERNO DE CALDAS

ACTA Nro. CATORCE (14) PARCIAL AL CONTRATO DE OBRA Nro. 29092023-1456

RADICADO SECRETARIA JURIDICA Nro. 29092023-1456

Secretaria :	**INFRAESTRUCTURA**			
Fecha acta	**13/02/2025**			
Concepto	**Descripción**			
No. Radicado Contrato de Obra	29092023-1456	Acto Administrativo:		
No. Pedido en SAP:	4500024051			
NIT o RUT:	901.740.908-5			
Contratista:	CONSORCIO SAN MIGUEL CONFORMADO POR: HARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES S.A.S (PARTICIPACION 10%), GAMA INGENIEROS ARQUITECTOS S.A.S. (PARTICIPACIÓN 45%) Y INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S. (PARTICIPACIÓN			
Representante Legal:	CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA			
Valor del Contrato ($):	$ 93.499.614.647,00	Aporte Departamento	$ 93.499.614.647,00	
Valor Adición	N/A	Aporte otras entidades		
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS			
Disponibilidad presupuestal	3500021700-3500021701	FONDO	2-0408 - 0-0408	
Duración del contrato (Plazo):	Duración Contrato: SESENTA (60) MESES DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO			
Fecha de iniciación	12/10/2023	Fecha de terminación	11/10/2028	
Interventor Externo	MAB INGENIERIA DE VALOR (A CARGO DE INVIAS)			
Supervisor Departamento	JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA			

OBRA EJECUTADA SEGÚN CONTRATO OBRA CIVIL

ITEM	GRUPO DE AJUSTE	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/PARCIAL
C1		**Capitulo 1. Actividades Preliminares**				
600.2.3	11601	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	-	$ 43.112,00	$ -
210.2.1	11601	EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	-	$ 54.578,00	$ -
201.7	11601	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	M3	-	$ 213.374,00	$ -
220.1	11601	TERRAPLENES	M3	-	$ 16.687,00	$ -
200.2	11601	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS	HA	-	$ 1.064.469,00	$ -
C2		**Capitulo 2. Estructura de Pavimento**				
341.2 T1	11603	BASE ESTABILIZADA CON MEZCLA ASFALTICA NATURAL BEMAN	M3	-	$ 329.188,00	$ -
341.2 T4	11603	BASE ESTABILIZADA CON MEZCLA ASFALTICA NATURAL BEMAN	M3	-	$ 474.867,00	$ -
310.1	11602	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	-	$ 1.743,00	$ -
320.3.1 T4	11602	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	-	$ 354.604,00	$ -
420.2	11603	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1	M2	-	$ 3.945,00	$ -
450.2P T1	11603	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC 19 - COMPRA DE MEZCLA	M3	-	$ 1.297.314,00	$ -
450.2P T3	11603	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC 19 - COMPRA DE MEZCLA	M3	-	$ 1.443.147,00	$ -
450.2P T4	11603	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC 19 - COMPRA DE MEZCLA	M3	-	$ 1.443.147,00	$ -
C3		**Capitulo 3. Estructuras de Drenaje**				
201.7	11604	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	M3	9,00	$ 213.374,00	$ 1.920.366,00
201.15	11604	REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS	ML	70,90	$ 104.053,00	$ 7.377.358,00
600.2.3	11604	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	677,10	$ 43.112,00	$ 29.191.135,00
610.1	11604	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3	-	$ 79.074,00	$ -
630.3.2	11604	CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - COMPRA DE MEZCLA	M3	-	$ 1.381.981,00	$ -
630.4.2 T1	11604	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	M3	-	$ 1.023.749,00	$ -
630.4.2 T3	11604	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	M3	-	$ 1.146.249,00	$ -
630.4.2 T4	11604	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	M3	-	$ 1.146.249,00	$ -
630.6 T1	11604	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	M3	0,40	$ 585.165,00	$ 234.066,00
630.6 T3	11604	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	M3	1,40	$ 756.665,00	$ 1.059.331,00
630.6 T4	11604	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	M3	1,10	$ 756.665,00	$ 832.332,00
630.5	11604	CONCRETO RESISTENCIA 17.5 MPa (E)	M3	-	$ 965.074,00	$ -
663.1	11604	TUBERIA DE PLASTICO TIPO PVC NORMA NTC-5055 DE DIAMETRO 900 mm	ML	88,20	$ 2.481.462,00	$ 218.864.948,00
640.1 T1	11604	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	KG	19.313,00	$ 8.763,00	$ 169.239.819,00
640.1 T3	11604	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	KG	1.588,13	$ 8.763,00	$ 13.916.783,00
640.1 T4	11604	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	KG	790,00	$ 8.763,00	$ 6.922.770,00
812.2P	11604	MALLA ELECTROSOLDADA e= 15cm	M2	-	$ 13.853,00	$ -
671.1 T1	11604	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	-	$ 709.340,00	$ -
671.1 T3	11604	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	-	$ 827.172,00	$ -
671.1 T4	11604	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	-	$ 827.172,00	$ -
673.2 T1	11604	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	-	$ 157.554,00	$ -
673.2 T3	11604	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	-	$ 281.220,00	$ -
673.2 T4	11604	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	-	$ 281.220,00	$ -
673.3.3 T1	11604	MATERIAL DE COBERTURA TIPO SUB- BASE CLASE C SBG-20	M3	326,00	$ 188.848,00	$ 61.564.448,00
673.3.3 T3	11604	MATERIAL DE COBERTURA TIPO SUB- BASE CLASE C SBG-20	M3	-	$ 334.680,00	$ -
673.1.1	11604	GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 700 N APROXIMADAMENTE	M2	-	$ 11.416,00	$ -
663.1.1	11604	TUBERIA DE PVC 4"	ML	-	$ 47.301,00	$ -
672.2	11605	BORDILLO DE PIEZA PREFABRICADA DE CONCRETO; NO INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	-	$ 50.240,00	$ -
C4		**Capitulo 4. Obras de Estabilización**				

GOBIERNO DE CALDAS

ACTA Nro. CATORCE (14) PARCIAL AL CONTRATO DE OBRA Nro. 29092023-1456

RADICADO SECRETARIA JURIDICA Nro. 29092023-1456

Secretaria :	**INFRAESTRUCTURA**			
Fecha acta	**13/02/2025**			
Concepto	**Descripción**			
No. Radicado Contrato de Obra	29092023-1456	Acto Administrativo:		
No. Pedido en SAP:	4500024051			
NIT o RUT:	901.740.908-5			
Contratista:	CONSORCIO SAN MIGUEL CONFORMADO POR: HARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES S.A.S (PARTICIPACION 10%), GAMA INGENIEROS ARQUITECTOS S.A.S. (PARTICIPACIÓN 45%) Y INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S. (PARTICIPACIÓN			
Representante Legal:	CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA			
Valor del Contrato ($):	$ 93.499.614.647,00	Aporte Departamento	$ 93.499.614.647,00	
Valor Adición	N/A	Aporte otras entidades		
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS			
Disponibilidad presupuestal	3500021700-3500021701	FONDO	2-0408 - 0-0408	
Duración del contrato (Plazo):	Duración Contrato: SESENTA (60) MESES DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO			
Fecha de iniciación	12/10/2023	Fecha de terminación	11/10/2028	
Interventor Externo	MAB INGENIERIA DE VALOR (A CARGO DE INVIAS)			
Supervisor Departamento	JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA			

OBRA EJECUTADA SEGÚN CONTRATO OBRA CIVIL

ITEM	GRUPO DE AJUSTE	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/PARCIAL
600.2.3	11606	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	-	$ 43.112,00	$ -
610.1	11606	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3	-	$ 79.074,00	$ -
630.3.2	11606	CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - COMPRA DE MEZCLA	M3	-	$ 1.381.981,00	$ -
630.4.2 T3	11606	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	M3	-	$ 1.146.249,00	$ -
630.4.2 T4	11606	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	M3	-	$ 1.146.249,00	$ -
630.6 T3	11606	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	M3	-	$ 756.665,00	$ -
630.6 T4	11606	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	M3	-	$ 756.665,00	$ -
640.1 T3	11606	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	KG	-	$ 8.763,00	$ -
640.1 T4	11606	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	KG	-	$ 8.763,00	$ -
673.2 T3	11606	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	-	$ 281.220,00	$ -
673.2 T4	11606	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	-	$ 281.220,00	$ -
673.1.1	11606	GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 700 N APROXIMADAMENTE	M2	-	$ 11.416,00	$ -
663.1.1	11606	TUBERIA DE PVC 4"	ML	-	$ 47.301,00	$ -
621.1.2	11606	PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIÁMETRO 1.2 m, INCLUYE EXCAVACIÓN EN ROCA, BAJO AGUA	ML	-	$ 4.215.785,00	$ -
623.1.2	11606	ANCLAJE PARA REALCE	ML	6,90	$ 45.881,00	$ 316.579,00
623.1	11606	ANCLAJE TIPO pasivos con acero #6, inyección de mortero perforación D=7,5cm perforación en material común	ML	-	$ 156.255,00	$ -
C5		**Capitulo 5. Señalización y Demarcación Vial**				
700.1	11607	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML	-	$ 2.880,00	$ -
701.1.2	11607	TACHA REFLECTIVA - ADHESIVO EPÓXICO	UND	-	$ 10.626,00	$ -
710.1.1	11607	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR, SP Y/O SI, TABLERO EN LÁMINA CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV (75X75 cm)	UND	-	$ 752.731,00	$ -
710.1.5	11607	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO PREVENTIVA DELINEADOR DE CURVA HORIZONTAL SP-75. REFLECTIVO TIPO IV (75X60cm).	UND	-	$ 668.368,00	$ -
C6		**Capitulo 6. Transportes**				
900.2.1	11608	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	M3/KM	6.743,00	$ 1.536,00	10.357.248,00
C7		**Capitulo 7 Obras estabilización tramo 1**				
201.7	11606	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	m3	-	$ 213.374,00	-
630.4.2 T1	11606	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	m3	-	$ 1.023.749,00	-
630.6 T1	11606	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	m3	-	$ 585.165,00	-
640.1 T1	11606	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	kg	-	$ 8.763,00	-
673.2 T1	11606	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3	-	$ 157.554,00	-
C8		**Caitulo 8 Obras no previstas**				
NP 1 T1	11604	LIMPIEZA MANUAL DE ALCANTARILLAS DIAMETRO 30" A 36" TRAMO 1, INCLUYE CARGUE TRANSPORTE Y DISPOCICIÓN FINAL DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA.	m	-	$ 97.743,00	-
NP2	11602	INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE APORTE DE LA ZONA, NO INCLUYE SUMINISTRO NI TRANSPORTE DE MATERIAL	m3	-	$ 24.174,00	-
NP 211.1	11601	REMOCIÓN DE DERRUMBES	m3	15.591,00	$ 20.603,00	321.221.373,00
NP421.1 T1	11603	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 T1	m3	-	$ 3.101,00	-
NP 461P	11603	RECICLADO DE PAVIMENTOS ASFALTICOS EXISTENTES IN SITU SIN ADICIÓN DE MATERIAL CEMENTANTE	m3	-	$ 139.068,00	-
NP442P	11603	MEZCLA ASFALTICA NATURAL DE APORTE PARA TRAMOS SIN CARPETA EXISTENTE	m3	-	$ 575.292,00	-
NP450.2P T1	11603	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC 19 ASFALTO MODIFICADO TIPO 3 - COMPRA DE MEZCLA TRAMO 1	m3	-	$ 1.665.013,00	-
NP 610.2	11604	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE PRESTAMO.EXCAVACIONES Y/O DERRUMBES	m3	282,70	$ 24.830,00	7.019.441,00
NP 610.3 T1	11604	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG-50 TRAMO 1	m3	-	$ 212.901,00	-

GOBIERNO DE CALDAS

ACTA Nro. CATORCE (14) PARCIAL AL CONTRATO DE OBRA Nro. 29092023-1456

RADICADO SECRETARIA JURIDICA Nro. 29092023-1456

Secretaria :	**INFRAESTRUCTURA**
Fecha acta	**13/02/2025**

Concepto	Descripción			
No. Radicado Contrato de Obra	29092023-1456	Acto Administrativo:		
No. Pedido en SAP:	4500024051			
NIT o RUT:	901.740.908-5			
Contratista:	CONSORCIO SAN MIGUEL CONFORMADO POR: HARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES S.A.S (PARTICIPACIÓN 10%), GAMA INGENIEROS ARQUITECTOS S.A.S. (PARTICIPACIÓN 45%) Y INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S. (PARTICIPACIÓN			
Representante Legal:	CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA			
Valor del Contrato ($):	$ 93.499.614.647,00	Aporte Departamento	$ 93.499.614.647,00	
Valor Adición	N/A	Aporte otras entidades		
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS			
Disponibilidad presupuestal	3500021700-3500021701	FONDO	2-0408 - 0-0408	
Duración del contrato (Plazo):	Duración Contrato: SESENTA (60) MESES DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO			
Fecha de iniciación	12/10/2023	Fecha de terminación	11/10/2028	
Interventor Externo	MAB INGENIERIA DE VALOR (A CARGO DE INVIAS)			
Supervisor Departamento	JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA			

OBRA EJECUTADA SEGÚN CONTRATO OBRA CIVIL

ITEM	GRUPO DE AJUSTE	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/PARCIAL
NP 900.2.2	11608	TRANSPORTE DE MATERIALES A DISTANCIAS MAYORES A MIL METROS (1000M), APLICA PARA MATERIALES USADOS EN EL ITEM 610.1 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3/KM	-	$ 1.536,00	-
NP 900.3.2	11608	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	M3/KM	39.750,00	$ 2.001,00	79.539.750,00
NP3	11601	DEMOLICIÓN EN ROCA A CIELO ABIERTO, CON CUÑA HIDRAULICA Y/O CEMENTO EXPASIVO PARA ATENCIÓN SITIO CRITICO UBICADO EN EL SECTOR CORINTO K88+500 AL K90+000 (INCLUYE EQUIPO NEUMATICO, PERFORADORA, CILINDRO HIDRAULICO, UNIDAD DE FUERZA Y CEMENTO EXPANSIVO, NO INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL NI TRANSPORTE)	m3	-	$ 509.165,00	-
NP 210.2.2	11601	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACION Y CANALES	m3	-	$ 43.112,00	-
NP4	11601	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE PRESTAMOS, NO INCLUYE CONFORMACIÓN EN ZONAS DE DEPOSITO NI TRANSPORTE	m3	282,70	$ 23.321,00	6.592.847,00
NP 600.2.1	11604	EXCAVACIONES EN ROCA PARA ESTRUCTURAS INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN EN ZONAS DE DEPOSITO AUTORIZADAS	M3	147,70	$ 166.984,00	24.663.537,00
NP630.3.2 T1	11604	CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 1	M3	-	$ 1.438.313,00	-
NP630.3.2 T3	11604	CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 3	M3	31,70	$ 1.589.243,00	50.379.003,00
NP630.3.2 T4	11606	CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 4	M3	17,80	$ 1.619.479,00	28.826.726,00
NP630.4.2 T1	11606	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 1	M3	4,90	$ 1.304.906,00	6.394.039,00
NP630.4.2 T3	11606	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 3	M3	-	$ 1.465.062,00	-
NP630.4.2 T4	11606	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 4	M3	-	$ 1.497.363,00	-
NP630.1.7 T1	11604	CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 1	M3	1,40	$ 997.704,00	1.396.786,00
NP630.1.7 T3	11604	CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 3	M3	7,40	$ 1.129.320,00	8.356.968,00
NP630.1.7 T4	11604	CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 4	M3	-	$ 1.158.525,00	-
NP5	11603	CORTE DE PAVIMENTO CON CORTADORA	M	3.198,00	$ 9.000,00	28.782.000,00
NP6 T1	11604	CUNETA DE CONCRETO CLASE D, VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO TRAMO 1	M3	542,10	$ 881.142,00	477.667.078,00
NP6 T3	11604	CUNETA DE CONCRETO CLASE D, VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO TRAMO 3	M3	-	$ 1.026.706,00	-
NP6 T4	11604	CUNETA DE CONCRETO CLASE D, VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO TRAMO 4	M3	-	$ 1.059.007,00	-
NP7	11603	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 PARA LA INSTALACION DE MEZCLA ASFALTICA SOBRE CAPAS DE RECICLADAS CON ASFALTO NATURAL TRAMO 1	M2	-	$ 4.252,00	-
NP5	14104	Suministro, fabricación y monalje de refuerzo en el el puente Hierro localizado en la municipalidad de Norcasia, Carretera Dorada-Norcasia, según relación anexa.	Un	0,90	$ 426.509.511,00	383.858.560,00

TOTAL COSTOS DE OBRA	**1.946.495.291,00**
REAJUSTES DE OBRA	**73.949.595,00**
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	**20.651.602,00**
PAGA	**23.129.172,00**
AJUSTE A DISEÑOS	**-**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**2.064.225.660,00**

GOBIERNO DE CALDAS

ACTA Nro. CATORCE (14) PARCIAL AL CONTRATO DE OBRA Nro. 29092023-1456

RADICADO SECRETARIA JURIDICA Nro. 29092023-1456

Secretaria :	**INFRAESTRUCTURA**				
Fecha acta	**13/02/2025**				
Concepto	**Descripción**				
No. Radicado Contrato de Obra	29092023-1456	Acto Administrativo:			
No. Pedido en SAP:	4500024051				
NIT o RUT:	901.740.908-5				
Contratista:	CONSORCIO SAN MIGUEL CONFORMADO POR: HARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES S.A.S (PARTICIPACION 10%), GAMA INGENIEROS ARQUITECTOS S.A.S. (PARTICIPACIÓN 45%) Y INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S. (PARTICIPACIÓN				
Representante Legal:	CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA				
Valor del Contrato ($):	$ 93.499.614.647,00	Aporte Departamento	$ 93.499.614.647,00		
Valor Adición	N/A	Aporte otras entidades			
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS				
Disponibilidad presupuestal	3500021700-3500021701	FONDO	2-0408 - 0-0408		
Duración del contrato (Plazo):	Duración Contrato: SESENTA (60) MESES DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO				
Fecha de iniciación	12/10/2023	Fecha de terminación	11/10/2028		
Interventor Externo	MAB INGENIERIA DE VALOR (A CARGO DE INVIAS)				
Supervisor Departamento	JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA				

OBRA EJECUTADA SEGÚN CONTRATO OBRA CIVIL

ITEM	GRUPO DE AJUSTE	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/PARCIAL
Valor Acta PARCIAL	X	TOTAL				$2.064.225.660,00
Amortización Anticipo						$206.422.566,00
Valor Ordenación del Gasto:						$1.857.803.094,00

RESUMEN DEL CONTRATO		
Valor Inicial del Contrato		93.499.614.647,00
Valor adicional		0,00
Valor Acta No. 1:	436.314.891,00	
Valor Acta No. 2:	553.009.668,00	
Valor Acta No. 3:	443.810.818,00	
Valor Acta No. 4:	844.483.205,00	
Valor Acta No. 5:	567.926.924,00	
Valor Acta No. 6:	267.282.965,00	
Valor Acta No. 7:	1.346.514.676,00	
Valor Acta No. 8:	4.116.961.935,00	
Valor Acta No. 9:	4.775.577.355,00	
Valor Acta No. 10:	5.374.186.889,00	
Valor Acta No. 11:	3.384.977.063,00	
Valor Acta No. 12:	2.725.328.241,00	
Valor Acta No. 13:	1.953.472.425,00	
Valor Acta No. 14:	2.064.225.660,00	
Saldo del contrato	64.645.541.932,00	
Sumas Iguales	93.499.614.647,00	93.499.614.647,00

RESUMEN DEL ANTICIPO		
Valor del Anticipo:		9.349.961.464,00
Amortización del Anticipo Acta 1:	43.631.489,00	
Amortización del Anticipo Acta 2:	55.300.967,00	
Amortización del Anticipo Acta 3:	44.381.082,00	
Amortización del Anticipo Acta 4:	84.448.321,00	
Amortización del Anticipo Acta 5:	56.792.692,00	
Amortización del Anticipo Acta 6:	26.728.297,00	
Amortización del Anticipo Acta7:	134.651.468,00	
Amortización del Anticipo Acta 8:	411.696.194,00	
Amortización del Anticipo Acta 9:	477.557.736,00	
Amortización del Anticipo Acta 10:	537.418.689,00	
Amortización del Anticipo Acta 11:	338.497.706,00	
Amortización del Anticipo Acta 12:	272.532.824,00	
Amortización del Anticipo Acta 13:	195.347.243,00	
Amortización del Anticipo Acta 14:	206.422.566,00	
Saldo por amortizar:	6.464.554.190,00	
Sumas Iguales:	9.349.961.464,00	9.349.961.464,00

SE HACE CONSTAR

Que el **CONSORCIO SAN MIGUEL**, representado legalmente por el ingeniero **CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA**, ejecuta parcialmente para el Departamento de Caldas el, **OBJETO DE ESTE CONTRATO DE OBRA A ENTERA SATISFACCION Y DENTRO DEL PLAZO PREVISTO.**

Dando cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2.002, modificado por el Artículo 1° de la ley 828 de 2.003 y al Artículo 27 del Decreto 2170 de 2.002, la suscrita Interventoría verificó el cumplimiento de éstas obligaciones por parte del contratista.

Los valores correspondientes al costo del impuesto de las diferentes estampillas serán descontadas de la presente acta por parte de la Secretaría de Hacienda del Departamento.

JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA
Secretario de Infraestructura
EL DEPARTAMENTO

RODRIGO GARCIA CAMPIÑO
CONSORCIO SAN MIGUEL
Contratista

JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA
SUPERVISOR
EL DEPARTAMENTO

ARIEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTOR EXTERNO
MAB INGENIERIA DE VALOR

GOBERNACIÓN DE CALDAS

GOBERNACIÓN DE CALDAS

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

PÁGINA

FECHA 10/02/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS

ACTA No: 7 (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA ☑ 1 de 3

POR CONTRATO ADICIONAL ☐ No. (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 29092023-1456 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MIGUEL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 071-2022 INTERVENTOR: MAB INGENIERIA DE VALOR

PLAZO INICIAL: 60 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 12/10/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 93.499.614.647,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ -

PLAZO ACUMULADO: 60 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 11/10/2028 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): $ -

No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓ		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 13 de fecha 13 diciembre 2024		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTUALIZADAS ANTERIOR ACTA No. 6 FECHA 26/11/2024			PRESENTES					
		GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+/-	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
C1				Capítulo 1. Actividades Preliminares													
1	600.2.3			EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	109521,00	$ 43.112,00	$ 4.721.669.352,00	0,00	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2	210.2.1			EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	31135,00	$ 54.578,00	$ 1.699.286.030,00	20625,00	$ 1.125.671.250,00		-9167,00	$ (500.316.526,00)	835,20	$ 142.022.872,00	11458,00	$ 625.354.724,00
3	201.7			DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	M3	342,00	$ 213.374,00	$ 72.973.908,00	0,00	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4	220.1			TERRAPLENES	M3	53499,00	$ 16.687,00	$ 892.737.813,00	0,00	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5	200.2			DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS	HA	5,00	$ 1.064.469,00	$ 5.322.345,00	5,00	$ 5.322.345,00			$ -	2,80	$ 2.980.513,00	5,00	$ 5.322.345,00
C2				Capítulo 2. Estructura de Pavimento													
6	341.2 T1			BASE ESTABILIZADA CON MEZCLA ASFALTICA NATURAL BEMAN	M3	13260,00	$ 329.188,00	$ 4.365.032.880,00	2821,69	$ 928.866.906,48			$ -	2.615,10	$ 860.859.539,00	2821,69	$ 928.866.906,48
7	341.2 T4			BASE ESTABILIZADA CON MEZCLA ASFALTICA NATURAL BEMAN	M3	8400,00	$ 474.867,00	$ 3.988.882.800,00	12694,00	$ 6.027.961.698,00			$ -	0,00	$ -	12694,00	$ 6.027.961.698,00
8	310.1			CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	88200,00	$ 1.743,00	$ 153.732.600,00	326955,00	$ 569.882.565,00			$ -	98.347,00	$ 171.418.821,00	326955,00	$ 569.882.565,00
9	320.3.1 T4			SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	13545,00	$ 354.604,00	$ 4.803.111.180,00	1459,60	$ 517.579.998,40			$ -	0,00	$ -	1459,60	$ 517.579.998,40
10	420.2			RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1	M2	216000,00	$ 3.945,00	$ 852.120.000,00	130000,00	$ 512.850.000,00			$ -	0,00	$ -	130000,00	$ 512.850.000,00
11	450.2P T1			MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC 19 - COMPRA DE MEZCLA	M3	2520,00	$ 1.297.314,00	$ 3.269.231.280,00	0,00	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12	450.2P T3			MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC 19 - COMPRA DE MEZCLA	M3	6720,00	$ 1.443.147,00	$ 9.697.947.840,00	6720,00	$ 9.697.947.840,00			$ -	0,00	$ -	6720,00	$ 9.697.947.840,00
13	450.2P T4			MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC 19 - COMPRA DE MEZCLA	M3	5860,00	$ 1.443.147,00	$ 8.485.704.360,00	5880,00	$ 8.485.704.360,00			$ -	0,00	$ -	5880,00	$ 8.485.704.360,00
C3				Capítulo 3. Estructuras de Drenaje													
14	201.7			DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	M3	230,00	$ 213.374,00	$ 49.076.020,00	2611,00	$ 557.119.514,00			$ -	2.290,10	$ 455.382.790,00	2611,00	$ 557.119.514,00
15	201.15			REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS	ML	397,00	$ 104.053,00	$ 41.309.041,00	845,00	$ 87.924.785,00		350,00	$ 36.418.550,00	862,90	$ 64.377.592,00	1195,00	$ 124.343.335,00
16	600.2.3			EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	37852,00	$ 43.112,00	$ 1.631.875.424,00	26335,50	$ 1.135.376.076,00			$ -	8.878,30	$ 327.211.456,00	26335,50	$ 1.135.376.076,00
17	610.1			RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3	9583,00	$ 79.074,00	$ 757.766.142,00	4005,00	$ 316.691.370,00			$ -	1.997,20	$ 128.819.454,00	4005,00	$ 316.691.370,00
18	630.3.2			CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - COMPRA DE MEZCLA	M3	1285,00	$ 1.381.981,00	$ 1.775.845.585,00	347,70	$ 480.514.793,70		-347,70	$ (480.514.793,70)	0,00	$ 439.055.364,00	0,00	$ -
19	630.4.2 T1			CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	M3	821,00	$ 1.023.749,00	$ 840.497.929,00	36,80	$ 37.673.963,20		-36,80	$ (37.673.963,20)	0,00	$ 17.198.983,00	0,00	$ -
20	630.4.2 T3			CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	M3	665,00	$ 1.146.249,00	$ 762.255.585,00	0,00	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
21	630.4.2 T4			CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	M3	1588,00	$ 1.146.249,00	$ 1.820.243.412,00	0,00	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
22	630.6 T1			CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	M3	486,00	$ 585.165,00	$ 284.390.190,00	35,00	$ 20.480.775,00			$ -	24,20	$ 11.059.622,00	35,00	$ 20.480.775,00
23	630.6 T3			CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	M3	566,00	$ 756.665,00	$ 428.272.390,00	66,00	$ 49.939.890,00			$ -	4,20	$ 680.999,00	66,00	$ 49.939.890,00
24	630.6 T4			CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	M3	57,00	$ 756.665,00	$ 43.129.905,00	57,00	$ 43.129.905,00			$ -	0,00	$ -	57,00	$ 43.129.905,00
25	630.5			CONCRETO RESISTENCIA 17.5 MPa (E)	M3	864,00	$ 965.074,00	$ 833.823.936,00	64,00	$ 61.764.736,00			$ -	0,00	$ -	64,00	$ 61.764.736,00
26	663.1			TUBERÍA DE PLASTICO TIPO PVC NORMA NTC-5055 DE DIAMETRO 900 mm	ML	1359,00	$ 2.481.462,00	$ 3.372.306.858,00	2229,00	$ 5.531.178.798,00		280,00	$ 694.809.360,00	2.110,40	$ 4.136.349.008,00	2509,00	$ 6.225.988.158,00
27	640.1 T1			ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	KG	5684,00	$ 8.763,00	$ 49.808.892,00	103549,00	$ 907.399.887,00			$ -	62.595,00	$ 122.059.827,00	103549,00	$ 907.399.887,00
28	640.1 T3			ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	KG	56280,00	$ 8.763,00	$ 493.181.640,00	45280,00	$ 396.788.640,00			$ -	2.665,00	$ 7.168.134,00	45280,00	$ 396.788.640,00
29	640.1 T4			ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	KG	157143,00	$ 8.763,00	$ 1.377.044.109,00	57143,00	$ 500.744.109,00			$ -	0,00	$ -	57143,00	$ 500.744.109,00
30	812.2P			MALLA ELECTROSOLDADA e= 15cm	M2	557,00	$ 13.853,00	$ 7.716.121,00	557,00	$ 7.716.121,00			$ -	0,00	$ -	557,00	$ 7.716.121,00
31	671.1 T1			CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	2142,00	$ 709.340,00	$ 1.519.406.280,00	0,00	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
32	671.1 T3			CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	5120,00	$ 827.172,00	$ 4.235.120.640,00	0,00	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
33	671.1 T4			CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	1240,00	$ 827.172,00	$ 1.025.693.280,00	0,00	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
34	673.2 T1			MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	3154,00	$ 157.554,00	$ 496.925.316,00	4304,00	$ 678.112.416,00		1500,00	$ 236.331.000,00	4.230,00	$ 666.453.420,00	5804,00	$ 914.443.416,00
35	673.2 T3			MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	10368,00	$ 281.220,00	$ 2.915.688.960,00	6368,00	$ 1.790.808.960,00			$ -	0,00	$ -	6368,00	$ 1.790.808.960,00
36	673.2 T4			MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	9228,00	$ 281.220,00	$ 2.595.098.160,00	6228,00	$ 1.751.438.160,00			$ -	0,00	$ -	6228,00	$ 1.751.438.160,00
37	673.3.3 T1			MATERIAL DE COBERTURA TIPO SUB- BASE CLASE C SBG-20	M3	394,00	$ 188.848,00	$ 74.406.112,00	3394,00	$ 640.950.112,00			$ -	1.430,00	$ 120.296.176,00	3394,00	$ 640.950.112,00
38	673.3.3 T3			MATERIAL DE COBERTURA TIPO SUB- BASE CLASE C SBG-20	M3	1888,00	$ 334.680,00	$ 631.875.840,00	1188,00	$ 397.599.840,00			$ -	0,00	$ -	1188,00	$ 397.599.840,00
39	673.1.1			GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 700 N APROXIMADAMENTE	M2	88433,00	$ 11.418,00	$ 1.009.551.126,00	88433,00	$ 1.009.551.128,00			$ -	22.932,00	$ 261.791.712,00	88433,00	$ 1.009.551.128,00
40	663.1.1			TUBERÍA DE PVC 4"	ML	37694,00	$ 47.301,00	$ 1.782.963.894,00	27423,00	$ 1.297.135.323,00			$ -	7.171,20	$ 339.204.932,00	27423,00	$ 1.297.135.323,00
41	672.2			BORDILLO DE PIEZA PREFABRICADA DE CONCRETO; NO INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	14596,00	$ 50.240,00	$ 733.303.040,00	4596,00	$ 230.903.040,00			$ -	0,00	$ -	4596,00	$ 230.903.040,00
C4				Capítulo 4. Obras de Estabilización													
42	600.2.3			EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	5268,00	$ 43.112,00	$ 227.114.016,00	5268,00	$ 227.114.016,00			$ -	2.168,40	$ 93.484.061,00	5268,00	$ 227.114.016,00
43	610.1			RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3	4707,00	$ 79.074,00	$ 372.201.318,00	3207,00	$ 253.590.318,00			$ -	1.137,30	$ 89.930.860,00	3207,00	$ 253.590.318,00
44	630.3.2			CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - COMPRA DE MEZCLA	M3	516,00	$ 1.381.981,00	$ 713.102.196,00	0,00	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
45	630.4.2 T3			CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	M3	1398,00	$ 1.146.249,00	$ 1.602.456.102,00	0,00	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
46	630.4.2 T4			CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	M3	101,00	$ 1.146.249,00	$ 115.771.149,00	0,00	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
47	630.6 T3			CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	M3	182,00	$ 756.665,00	$ 137.713.030,00	52,00	$ 39.346.580,00			$ -	0,00	$ -	52,00	$ 39.346.580,00
48	630.6 T4			CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	M3	29,00	$ 756.665,00	$ 21.943.285,00	29,00	$ 21.943.285,00			$ -	0,00	$ -	29,00	$ 21.943.285,00
49	640.1 T3			ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	KG	84693,00	$ 8.763,00	$ 742.164.759,00	56783,10	$ 497.590.305,30			$ -	0,00	$ -	56783,10	$ 497.590.305,30
50	640.1 T4			ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	KG	29896,00	$ 8.763,00	$ 261.978.648,00	29896,00	$ 261.978.648,00			$ -	0,00	$ -	29896,00	$ 261.978.648,00

GOBERNACIÓN DE CALDAS

GOBERNACIÓN DE CALDAS

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

PÁGINA 2 de 3

FECHA 10/02/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS

ACTA No: 7 (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA ☑

POR CONTRATO ADICIONAL ☐ No. (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 29092023-1456 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MIGUEL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 071-2022

INTERVENTOR: MAB INGENIERIA DE VALOR

PLAZO INICIAL: 60 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 12/10/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 93.499.614.647,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ -

PLAZO ACUMULADO: 60 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 11/10/2028 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): $ -

No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓ		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTUALIZADAS ANTERIOR / ACTA No. 6 FECHA 26/11/2024		PRESENTES			EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 13 de fecha 13 diciembre 2024		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+/-	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
51	673.2 T3			MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	516,00	$ 281.220,00	$ 145.109.520,00	516,00	$ 145.109.520,00			$ -	0,00	$ -	516,00	$ 145.109.520,00
52	673.2 T4			MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	191,00	$ 281.220,00	$ 53.713.020,00	191,00	$ 53.713.020,00			$ -	0,00	$ -	191,00	$ 53.713.020,00
53	673.1.1			GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 700 N APROXIMADAMENTE	M2	5128,00	$ 11.416,00	$ 58.541.248,00	5128,00	$ 58.541.248,00			$ -	977,00	$ 11.153.432,00	5128,00	$ 58.541.248,00
54	663.1.1			TUBERÍA DE PVC 4"	ML	216,00	$ 47.301,00	$ 10.217.016,00	631,50	$ 29.870.581,50			$ -	248,19	$ 11.739.635,00	631,50	$ 29.870.581,50
55	621.1.2			PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIÁMETRO 1.2 m, INCLUYE EXCAVACIÓN EN ROCA, BAJO AGUA	ML	364,00	$ 4.215.785,00	$ 1.534.545.740,00	89,00	$ 375.204.865,00			$ -	0,00	$ -	89,00	$ 375.204.865,00
56	623.1.2			ANCLAJE PARA REALCE	ML	679,00	$ 45.881,00	$ 31.153.199,00	679,00	$ 31.153.199,00			$ -	319,40	$ 7.373.077,00	679,00	$ 31.153.199,00
57	623.1			ANCLAJE TIPO pasivo con acero #6, inyección de mortero perforación D=7.5cm perforación en material común	ML	4313,00	$ 156.255,00	$ 673.927.815,00	0,00	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
C5				Capítulo 5. Señalización y Demarcación Vial													
58	700.1			LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML	130000,00	$ 2.880,00	$ 374.400.000,00	130000,00	$ 374.400.000,00			$ -	0,00	$ -	130000,00	$ 374.400.000,00
59	701.1.2			TACHA REFLECTIVA - ADHESIVO EPÓXICO	UND	15642,00	$ 10.626,00	$ 166.211.892,00	15642,00	$ 166.211.892,00			$ -	0,00	$ -	15642,00	$ 166.211.892,00
60	710.1.1			SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR, SP Y/O SI, TABLERO EN LÁMINA CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV (75X75 cm)	UND	305,00	$ 752.731,00	$ 229.582.955,00	305,00	$ 229.582.955,00			$ -	0,00	$ -	305,00	$ 229.582.955,00
61	710.1.5			SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO PREVENTIVA DELINEADOR DE CURVA HORIZONTAL SP-75, REFLECTIVO TIPO IV (75X60cm)	UND	1302,00	$ 668.368,00	$ 870.215.136,00	1302,00	$ 870.215.136,00			$ -	0,00	$ -	1302,00	$ 870.215.136,00
C6				Capítulo 6. Transportes													
62	900.2.1			TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	M3/KM	1047841,00	$ 1.536,00	$ 1.609.483.776,00	535271,31	$ 822.176.724,74		-50000,00	$ (76.800.000,00)	120.901,00	$ 200.240.640,00	485271,31	$ 745.376.724,74
C7				Capítulo 7 Obras estabilización tramo 1													
63	201.7			DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	m3	0,00	$ 213.374,00	$ 0,00	85,00	$ 18.136.790,00			$ -	12,80	$ 2.731.188,00	85,00	$ 18.136.790,00
64	630.4.2 T1			CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	m3	0,00	$ 1.023.749,00	$ 0,00	550,10	$ 563.164.324,90		-550,10	$ (563.164.324,90)	0,00	$ 559.069.329,00	0,00	$ -
65	630.6 T1			CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	m3	0,00	$ 585.165,00	$ 0,00	47,64	$ 27.877.260,60			$ -	34,50	$ 20.188.195,00	47,64	$ 27.877.260,60
66	640.1 T1			ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	kg	0,00	$ 8.763,00	$ 0,00	30654,40	$ 268.624.507,20		15000,00	$ 131.445.000,00	25.857,45	$ 220.956.153,00	45654,40	$ 400.069.507,20
67	673.2 T1			MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3	0,00	$ 157.554,00	$ 0,00	264,00	$ 41.594.256,00			$ -	84,20	$ 13.266.046,00	264,00	$ 41.594.256,00
C8				Capítulo 8 Obras no previstas													
68	NP 1 T1			LIMPIEZA MANUAL DE ALCANTARILLAS DIAMETRO 30" A 36" TRAMO 1, INCLUYE CARGUE TRANSPORTE Y DISPOCICIÓN FINAL DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA	m	0,00	$ 97.743,00	$ 0,00	315,00	$ 30.789.045,00			$ -	102,70	$ 10.038.206,00	315,00	$ 30.789.045,00
69	NP2			INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE APORTE DE LA ZONA, NO INCLUYE SUMINISTRO NI TRANSPORTE DE MATERIAL	m3	0,00	$ 24.174,00	$ 0,00	30150,00	$ 728.846.100,00			$ -	13.807,00	$ 333.770.418,00	30150,00	$ 728.846.100,00
70	NP 211.1			REMOCIÓN DE DERRUMBES	m3	0,00	$ 20.603,00	$ 0,00	23232,00	$ 478.648.896,00		30000,00	$ 618.090.000,00	21.904,10	$ 237.451.635,00	53232,00	$ 1.096.738.896,00
71	NP421.1 T1			RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 T1	m3	0,00	$ 3.101,00	$ 0,00	87534,00	$ 271.442.934,00			$ -	41.925,00	$ 264.047.359,00	87534,00	$ 271.442.934,00
72	NP 461P			RECICLADO DE PAVIMENTOS ASFALTICOS EXISTENTES IN SITU SIN ADICIÓN DE MATERIAL CEMENTANTE	m3	0,00	$ 139.068,00	$ 0,00	9290,80	$ 1.292.052.974,40			$ -	8.656,40	$ 1.203.828.235,00	9290,80	$ 1.292.052.974,40
73	NP442P			MEZCLA ASFALTICA NATURAL DE APORTE PARA TRAMOS SIN CARPETA EXISTENTE	m3	0,00	$ 575.292,00	$ 0,00	152,61	$ 87.792.435,66			$ -	152,60	$ 87.789.559,00	152,61	$ 87.792.435,66
74	NP450.2P T1			MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC 19 ASFALTO MODIFICADO TIPO 3 - COMPRA DE MEZCLA TRAMO 1	m3	0,00	$ 1.665.013,00	$ 0,00	4944,94	$ 8.233.389.384,22			$ -	4.503,70	$ 7.498.719.048,00	4944,94	$ 8.233.389.384,22
75	NP 610.2			RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE PRESTAMO EXCAVACIONES Y/O DERRUMBES	m3	0,00	$ 24.830,00	$ 0,00	5737,80	$ 142.469.574,00			$ -	5.271,40	$ 106.910.531,00	5737,80	$ 142.469.574,00
76	NP 610.3 T1			RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG-50 TRAMO 1	m3	0,00	$ 212.901,00	$ 0,00	326,00	$ 69.405.726,00			$ -	277,10	$ 58.994.868,00	326,00	$ 69.405.726,00
77	NP 900.2.2			TRANSPORTE DE MATERIALES A DISTANCIAS MAYORES A MIL METROS (1000M), APLICA PARA MATERIALES USADOS EN EL ITEM 610.1 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3/KM	0,00	$ 1.536,00	$ 0,00	82525,00	$ 126.758.400,00			$ -	79.253,00	$ 80.626.174,00	82525,00	$ 126.758.400,00
78	NP 900.3.2			TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	M3/KM	0,00	$ 2.001,00	$ 0,00	140874,80	$ 281.890.475,70		44996,91	$ 90.038.807,40	68.159,00	$ 92.007.981,00	185871,71	$ 371.929.283,10
79	NP3			DEMOLICIÓN EN ROCA A CIELO ABIERTO, CON CUÑA HIDRAULICA Y/O CEMENTO EXPASIVO PARA ATENCIÓN SITIO CRITICO UBICADO EN EL SECTOR CORINTO K88+500 AL K90+000 (INCLUYE EQUIPO NEUMATICO, PERFORADORA, CILINDRO HIDRAULICO, UNIDAD DE FUERZA Y CEMENTO EXPANSIVO, NO INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL NI TRANSPORTE)	m3	0,00	$ 509.165,00	$ 0,00	730,00	$ 371.690.450,00			$ -	730,00	$ 371.690.450,00	730,00	$ 371.690.450,00
80	NP 210.2.2			EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	0,00	$ 43.112,00	$ 0,00	79115,00	$ 3.410.805.880,00		-3448,30	$ (148.663.109,60)	12.494,40	$ 280.051.241,00	75666,70	$ 3.262.142.770,40
81	NP4			EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE PRESTAMOS, NO INCLUYE CONFORMACIÓN EN ZONAS DE DEPOSITO NI TRANSPORTE	m3	0,00	$ 23.321,00	$ 0,00	37722,00	$ 879.714.762,00			$ -	18.900,30	$ 418.817.175,00	37722,00	$ 879.714.762,00
82	NP 600.2.1			EXCAVACIONES EN ROCA PARA ESTRUCTURAS INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN EN ZONAS DE DEPOSITO AUTORIZADAS	M3	0,00	$ 166.984,00	$ 0,00	4500,00	$ 751.428.000,00			$ -	2.722,00	$ -	4500,00	$ 751.428.000,00
83	NP630.3.2 T1			CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 1	M3	0,00	$ 1.438.313,00	$ 0,00	420,00	$ 604.091.460,00			$ -	299,10	$ -	420,00	$ 604.091.460,00

GOBERNACIÓN DE CALDAS

GOBERNACIÓN DE CALDAS

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

PÁGINA

FECHA: 10/02/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS

ACTA No: 7 (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA ☑ 3 de 3

POR CONTRATO ADICIONAL ☐ No. (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 29092023-1456 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MIGUEL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 071-2022 INTERVENTOR: MAB INGENIERIA DE VALOR

PLAZO INICIAL: 60 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 12/10/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 93.499.614.647,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ -

PLAZO ACUMULADO: 60 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 11/10/2028 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): $ -

No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓ		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 13 de fecha 13 diciembre 2024		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTUALIZADAS ANTERIOR FECHA 26/11/2024		ACTA ACTA No. 6	PRESENTES					
		GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+/-	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
84	NP630.3.2 T3			CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 3	M3	0,00	$ 1.589.243,00	$ 0,00	1096,00	$ 1.741.810.328,00			$ -	62,40	$ -	1096,00	$ 1.741.810.328,00
85	NP630.3.2 T4			CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 4	M3	0,00	$ 1.619.479,00	$ 0,00	1056,00	$ 1.710.169.824,00			$ -	0,00	$ -	1056,00	$ 1.710.169.824,00
86	NP630.4.2 T1			CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 1	M3	0,00	$ 1.304.906,00	$ 0,00	756,00	$ 986.508.936,00			$ -	616,20	$ -	756,00	$ 986.508.936,00
87	NP630.4.2 T3			CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 3	M3	0,00	$ 1.465.062,00	$ 0,00	809,00	$ 1.185.235.158,00			$ -	0,00	$ -	809,00	$ 1.185.235.158,00
88	NP630.4.2 T4			CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 4	M3	0,00	$ 1.497.363,00	$ 0,00	754,00	$ 1.129.011.702,00			$ -	0,00	$ -	754,00	$ 1.129.011.702,00
89	NP630.1.7 T1			CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 1	M3	0,00	$ 997.704,00	$ 0,00	100,00	$ 99.770.400,00			$ -	35,40	$ -	100,00	$ 99.770.400,00
90	NP630.1.7 T3			CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 3	M3	0,00	$ 1.129.320,00	$ 0,00	200,00	$ 225.864.000,00			$ -	1,20	$ -	200,00	$ 225.864.000,00
91	NP630.1.7 T4			CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 4	M3	0,00	$ 1.158.525,00	$ 0,00	200,00	$ 231.705.000,00			$ -	0,00	$ -	200,00	$ 231.705.000,00
92	NP5			CORTE DE PAVIMENTO CON CORTADORA	M	0,00	$ 9.000,00	$ 0,00	45480,00	$ 409.320.000,00			$ -	7.065,90	$ -	45480,00	$ 409.320.000,00
93	NP6 T1			CUNETA DE CONCRETO CLASE D, VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO TRAMO 1	M3	0,00	$ 881.142,00	$ 0,00	2429,00	$ 2.140.293.918,00			$ -	1.255,50	$ -	2429,00	$ 2.140.293.918,00
94	NP6 T3			CUNETA DE CONCRETO CLASE D, VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO TRAMO 3	M3	0,00	$ 1.026.706,00	$ 0,00	2160,00	$ 2.217.684.960,00			$ -	0,00	$ -	2160,00	$ 2.217.684.960,00
95	NP6 T4			CUNETA DE CONCRETO CLASE D, VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO TRAMO 4	M3	0,00	$ 1.059.007,00	$ 0,00	2160,00	$ 2.287.455.120,00			$ -	0,00	$ -	2160,00	$ 2.287.455.120,00
96	NP7			RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 PARA LA INSTALACION DE MEZCLA ASFALTICA SOBRE CAPAS DE RECICLADAS CON ASFALTO NATURAL TRAMO 1	M2	0,00	$ 4.252,00	$ 0,00	44954,00	$ 191.144.408,00			$ -	43.224,10	$ -	44954,00	$ 191.144.408,00
97	NP5			Suministro, fabricación y montaje de refuerzo en el el puente Hierro localizado en la municipalidad de Norcasia, Carretera Dorada-Norcasia, según relación anexa.	Un	0,00	$ 426.509.511,00	$ 0,00	1,00	$ 426.509.511,00			$ -	0,00	$ -	1,00	$ 426.509.511,00
Ajuste al peso																	
				TOTAL COSTOS DE OBRA				$ 84.547.874.037,00		$ 83.923.568.499,00			$ 0,00		$ 20.549.266.710,00		$ 83.923.568.499,00
				REAJUSTES DE OBRA				$ 7.572.940.907,00		$ 7.572.940.907,00			$ 0,00		$ 553.119.220,00		$ 7.572.940.907,00
				PLAN DE MANEJO DE TRANSITO				$ 235.032.250,00		$ 859.337.788,00			$ 0,00		$ 428.443.474,00		$ 859.337.788,00
				PAGA				$ 455.318.280,00		$ 455.318.280,00			$ 0,00		$ 90.165.539,00		$ 455.318.280,00
				AJUSTE A DISEÑOS				$ 688.449.173,00		$ 688.449.173,00			$ 0,00		$ 490.051.447,00		$ 688.449.173,00
				VALOR TOTAL OBRA CONTRATADA				$ 93.499.614.647,00		$ 93.499.614.647,00			$ 0,00		$ 22.111.046.390,00		$ 93.499.614.647,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

Firma:
Nombre: RODRIGO GARCIA CAMPIÑO
Director de obra
Contratista
Matrícula Profesional No.: 17202-124680 CLD

Firma:
Nombre: MONICA GARCIA QUIÑONES
Director de Interventoría
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-46296 CAU

GOBIERNO DE CALDAS

RESUMEN DE ACTIVIDADES ACTA 14 PARCIAL

CONTRATO NRO: 3900026023-1-650

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RÍO NACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PERIODO: ENERO DE 2025

OBRA CIVIL CONTRATADA SEGÚN PROPUESTA Y ESTUDIO PREVIO							OBRAS DEL ADICIONAL		OBRA CIVIL EJECUTADA(+ MAYOR CANTIDAD-COSTA NO PERMITA EJECUTADO																			
		OBRA CIVIL Y PUESTOS DE TRABAJO CONTRATADOS CONTRATO INICIAL							ACTA N° 12		MAYOR CANTIDAD ACTA 12		TOTAL EJECUTADO ACTA N° 12		ACTA N° 13		MAYOR CANTIDAD ACTA 13		TOTAL EJECUTADO ACTA N° 13		ACTA N° 14		MAYOR CANTIDAD ACTA 14		TOTAL EJECUTADO ACTA N° 14		TOTAL EJECUTADO	
NRO.	GRUPO DE AJUSTE	DESCRIPCION	UND	CANT	VR/UNITARIO	VR/TOTAL	CANT.	VR/TOTAL	OBRA CANT.	VALOR VR/TOTAL	OBRA CANT.	VALOR VR/TOTAL	OBRA CANT.	VALOR VR/TOTAL	OBRA CANT.	VALOR VR/TOTAL	OBRA CANT.	VALOR VR/TOTAL	OBRA CANT.	VALOR VR/TOTAL	OBRA CANT.	VALOR VR/TOTAL	OBRA CANT.	VALOR VR/TOTAL	OBRA CANT.	VALOR VR/TOTAL	OBRA CANT.	VALOR VR/TOTAL
C1		**Capítulo 1. Actividades Preliminares**																										
600,2,3	11601	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	109.521,00	43.412,00	4.721.068.352,00																						
210,2	11611	EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	31.136,00	54.573,00	1.699.236.200,00			746,90	40.765.737,00					-42.612,90	-137.149.656,80			-42.612,90	-137.149.656,80							835,20	45.616.545
201,7	11601	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	M3	343,00	213.374,00	73.212.908,00																						
220,1	11601	TERRAPLENES	M3	53.499,00	16.887,00	890.737.813,00																						
203,2	11601	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS	HA	5,00	1.064.469,00	5.322.345,00																					2,80	2.980.343
C2		**Capítulo 2. Estructura de Pavimento**																										
341,2 T1	11603	BASE ESTABILIZADA CON MEZCLA ASFALTICA NATURAL SENAN	M3	15.269,00	286.789,00	4.380.012.880,00																					2.815,90	808.009.179
341,2 T4	11603	BASE ESTABILIZADA CON MEZCLA ASFALTICA NATURAL SENAN	M3	8.459,00	414.067,00	3.502.292.600,00																						
210,1	11602	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	88.291,00	1.742,00	153.732.200,00																					58.347,80	101.618.621
320,3,7 T4	11602	SUBBASE GRANULAR CLASE C SENAN	M3	13.944,00	364.694,00	4.955.111.160,00																						
402,2	11603	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSIÓN ASFALTICA CRR-1	M2	218.909,00	3.940,00	862.128.000,00																						
450,2P T1	11603	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 - COMPRA DE MEZCLA	M3	2.929,00	1.287.314,00	3.769.271.060,00																						
450,2P T3	11603	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 - COMPRA DE MEZCLA	M3	8.720,00	1.443.147,00	9.884.541.840,00																						
450,2P T4	11603	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 - COMPRA DE MEZCLA	M3	5.865,00	1.443.147,00	8.465.704.360,00																						
C3		**Capítulo 3. Estructuras de Drenaje**																										
201,7	11604	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	M3	230,00	213.374,00	49.076.020,00			102,90	21.970.835,00	102,90	21.970.835,00					53,45	11.384.172,00	53,45	11.384.172,00			9,00	1.920.764,00	9,00	1.920.764,00	2.295,35	490.056.163
230,1/6	11604	REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS	ML	207,00	194.653,00	40.296.471,00			169,20	16.896.529,00	169,20	16.896.529,00					68,00	6.792.915,00	68,00	6.792.915,00			75,80	7.377.358,00	75,80	7.377.358,00	733,40	91.764.990
600,2,3	11604	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	37.852,00	43.412,00	1.631.673.424,00			641,40	27.837.337,00	641,40	27.837.337,00									647,50	27.997.370,00	677,10	29.191.138,00	677,10	29.191.138,00	9.855,40	411.963.413
610,1	11604	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3	6.663,00	79.074,00	757.766.142,00			322,90	25.532.995,00	322,90	25.532.995,00					45,20	3.574.168,00	45,20	3.574.168,00							5.697,30	167.926.994
630,1,2	11604	CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - COMPRA DE MEZCLA	M3	1.286,00	1.281.281,00	1.775.641.566,00			27,50	35.504.478,00	27,50	35.504.478,00					-345,20	-477.059.841,00	-345,20	-477.059.841,00								
630,4,2 T1	11604	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	M3	821,00	1.023.749,00	840.617.929,00			19,60	19.461.231,00	19,60	19.461.231,00					-25,80	-26.650.214,00	-25,80	-26.650.214,00								
630,4,2 T3	11604	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	M3	959,00	1.146.249,00	767.233.566,00																						
630,4,2 T4	11604	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	M3	1.586,00	1.146.249,00	1.820.213.412,00																						
630,5 T1	11604	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	M3	486,00	895.969,00	364.560.150,00			2,00	1.791.938,00	2,00	1.791.938,00					3,70	3.317.243,00	5,70	5.109.181,00	0,40	354.956,00	0,40	354.956,00	24,60	14.256.643
630,5 T3	11604	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	M3	968,00	726.699,00	426.772.390,00			1,70	1.296.331,00	1,70	1.296.331,00					1,80	1.210.684,00	3,50	2.507.015,00	1,40	1.059.331,00	1,40	1.059.331,00	5,60	4.259.315
630,5 T4	11604	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	M3	57,00	726.699,00	43.139.905,00															1,10	837.332,00	1,10	837.332,00	1,10	837.332
630,5	11604	CONCRETO RESISTENCIA 17,5 MPa (E)	M3	665,00	965.074,00	633.617.810,00																						
680,1	11604	TUBERIA DE PLASTICO TIPO PVC HORNA RTG-0351 DE DIAMETRO 900 mm	M	1.359,00	2.491.982,00	3.372.308.838,00			261,60	651.780.837,00					192,30	479.291.373,00	192,30	479.291.373,00			68,20	218.894.944,00	68,20	218.894.944,00	3.756,60	1.430.742.510
9A3,1 T1	11604	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	KG	5.864,00	9.781,00	48.608.952,00			33.264,00	260.815.597,00					13.992,00	134.545.996,00	13.992,00	134.545.996,00			18.313,00	165.278.618,00	18.313,00	165.278.618,00	81.836,00	757.756.894
9A3,1 T3	11604	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	KG	56.269,00	9.781,00	455.161.649,00	1.223,10	10.864.779,00	6.233,00	60.864.779,00	914,00	8.939.492,00					814,00	8.260.492,00	1.599,10	14.915.783,00					1.599,10	13.076.769,00	9.253,10	97.270.178
9A3,1 T4	11604	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	KG	157.143,00	9.781,00	1.377.644.109,00													790,00	8.022.770,00	790,00	8.022.770,00	790,00	8.022.770	790,00	8.022.770	790,00	8.022.770
A12,2P	11604	MALLA ELECTROSOLDADA en 15cm	M2	557,00	13.788,00	7.746.121,00																						
671,1 T1	11604	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SIRU NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	2.142,00	709.045,00	1.519.406.280,00																						
671,1 T3	11604	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SIRU NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	5.128,00	837.175,00	4.293.120.640,00																						
671,1 T4	11604	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SIRU NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	1.249,00	827.172,00	1.033.243.280,00																						
673,2 T1	11604	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	3.154,00	157.654,00	495.523.516,00																					4.232,00	665.453.425
673,2 T3	11604	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	15.368,00	291.229,00	2.915.646.360,00																						
673,2 T4	11604	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	8.238,00	291.229,00	2.065.046.160,00																						
673,3,3 T1	11604	MATERIAL DE COBERTURA TIPO SUB-BASE CLASE C SENAN	M3	394,40	188.240,00	74.618.112,00			604,80	112.175.712,00	604,80	112.175.712,00			169,00	37.580.752,00	169,00	37.580.752,00			395,00	81.904.440,00	395,00	81.904.440,00	1.768,80	331.017.656
673,3,3 T3	11604	MATERIAL DE COBERTURA TIPO SUB-BASE CLASE C SENAN	M3	1.668,00	334.695,00	631.617.840,00																						
673,1,1	11604	GEOMEMBRANA TIPO RU TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION (GRAB) NOMINAL DE 700 N APROXIMADAMENTE	M2	88.833,00	11.410,00	1.009.511.130,00																					10.832,00	261.791.211
680,1,1	11604	TUBERIA DE PVC 4"	ML	37.264,00	47.301,00	1.762.263.264,00																					7.777,20	338.264.952
672,2	11605	BORDILLO DE PIEZA PREFABRICADA DE CONCRETO NO INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUBRASANTE DE APOYO	ML	14.596,00	50.340,00	735.103.040,00																						
C4		**Capítulo 4. Obras de Estabilización**																										
600,2,3	11606	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	5.268,00	43.112,00	227.114.016,00																					2.169,40	83.454.097
610,1	11606	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3	4.797,00	79.074,00	379.291.578,00																					5.137,30	406.080.693
630,1,2	11606	CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - COMPRA DE MEZCLA	M3	518,00	1.281.261,00	713.102.196,00																						
630,4,2 T3	11606	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	M3	1.286,00	1.146.249,00	1.692.436.182,00																						
630,4,2 T4	11606	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	M3	133,00	1.146.249,00	116.731.149,00																						
630,5 T3	11606	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	M3	182,00	726.699,00	132.713.030,00																						
630,5 T4	11606	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	M3	29,00	726.699,00	21.043.285,00																						
9A3,1 T3	11606	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	KG	84.693,00	8.782,00	743.164.759,00																						
9A3,1 T4	11606	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	KG	29.606,00	8.781,00	261.470.649,00																						
673,2 T3	11606	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	516,00	291.229,00	145.109.505,00																						
673,2 T4	11606	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	194,00	291.229,00	56.715.026,00																						
673,1,1	11606	GEOMEMBRANA TIPO RU TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION (GRAB) NOMINAL DE 700 N APROXIMADAMENTE	M2	9.176,00	11.410,00	96.547.048,00																					977,60	11.153.432
680,1,1	11606	TUBERIA DE PVC 4"	ML	216,00	47.301,00	10.217.016,00																					346,80	16.399.816
631,1,2	11606	TREMIE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIAMETRO 1,2 m, INCLUYE EXCAVACION EN ROCA, SUELO ATOR	ML	364,00	4.215.780,00	1.534.343.140,00																						
625,1,3	11606	ANCLAJE PARA ROCA E	ML	679,00	45.851,00	31.133.159,00			19,80	3.523.661,50	81,90	5.797.634,00					97,50	3.757.684,00	6,50	318.379,00			6,00	318.379,00	220,30	14.009.941
625,1	11606	ANCLAJE TIPO pernos con acero 60, inyección de mortero perforación D=7,5cm perforación en material terroso	ML	4.313,00	136.289,00	587.827.810,00																						
C5		**Capítulo 5. Señalización y Conservación Vial**																										
705,1	11607	LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO	ML	135.990,00	5.895,00	574.450.050,00																						
701,1,2	11607	TACHA REFLECTIVA - ADHESIVO EPÓXICO	UND	15.942,00	10.029,00	159.871.902,00																						
710,1,1	11607	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR -SP / IG SE TABLERO EN LAMINA GOA LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV (75x75 cm)	UND	305,00	702.721,00	329.542.905,00																						
710,1,5	11607	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO PREVENTIVA DELINEADOR DE CURVA HORIZONTAL SP-23, REFLECTIVO TIPO IV (75x900cm)	UND	1.300,00	668.368,00	870.211.136,00																						
C6		**Capítulo 6. Transportes**																										
800,2,1	11608	TRANSPORTE EN MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) HASTA DIEZ KILÓMETROS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	M3-KM	1.047.841,00	1.631,00	1.685.483.770,00	1.771,50	2.705.296,50	6.771,60	4.705.456,00	11.295,00	17.256.090,50					11.295,00	17.256.090,50	5.743,00	10.267.245,00			5.743,50	10.267.245,00	537.644,00	816.081.154
C7		**Capítulo 7 Obras complementarias Ítems 1**																										
810,2 T1	11608	DESMOLICION DE ESTRUCTURAS	M3	-	213.374,00	0,00																					12,96	2.764.788

GOBIERNO DE CALDAS

RESUMEN DE ACTIVIDADES ACTA 14 PARCIAL

CONTRATO NAD 20092023-1-694

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA LA DORADA - SONSON, RUTA 50), REALINEAMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PERIODO ENERO DE 2025

OBRA CIVIL CONTRATADA SEGUN PROPUESTA Y ESTUDIO PREVIO										OBRAS DEL ADICIONAL	
OBRA CIVIL Y PUESTOS DE TRABAJO CONTRATADOS CONTRATO INICIAL											
ARC.	GRUPO DE AJUSTE	DESCRIPCION	UNID	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL				CANT.	V/L TOTAL
PVT	11604	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) + COMPRA DE MEZCLA	m3	-	1,689,746.00	0.00					
630,4,2 T1	11606	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	m3	-	595,160.00	0.00					
630,8 T1	11606	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	kg	-	6,793.00	0.00					
640,1 T1	11606	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3	-	157,564.00	0.00					
CS		**Cambio 2 Obras no previstas**									
NP 1 T1	11604	LIMPIEZA MANUAL DE ALCANTARILLAS DIAMETRO 30" A 36" TRAMO 1, INCLUYE CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA	m	-	97,743.00	0.00					
NP2	11602	INSTALACION Y COMPACTACION DE MATERIAL DE APORTE DE LA ZONA 100 INCLUYE SUMINISTRO MTRANSPORTE DE MATERIAL	m3	-	29,174.00	0.00					
NP 211,1	11601	REMOCION DE DERRUMBES	m3	-	20,870.00	0.00					
NP421,1 T1	11603	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 T1	m2	-	3,101.00	0.00					
NP 451P	11603	RECICLADO DE PAVIMENTOS ASFALTICOS EXISTENTES IN SITU SIN ADICION DE MATERIAL CEMENTANTE	m2	-	130,000.00	0.00					
NP452P	11603	MEZCLA ASFALTICA NATURAL DE APORTE PARA IRIANGO SIN CARPETA EXISTENTE	m3	-	575,290.00	0.00					
NP460,2P T1	11602	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC 19 ASFALTO MODIFICADO TIPO 3+ COMPRA DE MEZCLA TRAMO 1	m3	-	1,665,011.00	0.00					
NP510,2	11606	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE PRESTAMO EXCAVACIONES Y/O DERRUMBES	m3	-	24,205.00	0.00					
NP 610,3 T1	11604	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG-50 TRAMO 1	m3	-	215,061.00	0.00					
NP 999,2,2	11605	TRANSPORTE DE MATERIALES A DISTANCIAS MAYORES A MIL METROS (1000M): APLICA PARA MATERIALES USADOS EN EL ITEM 610,1 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3/M	-	1,536.00	0.00	23,148.00	35,566,464.00	23,148.00	35,566,464.00	
NP 999,3,2	11605	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	M3/M	-	2,661.00	0.00	7,883.00	15,773,883.00	7,883.00	15,773,883.00	
NP3	11601	EXCAVACION EN ROCA A CIELO ABIERTO, CON CUÑA HIDRAULICA Y/O DEMITO EXPANSIVO PARA ATENCION SITIO CRITICO UBICADO EN EL SECTOR CORINTO VEREDA LA VISMIA (INCLUYE EQUIPO NEUMATICO, PERFORADORA, MARTILLO HIDRAULICO, UNIDAD DE FUERZA Y CEMENTO EXPANSIVO NO INCLUYE DISPOSICION FINAL NI TRANSPORTE)	m3	-	606,165.00	0.00					
NP 210,2	11601	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN DE LA EXPLANACION Y CANALES	m3	-	43,312.00	0.00	4,207.70	181,600,302.90	4,207.70	181,600,302.90	
NP4	11601	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN DE PRESTAMOS Y/O INCLUYE CONFORMACION EN ZONAS DE DEPOSITO NI TRANSPORTE	m3	-	33,021.00	0.00	514.90	21,207,963.00	514.90	21,207,963.00	
NP 640,1	11604	EXCAVACIONES EN ROCA PARA ESTRUCTURAS INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION EN ZONAS DE DEPOSITO AUTORIZADAS	M3	-	166,284.00	0.00					
NP630,3,2 T1	11604	CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) + PREPARADO EN OBRA TRAMO 1	M3	-	1,438,313.00	0.00					
NP630,3,2 T3	11604	CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) + PREPARADO EN OBRA TRAMO 3	M3	-	1,688,243.00	0.00					
NP630,3,2 T4	11606	CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) + PREPARADO EN OBRA TRAMO 4	M3	-	1,618,475.00	0.00					
NP630,4,2 T1	11606	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) + PREPARADO EN OBRA TRAMO 1	M3	-	1,204,950.00	0.00					
NP630,4,2 T2	11606	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) + PREPARADO EN OBRA TRAMO 2	M3	-	1,467,062.00	0.00					
NP630,4,2 T4	11606	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) + PREPARADO EN OBRA TRAMO 4	M3	-	1,481,283.00	0.00					
NP636,1,7 T1	11604	CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 21MPa (D) + PREPARADO EN OBRA TRAMO 1	M3	-	991,794.00	0.00	35.00	34,942,600.00	35.00	34,942,600.00	
NP636,1,7 T3	11604	CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 21MPa (D) + PREPARADO EN OBRA TRAMO 3	M3	-	1,129,320.00	0.00					
NP636,1,7 T4	11604	CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 21MPa (D) + PREPARADO EN OBRA TRAMO 4	M3	-	1,158,329.00	0.00					
NP5	11605	CORTE DE PAVIMENTO CON CORTADORA	M	-	9,091.00	0.00					
NP6 T1	11604	CUNETA DE CONCRETO CLASE D, VACIADA IN SITU, NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO TRAMO 1	M3	-	891,142.00	0.00	570.00	787,399,568.00	570.00	787,399,568.00	
NP6 T3	11604	CUNETA DE CONCRETO CLASE D, VACIADA IN SITU, NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO TRAMO 3	M3	-	1,024,756.00	0.00					
NP6 T4	11604	CUNETA DE CONCRETO CLASE D, VACIADA IN SITU, NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO TRAMO 4	M3	-	1,008,807.00	0.00					
NP7	11603	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 PARA LA INSTALACION DE MEZCLA ASFALTICA SOBRE CAPAS DE RECICLADAS CON ASFALTO NATURAL TRAMO 1	M2	-	4,292.00	0.00					
NP5	14104	Demolición, fabricación y montaje de refuerzo en el el puente viejo localizado entre municipalidad de Norcasia, Carretera Dorada-Norcasia, segun relación anexa.	UN	-	426,604,611.00	0.00					

OBRA CIVIL EJECUTADA Y MAYOR CANTIDAD - OBRA NO PREVISTA EJECUTADA																					
ACTA Nº 13		MAYOR CANTIDAD ACTA 13		TOTAL EJECUTADO ACTA Nº 13		ACTA Nº 13		MAYOR CANTIDAD ACTA 13		TOTAL EJECUTADO ACTA Nº 13		ACTA Nº 14		MAYOR CANTIDAD ACTA 14		TOTAL EJECUTADO ACTA Nº 14		TOTAL EJECUTADO	
OBRA	VALOR	OBRA	VALOR	OBRA	VALOR	OBRA	VALOR	OBRA	VALOR	OBRA	VALOR	OBRA	VALOR	OBRA	VALOR	OBRA	VALOR	OBRA	VALOR
CANT.	V/L TOTAL	CANT.	V/L TOTAL	CANT.	V/L TOTAL	CANT.	V/L TOTAL	CANT.	V/L TOTAL	CANT.	V/L TOTAL	CANT.	V/L TOTAL	CANT.	V/L TOTAL	CANT.	V/L TOTAL	CANT.	V/L TOTAL
		3.10	3,173,622.00	3.10	5,173,622.00			494.29	494,242,951.00	494.29	494,242,951.00								
		525.49	4,604,569.00	525.49	4,604,569.00			117.29	1,027,912.00	117.29	1,027,912.00							34.90	25,199,195
																		25,897.45	229,550,634
																		84.20	12,204,941
																		102.76	15,035,256
																		67,807.06	339,270,419
		5,000.00	105,615,000.00	5,233.60	124,615,000.00			3,049.00	164,024,567.00	3,049.00	164,024,567.00			15,091.00	321,225,373.00	15,091.00	321,225,373.00	37,486.60	772,871,940
								43,234.10	1,734,227,934.00	43,234.10	1,734,227,934.00							43,234.10	1,734,227,934
																		8,850.40	1,763,838,235
																		112.60	47,286,938
																		4,007.70	7,666,218,948
		536.70	13,385,953.50	536.70	13,385,953.50			429.60	10,592,479.20	429.60	10,592,479.20			283.70	7,019,441.50	283.70	7,019,441.50	5,064.90	127,938,302
																		377.90	36,994,895
		23,148.00	35,566,464.00	23,148.00	35,566,464.00			5,913.00	9,549,899.00	5,913.00	9,549,899.00							79,253.00	121,732,464
		7,883.00	15,773,883.00	7,883.00	15,773,883.00			14,295.20	28,604,295.20	14,295.20	28,604,295.20			39,750.00	79,539,750.00	39,750.00	79,539,750.00	167,699.00	216,905,919
																		720.90	371,650,400
		4,207.70	181,600,302.90	4,207.70	181,600,302.90			1,795.60	77,204,979.20	1,795.60	77,204,979.20							12,494.40	534,805,573
		514.90	21,207,963.00	514.90	21,207,963.00			439.60	9,948,744.00	439.60	9,948,744.00			282.70	6,390,447.00	282.70	6,390,447.00	86,164.00	467,356,144
								2,722.00	474,530,445.20	2,722.00	474,530,445.20			147.70	24,663,237.00	147.70	24,663,237.00	2,291.00	479,193,960
								799.10	439,169,414.00	799.10	439,169,414.00							799.10	439,169,414
								82.40	99,186,753.00	82.40	99,186,753.00			31.70	50,378,603.00	31.70	50,378,603.00	94.90	149,647,766
														17.80	28,826,726.00	17.80	28,826,726.00	17.80	28,826,726
								616.20	804,263,677.20	616.20	804,263,677.20			4.90	6,394,639.50	4.90	6,394,639.50	621.10	810,472,316
		35.00	34,942,600.00	35.00	34,942,600.00			10.40	10,370,722.00	10.40	10,370,722.00			1.40	1,395,788.00	1.40	1,395,788.00	35.40	35,710,588
								1.20	1,395,164.00	1.20	1,395,164.00			7.40	8,316,964.00	7.40	8,316,964.00	8.60	9,712,128
		4,883.79	44,313,300.00	4,883.79	44,313,300.00			2,147.20	19,279,690.00	2,147.20	19,279,690.00			3,199.00	29,782,000.00	3,199.00	29,782,000.00	10,230.00	93,374,990
		570.00	787,399,568.00	570.00	787,399,568.00			384.80	338,687,213.00	384.80	338,687,213.00			542.10	477,607,078.00	542.10	477,607,078.00	5,797.00	1,603,845,859
								43,234.10	193,788,573.30	43,234.10	193,788,573.30			5.90	387,802,240.00	5.90	387,802,240.00	43,234.10	193,788,573
																		5.90	387,802,240

TOTAL COSTOS DE OBRA	84,947,874,037.00	176,899,878.00	7,303,381,183.00	3,674,167,211.90	474,364,305.80	3,478,878,997.80	1,897,466,984.80	57,930,344.00	1,883,660,047.00	1,940,490,761.00	75,812,515,897.80	
REAJUSTES DE OBRA	7,972,940,967.00	74,093,709.00	0.00	74,093,709.00	0.00	0.00	0.00	73,949,500.00	0.00	73,949,500.00	791,582,516.00	
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	226,692,250.00	93,246,348.34	0.00	93,246,348.34	70,931,520.00	0.00	70,931,520.00	23,015,552.00	0.00	23,015,552.00	413,886,962.00	
PASA	466,318,288.00	33,218,188.30	0.00	33,218,188.30	28,064,202.00	0.00	28,064,202.00	23,129,172.00	0.00	23,129,172.00	176,887,764.00	
AJUSTE A DIGITOS	882,440,173.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-999,811,447.00	
VALOR TOTAL OBRA CONTRATADA	93,499,314,647.00	377,057,908.10	7,303,381,183.00	7,710,326,247.50	573,359,977.80	3,478,878,997.80	1,997,472,425.80	178,024,568.00	1,883,660,047.00	2,061,385,215.00	78,870,072,715.10	

VALOR ACTA 14 PARCIAL	$	2,061,385,215.00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$	308,422,584.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$	1,807,880,694.00

JUAN DAVID DUQUE P.
SUPERVISOR
GOBERNACIÓN DE CALDAS

ARIEL ALBERTO CORDOBA GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTOR EXTERNO
MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.S.

ALEJANDRO GARCIA CARDENAS
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO SAN MIGUEL

GOBIERNO DE CALDAS

ACTA DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRA ADICIONAL NO PREVISTA AL
ACTA DE OBRA NRO CATORCE (14) PARCIAL AL CONTRATO DE OBRA NRO. 29092023-1456
RADICADO SECRETARIA JURÍDICA NRO 29092023-1456

Secretaria :	**INFRAESTRUCTURA**				
Fecha acta mayores cantidades	**13/02/2025**				
Concepto	**Descripción**				
No. Radicado Contrato de Obra	29092023-1456	Acto Administrativo:			
No. Pedido en SAP:	4500024051				
NIT ó RUT:	901.740.908-5				
Contratista:	CONSORCIO SAN MIGUEL CONFORMADO POR: HARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES S.A.S (PARTICIPACIÓN 10%), GAMA INGENIEROS ARQUITECTOS S.A.S. (PARTICIPACIÓN 45%) Y INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S. (PARTICIPACIÓN 45%)				
Contrato Cedido a:					
Representante Legal:	CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA				
Valor del Contrato ($):	$ 93.499.614.647,00	Aporte Departamento			$ 93.499.614.647
Valor Adición 1	$ 0,00	Aporte otras entidades	N/A		
Valor Adición 2	$ 0,00				
Valor Adición 3	$ 0,00				
Objeto del contrato de Obra	MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS				
Compromiso Presupuestal:	3500021700-3500021701	FONDO	2-0408 - 0-0408		
Duración del contrato (Plazo):	Duración Contrato: SESENTA (60) MESES DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO				
Prorroga					
Fecha de Iniciación	12-oct.-23		Fecha de terminación	11-oct.-28	
Fecha de Reiniciación 1					
Supervisor Departamento	Ing. Juan David Duque Pedraza				
Interventro externo	MAB INGENIERIA DE VALOR (A CARGO DE INVIAS)				

MAYORES CANTIDADES DE OBRA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/PARCIAL
C3	**Capitulo 2. Estructura de Pavimento**				
310.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	10.147,00	1.743,00	17.686.221,00
C3	**Capitulo 3. Estructuras de Drenaje**				
201.7	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	M3	2.069,10	213.374,00	441.492.143,40
201.15	REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS	ML	536,80	104.053,00	55.855.650,40
663.1	TUBERÍA DE PLASTICO TIPO PVC NORMA NTC-5055 DE DIAMETRO 900 mm	ML	839,60	2.481.462,00	2.083.435.495,20
640.1 T1	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	KG	76.224,00	8.763,00	667.950.912,00
673.2 T1	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	1.076,00	157.554,00	169.528.104,00
673.3.3 T1	MATERIAL DE COBERTURA TIPO SUB- BASE CLASE C SBG-20	M3	1.362,00	188.848,00	257.210.976,00
C4	**Capitulo 4. Obras de Estabilización**				
663.1.1	TUBERÍA DE PVC 4"	ML	32,19	47.301,00	1.522.619,19
c7	**Capitulo 7 Obras estabilización tramo 1**				
673.2 T1	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	m3	12,80	213.374,00	2.731.187,20
201.7	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	m3	0,00	1.023.749,00	0,00
630.4.2 T1	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	m3	34,50	585.165,00	20.188.192,50
630.6 T1	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	kg	25.857,45	8.763,00	226.588.834,35
640.1 T1	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3	84,20	157.554,00	13.266.046,80
				TOTAL COSTOS DE OBRA	**$ 3.957.456.382**

OBRA NO PREVISTA

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/PARCIAL
NP 1 T1	LIMPIEZA MANUAL DE ALCANTARILLAS DIAMETRO 30" A 36" TRAMO 1, INCLUYE CARGUE TRANSPORTE Y DISPOCICIÓN FINAL DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA.	m	102,70	97.743,00	10.038.206,10
NP2	INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE APORTE DE LA ZONA, NO INCLUYE SUMINISTRO NI TRANSPORTE DE MATERIAL	m3	13.807,00	24.174,00	333.770.418,00
NP 211.1	REMOCIÓN DE DERRUMBES	m3	37.495,10	20.603,00	772.511.545,30
NP421.1 T1	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 T1	m3	41.925,00	3.101,00	130.009.425,00
NP 461P	RECICLADO DE PAVIMENTOS ASFALTICOS EXISTENTES IN SITU SIN ADICIÓN DE MATERIAL CEMENTANTE	m3	8.656,40	139.068,00	1.203.828.235,20
NP442P	MEZCLA ASFALTICA NATURAL DE APORTE PARA TRAMOS SIN CARPETA EXISTENTE	m3	152,60	575.292,00	87.789.559,20
NP450.2P T1	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC 19 ASFALTO MODIFICADO TIPO 3 - COMPRA DE MEZCLA TRAMO 1	m3	4.503,70	1.665.013,00	7.498.719.048,10
NP 610.2	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE PRESTAMO,EXCAVACIONES Y/O DERRUMBES	m3	5.554,10	24.830,00	137.908.303,00
NP 610.3 T1	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG-50 TRAMO 1	m3	277,10	212.901,00	58.994.867,10
NP 900.2.2	TRANSPORTE DE MATERIALES A DISTANCIAS MAYORES A MIL METROS (1000M), APLICA PARA MATERIALES USADOS EN EL ITEM 610.1 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3/KM	79.253,00	1.536,00	121.732.608,00
NP 900.3.2	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	M3/KM	107.909,00	2.001,00	215.925.909,00

GOBIERNO DE CALDAS

ACTA DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRA ADICIONAL NO PREVISTA AL
ACTA DE OBRA NRO CATORCE (14) PARCIAL AL CONTRATO DE OBRA NRO. 29092023-1456
RADICADO SECRETARIA JURÍDICA NRO 29092023-1456

Secretaria :	**INFRAESTRUCTURA**				
Fecha acta mayores cantidades	**13/02/2025**				
Concepto	**Descripción**				
No. Radicado Contrato de Obra	29092023-1456	Acto Administrativo:			
No. Pedido en SAP:	4500024051				
NIT ó RUT:	901.740.908-5				
Contratista:	CONSORCIO SAN MIGUEL CONFORMADO POR: HARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES S.A.S (PARTICIPACIÓN 10%), GAMA INGENIEROS ARQUITECTOS S.A.S. (PARTICIPACIÓN 45%) Y INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S. (PARTICIPACIÓN 45%)				
Contrato Cedido a:					
Representante Legal:	CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA				
Valor del Contrato ($):	$ 93.499.614.647,00	Aporte Departamento		$ 93.499.614.647	
Valor Adición 1	$ 0,00	Aporte otras entidades	N/A		
Valor Adición 2	$ 0,00				
Valor Adición 3	$ 0,00				
Objeto del contrato de Obra	MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS				
Compromiso Presupuestal:	3500021700-3500021701	FONDO	2-0408 - 0-0408		
Duración del contrato (Plazo):	Duración Contrato: SESENTA (60) MESES DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO				
Prorroga					
Fecha de iniciación	12-oct.-23	Fecha de terminación	11-oct.-28		
Fecha de Reiniciación 1					
Supervisor Departamento	Ing. Juan David Duque Pedraza				
Interventro externo	MAB INGENIERIA DE VALOR (A CARGO DE INVIAS)				

MAYORES CANTIDADES DE OBRA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/PARCIAL
NP3	DEMOLICIÓN EN ROCA A CIELO ABIERTO, CON CUÑA HIDRAULICA Y/O CEMENTO EXPASIVO PARA ATENCIÓN SITIO CRITICO UBICADO EN EL SECTOR CORINTO K88+500 AL K90+000 (INCLUYE EQUIPO NEUMATICO, PERFORADORA, CILINDRO HIDRAULICO, UNIDAD DE FUERZA Y CEMENTO EXPANSIVO, NO INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL NI TRANSPORTE)	m3	730,00	509.165,00	371.690.450,00
NP 210.2.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	12.494,40	43.112,00	538.658.572,80
NP4	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE PRESTAMOS, NO INCLUYE CONFORMACIÓN EN ZONAS DE DEPOSITO NI TRANSPORTE	m3	19.183,00	23.321,00	447.366.743,00
NP 600.2.1	EXCAVACIONES EN ROCA PARA ESTRUCTURAS INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN EN ZONAS DE DEPOSITO AUTORIZADAS	M3	2.869,70	166.984,00	479.193.984,80
NP630.3.2 T1	CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 1	M3	299,10	1.438.313,00	430.199.418,30
NP630.3.2 T3	CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 3	M3	94,10	1.589.243,00	149.547.766,30
NP630.3.2 T4	CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 4	M3	17,80	1.619.479,00	28.826.726,20
NP630.4.2 T1	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 1	M3	621,10	1.304.906,00	810.477.116,60
NP630.4.2 T3	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 3	M3	0,00	1.465.062,00	0,00
NP630.4.2 T4	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 4	M3	0,00	1.497.363,00	0,00
NP630.1.7 T1	CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 1	M3	36,80	997.704,00	36.715.507,20
NP630.1.7 T3	CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 3	M3	8,60	1.129.320,00	9.712.152,00
NP630.1.7 T4	CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 4	M3	0,00	1.158.525,00	0,00
NP5	CORTE DE PAVIMENTO CON CORTADORA	M	10.263,90	9.000,00	92.375.100,00
NP6 T1	CUNETA DE CONCRETO CLASE D, VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO TRAMO 1	M3	1.797,60	881.142,00	1.583.940.859,20
NP6 T3	CUNETA DE CONCRETO CLASE D, VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO TRAMO 3	M3	0,00	1.026.706,00	0,00
NP6 T4	CUNETA DE CONCRETO CLASE D, VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO TRAMO 4	M3	0,00	1.059.007,00	0,00
NP7	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 PARA LA INSTALACION DE MEZCLA ASFALTICA SOBRE CAPAS DE RECICLADAS CON ASFALTO NATURAL TRAMO 1	M2	43.224,10	4.252,00	183.788.873,20
NP5	Suministro, fabricación y monatje de refuerzo en el el puente Hierro localizado en la municipalidad de Norcasia, Carretera Dorada-Norcasia, según relación anexa.	Un	0,90	426.509.511,00	383.858.559,90
				TOTAL COSTOS DE OBRA	**$ 16.117.579.954**

GOBIERNO DE CALDAS

ACTA DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRA ADICIONAL NO PREVISTA AL
ACTA DE OBRA NRO CATORCE (14) PARCIAL AL CONTRATO DE OBRA NRO. 29092023-1456
RADICADO SECRETARIA JURÍDICA NRO 29092023-1456

Secretaria :	**INFRAESTRUCTURA**				
Fecha acta mayores cantidades	**13/02/2025**				
Concepto	**Descripción**				
No. Radicado Contrato de Obra	29092023-1456	Acto Administrativo:			
No. Pedido en SAP:	4500024051				
NIT ó RUT:	901.740.908-5				
Contratista:	CONSORCIO SAN MIGUEL CONFORMADO POR: HARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES S.A.S (PARTICIPACIÓN 10%), GAMA INGENIEROS ARQUITECTOS S.A.S. (PARTICIPACIÓN 45%) Y INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S. (PARTICIPACIÓN 45%)				
Contrato Cedido a:					
Representante Legal:	CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA				
Valor del Contrato ($):	$ 93.499.614.647,00	Aporte Departamento		$ 93.499.614.647	
Valor Adición 1	$ 0,00	Aporte otras entidades	N/A		
Valor Adición 2	$ 0,00				
Valor Adición 3	$ 0,00				
Objeto del contrato de Obra	MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS				
Compromiso Presupuestal:	3500021700-3500021701	FONDO	2-0408 - 0-0408		
Duración del contrato (Plazo):	Duración Contrato: SESENTA (60) MESES DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO				
Prorroga					
Fecha de iniciación	12-oct.-23	Fecha de terminación		11-oct.-28	
Fecha de Reiniciación 1					
Supervisor Departamento	Ing. Juan David Duque Pedraza				
Interventro externo	MAB INGENIERIA DE VALOR (A CARGO DE INVIAS)				

MAYORES CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/PARCIAL

Justificación: Para el reemplazo de las alcatarillas existentes se ha requerido la demolición de las estructuras existentes, adicional para la construcción del filtro longitudinal se requiere la demolición de la cuneta. existente lo cual a generado mayores cantidades de obra para el item 201.7 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS
Se han ejecutado los filtros de acuerdo a las necesidades del proyecto lo cual a generado mayores cantidades de obra por mayor longitud de filtro requerida vs la contemplada en los presupuestos iniciales, adicional por la adicion del tramo K33+000 al K33+790

Debido a que entre el K27+000 al K33+790 se encuentran varios sitios puntuales que presentan perdidas de banca es necesario ejecutar mayores cantidades de obra en los items relacionados con la construcción de muros de contención y la inclusión de estos en un nuevo capitulo denominado Capitulo 7 Obras de estabilización tramo.

Se incluyen los APU NP conciliados para la ejecución de las obras requeridas de acuerdo a las necesidades del proyecto los cuales se encuentran sustentados en las memorias tecnicas presentadas con los APUs.

JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA
Secretario de Infraestructura
EL DEPARTAMENTO

RODRIGO GARCIA CAMPIÑO
CONSORCIO SAN MIGUEL
Contratista

JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA
SUPERVISOR
EL DEPARTAMENTO

ARIEL ALBERTO CORREDOR GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTOR EXTERNO
MAB INGENIERIA DE VALOR

GOBIERNO DE CALDAS

PRESACTA NRO 17 PARCIAL CONTRATO DE OBRA Nro. 29092023-1456
RADICADO SECRETARIA JURIDICA Nro. 29092023-1456

Secretaria : INFRAESTRUCTURA
Fecha Presacta 13/02/2025

Concepto	Descripción			
No. Radicado Contrato de Obra	29092023-1456	Acto Administrativo:		
No. Pedido en SAP:	4500024051			
NIT o RUT:	901740908-5			
Contratista:	CONSORCIO SAN MIGUEL			
Representante Legal:	CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA			
Valor del Contrato ($):	$ 93.499.614.647,00	Aporte Departamento:	$ 93.499.614.647,00	
Valor Adición	N/A	Aporte otras entidades	N/A	
Objeto del Contrato	MEJORAMIENTO DE LA VIA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS			
Disponibilidad presupuestal	3500021700-3500021701	FONDO	2-0408 - 0-040s	
Duración del Contrato (Plazo):	Duración Contrato: SESENTA (60) MESES DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION			
Fecha de Iniciación	12/10/2023	Fecha de terminación	11/10/2028	
Interventor	MAB INGENIERIA DE VALOR (A CARGO DE INVIAS)			
Supervisor Departamento	JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA			

OBRA EJECOTADA SEGÚN CONTRATO + MAYORES CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	MEDIDAS
C1	**Capitulo 1. Actividades Preliminares**			
600.2.3	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	m3	0,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO
210.2.1	EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	0,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO
201.7	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	m3	0,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO
220.1	TERRAPLENES	m3	0,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO
200.2	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS	ha	0,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
C2	**Capitulo 2. Estructura de Pavimento**			
341.2 T1	BASE ESTABILIZADA CON MEZCLA ASFALTICA NATURAL BEMAN	m3	0,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
341.2 T4	BASE ESTABILIZADA CON MEZCLA ASFALTICA NATURAL BEMAN	m3	0,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
310.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	0,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
320.3.1 T4	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	0,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
420.2	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1	m2	0,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
450.2P T1	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC 19 - COMPRA DE MEZCLA	m3	0,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
450.2P T3	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC 19 - COMPRA DE MEZCLA	m3	0,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
450.2P T4	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC 19 - COMPRA DE MEZCLA	m3	0,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
C3	**Capitulo 3. Estructuras de Drenaje**			
201.7	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	m3	9,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
201.15	REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS	m	70,90	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
600.2.3	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	m3	677,10	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
610.1	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	m3	0,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
630.3.2	CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - COMPRA DE MEZCLA	m3	0,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
630.4.2 T1	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	m3	0,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
630.4.2 T3	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	m3	0,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
630.4.2 T4	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	m3	0,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
630.6 T1	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	m3	0,40	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
630.6 T3	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	m3	1,40	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
630.6 T4	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	m3	1,10	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
630.5	CONCRETO RESISTENCIA 17.5 MPa (E)	m3	0,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
663.1	TUBERÍA DE PLASTICO TIPO PVC NORMA NTC-5055 DE DIAMETRO 900 mm	m	88,20	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
640.1 T1	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	kg	19313,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
640.1 T3	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	kg	1588,13	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
640.1 T4	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	kg	790,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
812.2P	MALLA ELECTROSOLDADA e= 15cm	m2	0,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
671.1 T1	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	m3	0,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
671.1 T3	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	m3	0,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
671.1 T4	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	m3	0,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
673.2 T1	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3	0,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
673.2 T3	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3	0,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
673.2 T4	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3	0,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
673.3.3 T1	MATERIAL DE COBERTURA TIPO SUB- BASE CLASE C SBG-20	m3	326,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
673.3.3 T3	MATERIAL DE COBERTURA TIPO SUB- BASE CLASE C SBG-20	m3	0,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)

GOBIERNO DE CALDAS

PREACTA NRO 13 PARCIAL CONTRATO DE OBRA Rad. 29092023-1456

RADICADO SECRETARIA JURIDICA Rad. 29092023-1456

Secretaria : INFRAESTRUCTURA

Fecha Preacta 13/02/2025

Concepto	Descripción			
No. Radicado Contrato de Obra	29092023-1456	Acto Administrativo:		
No. Pedido en SAP:	4500024851			
NIT o RUT:	901710908-3			
Contratista:	CONSORCIO SAN MIGUEL			
Representante Legal:	CARLOS TOMASIO CADAVID MEJIA			
Valor del Contrato ($):	$ 93.499.614.647,00	Aporte Departamento	$ 93.499.614.647,00	
Valor Adición	N/A	Aporte otras entidades	N/A	
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO DE LA VIA DORADA - SAMIÑA, RUTA DEL REMACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS			
Disponibilidad presupuestal	3500021700-3500021701	FONDO	2-0408 - 8-0408	
Duración del contrato (Plazo):	Duración Contrato: SESENTA (60) MESES DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION			
Fecha de Iniciación	12/10/2023		Fecha de Terminación	11/10/2028
Interventor	MAB INGENIERIA DE VALOR (A CARGO DE VIAS)			
Supervisor Departamento	JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA			

OBRA EJECUTADA SEGÚN CONTRATO + MAYORES CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	MEDIDAS
673.1.1	GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 700 N APROXIMADAMENTE	m2	0,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
663.1.1	TUBERÍA DE PVC 4"	m	0,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
672.2	BORDILLO DE PIEZA PREFABRICADA DE CONCRETO; NO INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	m	0,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
C4	Capitulo 4. Obras de Estabilización			
600.2.3	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	m3	0,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
610.1	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	m3	0,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
630.3.2	CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - COMPRA DE MEZCLA	m3	0,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
630.4.2 T3	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	m3	0,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
630.4.2 T4	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	m3	0,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
630.6 T3	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	m3	0,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
630.6 T4	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	m3	0,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
640.1 T3	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	kg	0,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
640.1 T4	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	kg	0,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
673.2 T3	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3	0,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
673.2 T4	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3	0,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
673.1.1	GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 700 N APROXIMADAMENTE	m2	0,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
663.1.1	TUBERÍA DE PVC 4"	m	0,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
621.1.2	PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIÁMETRO 1.2 m, INCLUYE EXCAVACIÓN EN ROCA, BAJO AGUA	m	0,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
623.1.2	ANCLAJE PARA REALCE	m	0,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
623.1	ANCLAJE TIPO pasivos con acero #6, inyección de mortero perforación D=7.5cm perforación en material común	m	0,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
C5	Capitulo 5. Señalización y Demarcación Vial			
700.1	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	m	0,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
701.1.2	TACHA REFLECTIVA - ADHESIVO EPÓXICO	u	0,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
710.1.1	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR, SP Y/O SI, TABLERO EN LÁMINA CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV (75X75 cm)	u	0,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
710.1.5	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO PREVENTIVA DELINEADOR DE CURVA HORIZONTAL SP-75. REFLECTIVO TIPO IV (75X60cm).	u	0,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
C6	Capitulo 6. Transportes			
900.2.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	6743,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
C7	Capitulo 7 Obras estabilización tramo 1			
201.7	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	m3	0,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
630.4.2 T1	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	m3	0,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
630.6 T1	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	m3	0,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
640.1 T1	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	kg	0,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
673.2 T1	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3	0,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
C8	Caitulo 8 Obras no previstas			
NP 1 T1	LIMPIEZA MANUAL DE ALCANTARILLAS DIAMETRO 30" A 36" TRAMO 1, INCLUYE CARGUE TRANSPORTE Y DISPOCICIÓN FINAL DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA.	m	0,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
NP2	INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE APORTE DE LA ZONA, NO INCLUYE SUMINISTRO NI TRANSPORTE DE MATERIAL	m3	0,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
NP 211.1	REMOCIÓN DE DERRUMBES	m3	15591,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
NP421.1 T1	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 T1	m3	0,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
NP 461P	RECICLADO DE PAVIMENTOS ASFALTICOS EXISTENTES IN SITU SIN ADICIÓN DE MATERIAL CEMENTANTE	m3	0,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
NP442P	MEZCLA ASFALTICA NATURAL DE APORTE PARA TRAMOS SIN CARPETA EXISTENTE	m3	0,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)

GOBIERNO DE CALDAS

PREACTA NRO 13 PARCIAL CONTRATO DE OBRA Nro. 29092023-1436
RADICADO SECRETARIA JURIDICA Nro. 29092023-1456

Secretaria : INFRAESTRUCTURA
Fecha Preacta 13/02/2025

Concepto	Descripción			
No. Radicado Contrato de Obra	29092023-1436	Acto Administrativo:		
No. Pedido en SAP:	4500024011			
NIT o RUT:	901710908-3			
Contratista:	CONSORCIO SAN MIGUEL			
Representante Legal:	CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA			
Valor del Contrato ($):	$ 93.493.614.647,00	Aporte Departamento	$ 93.499.614.647,00	
Valor Adición	N/A	Aporte otras entidades	N/A	
Objeto del Contrato	MEJORAMIENTO DE LA VIA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL REMACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS			
Disponibilidad presupuestal	3500021700-3500021701	FONDO	2-0408 - 0-0408	
Duración del Contrato (Plazo):	Duración Contrato: SESENTA (60) MESES DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION			
Fecha de Iniciación	12/10/2023	Fecha de terminación	11/10/2028	
Interventor	MAB INGENIERIA DE VALOR (A CARGO DE INVIAS)			
Supervisor Departamento	JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA			

OBRA EJECUTADA SEGÚN CONTRATO + MAYORES CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	MEDIDAS
NP450.2P T1	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC 19 ASFALTO MODIFICADO TIPO 3 - COMPRA DE MEZCLA TRAMO 1	m3	0,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
NP 610.2	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE PRESTAMO,EXCAVACIONES Y/O DERRUMBES	m3	282,70	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
NP 610.3 T1	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG-50 TRAMO 1	m3	0,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
NP 900.2.2	TRANSPORTE DE MATERIALES A DISTANCIAS MAYORES A MIL METROS (1000M), APLICA PARA MATERIALES USADOS EN EL ITEM 610.1 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3/KM	0,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
NP 900.3.2	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	M3/KM	39750,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
NP3	DEMOLICIÓN EN ROCA A CIELO ABIERTO, CON CUÑA HIDRAULICA Y/O CEMENTO EXPASIVO PARA ATENCIÓN SITIO CRITICO UBICADO EN EL SECTOR CORINTO K88+500 AL K90+000 (INCLUYE EQUIPO NEUMATICO, PERFORADORA, CILINDRO HIDRAULICO, UNIDAD DE FUERZA Y CEMENTO EXPANSIVO, NO INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL NI TRANSPORTE)	m3	0,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
NP 210.2.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	0,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
NP4	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE PRESTAMOS, NO INCLUYE CONFORMACIÓN EN ZONAS DE DEPOSITO NI TRANSPORTE	m3	282,70	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
NP 600.2.1	EXCAVACIONES EN ROCA PARA ESTRUCTURAS INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN EN ZONAS DE DEPOSITO AUTORIZADAS	M3	147,70	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
NP630.3.2 T1	CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 1	M3	0,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
NP630.3.2 T3	CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 3	M3	31,70	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
NP630.3.2 T4	CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 4	M3	17,80	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
NP630.4.2 T1	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 1	M3	4,90	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
NP630.4.2 T3	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 3	M3	0,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
NP630.4.2 T4	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 4	M3	0,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
NP630.1.7 T1	CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 1	M3	1,40	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
NP630.1.7 T3	CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 3	M3	7,40	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
NP630.1.7 T4	CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 4	M3	0,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
NP5	CORTE DE PAVIMENTO CON CORTADORA	M	3198,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
NP6 T1	CUNETA DE CONCRETO CLASE D, VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO TRAMO 1	M3	542,10	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
NP6 T3	CUNETA DE CONCRETO CLASE D, VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO TRAMO 3	M3	0,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
NP6 T4	CUNETA DE CONCRETO CLASE D, VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO TRAMO 4	M3	0,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
NP7	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 PARA LA INSTALACION DE MEZCLA ASFALTICA SOBRE CAPAS DE RECICLADAS CON ASFALTO NATURAL TRAMO 1	M2	0,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)

GOBIERNO DE CALDAS

PREACTA NRO 13 PARCIAL CONTRATO DE OBRA Nro. 29092023-1456

RADICADO SECRETARIA JURIDICA Nro. 29092023-1456

Secretaria : INFRAESTRUCTURA

Fecha Preacta 13/02/2025

Concepto	Descripcion			
No. Radicado Contrato de Obra	29092023-1456	Acto Administrativo:		
No. Pedido en SAP:	4500024051			
NIT o RUT:	901740908-5			
Contratista:	CONSORCIO SAN MIGUEL			
Representante Legal :	CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA			
Valor del Contrato ($):	$ 93.488.614.647,00	Aporte Departamento	$ 93.488.614.647,00	
Valor Adición	N/A	Aporte otras entidades	N/A	
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS			
Disponibilidad presupuestal	3500021700-3500021701	FUNDO	2-0408 - 8-0408	
Duración del contrato (Plazo):	Duración Contrato: SESENTA (60) MESES DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION			
Fecha de Anulación	12/10/2023	Fecha de Terminación	12/10/2028	
Interventor	MAB INGENIERIA DE VALOR (A CARGO DE INVIAS)			
Supervisor Departamento	JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA			

OBRA EJECUTADA SEGÚN CONTRATO + MAYORES CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	MEDIDAS
NP5	Suministro, fabricación y monatje de refuerzo en el el puente Hierro localizado en la municipalidad de Norcasia, Carretera Dorada-Norcasia, según relación anexa.	Un	0,90	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
	REAJUSTES DE OBRA	Global	$ 73.949.595,00	VER ACTAS DE AJUSTE
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	Global	$ 20.651.602,00	VER PRE ACTA DE PMT
	PAGA	Global	$ 23.129.172,00	VER PREACTA PAGA
	AJUSTE A DISEÑOS	Global	$ -	VER ACTA DE AJUSTE DE ESTUDIOS

ARIEL ALBERTO CORREA GÓMEZ
MAB INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTOR

RODRIGO GARCIA CAMPIÑO
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

GOBIERNO DE CALDAS

GOBERNACIÓN DE CALDAS

ACTA DE AJUSTE

PÁGINA 1

FECHA 13/02/2026 (Día / Mes / Año)

SECRETARIA INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No.** _____ **(P)** **ACTA DE AJUSTE FINAL:** SI ☐ NO ☒

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 12 T1 **MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:** NOVIEMBRE **ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No.** 12A T1 **(D)**
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : 29092023-1456 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MIGUEL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1071-2022 (Indique número y año) INTERVENTOR: MAB INGENIERIA DE VALOR S.A

PLAZO INICIAL: 60 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 12/10/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: _____ (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA): $ 93.499.614.647,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 93.499.614.647,00

PLAZO ACUMULADO: 60 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 11/10/2028 (Incluidas las suspensiones. Indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: _____ (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA): _____

DATOS ESPECIFICOS

GRUPO DE AJUSTE	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año utilizado Julio 2023	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA Mes y Año Utilizado NOVIEMBRE 2024	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA NOVIEMBRE 2024 ACTA 12	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
	Io	I	I / Io	(A)	(B)	Po=A-B	Pi=Po*(I/Io)	Pi-Po	
11601	120.71	126.45	1,04755	$70,951.00	$7,095.00	$63,856.00	$66,892.00	$3,036.0	$5,692,830.00
11602	121.78	130.02	1,06786	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.0	-$2,243.00
11603	134.15	138.90	1,03518	$44,313,300.00	$4,431,330.00	$39,881,970.00	$41,294,883.00	$1,407,913.0	$393,396,109.00
11604	124.87	126.59	1,01377	$1,215,280,311.00	$121,528,031.00	$1,093,734,280.00	$1,108,799,737.00	$15,065,457.0	$71,132,275.00
11605	125.89	136.16	1,08130	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.0	$0.00
11606	127.04	129.33	1,01803	$11,302,152.00	$1,130,215.00	$10,171,937.00	$10,355,294.00	$183,357.0	$17,970,672.00
11607	132.78	141.92	1,06900	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.0	$0.00
11608	116.41	125.52	1,07826	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.0	$2,346,224.00
			TOTALES	$ 1,270,946,714.00	$ 127,094,671.00	$ 1,143,852,043.00	$ 1,160,506,801.00	$ 16,654,758.00	$ 490,475,867.00
							VALOR AJUSTE	$ 16,654,758.00	$ 490,475,867.00
							VALOR IVA	$ -	$ -
							VALOR TOTAL	$ 16,654,758.00	$ 490,475,867.00

PORCENTAJE AMORTIZADO: 10 (%) (tres decimales)

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR	
*VALOR AJUSTE	$ -
VALOR IVA	$ -
*VALOR TOTAL AJUSTE	$ -

* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR AJUSTE DEFINITIVO		
VALOR IVA		
VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR		

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA: $ 16,654,758

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 16,654,758 (Indicar el valor incluido IVA)

NOTAS:

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectúen por fuera de este plazo, aplica el formato MEPI-MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes.
2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.
3. El (I) "ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el índice será el correspondiente al mes en que debió haberse ejecutado dicha cuota parte, según el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.
4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.
6. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras, No incluye valor de provisiones ni el IVA.
7. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.
8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra.

Firma:
RODRIGO LONDOÑA CAMPIÑO
DIRECTOR DE OBRA
Contratista

Firma:
ARIEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ
Representante Legal o Apoderado
Interventoría

GOBIERNO DE CALDAS

GOBERNACIÓN DE CALDAS

ACTA DE AJUSTE

PAGINA 1

FECHA 13/02/2025 (Día / Mes / Año)

SECRETARIA INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No.** _____ **(P)** **ACTA DE AJUSTE FINAL:** SI ☐ NO ☑

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 13 T1 **MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:** NOVIEMBRE **ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No.** 13A T1 **(D)**
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : 29092023-1456 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MIGUEL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1071-2022 (Indique número y año) **INTERVENTOR:** MAB INGENIERIA DE VALOR S.A

PLAZO INICIAL: 60 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 12/10/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA): $ 93.499.614.647,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 93.499.614.647,00

PLAZO ACUMULADO: 60 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 11/10/2028 (Incluidas las suspensiones. Indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA):

DATOS ESPECÍFICOS

GRUPO DE AJUSTE	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año utilizado Julio 2023	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA Mes y Año Utilizado DICIEMBRE 2024	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA DICIEMBRE 2024 ACTA 13	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
	Io	I	I / Io	(A)	(B)	Po=A-B	Pi=Po*(I/Io)	Pi-Po	
11601	120,71	126,52	1,04813	-$90.042.784,00	-$9.004.278,00	-$81.038.506,00	-$84.938.042,00	-$3.900.536,0	$1.792.294,00
11602	121,75	129,54	1,06372	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,0	-$2.243,00
11603	134,15	138,30	1,03071	$69.030.739,00	$6.903.074,00	$62.127.665,00	$64.035.296,00	$1.907.631,0	$395.293.740,00
11604	124,87	128,55	1,01345	$783.937.644,00	$78.393.764,00	$705.543.880,00	$715.039.767,00	$9.495.887,0	$80.624.657,00
11605	125,89	130,33	1,03485	$0,00	$0,00	$0,00	$0,0	$0,0	$0,00
11606	127,04	129,89	1,02243	$246.625.592,00	$24.662.559,00	$221.963.033,00	$226.942.525,00	$4.979.492,0	$22.900.164,00
11607	132,78	140,40	1,05755	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,0	$0,00
11608	116,41	125,53	1,07834	-$14.243.328,00	-$1.424.333,00	-$12.818.995,00	-$13.823.284,00	-$1.004.289,0	$1.341.935,00
			TOTALES	$ 995.397.863,00	$ 99.530.786,00	$ 895.777.077,00	$ 907.251.757,00	$ 11.474.680,00	$ 501.950.547,00
							VALOR AJUSTE	$ 11.474.680,00	$ 501.950.547,00
							VALOR IVA	$ -	$ -
							VALOR TOTAL	$ 11.474.680,00	$ 501.950.547,00

PORCENTAJE AMORTIZADO: 10 (%) (tres decimales)

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR	
*VALOR AJUSTE _____	$ -
VALOR IVA	$ -
*VALOR TOTAL AJUSTE _____	$ -

* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR AJUSTE DEFINITIVO		
VALOR IVA		
VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR		

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA: $ 11.474.680

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 11.474.680 (Indicar el valor incluido IVA)

NOTAS:

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectúen por fuera de este plazo, aplica el formato MEPI-MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes.
2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.
3. El (I) "ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el índice será el correspondiente al mes en que debió haberse ejecutado dicha cuota parte, según el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.
4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.
6. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.
7. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.
8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra.

Firma:
RODRIGO GARCIA CAMPIÑO
DIRECTOR DE OBRA
Contratista

Firma:
ARIEL ALBERTO CORREDOR GOMEZ
Representante Legal o Apoderado
Interventoría

GOBIERNO DE CALDAS

GOBERNACIÓN DE CALDAS

ACTA DE AJUSTE

PÁGINA 1

FECHA 13/02/2025 (Día / Mes / Año)

SECRETARIA INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS

ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. _____ **(P)**

ACTA DE AJUSTE FINAL: SI ☐ NO ☒

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 12 T3

MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: NOVIEMBRE

ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 12 T3 **(D)**
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : 29092023-1456 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MIGUEL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1071-2022 (Indique número y año)

INTERVENTOR: MAB INGENIERIA DE VALOR S.A

PLAZO INICIAL: 60 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 12/10/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: _____ (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA): $ 93.499.614.647,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 93.499.614.647,00

PLAZO ACUMULADO: 60 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 11/10/2028 (Incluidas las suspensiones. Indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: _____ (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA): _____

DATOS ESPECÍFICOS

GRUPO DE AJUSTE	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año utilizado Julio 2023	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA Mes y Año Utilizado NOVIEMBRE 2024	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA NOVIEMBRE 2024 ACTA 12	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
	Io	I	I / Io	(A)	(B)	Pe*A-B	Pi=Pe*(I/Io)	Pi-Pe	
11601	120,71	126,45	1,04755	$227,931,885,00	$22,793,189,00	$205,138,696,00	$214,893,448,00	$9,754,752,00	$61,079,345,00
11602	121,78	130,07	1,06766	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$26,617,797,00
11603	134,18	138,90	1,03518	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
11604	124,87	126,59	1,01377	$482,860,172,00	$48,286,017,00	$434,574,155,00	$440,560,121,00	$5,985,966,00	$42,133,586,00
11605	125,69	136,16	1,08330	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
11606	127,04	129,33	1,01803	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
11607	132,78	141,92	1,06900	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
11608	116,41	125,52	1,07826	$16,881,122,00	$1,688,112,00	$14,473,010,00	$15,605,637,00	$1,132,627,00	$18,603,398,00
			TOTALES	$ 726,673,179,00	$ 72,687,318,00	$ 654,185,861,00	$ 671,059,206,00	$ 16,873,345,00	$ 148,614,011,00
							VALOR AJUSTE	$ 16,873,345,00	$ 148,614,011,00
							VALOR IVA	$ -	$ -
							VALOR TOTAL	$ 16,873,345,00	$ 148,614,011,00

PORCENTAJE AMORTIZADO: 10 (%) (tres decimales)

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR		
*VALOR AJUSTE	$	-
VALOR IVA	$	-
*VALOR TOTAL AJUSTE	$	-

* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR AJUSTE DEFINITIVO		
VALOR IVA		
VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR		

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA: $ 16,873,345

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 16,873,345 (Indicar el valor incluido IVA)

NOTAS:

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección, En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectúen por fuera de este plazo, aplica el formato MEPI-MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes.
2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.
3. El (I) "ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el índice será el correspondiente al mes en que debió haberse ejecutado dicha cuota parte, según el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.
4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.
6. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.
7. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.
8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra.

Firma:
RODRIGO GARCIA CAMPIÑO
DIRECTOR DE OBRA
Contratista

Firma:
ARIEL ALBERTO CORREDOR GOMEZ
Representante Legal o Apoderado
Interventoría

GOBIERNO DE CALDAS

GOBERNACIÓN DE CALDAS

ACTA DE AJUSTE

PÁGINA 1

FECHA 13/02/2025 (Día / Mes / Año)

SECRETARIA INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No.** _____ **(P)** **ACTA DE AJUSTE FINAL:** SI ☐ NO ☐

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 13 T3 **MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:** DICIEMBRE **ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No.** 13A T3 **(D)**
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : 29092023-1456 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MIGUEL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1071-2022 (Indique número y año) INTERVENTOR: MAB INGENIERIA DE VALOR S.A

PLAZO INICIAL: 60 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 12/10/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA): $ 93.499.614.647,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 93.499.614.647,00

PLAZO ACUMULADO: 60 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 11/10/2028 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA):

DATOS ESPECÍFICOS

GRUPO DE AJUSTE	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año utilizado Julio 2023	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA Mes y Año Utilizado DICIEMBRE 2024	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA DICIEMBRE 2024 ACTA 13	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
	Io	I	I / Io	(A)	(B)	P=A-B	Pi=Po*(I/Io)	Pi-Po	
11601	120,71	126,52	1,04813	$142,377,690,00	$14,237,769,00	$128,139,921,00	$134,307,537,00	$6,167,616,00	$67,196,861,00
11602	121,78	129,54	1,06372	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$26,617,782,00
11603	134,18	138,30	1,03071	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
11604	124,67	126,55	1,01345	$383,175,867,00	$36,312,587,00	$346,813,280,00	$351,210,223,00	$4,396,943,00	$46,619,391,00
11605	125,89	136,33	1,08465	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
11606	127,04	129,89	1,02243	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
11607	132,78	140,40	1,05755	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
11608	116,41	125,53	1,07834	$24,839,421,00	$2,483,942,00	$22,355,479,00	$24,106,892,00	$1,751,413,09	$20,584,811,00
			TOTALES	$ 530,342,978,00	$ 53,034,298,00	$ 477,308,680,00	$ 489,624,652,00	$ 12,315,972,00	$ 161,018,845,00
							VALOR AJUSTE	$ 12,315,972,00	$ 161,018,845,00
							VALOR IVA	$ -	$ -
							VALOR TOTAL	$ 12,315,972,00	$ 161,018,845,00

PORCENTAJE AMORTIZADO: 10 (%) (tres decimales)

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR	
*VALOR AJUSTE	$ -
VALOR IVA	$ -
*VALOR TOTAL AJUSTE	$ -

* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR AJUSTE DEFINITIVO		
VALOR IVA		
VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR		

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA: $ 12.315.972

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 12.315.972 (Indicar el valor incluido IVA)

NOTAS:

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectúen por fuera de este plazo, aplica el formato MEPI-MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes.
2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.
3. El (I) "ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el Índice será el correspondiente al mes en que debió haberse ejecutado dicha cuota parte, según el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.
4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra o Interventoría.
5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumorales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.
6. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.
7. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.
8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra.

Firma:
RODRIGO GARCIA CAMPIÑO
DIRECTOR DE OBRA
Contratista

Firma:
ARIEL ALBERTO CORREDOR GOMEZ
Representante Legal o Apoderado
Interventoría

GOBIERNO DE CALDAS

GOBERNACIÓN DE CALDAS

ACTA DE AJUSTE

PAGINA 1

FECHA 13/02/2026 (Día / Mes / Año)

SECRETARIA INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No.** _____ **(P)** **ACTA DE AJUSTE FINAL:** SI ☐ NO ☑

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 13 T4 **MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:** NOVIEMBRE **ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No.** 13A T4 **(D)**
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : 29092023-1456 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MIGUEL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1071-2022 (Indique número y año) INTERVENTOR: MAB INGENIERIA DE VALOR S.A

PLAZO INICIAL: 60 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 12/10/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA): $ 93.499.614.647,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 93.499.614.647,00

PLAZO ACUMULADO: 60 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 11/10/2028 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA):

DATOS ESPECIFICOS

GRUPO DE AJUSTE	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año utilizado Julio 2023	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA Mes y Año Utilizado NOVIEMBRE 2024	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA NOVIEMBRE 2024 ACTA 12	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
	Io	I	I / Io	(A)	(B)	Pe=A-B	Pi=Pe*(I/Io)	Pi-Pe	
11601	120,71	126,45	1,04755	$115.931.229,70	$11.593.123,00	$104.338.106,70	$109.299.591,00	$4.961.484,30	$7.776.032,00
11602	121,78	130,02	1,06766	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
11603	134,18	138,90	1,03518	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
11604	124,87	126,59	1,01377	$372.436.006,90	$37.243.601,00	$335.192.405,90	$339.809.455,00	$4.617.049,10	$19.255.768,00
11605	125,69	136,16	1,08339	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
11606	127,04	129,33	1,01803	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
11607	132,76	141,52	1,06600	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
11608	118,41	125,52	1,07826	$37.969.881,00	$3.796.988,00	$34.172.893,00	$36.847.191,00	$2.674.298,00	$7.372.176,00
			TOTALES	$ 526.337.117,60	$ 52.633.712,00	$ 473.703.405,60	$ 485.956.237,00	$ 12.252.831,00	$ 34.403.976,00
							VALOR AJUSTE	$ 12.252.831,00	$ 34.403.976,00
							VALOR IVA	$ -	$ -
							VALOR TOTAL	$ 12.252.831,00	$ 34.403.976,00

PORCENTAJE AMORTIZADO: 10 (%) (tres decimales)

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR		
*VALOR AJUSTE	$	-
VALOR IVA	$	-
*VALOR TOTAL AJUSTE	$	-

* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR AJUSTE DEFINITIVO		
VALOR IVA		
VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR		

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA: $ 12.252.831

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 12.252.831 (Indicar el valor incluido IVA)

NOTAS:

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectúen por fuera de este plazo, aplica el formato MEPI-MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes.
2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.
3. El (l) "ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el índice será el correspondiente al mes en que debió haberse ejecutado dicha cuota parte, según el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.
4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.
6. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.
7. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.
8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra.

Firma:
RODRIGO GARCIA CAMPIÑO
DIRECTOR DE OBRA
Contratista

Firma:
ARIEL ALBERTO CORREDOR GOMEZ
Representante Legal o Apoderado
Interventoría

GOBIERNO DE CALDAS

GOBERNACIÓN DE CALDAS

ACTA DE AJUSTE

PÁGINA 1

FECHA 13/02/2026 (Día / Mes / Año)

SECRETARIA INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No.** _____ **(P)** **ACTA DE AJUSTE FINAL:** SI ☐ NO ☒

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 13 T4 **MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:** DICIEMBRE **ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No.** 13A T4 **(D)**
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : 29092023-1456 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MIGUEL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1071-2022 (Indique número y año) INTERVENTOR: MAB INGENIERIA DE VALOR S.A

PLAZO INICIAL: 60 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 12/10/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA): $ 93.499.614.647,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) $ 93.499.614.647,00

PLAZO ACUMULADO: 60 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 11/10/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA):

DATOS ESPECÍFICOS

GRUPO DE AJUSTE	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año utilizado Julio 2023	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA Mes y Año utilizado DICIEMBRE 2024	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA DICIEMBRE 2024 ACTA 13	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
	Io	I	I / Io	(A)	(B)	Po=A-B	Pi=Po*(I/Io)	Pi-Po	
11601	120,71	126,52	1,04813	$1.694.293,00	$169.429,00	$1.524.864,00	$1.598.759,00	$73.895,00	$7.849.427,00
11602	121,76	129,54	1,06372	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
11603	134,18	138,30	1,03071	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
11604	174,87	176,55	1,01345	$318.810.651,00	$31.881.065,00	$286.929.586,00	$290.789.934,00	$3.860.348,00	$23.116.116,00
11605	125,69	136,33	1,08465	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
11606	127,34	129,69	1,02245	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
11607	132,76	140,40	1,05755	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
11608	118,41	125,53	1,07834	$6.300.810,00	$630.081,00	$5.670.729,00	$6.114.995,00	$444.266,00	$7.816.442,00
			TOTALES	$ 326.805.754,00	$ 32.680.575,00	$ 294.125.179,00	$ 298.503.188,00	$ 4.378.009,00	$ 38.781.985,00
							VALOR AJUSTE	$ 4.378.009,00	$ 38.781.985,00
							VALOR IVA	$ -	$ -
							VALOR TOTAL	$ 4.378.009,00	$ 38.781.985,00

PORCENTAJE AMORTIZADO: 10 (%) (tres decimales)

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR		
*VALOR AJUSTE	$	-
VALOR IVA	$	-
*VALOR TOTAL AJUSTE	$	-

* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR AJUSTE DEFINITIVO		
VALOR IVA		
VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR		

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA: $ 4.378.009

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 4.378.009 (Relacionar el valor incluido IVA)

NOTAS:

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectúen por fuera de este plazo, aplica el formato MEPI-MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes.
2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.
3. El (I) "ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el Índice será el correspondiente al mes en que debió haberse ejecutado dicha cuota parte, según el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.
4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra o Interventoría.
5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.
6. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras, No incluye valor de provisiones ni el IVA.
7. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.
8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra.

Firma:
RODRIGO CANO CAMPIÑO
DIRECTOR DE OBRA
Contratista

Firma:
ARIEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ
Representante Legal o Apoderado
Interventoría

DANE

Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles - ICOCIV

A16.3 ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo

Código grupos de obra CPC V 2.0 A.C.	Código subclases CPC V 2.0 A.C.	Código de tipología de obra	Tipología de obra	Código de agregación a nivel de obra-capítulo	Código Capítulo Constructivo	Capítulo constructivo	Ponderación al tipo de obra (%)	2023						2024									
								Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
								Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice
53020I	53211	53211_06	Vías interurbanas	11601	01	Preliminares y (	22,06	120,71	131,04	121,17	121,51	121,72	121,82	123,67	125,44	126,01	126,19	126,23	126,20	126,24	126,15	126,36	126,45	126,45	126,52
53020I	53211	53211_06	Vías interurbanas	11602	02	Afirmados, sub	18,69	121,78	122,44	122,70	122,84	123,34	122,89	125,30	127,23	128,09	128,52	129,24	129,24	128,70	128,82	129,28	129,34	130,02	129,54
53020I	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	03	Pavimentos asf	38,51	134,18	133,42	133,96	133,23	134,49	134,76	138,39	140,02	138,41	140,68	142,03	140,94	139,92	140,63	140,08	139,01	138,90	138,30
53020I	53211	53211_06	Vías interurbanas	11604	04	Estructuras hid	7,09	124,87	124,32	123,49	123,81	123,93	123,96	126,63	128,48	128,51	127,50	127,22	126,67	126,86	126,53	126,37	126,62	126,59	126,55
53020I	53211	53211_06	Vías interurbanas	11605	05	Obras de urbar	0,96	125,69	125,51	125,69	125,71	125,70	125,75	131,60	134,15	134,13	135,00	135,30	134,94	135,52	135,40	135,27	136,30	136,16	136,33
53020I	53211	53211_06	Vías interurbanas	11606	06	Obras geotécni	4,07	127,04	126,46	126,50	126,17	126,11	126,38	129,62	131,14	131,11	130,44	130,37	129,56	129,38	129,15	129,13	129,49	129,35	129,89
53020I	53211	53211_06	Vías interurbanas	11607	07	Señalización y (	4,40	132,76	131,80	132,59	131,40	136,62	134,17	141,61	141,36	141,15	141,25	144,61	143,19	140,61	143,14	142,08	142,93	141,92	140,40
53020I	53211	53211_06	Vías interurbanas	11608	08	Transporte y sc	4,22	116,41	117,92	118,35	119,30	119,68	119,69	122,09	123,42	123,60	124,20	124,68	124,74	124,81	124,76	124,85	125,69	125,52	125,53

Fuente: DANE - ICOCIV

Nota:
*La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice.
La codificación del "grupo CPC V2.0 AC) corresponde a la unión de la división 53 de la CPC V2.0 A.C. en donde se encuentran dos grupos, el primero (5301) que corresponde a la construcción de edificaciones residenciales y no residenciales, y el segundo grupo (5302) de construcción de obras civiles. Dentro de este último es posible agrupar las subclases de acuerdo a cinco grandes grupos utilizados en el Sistema de Cuentas Nacionales.

Actualizado al 30 de enero de 2025

GOBERNACIÓN DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
Secretaria de Infraestructura	
MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS	

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA No:	14 TRAMO 3	FECHA:	30/01/2025
PERIODO:	1 AL 30 DE ENERO 2025		
CONTRATO DE OBRA No:	29092023-1456	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1071 DE 2022	INTERVENTORÍA:	MAB INGENIERIA DE VALOR

ITEM	PMT	UNIDAD
1	PMT	GLOBAL

CONTROLADORES VIALES

Elemento	unidad	cantidad	Valor Promedio mensual	Valor Total	Observaciones

SEÑALIZACIÓN INSTALADA

Elemento	Unidad	Cantidad	Valor Unidad/Mes	Valor Total	Observaciones
Señal Inicio de obra	Unidad	0,00	$ 0,00	$ 0,00	
Señal Fin de Obra	Unidad	0,00	$ 28.019,00	$ 0,00	
Señal Trabajos en la vía x 60 cm	Unidad	7,00	$ 25.336,00	$ 177.352,00	
Señal Angostamiento a la derecha x 60 cm	Unidad	6,00	$ 25.115,00	$ 150.690,00	
Señal Angostamiento a la izquierda x 60 cm	Unidad	7,00	$ 24.960,00	$ 174.720,00	
Señal Auxiliar de transito x 60 cm	Unidad	6,00	$ 25.711,00	$ 154.266,00	
Señal Maquinaria en la vía x 60 cm	Unidad	8,00	$ 25.336,00	$ 202.688,00	
Señal Barricada	Unidad	0,00	$ 35.700,00	$ 0,00	
Señal Bombones (Balizas)	Unidad	605,00	$ 11.321,00	$ 6.849.205,00	
Señal velocidad permitida	Unidad	6,00	$ 25.336,00	$ 152.016,00	
Desvio a 100 m	Unidad	0,00	$ 0,00	$ 0,00	
Paleta Pare y Siga x 45 cm	Unidad	4,00	$ 12.717,00	$ 50.868,00	
Flasher Luminoso	Unidad	0,00	$ 20.230,00	$ 0,00	
Baston Luminoso con cargador (Controlador vial)	Unidad	0,00	$ 20.230,00	$ 0,00	
Conos viales x 70 cm	Unidad	17,00	$ 5.396,00	$ 91.732,00	
Barreras Plasticas (maletines)medianos	Unidad	15,00	$ 57.517,00	$ 862.755,00	
			SUB TOTAL	$ 8.866.292,00	

ELEMENTOS CONTRAFACTURA

Elemento	Unidad	Cantidad	Valor Unidad/Mes	Valor Total	Observaciones
					Contra factura
					Contra factura
					Contra factura
			SUB TOTAL	$ 0,00	
			SUB TOTAL	$ 8.866.292,00	
			ADMINISTRACIÓN (26%)	$ 2.305.236,00	
			SUB TOTAL	$ 11.171.528,00	

TOTAL	$ 11.171.528,00

MAB INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

GOBIERNO DE CALDAS

GOBERNACIÓN DE CALDAS

Secretaria de Infraestructura

Hoja No 1 de 1

MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA No:	14 TRAMO 4	FECHA:	30/01/2025
PERIODO:	1 AL 30 DE ENERO 2025		
CONTRATO DE OBRA No:	29092023-1456	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1071 DE 2022	INTERVENTORÍA:	MAB INGENIERIA DE VALOR

ITEM	PMT	UNIDAD
1	PMT	GLOBAL

CONTROLADORES VIALES

Elemento	unidad	cantidad	Valor Promedio mensual	Valor Total	Observaciones

SEÑALIZACIÓN INSTALADA

Elemento	Unidad	Cantidad	Valor Unidad/Mes	Valor Total	Observaciones
Señal Inicio de obra	Unidad	0,00	$ 0,00	$ 0,00	
Señal Fin de Obra	Unidad	1,00	$ 28.019,00	$ 28.019,00	
Señal Trabajos en la via x 60 cm	Unidad	4,00	$ 25.336,00	$ 101.344,00	
Señal Angostamiento a la derecha x 60 cm	Unidad	6,00	$ 25.115,00	$ 150.690,00	
Señal Angostamiento a la izquierda x 60 cm	Unidad	5,00	$ 24.960,00	$ 124.800,00	
Señal Auxiliar de transito x 60 cm	Unidad	4,00	$ 25.711,00	$ 102.844,00	
Señal Maquinaria en la via x 60 cm	Unidad	3,00	$ 25.336,00	$ 76.008,00	
Señal Barricada	Unidad	3,00	$ 35.700,00	$ 107.100,00	
Señal Bombones (Balizas)	Unidad	346,00	$ 11.321,00	$ 3.917.066,00	
Señal velocidad permitida	Unidad	6,00	$ 25.336,00	$ 152.016,00	
Desvio a 100 m	Unidad	0,00	$ 0,00	$ 0,00	
Paleta Pare y Siga x 45 cm	Unidad	2,00	$ 12.717,00	$ 25.434,00	
Flasher Luminoso	Unidad	0,00	$ 20.230,00	$ 0,00	
Baston Luminoso con cargador (Controlador vial)	Unidad	0,00	$ 20.230,00	$ 0,00	
Conos viales x 70 cm	Unidad	21,00	$ 5.396,00	$ 113.316,00	
Barreras Plasticas (maletines)medianos	Unidad	14,00	$ 57.517,00	$ 805.238,00	
			SUB TOTAL	$ 5.703.875,00	

ELEMENTOS CONTRAFACTURA

Elemento	Unidad	Cantidad	Valor Unidad/Mes	Valor Total	Observaciones
					Contra factura
					Contra factura
					Contra factura
			SUB TOTAL	$ 0,00	
			SUB TOTAL	$ 5.703.875,00	
			ADMINISTRACIÓN (26%)	$ 1.483.008,00	
			SUB TOTAL	$ 7.186.883,00	

TOTAL	$ 7.186.883,00

MAB INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°. FE 2703

Autorización DIAN 18764082056181 de 23/10/2024

Desde 2501 Hasta 4000 Vigencia 23/10/2026 Prefijo FE

Medio de pago	Forma de pago	Orden de compra	Fecha de generación	Fecha emisión	Fecha vencimiento
Acuerdo mutuo	Crédito		10/02/2025 12:00:00	10/02/2025	15/02/2025
Número contrato	**Centro de costos**		**Tipo de operación**		
	03010121000 CONSORCIO SAN MIGUEL - CALDAS		Estándar		

Dirección de entrega bien o servicio
CRA 48 48 SUR 75 BG 163

Obra
CONSORCIO SAN MIGUEL - CALDAS

CONSORCIO SAN MIGUEL - CALDAS

NIT 901740908 - 5

Régimen Tributario: Responsable de IVA
Dirección: CR 48 48 SUR 75 BG 163

Departamento: Antioquia
Ciudad: Envigado
Teléfono: 4483012
Correos electrónicos: facturacionelectronica@intramaq.co - analistacontable@intramaq.co

INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA SAS

NIT 900102268 - 1

Actividad económica: 4290
Dirección: CRA 48 48 SUR 75 BG 163

Departamento: Antioquia
Ciudad: Envigado
Teléfono: 4483012
Correo Electrónico: facturacionelectronica@intramaq.co

SOMOS RESPONSABLES DE IVA
Autorretenedores ICA Municipio de Montebano. Acuerdo 17 de 2018.
Autorretenedores ICA Municipio de Bello. Decreto 201904000247 de 2019.
Autorretenedores ICA del distrito de Medellin. Resolución 202350101414 de 14/12/2023.

		Descripción	Cant.	U/M	Precio Unitario	Descuento	IVA	%	INC	%	Valor total
1	1450	ALQUILER DE SEÑALIZACIÓN PARA INSTALACIÓN DE PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	1,00	94	12.869.626,05	$0.00	2.445.228,95	19,00	0,00	0,00	12.869.626,05

Notas finales

Descripción

Observaciones

Resumen totales

Moneda	COP
Tasa de cambio	
Subtotales	$12,869,626.05
Total impuestos	$2,445,228.95
Total Más Impuestos	$15,314,855.00
Descuentos	$0.00
Anticipos	$0.00
Retención en Garantía	$0.00
Retenciones	
Rte IVA	$0.00
Rte fuente	$514,785.04
Rte ICA	$0.00
Total a Pagar	**$14,800,069.96**

Valor a pagar en letras
CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS MIL SESENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS

Código único de facturación electrónica
765c7416ebb7ac3cc6412851ed92d027fc0fd702295674f512b1c280b0745bc86d7c508e6afeb4351adbb7767b37271

Valor firma digital
MvkPV+tZyVcA5EgETAKn7VNNHSHTL+UDYHSTdR0qvFdQLcBfDtX++EEVJxpuLGKG3xkJWKEmFg1447c9PwVfFL2+ncLv9RZmu6g9A1wp94k4l36ZAfGJPTMS/lug4GwEPIORJYW1UzyZKJDBUlqcd4WZJp6PtAYzEL2K4J+1wcTdNxCBNtpPKdwqPDRsBMvEWU9h3LdPPS4nPdCMQDAGdEvnuxbhPCO7FoxmzKdnno4KGyQzW41xUbYMjpoJ9e9BfpQJUlpnyG+cWtnBqBkBQnnhT1C2T5JpBLbT3Aw+W2BCWLQm6EDeXxxs4cKGSl6WA==

Fecha y hora de expedición
10/02/2025 12:00:00

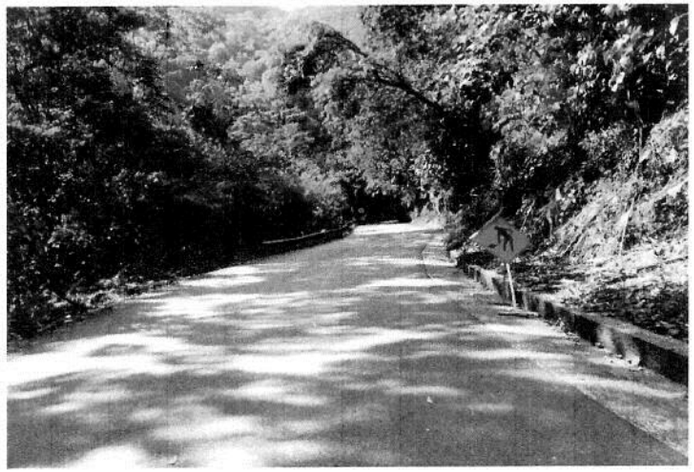
Nombre fabricante SINCOSOFT S.A.S NIT 830.021.894 - 9

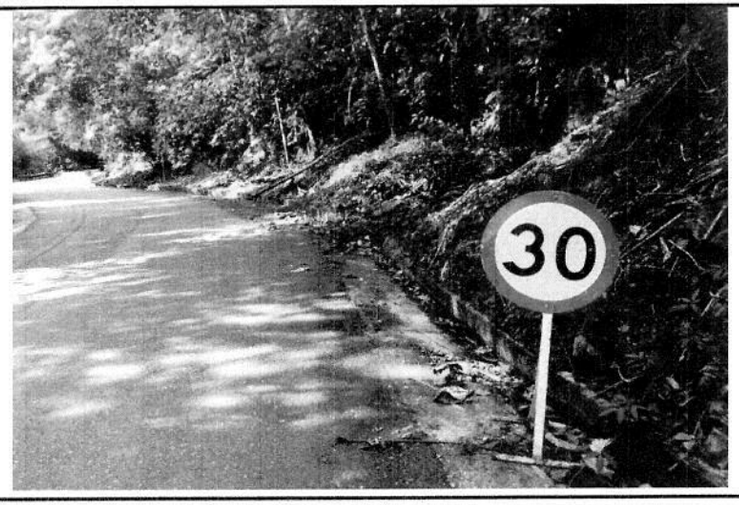
GOBIERNO DE CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaría de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS	

REGISTRO FOTOGRAFICO



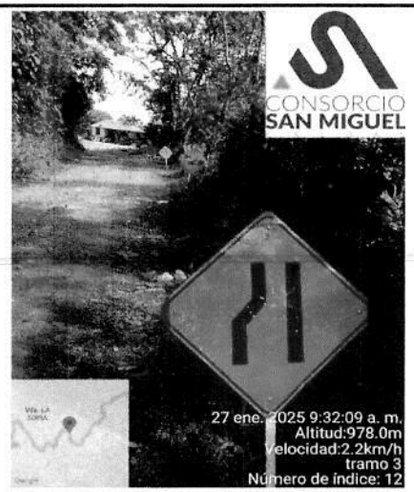


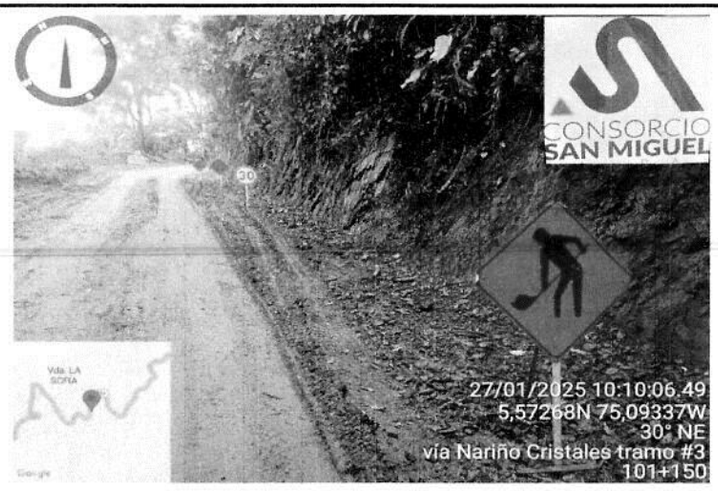




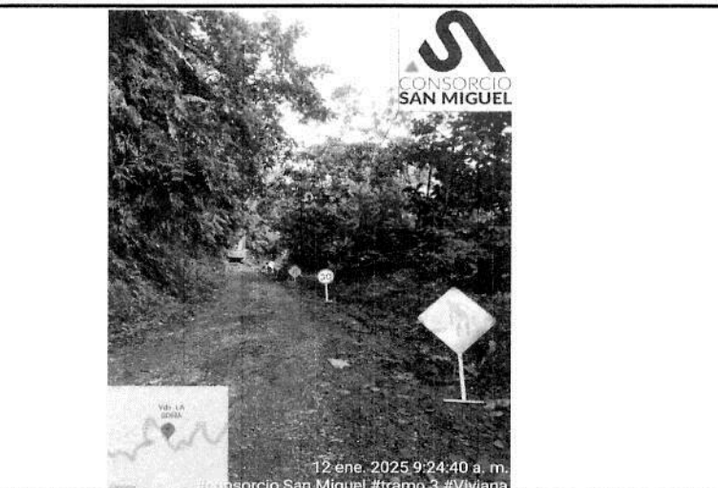
GOBIERNO DE CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaría de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS	

REGISTRO FOTOGRAFICO



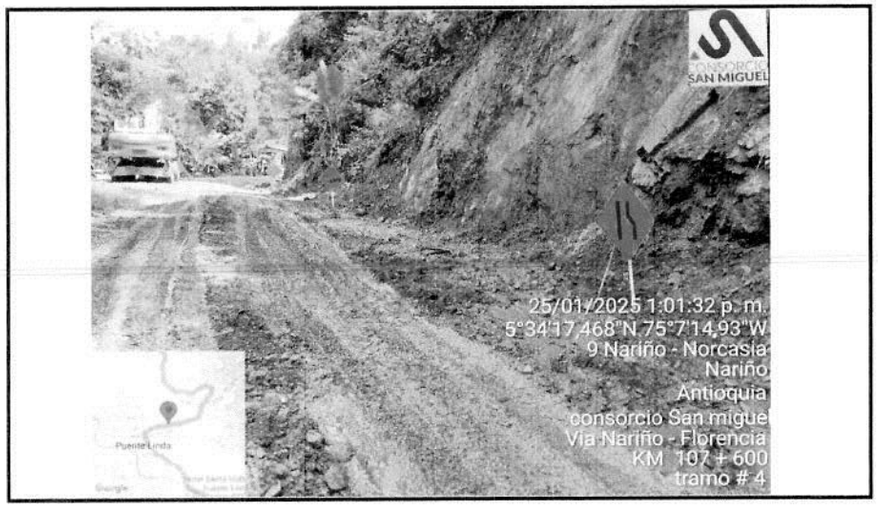




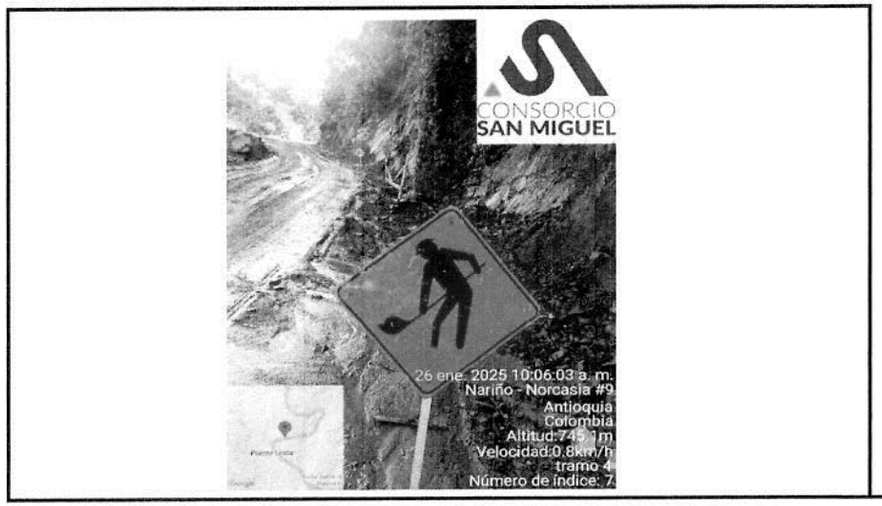


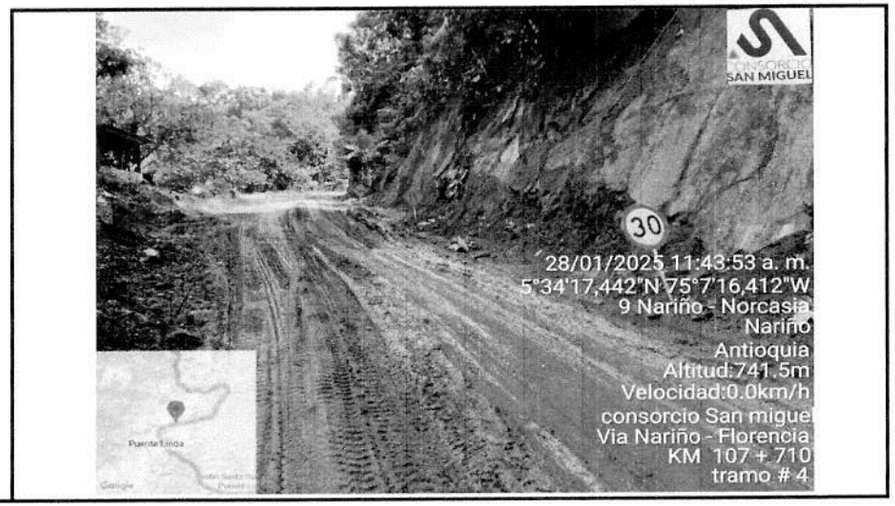
GOBIERNO DE CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaría de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS	

REGISTRO FOTOGRAFICO









Gobierno de CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS Secretaria de Infraestructura	Hoja No 1 de 1
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS	

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA No:	14- TRAMO 1	FECHA:	30/1/2025
PERIODO:	1 AL 30 DE ENERO DE 2025		
CONTRATO DE OBRA No:	LP-SI-004-2023	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1071 DE 2022	INTERVENTORÍA:	MAB INGENIERIA DE VALOR

ITEM	16	UNIDAD
600.2.3	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	m3

ACTA DE OBRA N°14

Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Cantidad	Margen	Descripción
K33+670.00	K33+670.00	3.20	1.80	0.20	1.15	DERECHA	EXCAVACION PARA DISIPADOR
K33+485.00	K33+485.00	5.10	1.40	0.20	1.43	DERECHA	EXCAVACION PARA DISIPADOR
K33+415.00	K33+415.00	2.50	1.70	0.20	0.85	DERECHA	EXCAVACION PARA DISIPADOR
K33+210.00	K33+210.00	7.50	1.20	0.30	2.70	DERECHA	EXCAVACION PARA DISIPADOR
K32+375.00	K32+375.00	5.20	1.60	0.20	1.66	DERECHA	EXCAVACION PARA DISIPADOR
K32+097.00	K32+097.00	4.00	1.60	0.20	1.28	DERECHA	EXCAVACION PARA DISIPADOR
K29+170.00	K29+170.00	2.00	1.30	0.20	0.52	IZQUIERDA	EXCAVACION PARA DISIPADOR
K28+370.00	K28+370.00	4.30	1.20	0.10	0.52	DERECHA	EXCAVACION PARA DISIPADOR
K28+150.00	K28+150.00	5.40	1.50	0.20	1.62	DERECHA	EXCAVACION PARA DISIPADOR
K28+030.00	K28+030.00	4.00	1.30	0.20	1.04	IZQUIERDA	EXCAVACION PARA DISIPADOR
K28+040.00	K28+040.00	9.70	1.40	0.15	2.04	DERECHA	EXCAVACION PARA DISIPADOR
K27+970.00	K27+970.00	6.50	1.10	0.15	1.07	DERECHA	EXCAVACION PARA DISIPADOR
K27+920.00	K27+920.00	14.90	1.40	0.15	3.13	DERECHA	EXCAVACION PARA DISIPADOR
K27+650.00	K27+650.00	3.00	0.80	0.10	0.24	IZQUIERDA	EXCAVACION PARA DISIPADOR
K27+540.00	K27+540.00	6.70	1.60	0.10	1.07	IZQUIERDA	EXCAVACION PARA DISIPADOR
K27+540.00	K27+540.00	2.30	1.30	0.10	0.30	DERECHA	EXCAVACION PARA DISIPADOR
K27+360.00	K27+380.00	11.30	1.00	0.20	2.26	DERECHA	EXCAVACION PARA DISIPADOR
K27+180.00	K27+180.00	7.80	1.00	0.20	1.56	IZQUIERDA	EXCAVACION DE COMPLEMENTO DISIPADOR
K27+180.00	K27+180.00	3.60	0.60	0.40	0.86	DERECHA	EXCAVACION DE COMPLEMENTO DISIPADOR
K27+060.00	K27+060.00	8.50	0.50	0.20	0.85	IZQUIERDA	EXCAVACION DE COMPLEMENTO DISIPADOR
K27+055.00	K27+055.00	5.90	0.50	0.15	0.44	DERECHA	EXCAVACION DE COMPLEMENTO DISIPADOR
EXCAVACION SECTORES DONDE NO SE HIZO FILTRO							EXCAVACION PARA CONSTRUCCIÓN DE CUNETA
K27+056.00	K27+069.00	13.00	1.160	0.15	2.26	IZQUIERDA	EXCAVACION PARA CONSTRUCCIÓN DE CUNETA
K27+074.00	K27+113.20	39.20	1.160	0.15	6.82	IZQUIERDA	EXCAVACION PARA CONSTRUCCIÓN DE CUNETA
K27+288.00	K27+353.10	65.10	1.160	0.15	11.33	IZQUIERDA	EXCAVACION PARA CONSTRUCCIÓN DE CUNETA
K27+363.00	K27+437.40	74.40	1.160	0.15	12.95	IZQUIERDA	EXCAVACION PARA CONSTRUCCIÓN DE CUNETA
K27+442.00	K27+548.30	106.30	1.160	0.15	18.50	IZQUIERDA	EXCAVACION PARA CONSTRUCCIÓN DE CUNETA
K27+673.00	K27+751.70	78.70	1.160	0.10	9.13	IZQUIERDA	EXCAVACION PARA CONSTRUCCIÓN DE CUNETA
K27+870.00	K28+012.80	135.80	1.160	0.08	11.81	IZQUIERDA	EXCAVACION PARA CONSTRUCCIÓN DE CUNETA
K28+392.00	K28+627.00	235.00	1.160	0.08	20.45	IZQUIERDA	EXCAVACION PARA CONSTRUCCIÓN DE CUNETA
K28+650.00	K28+748.80	98.80	1.160	0.08	8.60	IZQUIERDA	EXCAVACION PARA CONSTRUCCIÓN DE CUNETA
K29+304.40	K29+420.70	116.30	1.160	0.10	13.49	IZQUIERDA	EXCAVACION PARA CONSTRUCCIÓN DE CUNETA
K29+428.20	K29+478.10	49.90	1.160	0.10	5.79	IZQUIERDA	EXCAVACION PARA CONSTRUCCIÓN DE CUNETA
K29+691.30	K29+719.40	28.10	1.160	0.10	3.26	IZQUIERDA	EXCAVACION PARA CONSTRUCCIÓN DE CUNETA
K29+970.00	K30+020.70	51.00	1.160	0.15	8.87	IZQUIERDA	EXCAVACION PARA CONSTRUCCIÓN DE CUNETA
K30+025.00	K30+114.30	89.30	1.160	0.08	7.77	IZQUIERDA	EXCAVACION PARA CONSTRUCCIÓN DE CUNETA
K30+121.70	K30+169.30	47.60	1.160	0.08	4.14	IZQUIERDA	EXCAVACION PARA CONSTRUCCIÓN DE CUNETA
K30+174.70	K30+297.80	123.10	1.160	0.08	10.71	IZQUIERDA	EXCAVACION PARA CONSTRUCCIÓN DE CUNETA
K29+031.00	K29+421.00	122.64	1.16	0.05	7.11	IZQUIERDA	EXCAVACION PARA CONSTRUCCIÓN DE CUNETA
K30+021.00	K30+298.00	26.70	1.160	0.08	2.32	IZQUIERDA	EXCAVACION PARA CONSTRUCCIÓN DE CUNETA
K27+653.10	K27+709.70	56.60	1.160	0.05	3.28	DERECHA	EXCAVACION PARA CONSTRUCCIÓN DE CUNETA
K28+520.00	K28+757.90	238.00	1.160	0.08	20.71	DERECHA	EXCAVACION PARA CONSTRUCCIÓN DE CUNETA
K28+762.90	K28+832.70	69.80	1.160	0.15	12.15	DERECHA	EXCAVACION PARA CONSTRUCCIÓN DE CUNETA
K30+300.00	K30+390.00	90.00	1.160	0.05	5.22	DERECHA	EXCAVACION PARA CONSTRUCCIÓN DE CUNETA
K30+508.50	K30+584.70	76.20	1.160	0.05	4.42	DERECHA	EXCAVACION PARA CONSTRUCCIÓN DE CUNETA
K30+590.90	K30+673.00	82.10	1.160	0.05	4.76	DERECHA	EXCAVACION PARA CONSTRUCCIÓN DE CUNETA
K30+677.60	K30+751.60	74.00	1.160	0.05	4.29	DERECHA	EXCAVACION PARA CONSTRUCCIÓN DE CUNETA
K30+763.60	K30+869.20	105.60	1.160	0.05	6.12	DERECHA	EXCAVACION PARA CONSTRUCCIÓN DE CUNETA
K31+300.00	K31+364.60	64.60	1.160	0.05	3.75	DERECHA	EXCAVACION PARA CONSTRUCCIÓN DE CUNETA
K31+371.10	K31+377.60	6.50	1.160	0.05	0.38	DERECHA	EXCAVACION PARA CONSTRUCCIÓN DE CUNETA
K31+382.80	K31+438.90	56.10	1.160	0.05	3.25	DERECHA	EXCAVACION PARA CONSTRUCCIÓN DE CUNETA
K31+445.50	K31+476.50	31.00	1.160	0.05	1.80	DERECHA	EXCAVACION PARA CONSTRUCCIÓN DE CUNETA
K31+483.60	K31+528.40	44.80	1.160	0.05	2.60	DERECHA	EXCAVACION PARA CONSTRUCCIÓN DE CUNETA

K31+532.20	K31+551.60	19.40	1.160	0.05	1.13	DERECHA	EXCAVACION PARA CONSTRUCCIÓN DE CUNETA
K31+558.10	K31+634.40	76.30	1.160	0.05	4.43	DERECHA	EXCAVACION PARA CONSTRUCCIÓN DE CUNETA
K31+654.20	K31+708.60	54.40	1.16	0.05	3.16	DERECHA	EXCAVACION PARA CONSTRUCCIÓN DE CUNETA
K31+718.40	K31+729.30	10.90	1.160	0.05	0.63	DERECHA	EXCAVACION PARA CONSTRUCCIÓN DE CUNETA
K30+486.40	K30+535.40	49.00	1.160	0.05	2.84	DERECHA	EXCAVACION PARA CONSTRUCCIÓN DE CUNETA
K31+734.10	K31+805.90	71.80	1.160	0.05	4.16	DERECHA	EXCAVACION PARA CONSTRUCCIÓN DE CUNETA
K31+813.20	K31+843.60	30.40	1.160	0.05	1.76	DERECHA	EXCAVACION PARA CONSTRUCCIÓN DE CUNETA
K31+966.20	K32+002.80	36.60	1.160	0.05	2.12	DERECHA	EXCAVACION PARA CONSTRUCCIÓN DE CUNETA
K32+009.70	K32+096.50	86.80	1.160	0.05	5.03	DERECHA	EXCAVACION PARA CONSTRUCCIÓN DE CUNETA
K32+104.30	K32+156.20	51.90	1.160	0.05	3.01	DERECHA	EXCAVACION PARA CONSTRUCCIÓN DE CUNETA
K32+167.10	K32+222.00	54.90	1.160	0.05	3.18	DERECHA	EXCAVACION PARA CONSTRUCCIÓN DE CUNETA
K32+268.10	K32+307.70	39.60	1.160	0.05	2.30	DERECHA	EXCAVACION PARA CONSTRUCCIÓN DE CUNETA
K32+315.10	K32+363.10	48.00	1.160	0.05	2.78	DERECHA	EXCAVACION PARA CONSTRUCCIÓN DE CUNETA
K32+389.00	K32+399.90	10.90	1.160	0.05	0.63	DERECHA	EXCAVACION PARA CONSTRUCCIÓN DE CUNETA
K32+410.40	K32+417.10	6.70	1.160	0.05	0.39	DERECHA	EXCAVACION PARA CONSTRUCCIÓN DE CUNETA
K32+434.40	K32+488.70	54.30	1.160	0.05	3.15	DERECHA	EXCAVACION PARA CONSTRUCCIÓN DE CUNETA
K32+507.10	K32+526.70	19.60	1.160	0.05	1.14	DERECHA	EXCAVACION PARA CONSTRUCCIÓN DE CUNETA
K30+400.00	K30+867.00	51.60	1.160	0.05	2.99	DERECHA	EXCAVACION PARA CONSTRUCCIÓN DE CUNETA
K31+300.00	K31+720.00	56.97	1.160	0.05	3.30	DERECHA	EXCAVACION PARA CONSTRUCCIÓN DE CUNETA
K31+722.00	K32+527.00	449.81	1.16	0.05	26.09	DERECHA	EXCAVACION PARA CONSTRUCCIÓN DE CUNETA
SUBTOTAL ACTA PARCIAL N°14				**338.86**			

ACTA PARCIAL NO. 1	322.90
ACTA PARCIAL NO. 2	211.90
ACTA PARCIAL NO. 3	60.00
ACTA PARCIAL NO. 4	154.90
ACTA PARCIAL NO. 5	35.30
ACTA PARCIAL NO. 6	0.00
ACTA PARCIAL NO. 7	35.30
ACTA PARCIAL NO. 8	52.00
ACTA PARCIAL NO. 9	16.30
ACTA PARCIAL NO. 10	16.00
ACTA PARCIAL NO. 11	33.40
ACTA PARCIAL NO. 12	2.60
ACTA PARCIAL NO. 13	61.00
ACTA PARCIAL NO. 14	**338.90**
TOTAL ACUMULADO	1001.6

ING. SEBASTIAN GOMEZ VERGARA
MAB INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

ING. LUIS FERNANDO GOMEZ MENDEZ
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

Gobierno de CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS Secretaria de Infraestructura	Hoja No 1 de 1
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS	

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VIA DORADA - SONSON, RUTA DEL REANACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS.

PREACTA DE OBRA No:	14- TRAMO 1					FECHA:	30/1/2025
PERIODO:	1 AL 30 DE ENERO DE 2025						
CONTRATO DE OBRA No:	LP-SI-004-2023					CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1071 DE 2022					INTERVENTORÍA:	MAB INGENIERIA DE VALOR
ITEM	22						UNIDAD
630.6 T1	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)						m3
Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Cantidad	Margen	Descripción
ALCANTARILLAS							
ACTA DE OBRA N°14							
K27+970.00	K27+970.00	6.50	1.10	0.05	0.36	DERECHA	Solado para disipador
SUBTOTAL ACTA PARCIAL N°14				0.40			

ACTA PARCIAL NO. 1	0.00
ACTA PARCIAL NO. 2	1.90
ACTA PARCIAL NO. 3	0.90
ACTA PARCIAL NO. 4	2.10
ACTA PARCIAL NO. 5	2.30
ACTA PARCIAL NO. 6	0.00
ACTA PARCIAL NO. 7	2.70
ACTA PARCIAL NO. 8	2.00
ACTA PARCIAL NO. 9	4.30
ACTA PARCIAL NO. 10	1.20
ACTA PARCIAL NO. 11	1.50
ACTA PARCIAL NO. 12	2.00
ACTA PARCIAL NO. 13	3.30
ACTA PARCIAL NO. 14	**0.40**
TOTAL ACUMULADO	24.6

ING. SEBASTIAN GOMEZ VERGARA
MAB INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

ING. LUIS FERNANDO GOMEZ MENDEZ
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

Gobierno de CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS	Hoja No 1 de 4
	Secretaría de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS	

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VIA DORADA - SONSON, RUTA DEL REANACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS.

PREACTA DE OBRA No:	14- TRAMO 1	FECHA:	30/1/2025
PERIODO:	1 AL 30 DE ENERO DE 2025		
CONTRATO DE OBRA No:	LP-81-004-2023	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	10V1 DE 2022	INTERVENTORÍA:	MAB INGENIERIA DE VALOR

ITEM	27	UNIDAD
640.1 T1	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	kg

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	CANTIDAD	LONGITUD	CALIBRE	PESO (KG-M)	PESO TOTAL	Descripción
ALCANTARILLAS							
ACTA DE OBRA N°14							
ACERO REALCES Y DSIPADORES							
K28+030.00	K28+030.00		122.4	3/8"	0.560	68.54	DISIPADOR MARGEN IZQUIERDA
K29+080.00	K29+080.00		23.64	1/2"	0.994	23.50	REALCE MURO MARGEN DERECHA
			2.4	3/8"	0.560	1.34	
K30+990.00	K30+990.00		40.14	3/8"	0.560	22.48	REALCE DESCOLE MARGEN IZQUIERDA
K30+990.00	K30+990.00		61.9	3/8"	0.560	34.66	REALCE DESCOLE MARGEN DERECHA
K31+300.00	K31+300.00		24.76	3/8"	0.560	13.87	REALCE MURO MARGEN DERECHA
K31+300.00	K31+300.00		48.06	3/8"	0.560	26.91	REALCE MURO MARGEN IZQUIERDA
K29+040.00	K29+040.00		9.2	1/2"	0.994	9.14	ACERO EN CONCRETO CICLOPEO
K28+040.00	K28+040.00		4.8	3/8"	0.560	2.69	REALCE DE MURO CALZADA DERECHA
K28+030.00	K28+030.00		5.1	3/8"	0.560	2.86	REALCE DE MURO CALZADA IZQUIERDA
K30+590.00	K30+592.00		8.16	3/8"	0.560	4.57	REALCE DE MURO CALZADA DERECHA
K28+030.00	K28+030.00		51	3/8"	0.560	28.56	SECCION DE CUNETA IRREGULAR
CUNETAS REGULARES							
ACERO CUNETAS REGULARES MARGEN IZQUIERDA							
ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	No PLACAS	KGS ACERO LONG	PESO ACERO 3/8"	PESO (KG-M)	PESO TOTAL	DESCRIPCION
K29+278.00	K29+303.00	10	21.00	0.56	11.76	117.60	ACERO EN CUNETAS REGULARES (Ver anexo planilla acero)
K30+867.80	K30+884.80	8	24.15	0.56	13.52	108.19	ACERO EN CUNETAS REGULARES (Ver anexo planilla acero)
K30+890.90	K30+978.40	41	24.15	0.56	13.52	594.48	ACERO EN CUNETAS REGULARES (Ver anexo planilla acero)
K30+984.20	K31+143.00	73	24.15	0.56	13.52	1014.30	ACERO EN CUNETAS REGULARES (Ver anexo planilla acero)
K31+149.40	K31+228.20	38	24.15	0.56	13.52	513.91	ACERO EN CUNETAS REGULARES (Ver anexo planilla acero)
K31+248.70	K31+300.30	25	24.15	0.56	13.52	330.10	ACERO EN CUNETAS REGULARES (Ver anexo planilla acero)
K31+730.00	K31+806.00	35	24.15	0.56	13.52	473.34	ACERO EN CUNETAS REGULARES (Ver anexo planilla acero)
K31+819.40	K31+860.60	19	24.15	0.56	13.52	256.96	ACERO EN CUNETAS REGULARES (Ver anexo planilla acero)
K31+942.60	K32+095.80	71	24.15	0.56	13.52	960.20	ACERO EN CUNETAS REGULARES (Ver anexo planilla acero)
K32+103.80	K32+163.00	27	24.15	0.56	13.52	365.15	ACERO EN CUNETAS REGULARES (Ver anexo planilla acero)
K32+173.50	K32+221.90	22	24.15	0.56	13.52	297.53	ACERO EN CUNETAS REGULARES (Ver anexo planilla acero)
K32+231.90	K32+253.20	10	24.15	0.56	13.52	135.24	ACERO EN CUNETAS REGULARES (Ver anexo planilla acero)
K32+272.60	K32+300.70	13	24.15	0.56	13.52	175.81	ACERO EN CUNETAS REGULARES (Ver anexo planilla acero)
K32+317.30	K32+367.30	23	24.15	0.56	13.52	311.05	ACERO EN CUNETAS REGULARES (Ver anexo planilla acero)
K32+376.30	K32+389.30	6	24.15	0.56	13.52	81.14	ACERO EN CUNETAS REGULARES (Ver anexo planilla acero)
K32+390.45	K32+403.75	6	24.15	0.56	13.52	81.14	ACERO EN CUNETAS REGULARES (Ver anexo planilla acero)
K32+416.35	K32+435.85	8	24.15	0.56	13.52	108.19	ACERO EN CUNETAS REGULARES (Ver anexo planilla acero)
K32+439.05	K32+500.55	28	24.15	0.56	13.52	378.67	ACERO EN CUNETAS REGULARES (Ver anexo planilla acero)
K32+514.05	K32+560.05	21	24.15	0.56	13.52	284.00	ACERO EN CUNETAS REGULARES (Ver anexo planilla acero)
K32+568.50	K32+588.65	9	24.15	0.56	13.52	121.72	ACERO EN CUNETAS REGULARES (Ver anexo planilla acero)
K32+605.15	K32+618.25	6	24.15	0.56	13.52	81.14	ACERO EN CUNETAS REGULARES (Ver anexo planilla acero)
K32+618.95	K32+680.35	28	24.15	0.56	13.52	378.67	ACERO EN CUNETAS REGULARES (Ver anexo planilla acero)
K32+691.15	K32+702.05	5	24.15	0.56	13.52	67.62	ACERO EN CUNETAS REGULARES (Ver anexo planilla acero)
K32+709.55	K32+713.85	2	24.15	0.56	13.52	27.05	ACERO EN CUNETAS REGULARES (Ver anexo planilla acero)
K32+720.45	K32+757.35	17	24.15	0.56	13.52	229.91	ACERO EN CUNETAS REGULARES (Ver anexo planilla acero)
K32+773.85	K32+880.55	49	24.15	0.56	13.52	662.68	ACERO EN CUNETAS REGULARES (Ver anexo planilla acero)
K32+897.55	K32+947.85	23	24.15	0.56	13.52	311.05	ACERO EN CUNETAS REGULARES (Ver anexo planilla acero)
ACERO CUNETAS REGULARES MARGEN DERECHA							
ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	No PLACAS	KGS ACERO LONG	PESO ACERO 3/8"	PESO (KG-M)	PESO TOTAL	DESCRIPCION
K30+437.00	K30+486.00	23	24.15	0.56	13.52	311.05	ACERO EN CUNETAS REGULARES (Ver anexo planilla acero)
K30+867.80	K30+876.30	4	24.15	0.56	13.52	54.19	ACERO EN CUNETAS REGULARES (Ver anexo planilla acero)
K30+881.90	K30+976.10	44	24.15	0.56	13.52	595.06	ACERO EN CUNETAS REGULARES (Ver anexo planilla acero)
K30+979.50	K31+070.30	43	24.15	0.56	13.52	581.53	ACERO EN CUNETAS REGULARES (Ver anexo planilla acero)
K31+075.30	K31+113.00	18	24.15	0.56	13.52	243.43	ACERO EN CUNETAS REGULARES (Ver anexo planilla acero)
K31+118.30	K31+148.10	14	24.15	0.56	13.52	189.34	ACERO EN CUNETAS REGULARES (Ver anexo planilla acero)
K31+154.80	K31+279.50	58	24.15	0.56	13.52	784.39	ACERO EN CUNETAS REGULARES (Ver anexo planilla acero)
K31+283.80	K31+300.00	4	24.15	0.56	13.52	54.10	ACERO EN CUNETAS REGULARES (Ver anexo planilla acero)
K31+734.10	K31+806.90	33	24.15	0.56	13.52	446.29	ACERO EN CUNETAS REGULARES (Ver anexo planilla acero)
K31+813.20	K31+843.60	14	24.15	0.56	13.52	189.34	ACERO EN CUNETAS REGULARES (Ver anexo planilla acero)
K31+966.20	K32+002.80	17	24.15	0.56	13.52	229.91	ACERO EN CUNETAS REGULARES (Ver anexo planilla acero)
K32+009.70	K32+096.50	40	24.15	0.56	13.52	540.96	ACERO EN CUNETAS REGULARES (Ver anexo planilla acero)
K32+104.30	K32+156.20	24	24.15	0.56	13.52	324.58	ACERO EN CUNETAS REGULARES (Ver anexo planilla acero)
K32+167.10	K32+222.00	25	24.15	0.56	13.52	338.10	ACERO EN CUNETAS REGULARES (Ver anexo planilla acero)
K32+268.10	K32+307.70	18	24.15	0.56	13.52	243.43	ACERO EN CUNETAS REGULARES (Ver anexo planilla acero)
K32+315.10	K32+363.10	22	24.15	0.56	13.52	297.53	ACERO EN CUNETAS REGULARES (Ver anexo planilla acero)
K32+389.00	K32+399.90	5	24.15	0.56	13.52	67.62	ACERO EN CUNETAS REGULARES (Ver anexo planilla acero)
K32+410.40	K32+417.10	3	24.15	0.56	13.52	40.57	ACERO EN CUNETAS REGULARES (Ver anexo planilla acero)
K32+434.40	K32+488.70	25	24.15	0.56	13.52	338.10	ACERO EN CUNETAS REGULARES (Ver anexo planilla acero)
K32+507.10	K32+526.70	9	24.15	0.56	13.52	121.72	ACERO EN CUNETAS REGULARES (Ver anexo planilla acero)

Gobierno de CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS	Hoja No 1 de 4
	Secretaria de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS	

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VIA DORADA - SONSON, RUTA DEL REANACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS.

PREACTA DE OBRA No:	14- TRAMO 3	FECHA:	30/1/2025
PERIODO:			1 AL 30 DE ENERO DE 2025
CONTRATO DE OBRA No:	LP-SI-004-2023	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1071 DE 2022	INTERVENTORÍA:	MAB INGENIERIA DE VALOR

ITEM	27						UNIDAD
640.1 T1	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa						kg
ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	CANTIDAD	LONGITUD	CALIBRE	PESO (KG-M)	PESO TOTAL	Descripción
CUNETAS IRREGULARES							
ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	CANTIDAD	LONGITUD	CALIBRE	PESO (KG-M)	PESO TOTAL	DESCRIPCION
ACERO CUNETAS IREGULARES MARGEN DERECHA							
K30+400.00	K30+400.00		8.40	3/8"	0.56	4.70	CUNETA IRREGULAR MARGEN DERECHA (Ver anexo planilla acero)
K30+420.00	K30+420.00		100.00	3/8"	0.56	56.00	CUNETA IRREGULAR MARGEN DERECHA (Ver anexo planilla acero)
K30+500.00	K30+500.00		52.40	3/8"	0.56	29.34	CUNETA IRREGULAR MARGEN DERECHA (Ver anexo planilla acero)
K30+505.00	K30+505.00		36.30	3/8"	0.56	20.33	CUNETA IRREGULAR MARGEN DERECHA (Ver anexo planilla acero)
K30+585.00	K30+585.00		57.35	3/8"	0.56	32.12	CUNETA IRREGULAR MARGEN DERECHA (Ver anexo planilla acero)
K30+673.00	K30+673.00		38.00	3/8"	0.56	21.28	CUNETA IRREGULAR MARGEN DERECHA (Ver anexo planilla acero)
K30+752.00	K30+752.00		29.85	3/8"	0.56	16.55	CUNETA IRREGULAR MARGEN DERECHA (Ver anexo planilla acero)
K30+869.00	K30+869.00		87.15	3/8"	0.56	48.80	CUNETA IRREGULAR MARGEN DERECHA (Ver anexo planilla acero)
K31+300.00	K31+300.00		25.50	3/8"	0.56	14.16	CUNETA IRREGULAR MARGEN DERECHA (Ver anexo planilla acero)
K31+365.00	K31+365.00		57.75	3/8"	0.56	32.34	CUNETA IRREGULAR MARGEN DERECHA (Ver anexo planilla acero)
K31+378.00	K31+378.00		60.10	3/8"	0.56	33.66	CUNETA IRREGULAR MARGEN DERECHA (Ver anexo planilla acero)
K31+439.00	K31+439.00		89.95	3/8"	0.56	50.37	CUNETA IRREGULAR MARGEN DERECHA (Ver anexo planilla acero)
K31+552.00	K31+552.00		115.95	3/8"	0.56	64.93	CUNETA IRREGULAR MARGEN DERECHA (Ver anexo planilla acero)
K31+634.00	K31+634.00		168.25	3/8"	0.56	94.22	CUNETA IRREGULAR MARGEN DERECHA (Ver anexo planilla acero)
K31+709.00	K31+709.00		151.80	3/8"	0.56	85.01	CUNETA IRREGULAR MARGEN DERECHA (Ver anexo planilla acero)
K30+867.00	K30+867.00		38.93	3/8"	0.56	21.34	CUNETA IRREGULAR MARGEN DERECHA (Ver anexo planilla acero)
K30+881.00	K30+881.00		87.60	3/8"	0.56	49.06	CUNETA IRREGULAR MARGEN DERECHA (Ver anexo planilla acero)
K30+929.00	K30+929.00		28.01	3/8"	0.56	15.69	CUNETA IRREGULAR MARGEN DERECHA (Ver anexo planilla acero)
K31+070.00	K31+070.00		124.15	3/8"	0.56	69.52	CUNETA IRREGULAR MARGEN DERECHA (Ver anexo planilla acero)
K31+722.00	K31+722.00		65.00	3/8"	0.56	36.40	CUNETA IRREGULAR MARGEN DERECHA (Ver anexo planilla acero)
K31+805.00	K31+805.00		45.15	3/8"	0.56	28.48	CUNETA IRREGULAR MARGEN DERECHA (Ver anexo planilla acero)
K31+843.00	K31+843.00		28.45	3/8"	0.56	16.49	CUNETA IRREGULAR MARGEN DERECHA (Ver anexo planilla acero)
K31+860.00	K31+860.00		1468.80	3/8"	0.56	822.53	CUNETA IRREGULAR MARGEN DERECHA (Ver anexo planilla acero)
K31+963.00	K31+963.00		26.25	3/8"	0.56	14.70	CUNETA IRREGULAR MARGEN DERECHA (Ver anexo planilla acero)
K32+000.00	K32+000.00		63.55	3/8"	0.56	35.59	CUNETA IRREGULAR MARGEN DERECHA (Ver anexo planilla acero)
K32+097.00	K32+097.00		83.39	3/8"	0.56	46.70	CUNETA IRREGULAR MARGEN DERECHA (Ver anexo planilla acero)
K32+156.00	K32+156.00		123.25	3/8"	0.56	69.02	CUNETA IRREGULAR MARGEN DERECHA (Ver anexo planilla acero)
K32+282.00	K32+282.00		259.12	3/8"	0.56	145.11	CUNETA IRREGULAR MARGEN DERECHA (Ver anexo planilla acero)
K32+307.00	K32+307.00		52.55	3/8"	0.56	29.43	CUNETA IRREGULAR MARGEN DERECHA (Ver anexo planilla acero)
K32+368.00	K32+368.00		142.80	3/8"	0.56	79.97	CUNETA IRREGULAR MARGEN DERECHA (Ver anexo planilla acero)
K32+387.00	K32+387.00		167.11	3/8"	0.56	93.58	CUNETA IRREGULAR MARGEN DERECHA (Ver anexo planilla acero)
K32+417.00	K32+417.00		52.75	3/8"	0.56	29.54	CUNETA IRREGULAR MARGEN DERECHA (Ver anexo planilla acero)
K32+423.00	K32+423.00		54.16	3/8"	0.56	30.33	CUNETA IRREGULAR MARGEN DERECHA (Ver anexo planilla acero)
K32+432.00	K32+432.00		22.50	3/8"	0.56	12.60	CUNETA IRREGULAR MARGEN DERECHA (Ver anexo planilla acero)
K32+488.00	K32+488.00		144.84	3/8"	0.56	81.11	CUNETA IRREGULAR MARGEN DERECHA (Ver anexo planilla acero)
K32+505.00	K32+505.00		29.05	3/8"	0.56	16.27	CUNETA IRREGULAR MARGEN DERECHA (Ver anexo planilla acero)
ACERO CUNETAS IRREGULARES MARGEN IZQUIERDA							
K29+303.00	K29+303.00		21.80	3/8"	0.56	12.21	CUNETA IRREGULAR MARGEN IZQUIERDA (Ver anexo planilla acero)
K29+275.00	K29+275.00		210.00	3/8"	0.56	117.60	CUNETA IRREGULAR MARGEN IZQUIERDA (Ver anexo planilla acero)
K30+114.00	K30+114.00		74.90	3/8"	0.56	41.94	CUNETA IRREGULAR MARGEN IZQUIERDA (Ver anexo planilla acero)
K30+169.00	K30+169.00		64.20	3/8"	0.56	35.95	CUNETA IRREGULAR MARGEN IZQUIERDA (Ver anexo planilla acero)
K30+298.00	K30+298.00		141.35	3/8"	0.56	79.16	CUNETA IRREGULAR MARGEN IZQUIERDA (Ver anexo planilla acero)
K30+320.00	K30+320.00		341.05	3/8"	0.56	190.99	CUNETA IRREGULAR MARGEN IZQUIERDA (Ver anexo planilla acero)
K31+806.00	K31+806.00		242.67	3/8"	0.56	135.90	CUNETA IRREGULAR MARGEN IZQUIERDA (Ver anexo planilla acero)
K32+097.00	K32+097.00		82.31	3/8"	0.56	46.09	CUNETA IRREGULAR MARGEN IZQUIERDA (Ver anexo planilla acero)
K32+163.00	K32+163.00		114.15	3/8"	0.56	63.92	CUNETA IRREGULAR MARGEN IZQUIERDA (Ver anexo planilla acero)
K32+222.00	K32+222.00		148.42	3/8"	0.56	83.12	CUNETA IRREGULAR MARGEN IZQUIERDA (Ver anexo planilla acero)
K32+253.00	K32+253.00		171.00	3/8"	0.56	95.76	CUNETA IRREGULAR MARGEN IZQUIERDA (Ver anexo planilla acero)
K32+300.00	K32+300.00		177.70	3/8"	0.56	99.51	CUNETA IRREGULAR MARGEN IZQUIERDA (Ver anexo planilla acero)
K32+367.00	K32+367.00		190.77	3/8"	0.56	106.83	CUNETA IRREGULAR MARGEN IZQUIERDA (Ver anexo planilla acero)
K32+377.00	K32+377.00		11.45	3/8"	0.56	6.41	CUNETA IRREGULAR MARGEN IZQUIERDA (Ver anexo planilla acero)
K32+480.00	K32+480.00		186.92	3/8"	0.56	104.65	CUNETA IRREGULAR MARGEN IZQUIERDA (Ver anexo planilla acero)
K32+420.00	K32+420.00		42.66	3/8"	0.56	23.89	CUNETA IRREGULAR MARGEN IZQUIERDA (Ver anexo planilla acero)
K32+550.00	K32+550.00		101.45	3/8"	0.56	56.81	CUNETA IRREGULAR MARGEN IZQUIERDA (Ver anexo planilla acero)
K32+570.00	K32+570.00		146.96	3/8"	0.56	82.30	CUNETA IRREGULAR MARGEN IZQUIERDA (Ver anexo planilla acero)
K32+605.00	K32+605.00		8.80	3/8"	0.56	4.93	CUNETA IRREGULAR MARGEN IZQUIERDA (Ver anexo planilla acero)
K32+680.00	K32+680.00		149.00	3/8"	0.56	83.44	CUNETA IRREGULAR MARGEN IZQUIERDA (Ver anexo planilla acero)
K32+700.00	K32+700.00		84.75	3/8"	0.56	47.46	CUNETA IRREGULAR MARGEN IZQUIERDA (Ver anexo planilla acero)
K32+705.00	K32+705.00		52.35	3/8"	0.56	29.32	CUNETA IRREGULAR MARGEN IZQUIERDA (Ver anexo planilla acero)
K33+757.00	K33+757.00		215.35	3/8"	0.56	120.60	CUNETA IRREGULAR MARGEN IZQUIERDA (Ver anexo planilla acero)
K32+880.00	K32+880.00		199.75	3/8"	0.56	111.86	CUNETA IRREGULAR MARGEN IZQUIERDA (Ver anexo planilla acero)
K30+420.00	K30+420.00		44.80	3/8"	0.56	25.09	CUNETA IRREGULAR MARGEN IZQUIERDA (Ver anexo planilla acero)
K30+500.00	K30+500.00		38.90	3/8"	0.56	21.78	CUNETA IRREGULAR MARGEN IZQUIERDA (Ver anexo planilla acero)
K30+588.00	K30+588.00		25.60	3/8"	0.56	14.34	CUNETA IRREGULAR MARGEN IZQUIERDA (Ver anexo planilla acero)
K30+669.00	K30+669.00		34.20	3/8"	0.56	19.15	CUNETA IRREGULAR MARGEN IZQUIERDA (Ver anexo planilla acero)
K30+748.00	K30+748.00		61.85	3/8"	0.56	34.64	CUNETA IRREGULAR MARGEN IZQUIERDA (Ver anexo planilla acero)
K30+859.00	K30+859.00		75.10	3/8"	0.56	42.06	CUNETA IRREGULAR MARGEN IZQUIERDA (Ver anexo planilla acero)
K30+867.00	K30+867.00		25.40	3/8"	0.56	14.22	CUNETA IRREGULAR MARGEN IZQUIERDA (Ver anexo planilla acero)
K30+884.00	K30+884.00		100.90	3/8"	0.56	56.17	CUNETA IRREGULAR MARGEN IZQUIERDA (Ver anexo planilla acero)
K30+978.00	K30+978.00		52.05	3/8"	0.56	29.15	CUNETA IRREGULAR MARGEN IZQUIERDA (Ver anexo planilla acero)
K31+143.00	K31+143.00		16.80	3/8"	0.56	9.41	CUNETA IRREGULAR MARGEN IZQUIERDA (Ver anexo planilla acero)
K31+300.00	K31+300.00		22.90	3/8"	0.56	12.77	CUNETA IRREGULAR MARGEN IZQUIERDA (Ver anexo planilla acero)
K31+374.00	K31+374.00		3.80	3/8"	0.56	2.18	CUNETA IRREGULAR MARGEN IZQUIERDA (Ver anexo planilla acero)
K31+475.00	K31+475.00		81.50	3/8"	0.56	45.64	CUNETA IRREGULAR MARGEN IZQUIERDA (Ver anexo planilla acero)
K31+627.00	K31+627.00		333.05	3/8"	0.56	186.51	CUNETA IRREGULAR MARGEN IZQUIERDA (Ver anexo planilla acero)
K31+720.00	K31+720.00		24.15	3/8"	0.56	13.52	CUNETA IRREGULAR MARGEN IZQUIERDA (Ver anexo planilla acero)
SUBTOTAL ACTA PARCIAL N°14					19312.68		

Gobierno de CALDAS	GOBERNACION DE CALDAS Secretaria de Infraestructura	Hoja No 1 de 4
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS	

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VIA DORADA - SONSON, RUTA DEL REANACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS.

PREACTA DE OBRA No:	14- TRAMO 1	FECHA:	30/01/2025
PERIODO:	1 AL 30 DE ENERO DE 2025		
CONTRATO DE OBRA No:	LP-SI-004-2023	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1071 DE 2022	INTERVENTORÍA:	MAB INGENIERIA DE VALOR

ITEM	27						UNIDAD
640.1 T1	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa						kg
ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	CANTIDAD	LONGITUD	CALIBRE	PESO (KG-M)	PESO TOTAL	Descripción

ACTA PARCIAL NO. 2	1975,00
ACTA PARCIAL NO. 3	659,00
ACTA PARCIAL NO. 4	1228,00
ACTA PARCIAL NO. 5	1227,00
ACTA PARCIAL NO. 6	0,00
ACTA PARCIAL NO. 7	2346,00
ACTA PARCIAL NO. 8	1971,00
ACTA PARCIAL NO. 9	2338,91
ACTA PARCIAL NO. 10	1318,00
ACTA PARCIAL NO. 11	10591,00
ACTA PARCIAL NO. 12	33084,00
ACTA PARCIAL NO. 13	10591,00
ACTA PARCIAL NO. 13	10591,00
ACTA PARCIAL NO. 14	**19313,00**
TOTAL ACUMULADO	77919,9

ING. SEBASTIAN GOMEZ VERGARA
MAB INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

ING. LUIS FERNANDO GOMEZ MENDEZ
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA


CANTIDADES ACERO FIGURADO

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON

No. del Contrato LP-SI-004-2023

Localización: ACERO TIPO PARA CUNETA REGULAR

Fecha: ENERO, 2025

Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm	8 mm	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"
			6M	8M	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7	No. 8	No. 9	No. 10
	9	1,35				12,15							
	6	2				12							
							0						
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0,222	0,394	0,250	0,560	0,994	1,552	2,235	3,042	3,973	5,060	6,404
Metros lineales						24,15	0						
Peso en kilos						13,524	0						
Peso total (kg)			13,524										

	Nombre		
INGENIERO	LUIS FERNANDO GOMEZ		


CANTIDADES ACERO FIGURADO

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON

No. del Contrato LP-SI-004-2023

Localización: ACERO TIPO PARA CUNETA REGULAR

Fecha: ENERO, 2025

Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm	8 mm	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"
			6M	8M	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7	No. 8	No. 9	No. 10
	9	1				9							
	6	2				12							
							0						
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0,222	0,394	0,250	0,560	0,994	1,552	2,235	3,042	3,973	5,060	6,404
Metros lineales						21	0						
Peso en kilos						11,76	0						
Peso total (kg)			11,76										

	Nombre		
INGENIERO	LUIS FERNANDO GOMEZ		


CANTIDADES ACERO FIGURADO

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON

No. del Contrato LP-SI-004-2023

Localización: ACERO CUNETAS IRREGULARES k29+275 CI

Fecha: ENERO, 2025

Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm	8 mm	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"
			6M	8M	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7	No. 8	No. 9	No. 10
	9	1				90							
	6	2				120							
							0						
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0,222	0,394	0,250	0,560	0,994	1,552	2,235	3,042	3,973	5,060	6,404
Metros lineales						210	0						
Peso en kilos						117,6	0						
Peso total (kg)			117,6										

	Nombre		
INGENIERO	LUIS FERNANDO GOMEZ		


CANTIDADES ACERO FIGURADO

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON

No. del Contrato LP-SI-004-2023

Localización: ACERO CUNETAS IRREGULARES k28+030 CI

Fecha: DICIEMBRE, 2024

Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm	8 mm	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"
			6M	8M	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7	No. 8	No. 9	No. 10
	15	1,8				27							
	8	3				24							
							0						
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0,222	0,394	0,250	0,560	0,994	1,552	2,235	3,042	3,973	5,060	6,404
Metros lineales						51	0						
Peso en kilos						28,56	0						
Peso total (kg)			28,56										

	Nombre		
INGENIERO	LUIS FERNANDO GOMEZ		

CANTIDADES ACERO FIGURADO


CONSORCIO SAN MIGUEL

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON

No. del Contrato LP-SI-004-2023

Localización: ACERO CUNETAS IRREGULARES k30+114 CI

Fecha: DICIEMBRE, 2024

Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm	8 mm	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"
			6M	8M	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7	No. 8	No. 9	No. 10
	12	2				24							
	10	1,55				15,5							
	6	2				12							
	2	1,9				3,8							
	9	0,35				3,15							
	7	2,35				16,45							
							0						
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0,222	0,394	0,250	0,560	0,994	1,552	2,235	3,042	3,973	5,060	6,404
Metros lineales						74,9	0						
Peso en kilos						41,944	0						
Peso total (kg)			41,944										

	Nombre		
INGENIERO	LUIS FERNANDO GOMEZ		

CANTIDADES ACERO FIGURADO



CONSORCIO SAN MIGUEL

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON

No. del Contrato LP-SI-004-2023

Localización: ACERO CUNETAS IRREGULARES k30+169 CI

Fecha: ENERO, 2025














Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm	8 mm	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"
			6M	8M	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7	No. 8	No. 9	No. 10
	8	1,5				12							
	7	1,95				13,65							
	6	1,65				9,9							
	9	1,55				13,95							
	4	1,65				6,6							
	9	0,9				8,1							
							0						
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0,222	0,394	0,250	0,560	0,994	1,552	2,235	3,042	3,973	5,060	6,404
Metros lineales						64,2	0						
Peso en kilos						35,952	0						
Peso total (kg)			35,952										

	Nombre		
INGENIERO	LUIS FERNANDO GOMEZ		

CANTIDADES ACERO FIGURADO

CONSORCIO SAN MIGUEL

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON
No. del Contrato LP-SI-004-2023
Localización: ACERO CUNETAS IRREGULARES k30+298 CI
Fecha: ENERO, 2025

Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm	8 mm	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"
			6M	8M	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7	No. 8	No. 9	No. 10
	9	1,35				12,15							
	8	1,75				14							
	6	1,65				9,9							
	8	1,35				10,8							
	8	1,2				9,6							
	8	1,2				9,6							
	6	2				12							
	8	1,8				14,4							
	3	1,7				5,1							
	8	0,6				4,8							
	7	1,3				9,1							
	6	1,65				9,9							
	5	2				10							
	5	2				10							
							0						
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0,222	0,394	0,250	0,560	0,994	1,552	2,235	3,042	3,973	5,060	6,404
Metros lineales						141,35	0						
Peso en kilos						79,156	0						
Peso total (kg)			79,156										

	Nombre		
INGENIERO	LUIS FERNANDO GOMEZ		

CANTIDADES ACERO FIGURADO




CONSORCIO SAN MIGUEL

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON

No. del Contrato LP-SI-004-2023

Localización: ACERO CUNETAS IRREGULARES k30+320 CI

Fecha: ENERO, 2025

Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm	8 mm	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"
			6M	8M	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7	No. 8	No. 9	No. 10
	8	1,75				14							
	9	1,85				16,65							
	8	1,8				14,4							
	70	2				140							
	70	2				140							
	8	2				16							
							0						
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0,222	0,394	0,250	0,560	0,994	1,552	2,235	3,042	3,973	5,060	6,404
Metros lineales						341,05	0						
Peso en kilos						190,988	0						
Peso total (kg)			190,99										

	Nombre		
INGENIERO	LUIS FERNANDO GOMEZ		

CANTIDADES ACERO FIGURADO


CONSORCIO SAN MIGUEL

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON

No. del Contrato LP-SI-004-2023

Localización: ACERO CUNETAS IRREGULARES k30+400 CD

Fecha: ENERO, 2025

Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm	8 mm	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"
			6M	8M	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7	No. 8	No. 9	No. 10
	4	0,95				3,8							
	4	1,15				4,6							
							0						
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0,222	0,394	0,250	0,560	0,994	1,552	2,235	3,042	3,973	5,060	6,404
Metros lineales						8,4	0						
Peso en kilos						4,704	0						
Peso total (kg)			4,704										

	Nombre		
INGENIERO	LUIS FERNANDO GOMEZ		

CANTIDADES ACERO FIGURADO






CONSORCIO SAN MIGUEL

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON

No. del Contrato LP-SI-004-2023

Localización: ACERO CUNETAS IRREGULARES k30+420 CD

Fecha: ENERO, 2025

Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm	8 mm	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"
			6M	8M	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7	No. 8	No. 9	No. 10
	8	1,4				11,2							
	6	1,45				8,7							
	6	1,5				9							
	6	1,2				7,2							
	7	1,6				11,2							
	7	1,8				12,6							
	6	1,7				10,2							
	7	1,25				8,75							
	6	1,25				7,5							
	7	1,95				13,65							
							0						
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0,222	0,394	0,250	0,560	0,994	1,552	2,235	3,042	3,973	5,060	6,404
Metros lineales						100	0						
Peso en kilos						56	0						
Peso total (kg)			56										

	Nombre		
INGENIERO	LUIS FERNANDO GOMEZ		

CANTIDADES ACERO FIGURADO


CONSORCIO SAN MIGUEL

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON

No. del Contrato LP-SI-004-2023

Localización: ACERO CUNETAS IRREGULARES k30+500 CD

Fecha: ENERO, 2025

Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm	8 mm	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"
			6M	8M	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7	No. 8	No. 9	No. 10
	6	1,15				6,9							
	5	1,4				7							
	14	2				28							
	21	0,5				10,5							
							0						
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0,222	0,394	0,250	0,560	0,994	1,552	2,235	3,042	3,973	5,060	6,404
Metros lineales						52,4	0						
Peso en kilos						29,344	0						
Peso total (kg)			29,344										

	Nombre		
INGENIERO	LUIS FERNANDO GOMEZ		

CANTIDADES ACERO FIGURADO


CONSORCIO SAN MIGUEL

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON

No. del Contrato LP-SI-004-2023

Localización: ACERO CUNETAS IRREGULARES k30+505 CD

Fecha: ENERO, 2025

Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm	8 mm	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"
			6M	8M	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7	No. 8	No. 9	No. 10
	9	1,6				14,4							
	2	2,3				4,6							
	10	0,4				4							
	7	1,9				13,3							
							0						
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0,222	0,394	0,250	0,560	0,994	1,552	2,235	3,042	3,973	5,060	6,404
Metros lineales						36,3	0						
Peso en kilos						20,328	0						
Peso total (kg)			20,328										

	Nombre		
INGENIERO	LUIS FERNANDO GOMEZ		


CANTIDADES ACERO FIGURADO

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON

No. del Contrato LP-SI-004-2023

Localización: ACERO CUNETAS IRREGULARES k30+585 CD

Fecha: ENERO, 2025

Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm	8 mm	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"
			6M	8M	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7	No. 8	No. 9	No. 10
	4	1,35				5,4							
	9	1,35				12,15							
	8	1,45				11,6							
	6	0,9				5,4							
	6	2				12							
	6	1,8				10,8							
							0						
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0,222	0,394	0,250	0,560	0,994	1,552	2,235	3,042	3,973	5,060	6,404
Metros lineales						57,35	0						
Peso en kilos						32,116	0						
Peso total (kg)			32,116										

	Nombre		
INGENIERO	LUIS FERNANDO GOMEZ		

CANTIDADES ACERO FIGURADO



CONSORCIO SAN MIGUEL

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON

No. del Contrato LP-SI-004-2023

Localización: ACERO CUNETAS IRREGULARES k30+673 CD

Fecha: ENERO, 2025

Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm	8 mm	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"
			6M	8M	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7	No. 8	No. 9	No. 10
	4	1,35				5,4							
	8	1,45				11,6							
	6	1				6							
	6	1,8				10,8							
	2	1,5				3							
	6	0,2				1,2							
							0						
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0,222	0,394	0,250	0,560	0,994	1,552	2,235	3,042	3,973	5,060	6,404
Metros lineales						38	0						
Peso en kilos						21,28	0						
Peso total (kg)			21,28										

	Nombre		
INGENIERO	LUIS FERNANDO GOMEZ		

CANTIDADES ACERO FIGURADO


CONSORCIO SAN MIGUEL

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON

No. del Contrato LP-SI-004-2023

Localización: ACERO CUNETAS IRREGULARES k30+752 CD




Fecha: ENERO, 2025

Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm	8 mm	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"
			6M	8M	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7	No. 8	No. 9	No. 10
	9	1,35				12,15							
	6	2,1				12,6							
	2	1,7				3,4							
	7	0,2				1,4							
							0						
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0,222	0,394	0,250	0,560	0,994	1,552	2,235	3,042	3,973	5,060	6,404
Metros lineales						29,55	0						
Peso en kilos						16,548	0						
Peso total (kg)			16,548										

	Nombre		
INGENIERO	LUIS FERNANDO GOMEZ		

CANTIDADES ACERO FIGURADO

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON
No. del Contrato LP-SI-004-2023
Localización: ACERO CUNETAS IRREGULARES k30+869 CD
Fecha: ENERO, 2025

Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm	8 mm	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"
			6M	8M	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7	No. 8	No. 9	No. 10
	9	1,95				17,55							
	10	1,75				17,5							
						0							
	9	2,3				20,7							
	4	1,75				7							
	8	0,95				7,6							
	7	2,4				16,8							
							0						
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0,222	0,394	0,250	0,560	0,994	1,552	2,235	3,042	3,973	5,060	6,404
Metros lineales						87,15	0						
Peso en kilos						48,804	0						
Peso total (kg)			48,804										

	Nombre		
INGENIERO	LUIS FERNANDO GOMEZ		


CANTIDADES ACERO FIGURADO

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON

No. del Contrato LP-SI-004-2023

Localización: ACERO CUNETAS IRREGULARES k31+300 CD

Fecha: ENERO, 2025

Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm	8 mm	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"
			6M	8M	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7	No. 8	No. 9	No. 10
	10	1,25				12,5							
	5	2,2				11							
							0						
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0,222	0,394	0,250	0,560	0,994	1,552	2,235	3,042	3,973	5,060	6,404
Metros lineales						23,5	0						
Peso en kilos						13,16	0						
Peso total (kg)			13,16										

	Nombre		
INGENIERO	LUIS FERNANDO GOMEZ		

CANTIDADES ACERO FIGURADO



CONSORCIO SAN MIGUEL

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON

No. del Contrato LP-SI-004-2023

Localización: ACERO CUNETAS IRREGULARES k31+365 CD

Fecha: ENERO, 2025

Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm	8 mm	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"
			6M	8M	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7	No. 8	No. 9	No. 10
	9	1,25				11,25							
	9	0,95				8,55							
	9	1,05				9,45							
	5	2				10							
	4	2				8							
	5	2,1				10,5							
							0						
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0,222	0,394	0,250	0,560	0,994	1,552	2,235	3,042	3,973	5,060	6,404
Metros lineales						57,75	0						
Peso en kilos						32,34	0						
Peso total (kg)			32,34										

	Nombre		
INGENIERO	LUIS FERNANDO GOMEZ		

CANTIDADES ACERO FIGURADO


CONSORCIO SAN MIGUEL

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON

No. del Contrato LP-SI-004-2023

Localización: ACERO CUNETAS IRREGULARES k31+378 CD

Fecha: ENERO, 2025

Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm	8 mm	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"
			6M	8M	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7	No. 8	No. 9	No. 10
	8	1,45				11,6							
	6	1,7				10,2							
	6	1,35				8,1							
	6	1,8				10,8							
	7	1,7				11,9							
	5	1,5				7,5							
							0						
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0,222	0,394	0,250	0,560	0,994	1,552	2,235	3,042	3,973	5,060	6,404
Metros lineales						60,1	0						
Peso en kilos						33,656	0						
Peso total (kg)			33,656										

	Nombre		
INGENIERO	LUIS FERNANDO GOMEZ		

CANTIDADES ACERO FIGURADO




CONSORCIO SAN MIGUEL

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON

No. del Contrato LP-SI-004-2023

Localización: ACERO CUNETAS IRREGULARES k31+439 CD

Fecha: ENERO, 2025

Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm	8 mm	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"
			6M	8M	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7	No. 8	No. 9	No. 10
	9	1,7				15,3							
	9	1,8				16,2							
	7	2				14							
	7	1,9				13,3							
	7	2,3				16,1							
	7	2,15				15,05							
							0						
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0,222	0,394	0,250	0,560	0,994	1,552	2,235	3,042	3,973	5,060	6,404
Metros lineales						89,95	0						
Peso en kilos						50,372	0						
Peso total (kg)			50,372										

	Nombre		
INGENIERO	LUIS FERNANDO GOMEZ		

CANTIDADES ACERO FIGURADO




CONSORCIO SAN MIGUEL

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON

No. del Contrato LP-SI-004-2023

Localización: ACERO CUNETAS IRREGULARES k31+552 CD

Fecha: ENERO, 2025

Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm	8 mm	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"
			6M	8M	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7	No. 8	No. 9	No. 10
	9	1,7				15,3							
	10	1,7				17							
	14	1,9				26,6							
	7	2				14							
	14	2				28							
	7	2,15				15,05							
							0						
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0,222	0,394	0,250	0,560	0,994	1,552	2,235	3,042	3,973	5,060	6,404
Metros lineales						115,95	0						
Peso en kilos						64,932	0						
Peso total (kg)			64,932										

	Nombre		
INGENIERO	LUIS FERNANDO GOMEZ		

CANTIDADES ACERO FIGURADO



CONSORCIO SAN MIGUEL

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON

No. del Contrato LP-SI-004-2023

Localización: ACERO CUNETAS IRREGULARES k31+634 CD

Fecha: ENERO, 2025

Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm	8 mm	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"
			6M	8M	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7	No. 8	No. 9	No. 10
	4	1,35				5,4							
	9	1,45				13,05							
	56	0,95				53,2							
	6	1,7				10,2							
	35	2,1				73,5							
	6	2,15				12,9							
							0						
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0,222	0,394	0,250	0,560	0,994	1,552	2,235	3,042	3,973	5,060	6,404
Metros lineales						168,25	0						
Peso en kilos						94,22	0						
Peso total (kg)			94,22										

	Nombre		
INGENIERO	LUIS FERNANDO GOMEZ		

CANTIDADES ACERO FIGURADO







CONSORCIO SAN MIGUEL

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON

No. del Contrato LP-SI-004-2023

Localización: ACERO CUNETAS IRREGULARES k31+709 CD

Fecha: ENERO, 2025

Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm	8 mm	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"
			6M	8M	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7	No. 8	No. 9	No. 10
	7	1,3				9,1							
	7	1,35				9,45							
	8	1,65				13,2							
	9	1,65				14,85							
	14	2				28							
	6	1,65				9,9							
	6	1,65				9,9							
	7	1,8				12,6							
	14	2,1				29,4							
	7	2,2				15,4							
							0						
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0,222	0,394	0,250	0,560	0,994	1,552	2,235	3,042	3,973	5,060	6,404
Metros lineales						151,8	0						
Peso en kilos						85,008	0						
Peso total (kg)			85,008										

	Nombre		
INGENIERO	LUIS FERNANDO GOMEZ		

CANTIDADES ACERO FIGURADO


CONSORCIO SAN MIGUEL

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON

No. del Contrato LP-SI-004-2023

Localización: ACERO CUNETAS IRREGULARES k30+420 CI

Fecha: ENERO, 2025

Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm	8 mm	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"
			6M	8M	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7	No. 8	No. 9	No. 10
	9	0,8				7,2							
	3	5,2				15,6							
	20	0,6				12							
	5	2				10							
							0						
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0,222	0,394	0,250	0,560	0,994	1,552	2,235	3,042	3,973	5,060	6,404
Metros lineales						44,8	0						
Peso en kilos						25,088	0						
Peso total (kg)			25,088										

	Nombre		
INGENIERO	LUIS FERNANDO GOMEZ		

CANTIDADES ACERO FIGURADO



CONSORCIO SAN MIGUEL

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON

No. del Contrato LP-SI-004-2023

Localización: ACERO CUNETAS IRREGULARES k30+500 CI

Fecha: ENERO, 2025

Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm	8 mm	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"
			6M	8M	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7	No. 8	No. 9	No. 10
	4	1,35				5,4							
	10	1,4				14							
	6	0,95				5,7							
	6	2,3				13,8							
							0						
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0,222	0,394	0,250	0,560	0,994	1,552	2,235	3,042	3,973	5,060	6,404
Metros lineales						38,9	0						
Peso en kilos						21,784	0						
Peso total (kg)			21,784										

	Nombre		
INGENIERO	LUIS FERNANDO GOMEZ		

CANTIDADES ACERO FIGURADO



CONSORCIO SAN MIGUEL

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON

No. del Contrato LP-SI-004-2023

Localización: ACERO CUNETAS IRREGULARES k30+588 CI

Fecha: ENERO, 2025

Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm	8 mm	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"
			6M	8M	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7	No. 8	No. 9	No. 10
	4	1,3				5,2							
	6	1,35				8,1							
	6	0,75				4,5							
	6	1,3				7,8							
							0						
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0,222	0,394	0,250	0,560	0,994	1,552	2,235	3,042	3,973	5,060	6,404
Metros lineales						25,6	0						
Peso en kilos						14,336	0						
Peso total (kg)			14,336										

	Nombre		
INGENIERO	LUIS FERNANDO GOMEZ		

CANTIDADES ACERO FIGURADO



CONSORCIO SAN MIGUEL

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON

No. del Contrato LP-SI-004-2023

Localización: ACERO CUNETAS IRREGULARES k30+669 CI

Fecha: ENERO, 2025

Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm	8 mm	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"
			6M	8M	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7	No. 8	No. 9	No. 10
	4	1,35				5,4							
	9	1,4				12,6							
	6	0,8				4,8							
	6	1,9				11,4							
							0						
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0,222	0,394	0,250	0,560	0,994	1,552	2,235	3,042	3,973	5,060	6,404
Metros lineales						34,2	0						
Peso en kilos						19,152	0						
Peso total (kg)			19,152										

	Nombre		
INGENIERO	LUIS FERNANDO GOMEZ		


CANTIDADES ACERO FIGURADO

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON

No. del Contrato LP-SI-004-2023

Localización: ACERO CUNETAS IRREGULARES k30+748 CI

Fecha: ENERO, 2025

Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm	8 mm	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"
			6M	8M	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7	No. 8	No. 9	No. 10
	8	1,25				10							
	3	0,9				2,7							
	9	2,05				18,45							
	8	2,2				17,6							
	4	1,7				6,8							
	7	0,9				6,3							
							0						
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0,222	0,394	0,250	0,560	0,994	1,552	2,235	3,042	3,973	5,060	6,404
Metros lineales						61,85	0						
Peso en kilos						34,636	0						
Peso total (kg)			34,636										

	Nombre		
INGENIERO	LUIS FERNANDO GOMEZ		

CANTIDADES ACERO FIGURADO



CONSORCIO SAN MIGUEL

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON

No. del Contrato LP-SI-004-2023

Localización: ACERO CUNETAS IRREGULARES k30+859 CI

Fecha: ENERO, 2025

Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm	8 mm	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"
			6M	8M	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7	No. 8	No. 9	No. 10
	6	1,35				8,1							
	8	1,7				13,6							
	8	1,65				13,2							
	6	1,3				7,8							
	7	1,9				13,3							
	2	1,7				3,4							
	8	0,3				2,4							
	7	1,9				13,3							
							0						
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0,222	0,394	0,250	0,560	0,994	1,552	2,235	3,042	3,973	5,060	6,404
Metros lineales						75,1	0						
Peso en kilos						42,056	0						
Peso total (kg)			42,056										

	Nombre		
INGENIERO	LUIS FERNANDO GOMEZ		

CANTIDADES ACERO FIGURADO


CONSORCIO SAN MIGUEL

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON

No. del Contrato LP-SI-004-2023

Localización: ACERO CUNETAS IRREGULARES k31+300 CI

Fecha: ENERO, 2025

Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm	8 mm	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"
			6M	8M	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7	No. 8	No. 9	No. 10
	9	1,2				10,8							
	5	2,4				12							
							0						
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0,222	0,394	0,250	0,560	0,994	1,552	2,235	3,042	3,973	5,060	6,404
Metros lineales						22,8	0						
Peso en kilos						12,768	0						
Peso total (kg)			12,768										

	Nombre		
INGENIERO	LUIS FERNANDO GOMEZ		

CANTIDADES ACERO FIGURADO

CONSORCIO SAN MIGUEL

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON

No. del Contrato LP-SI-004-2023

Localización: ACERO CUNETAS IRREGULARES k31+374 CI

Fecha: ENERO, 2025

Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm	8 mm	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"
			6M	8M	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7	No. 8	No. 9	No. 10
———	2	1,25				2,5							
———	7	0,2				1,4							
							0						
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0,222	0,394	0,250	0,560	0,994	1,552	2,235	3,042	3,973	5,060	6,404
Metros lineales						3,9	0						
Peso en kilos						2,184	0						
Peso total (kg)			2,184										

	Nombre		
INGENIERO	LUIS FERNANDO GOMEZ		




CANTIDADES ACERO FIGURADO

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON

No. del Contrato LP-SI-004-2023

Localización: ACERO CUNETAS IRREGULARES k31+374 CI

Fecha: ENERO, 2025










Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm	8 mm	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"
			6M	8M	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7	No. 8	No. 9	No. 10
	7	1,4				9,8							
	7	1,95				13,65							
	9	1,35				12,15							
	6	1,65				9,9							
	8	1,5				12							
	4	1,5				6							
	6	1				6							
	6	2				12							
							0						
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0,222	0,394	0,250	0,560	0,994	1,552	2,235	3,042	3,973	5,060	6,404
Metros lineales						81,5	0						
Peso en kilos						45,64	0						
Peso total (kg)			45,64										

	Nombre		
INGENIERO	LUIS FERNANDO GOMEZ		

CANTIDADES ACERO FIGURADO

CONSORCIO SAN MIGUEL

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON
No. del Contrato LP-SI-004-2023
Localización: ACERO CUNETAS IRREGULARES k31+374 CI
Fecha: ENERO, 2025

Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm	8 mm	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"
			6M	8M	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7	No. 8	No. 9	No. 10
	9	1,6				14,4							
	9	1,9				17,1							
	9	2,35				21,15							
	9	2,45				22,05							
	9	2,15				19,35							
	15	3,1				46,5							
	10	1,55				15,5							
						0							
	7	2				14							
	8	2				16							
	11	2,1				23,1							
	6	2,25				13,5							
	10	1,75				17,5							
	9	2,1				18,9							
	8	2,1				16,8							
	14	2,8				39,2							
	8	2,25				18							
							0						
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0,222	0,394	0,250	0,560	0,994	1,552	2,235	3,042	3,973	5,060	6,404
Metros lineales						333,05	0						
Peso en kilos						186,508	0						
Peso total (kg)			186,508										

	Nombre		
INGENIERO	LUIS FERNANDO GOMEZ		

CANTIDADES ACERO FIGURADO


CONSORCIO SAN MIGUEL



Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON

No. del Contrato LP-SI-004-2023

Localización: ACERO CUNETAS IRREGULARES k31+720 CI

Fecha: ENERO, 2025

Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm	8 mm	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"
			6M	8M	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7	No. 8	No. 9	No. 10
	9	1,25				11,25							
	6	2,15				12,9							
							0						
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0,222	0,394	0,250	0,560	0,994	1,552	2,235	3,042	3,973	5,060	6,404
Metros lineales						24,15	0						
Peso en kilos						13,524	0						
Peso total (kg)			13,524										

	Nombre		
INGENIERO	LUIS FERNANDO GOMEZ		

CANTIDADES ACERO FIGURADO

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON

No. del Contrato LP-SI-004-2023

Localización: ACERO CUNETAS IRREGULARES k30+867 CD

Fecha: ENERO, 2025

Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm	8 mm	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"
			6M	8M	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7	No. 8	No. 9	No. 10
	11	1,85				20,35							
	8	2,31				18,48							
							0						
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0,222	0,394	0,250	0,560	0,994	1,552	2,235	3,042	3,973	5,060	6,404
Metros lineales						38,83	0						
Peso en kilos						21,7448	0						
Peso total (kg)			21,745										

	Nombre		
INGENIERO	LUIS FERNANDO GOMEZ		



CANTIDADES ACERO FIGURADO

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON

No. del Contrato LP-SI-004-2023

Localización: ACERO CUNETAS IRREGULARES k30+881 CD

Fecha: ENERO, 2025

Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm	8 mm	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"
			6M	8M	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7	No. 8	No. 9	No. 10
	7	1,8				12,6							
	8	1,75				14							
	8	1,45				11,6							
	8	1,9				15,2							
	9	1,9				17,1							
	9	1,9				17,1							
							0						
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0,222	0,394	0,250	0,560	0,994	1,552	2,235	3,042	3,973	5,060	6,404
Metros lineales						87,6	0						
Peso en kilos						49,056	0						
Peso total (kg)			49,056										

	Nombre		
INGENIERO	LUIS FERNANDO GOMEZ		

CANTIDADES ACERO FIGURADO


CONSORCIO SAN MIGUEL

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON

No. del Contrato LP-SI-004-2023

Localización: ACERO CUNETAS IRREGULARES k30+997 CD

Fecha: ENERO, 2025

Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm	8 mm	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"
			6M	8M	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7	No. 8	No. 9	No. 10
	9	1,45				13,05							
	2	1,48				2,96							
	6	0,2				1,2							
	6	1,8				10,8							
							0						
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0,222	0,394	0,250	0,560	0,994	1,552	2,235	3,042	3,973	5,060	6,404
Metros lineales						28,01	0						
Peso en kilos						15,6856	0						
Peso total (kg)			15,686										

	Nombre		
INGENIERO	LUIS FERNANDO GOMEZ		

CANTIDADES ACERO FIGURADO



CONSORCIO SAN MIGUEL

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON

No. del Contrato LP-SI-004-2023

Localización: ACERO CUNETAS IRREGULARES k31+070 CD

Fecha: ENERO, 2025

Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm	8 mm	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"
			6M	8M	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7	No. 8	No. 9	No. 10
	7	1,8				12,6							
	7	1,7				11,9							
	6	1,8				10,8							
	8	1,4				11,2							
	8	1,9				15,2							
	8	1,9				15,2							
	7	1,4				9,8							
	7	1,55				10,85							
	7	1,95				13,65							
	7	1,85				12,95							
							0						
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0,222	0,394	0,250	0,560	0,994	1,552	2,235	3,042	3,973	5,060	6,404
Metros lineales						124,15	0						
Peso en kilos						69,524	0						
Peso total (kg)			69,524										

	Nombre		
INGENIERO	LUIS FERNANDO GOMEZ		

CANTIDADES ACERO FIGURADO


CONSORCIO SAN MIGUEL

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON

No. del Contrato LP-SI-004-2023

Localización: ACERO CUNETAS IRREGULARES k30+867 CI

Fecha: ENERO, 2025

Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm	8 mm	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"
			6M	8M	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7	No. 8	No. 9	No. 10
	8	1,6				12,8							
	7	1,8				12,6							
							0						
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0,222	0,394	0,250	0,560	0,994	1,552	2,235	3,042	3,973	5,060	6,404
Metros lineales						25,4	0						
Peso en kilos						14,224	0						
Peso total (kg)			14,224										

	Nombre		
INGENIERO	LUIS FERNANDO GOMEZ		

CANTIDADES ACERO FIGURADO



CONSORCIO SAN MIGUEL

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON

No. del Contrato LP-SI-004-2023

Localización: ACERO CUNETAS IRREGULARES k30+884 CI

Fecha: ENERO, 2025

Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm	8 mm	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"
			6M	8M	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7	No. 8	No. 9	No. 10
	9	1,75				15,75							
	7	2,75				19,25							
	8	2,15				17,2							
	8	1,85				14,8							
	8	1,85				14,8							
	10	1,85				18,5							
							0						
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0,222	0,394	0,250	0,560	0,994	1,552	2,235	3,042	3,973	5,060	6,404
Metros lineales						100,3	0						
Peso en kilos						56,168	0						
Peso total (kg)			56,168										

	Nombre		
INGENIERO	LUIS FERNANDO GOMEZ		

CANTIDADES ACERO FIGURADO



CONSORCIO SAN MIGUEL

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON

No. del Contrato LP-SI-004-2023

Localización: ACERO CUNETAS IRREGULARES k30+978 CI

Fecha: ENERO, 2025

Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm	8 mm	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"
			6M	8M	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7	No. 8	No. 9	No. 10
	9	1,3				11,7							
	8	1,6				12,8							
	6	1,7				10,2							
	2	1,6				3,2							
	6	0,2				1,2							
	7	1,85				12,95							
							0						
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0,222	0,394	0,250	0,560	0,994	1,552	2,235	3,042	3,973	5,060	6,404
Metros lineales						52,05	0						
Peso en kilos						29,148	0						
Peso total (kg)			29,148										

	Nombre		
INGENIERO	LUIS FERNANDO GOMEZ		

CANTIDADES ACERO FIGURADO


CONSORCIO SAN MIGUEL

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON

No. del Contrato LP-SI-004-2023

Localización: ACERO CUNETAS IRREGULARES k31+143 CI

Fecha: ENERO, 2025

Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm	8 mm	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"
			6M	8M	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7	No. 8	No. 9	No. 10
	6	1,3				7,8							
	6	1,5				9							
							0						
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0,222	0,394	0,250	0,560	0,994	1,552	2,235	3,042	3,973	5,060	6,404
Metros lineales						16,8	0						
Peso en kilos						9,408	0						
Peso total (kg)			9,408										

	Nombre		
INGENIERO	LUIS FERNANDO GOMEZ		




CANTIDADES ACERO FIGURADO

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON

No. del Contrato LP-SI-004-2023

Localización: ACERO CUNETAS IRREGULARES k31+722 CD

Fecha: ENERO, 2025

Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm	8 mm	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"
			6M	8M	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7	No. 8	No. 9	No. 10
	7	1,5				10,5							
	9	1,35				12,15							
	6	1,35				8,1							
	7	1,55				10,85							
	6	2,05				12,3							
	6	1,85				11,1							
							0						
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0,222	0,394	0,250	0,560	0,994	1,552	2,235	3,042	3,973	5,060	6,404
Metros lineales						65	0						
Peso en kilos						36,4	0						
Peso total (kg)			36,4										

	Nombre		
INGENIERO	LUIS FERNANDO GOMEZ		



CANTIDADES ACERO FIGURADO

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON

No. del Contrato LP-SI-004-2023

Localización: ACERO CUNETAS IRREGULARES k31+805 CD

Fecha: ENERO, 2025

Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm	8 mm	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"
			6M	8M	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7	No. 8	No. 9	No. 10
	9	1,35				12,15							
	8	1,05				8,4							
	6	2				12							
	4	1,9				7,6							
							0						
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0,222	0,394	0,250	0,560	0,994	1,552	2,235	3,042	3,973	5,060	6,404
Metros lineales						40,15	0						
Peso en kilos						22,484	0						
Peso total (kg)			22,484										

	Nombre		
INGENIERO	LUIS FERNANDO GOMEZ		


CANTIDADES ACERO FIGURADO

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON

No. del Contrato LP-SI-004-2023

Localización: ACERO CUNETAS IRREGULARES k31+843 CD

Fecha: ENERO, 2025

Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm	8 mm	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"
			6M	8M	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7	No. 8	No. 9	No. 10
	9	1,6				14,4							
	7	2,15				15,05							
							0						
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0,222	0,394	0,250	0,560	0,994	1,552	2,235	3,042	3,973	5,060	6,404
Metros lineales						29,45	0						
Peso en kilos						16,492	0						
Peso total (kg)			16,492										

	Nombre		
INGENIERO	LUIS FERNANDO GOMEZ		

CANTIDADES ACERO FIGURADO

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON

No. del Contrato LP-SI-004-2023

Localización: ACERO CUNETAS IRREGULARES k31+860 CD MURO AMARILLO

Fecha: ENERO, 2025

Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm	8 mm	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"
			6M	8M	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7	No. 8	No. 9	No. 10
	432	2				864							
	378	1,6				604,8							
							0						
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0,222	0,394	0,250	0,560	0,994	1,552	2,235	3,042	3,973	5,060	6,404
Metros lineales						1468,8	0						
Peso en kilos						822,528	0						
Peso total (kg)			822,53										

	Nombre		
INGENIERO	LUIS FERNANDO GOMEZ		


CANTIDADES ACERO FIGURADO

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON

No. del Contrato LP-SI-004-2023

Localización: ACERO CUNETAS IRREGULARES k31+963 CD

Fecha: ENERO, 2025

Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm	8 mm	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"
			6M	8M	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7	No. 8	No. 9	No. 10
	9	1,55				13,95							
	6	2,05				12,3							
							0						
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0,222	0,394	0,250	0,560	0,994	1,552	2,235	3,042	3,973	5,060	6,404
Metros lineales						26,25	0						
Peso en kilos						14,7	0						
Peso total (kg)			14,7										

	Nombre		
INGENIERO	LUIS FERNANDO GOMEZ		
