COP 740 - 2024,

OBJETO: "EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."

CONTRATISTA: CONSORCIO USAQUÉN 005-2024

INTERVENTORÍA: R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS SAS.

PARQUE: DESARROLLO ESTRELLA DEL NORTE - CÓD 01-189.

DIRECTORA DE OBRA: ARQ. MAGDA URIBE.

RESIDENTE DE OBRA: ING. DANIEL CHARRY

DIRECTORA DE INTERVENTORÍA: ING. MARGARITH GÓMEZ

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA: ING. ESPERANZA QUEVEDO.

Norma

Powered by CamScanner

MARTES 11 DE MARZO DE 2025.

PERSONAL: 1 MAESTRO + 3 AY + 1 TOPÓGRAFO + 1 CADENERO.

EQUIPO: ESTACIÓN TOTAL.

ACTIVIDADES: - SE REALIZA RETIRO DE CON EQUIPO POR ÁREA A INTERVENIR.

- RECIBEN CONTAINER Y BAÑO PORTÁTIL A LA OBRA.
- SE INICIA EXCAVACIÓN PARA INSTALACIÓN DE VARAS BOLLIZAS PARA CERRAMIENTO.
- SE INICIA DEMOLICIÓN MANUAL DE CIMIENTOS EN CONCRETO EXISTENTES, CLIMA: LLUVIA EN LA TARDE.

VIERNES 12 DE MARZO DE 2025

PERSONAL: 1 MAESTRO + 3 AYUDANTES.

CLIMA: NUBLADO EN LA MAÑANA; LLUVIA A PARTIR DE LAS 12:30 PM.

ACTIVIDADES: - SE CONTINÚA CON LA DEMOLICIÓN DE CIMIENTOS EN CONCRETO.

- SE INSTALA BAÑO.
- SE TERMINA EXCAVAMIENTO DE OBRA.

Norma

Powered by CamScanner

JUEVES 13 DE MARZO/2025

PERSONAL: 2 AY.

ACTIVIDADES: - DEMOLICIÓN MANUAL DE SOBRES DE CONCRETO CON ESPESOR PROMEDIO DE 13cm.

CLIMA: LLUVIA EN LA TARDE. (1PM - 4PM).

VIERNES 14 DE MARZO/2025


PERSONAL: 1 MAESTRO 1 AY.

CLIMA: MAÑANA SOLEADA; LLUVIA A PARTIR DE LA 1PM.

ACTIVIDADES: - CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DE DEMOLICIÓN QUE LLEVARÁ A SAN PATRICIO PARA SER UTILIZADO COMO RELLENO PARA MEJORAR EL TERRENO.

- EN COMITÉ DE OBRA SE OBSERVA QUE LA PENDIENTE DEL TERRENO EN EL SENDERO QUE CONECTA LA BAHÍA (VÍA COSTERA) CON LOS JUEGOS INFANTILES ES MUY INCLINADA, LO QUE OBLIGARÍA A HACER UNOS ESCALONES. CONTRATISTA, INTERVENTORÍA Y APOYO A LA SUPERVISIÓN ACUERDAN MODIFICAR ESE TRAZADO Y HACER UNOS METROS AL SUR LA VEREDA

AL ANDÉN SOBRE LA CRA 19B; ESTO CON EL FIN DE SALVAGUARDAR LA PEATONAL.

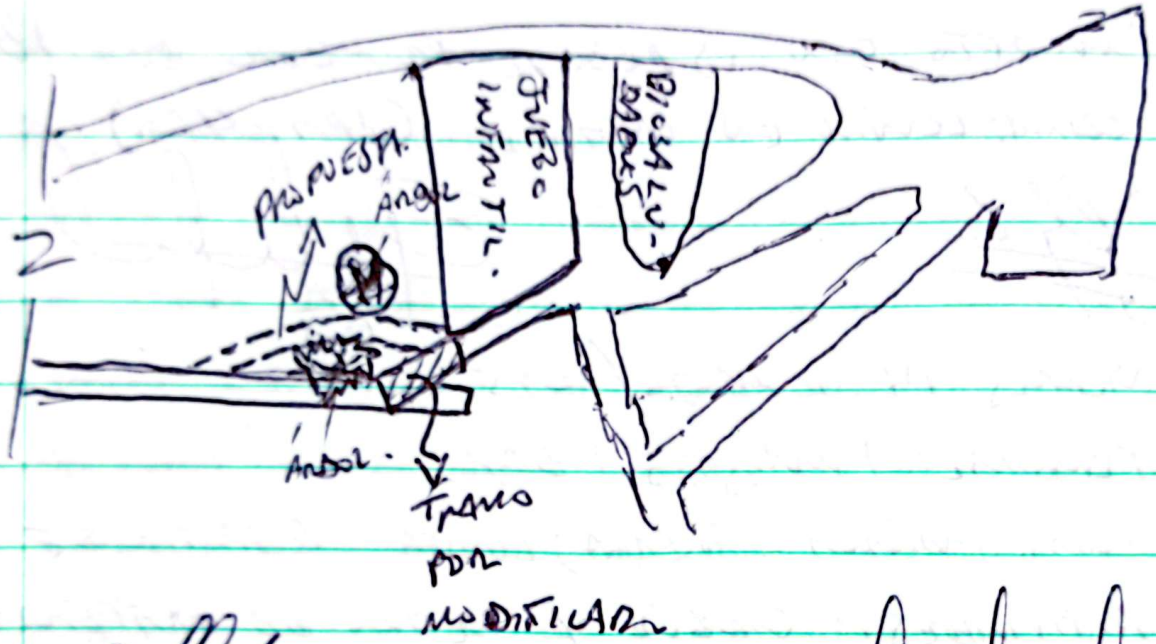

SÁBADO 15 DE MARZO/2025

PERSONAL: 1 AY.


ACTIVIDADES - ACOPIO DE MATERIAL PARA CARGUE POSTERIOR.

LUNES 17 DE MARZO/2025

PERSONAL: 1 MAESTRO + 3 AY.

CLIMA: NUBLADO EN LA MAÑANA; LLUVIA EN LA TARDE.

ACTIVIDADES: - DESCARTE MANUAL SOBRE ÁREA DEL SENDERO LARGO (OCCIDENTAL).
- DESMONTE DE JUEGO INFANTIL EN MADERA
- DEMOLICIÓN DE PLAZOLETAS EXISTENTES EN CONCRETO.
- CARGUE DE VOLQUETA CON DESTINO A PARQUE SAN PATRICIO.

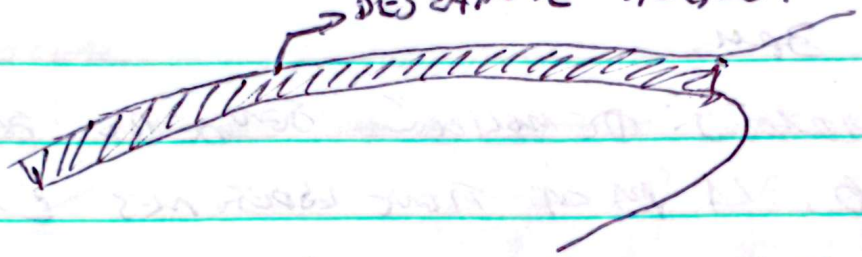

LOS CESPEDONES SE EMPIEZAN A SEMBRAR EN LAS ÁREAS DEMOLIDAS SOBRE LAS QUE NO HABRÁ SENDERO EN ADOQUÍN O PLACA DE JUEGOS O BIOSALUDABLES.

DLC

TM

MARTES 18 DE MARZO/2025
PERSONAL: 2 AYUDANTES.
CLIMA: NUBLADO EN LA MAÑANA, LLUVIA A PARTIR DE LAS 2PM.
ACTIVIDADES: SE APRUEBA INTERVENCIÓN DEL ANDÉN SOBRE LA CRA 19B, POR LO QUE

Norma

Powered by CamScanner

SE PODRÁ INICIAR DEMOLICIÓN.
- SE CONTINUA CON RETIEMBRA DE CESPEDÓN.

TM

MIERCOLES 19 DE MARZO DE 2025
PERSONAL: 1 MAESTRO + 4 M.
CLIMA: MAÑANA SOLEADA; LLUVIA A PARTIR DE LAS 3PM.
ACTIVIDADES: DEMOLICIÓN SENDERO SOBRE CAA 19B. LA PLACA TIENE ESPESORES ENTRE 15 Y 20 CMS.
- SE CONTINUÁ CON SIEMBRA DE CESPEDÓN.
- SE CARGA Y BAJÁ CESPEDÓN PARA PASAJE COBADAS (20 m²).

TM

JUEVES 20 DE MARZO DE 2025
PERSONAL: 1 A Y.
CLIMA: NUBLADO CON LLOVIZNAS.
ACTIVIDADES: SE APOYÓ MATERIAL DE DEMOLICIÓN PARA FACILITAR EL CARGUÉ.

- LLEGA VIA
PROVISIÓN
VIERNES 21/0
PERSONAL: 1
CLIMA: SOLEADO
ACTIVIDADES: DE
MARTES 26/03/
PERSONAL: 1 A
CLIMA: SOLEADO.
ACTIVIDADES: LLE
OBRA
MIÉRCOLES 27/
PERSONAL: 1 A

Norma

Powered by CamScanner

- LLEGA VIAJE DE BASÁLTICO A-80 DEL PROVEEDOR NOVO (MECÁNICAS INDUSTRIALES).

VIERNES 21/03/2025

PERSONAL: 1 MAESTRO + 1 AY.

CLIMA: SOLEADO.

ACTIVIDADES: REPUNTEO MANUAL, CHECADO NIVELES.

MARTES 26/03/2025.

PERSONAL: 1 AY.

CLIMA: SOLEADO.

ACTIVIDADES: LLEGA VIAJE DE BASÁLTICO A-80 A LA OBRA.

MIÉRCOLES 27/03/2025.

PERSONAL: 1 AY.

Norma

Powered by CamScanner

CLIMA: LLUVIA EN LA TARDE.

ACTIVIDADES: DESCAPOTE MANUAL.

Nadia Ar. - Interventoría

JUEVES 28/03/2025.

PERSONAL: 1AY.

CLIMA: LLUVIA.

ACTIVIDADES: - REPLANTEO DE NIVELES.

Nadia Ar. - Interventoría

VIERNES 29/03/2025.

PERSONAL: 1AY.

CLIMA: LLUVIA.

ACTIVIDADES: LA LLUVIA NO PERMITIÓ AVANCES EN DESCAPOTE.

Nadia Ar. - Interventoría

LUNES 31/03/2025

PERSONAL: 1AY

CLIMA: LLUVIA.

Norma

Powered by CamScanner

ACTIVIDADES: DESCAPOTE MANUAL, SECTOR JUEGOS INFANTILES.

Nula A - Interventoría Ltda.

MARTES 01/04/2025

PERSONAL: 1 MAESTRO, 1 AY, 1 OFICIAL.

EQUIPO: 1 EXCAVADORA.

CLIMA: NUBLADO.

ACTIVIDADES: - LLEGA EXCAVADORA A LA OBRA A LAS 10 AM.

- SE MANTIENEN NUBES EN SENDERO OCCIDENTAL

PARA DAR INICIO A LAS EXCAVACIONES.

. Esta interventoría hace acompañamiento al contratista en la toma de niveles del sendero occidental, dando inicio a las excavaciones en este.


Nula A. Interventoría Ltda.

Norma

Powered by CamScanner

2-09-2025


MIERCOLES. • SE REALIZA REPLANTEO DE LA ZONA DE BIO-PLAZOLETA Y JUEGOS, POR LA UBICACION DEL POSTE. CON EL FIN DE DEJAR ALINEADO EL POSTE CON EL BORDILLO DE LA ZONA DE BIOSALUDABLES, HACIA EL COSTADO SUR I 1,50MTS REPETANDO LAS AREAS DE LA PLAZOLETA CENTRAL - Y ZONA DE JUEGOS,
CON EL DESPLAZAMIENTO SE ALINEA EL SENDERO QUE NACE DE LA PLAZOLETA HACIA EL ORIENTE.

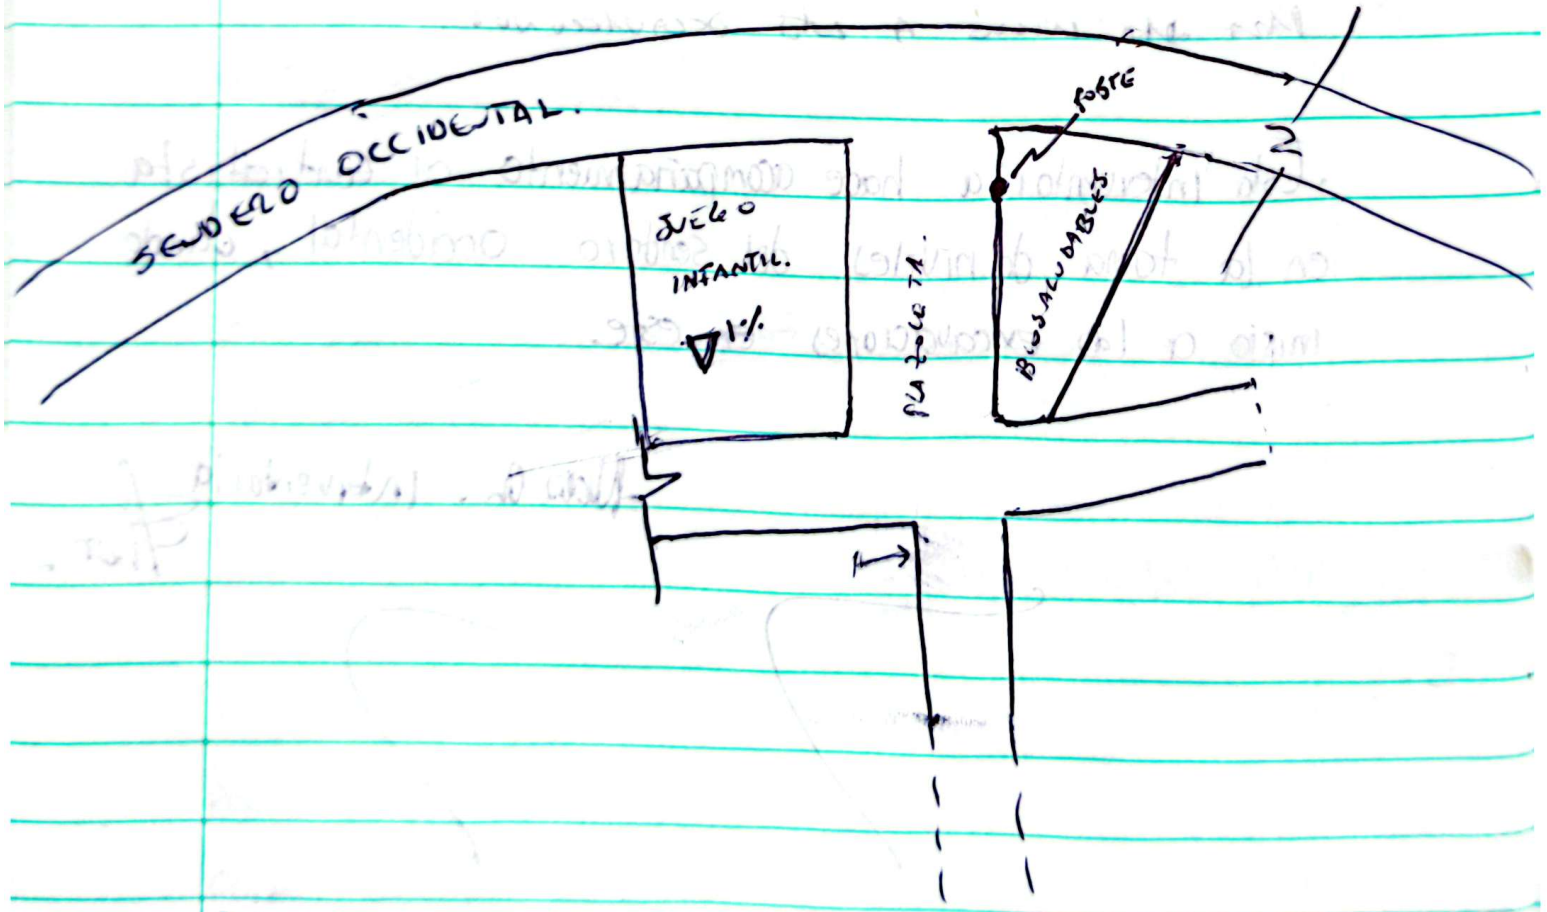


Norma

Powered by CamScanner

- SENDERO OCCIDENTAL SE REALIZARA MEJORAMIENTO CON LA DEMOLICION DE LOS ANDENES, YA QUE LA ESTRUCTURA EXCAVADA PARA EL SENDERO CONTINUA CON TIERRA (H.O) VERIFICADO CON EN APIQUE.

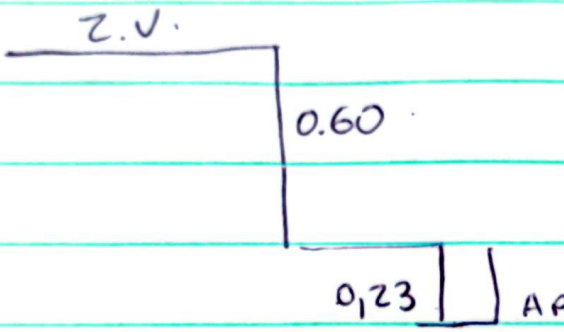

EN UNA LONGITUD DE 23,40 mts. EN PROMEDIO h: 0,90 MTS. — P = 3%.



PERSONAL EN OBRA: 1 MAESTRO, 4 AYUDANTES, 1 OPERARIO.


EQUIPO: 1 EXCAVADORA.

CLIMA: LLOVIENA DESDE LA 1:30 P.M.

ACTIVIDADES: - SE AVANZA CON EXCAVACION MECANICA EN SENDERO OCCIDENTAL, PARQUETA DE JUEGOS Y BIOSALUDABLES.

PARA EXCAVAR LA ZONA DE BIOSALUDABLES SE RETIRO EL MONTICULO EXISTENTE CON MÁQUINA. LAS DIMENSIONES

Di E570 SON : L = 12,90 ; A = 3 ; H = 0,80



Hauteur maximale : 0,40.

Norma

Powered by CamScanner
