CONTRATO O CONVENIO No.	CONTRATO 315 ARC-DISAN-DHONAC 2025
FECHA FIRMA CONTRATO	21 DE MARZO 2025
CONTRATISTA:	**DEGAR SOLUTIONS S.A.S**
NIT:	901594034-7
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	MAYO 2025
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	ABRIL

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATAR EL SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN DEL HOSPITAL NAVAL NIVEL III CARTAGENA Y LA REGIONAL NORTE

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

2. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A/A

ITEM 1	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO + IVA
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12.000 BTU 220 VAC CONVENCIONAL. INCLUYE: IIMPIEZA GENERAL CARCAZA, FILTROS DE AIRE, LAVADO CON AGUA A PRESIÓN AL SERPENTÍN EVAPORADORA Y BLOWER, APLICACIÓN DE LIQUIDO DESINCRUSTANTE, MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO DE CONTROL (AJUSTE DE BORNERAS, LIMPIEZA DE TARJETA ELECRONICA) LAVADO AL SERPENTÍN DE LA CONDENSADORA, ASPA DEL VENTILADOR, AJUSTE GENERAL DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA ACABADO COLOR BLANCO EN CASO DE REQUERIRLO Y CALIBRACION DE CARGA DE REFRIGERANTE R410.	1	$ 270.588,24	$ 51.411,76	$ 322.000,00
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 18.000 BTU 220 VAC CONVENCIONAL. INCLUYE: IIMPIEZA GENERAL CARCAZA, FILTROS DE AIRE, LAVADO CON AGUA A PRESIÓN AL SERPENTÍN EVAPORADORA Y BLOWER, APLICACIÓN DE LIQUIDO DESINCRUSTANTE, MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO DE CONTROL (AJUSTE DE BORNERAS, LIMPIEZA DE TARJETA ELECRONICA) LAVADO AL SERPENTÍN DE LA CONDENSADORA, ASPA DEL VENTILADOR, AJUSTE GENERAL DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA ACABADO COLOR BLANCO EN CASO DE REQUERIRLO Y CALIBRACION DE CARGA DE REFRIGERANTE R410.	1	$ 295.798,32	$ 56.201,68	$ 352.000,00
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24.000 BTU 220 VAC CONVENCIONAL. INCLUYE: IIMPIEZA GENERAL CARCAZA, FILTROS DE AIRE, LAVADO CON AGUA A PRESIÓN AL SERPENTÍN EVAPORADORA Y BLOWER, APLICACIÓN DE LIQUIDO DESINCRUSTANTE, MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO DE CONTROL (AJUSTE DE BORNERAS, LIMPIEZA DE TARJETA ELECRONICA) LAVADO AL SERPENTÍN DE LA CONDENSADORA, ASPA DEL VENTILADOR, AJUSTE GENERAL DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA ACABADO EN CASO DE REQUERIRLO COLOR BLANCO Y CALIBRACION DE CARGA DE REFRIGERANTE R410.	1	$ 331.932,77	$ 63.067,23	$ 395.000,00
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 36.000 BTU 220 VAC CONVENCIONAL. INCLUYE: IIMPIEZA GENERAL CARCAZA, FILTROS DE AIRE, LAVADO CON AGUA A PRESIÓN AL SERPENTÍN EVAPORADORA Y BLOWER, APLICACIÓN DE LIQUIDO DESINCRUSTANTE, MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO DE CONTROL (AJUSTE DE BORNERAS, LIMPIEZA DE TARJETA ELECRONICA) LAVADO AL SERPENTÍN DE LA CONDENSADORA, ASPA DEL VENTILADOR, AJUSTE GENERAL DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA ACABADO ENCASO DE REQUERIRLO COLOR BLANCO Y CALIBRACION DE CARGA DE REFRIGERANTE R410.	1	$ 407.563,03	$ 77.436,97	$ 485.000,00
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL DE 3TR O 36.000 BTU 220 VAC. INCLUYE: IIMPIEZA GENERAL CARCAZA, FILTROS DE AIRE, LAVADO CON AGUA A PRESIÓN AL SERPENTÍN EVAPORADORA Y BLOWER, APLICACIÓN DE LIQUIDO DESINCRUSTANTE, MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO DE CONTROL (AJUSTE DE BORNERAS, LIMPIEZA DE TARJETA ELECRONICA) LAVADO AL SERPENTÍN DE LA CONDENSADORA, ASPA DEL VENTILADOR, AJUSTE GENERAL DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA ACABADO COLOR GRIS Y CALIBRACION DE CARGA DE REFRIGERANTE R410.	1	$ 550.420,17	$ 104.579,83	$ 655.000,00
6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL DE 5TR O 60.000 BTU 220 VAC. INCLUYE: IIMPIEZA GENERAL CARCAZA, FILTROS DE AIRE, LAVADO CON AGUA A PRESIÓN AL SERPENTÍN EVAPORADORA Y BLOWER, APLICACIÓN DE LIQUIDO DESINCRUSTANTE, MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO DE CONTROL (AJUSTE DE BORNERAS, LIMPIEZA DE TARJETA ELECRONICA) LAVADO AL SERPENTÍN DE LA CONDENSADORA, ASPA DEL VENTILADOR, AJUSTE GENERAL DE	1	$ 630.252,10	$ 119.747,90	$ 750.000,00

	CONTACTOS ELÉCTRICOS, APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA ACABADO COLOR GRIS EN CASO DE REQUERIRLO Y CALIBRACION DE CARGA DE REFRIGERANTE R410.				
7	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASETTE DE 3TR O 36.000 BTU 220 VAC. INCLUYE: IIMPIEZA GENERAL CARCAZA, FILTROS DE AIRE, LAVADO CON AGUA A PRESIÓN AL SERPENTÍN EVAPORADORA Y BLOWER, APLICACIÓN DE LIQUIDO DESINCRUSTANTE, MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO DE CONTROL (AJUSTE DE BORNERAS, LIMPIEZA DE TARJETA ELECRONICA) LAVADO AL SERPENTÍN DE LA CONDENSADORA, ASPA DEL VENTILADOR, AJUSTE GENERAL DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA ACABADO COLOR GRIS Y CALIBRACION DE CARGA DE REFRIGERANTE R410.	1	$ 550.420,17	$ 104.579,83	$ 655.000,00
8	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASETTE DE 5TR O 60.000 BTU 220 VAC. INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL CARCAZAS, FILTROS DE AIRE, LAVADO CON AGUA A PRESIÓN AL SERPENTÍN EVAPORADORA Y BLOWER, APLICACIÓN DE LIQUIDO DESINCRUSTANTE, MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO DE CONTROL (AJUSTE DE BORNERAS, LIMPIEZA DE TARJETA ELECRONICA) LAVADO AL SERPENTÍN DE LA CONDENSADORA, ASPA DEL VENTILADOR, AJUSTE GENERAL DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA ACABADO COLOR GRIS EN CASO DE REQUERIRLO Y CALIBRACION DE CARGA DE REFRIGERANTE R410	1	$ 630.252,10	$ 119.747,90	$ 750.000,00
9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO DE 3TR O 36.000 BTU 220 VAC. INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL CARCAZAS, FILTROS DE AIRE, LAVADO CON AGUA A PRESIÓN AL SERPENTÍN EVAPORADORA Y BLOWER, APLICACIÓN DE LIQUIDO DESINCRUSTANTE, MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO DE CONTROL (AJUSTE DE BORNERAS, LIMPIEZA DE TARJETA ELECRONICA) LAVADO AL SERPENTÍN DE LA CONDENSADORA, ASPA DEL VENTILADOR, AJUSTE GENERAL DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA ACABADO COLOR GRIS EN CASO DE REQUERIRLO Y CALIBRACION DE CARGA DE REFRIGERANTE R410	1	$ 533.613,45	$ 101.386,55	$ 635.000,00
10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO DE 5TR O 60.000 BTU 220 VAC. INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL CARCAZAS, FILTROS DE AIRE, LAVADO CON AGUA A PRESIÓN AL SERPENTÍN EVAPORADORA Y BLOWER, APLICACIÓN DE LIQUIDO DESINCRUSTANTE, MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO DE CONTROL (AJUSTE DE BORNERAS, LIMPIEZA DE TARJETA ELECRONICA) LAVADO AL SERPENTÍN DE LA CONDENSADORA, ASPA DEL VENTILADOR, AJUSTE GENERAL DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA ACABADO COLOR GRIS EN CASO DE REQUERIRLO Y CALIBRACION DE CARGA DE REFRIGERANTE R410	1	$ 630.252,10	$ 119.747,90	$ 750.000,00
11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE CONDENSADO COMPACTO DE 5 TR O 60.000 BTU 220 VAC. INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL CARCAZAS, FILTROS DE AIRE, LAVADO CON AGUA A PRESIÓN AL SERPENTÍN EVAPORADORA Y BLOWER, APLICACIÓN DE LIQUIDO DESINCRUSTANTE, MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO DE CONTROL (AJUSTE DE BORNERAS, LIMPIEZA DE TARJETA ELECRONICA) LAVADO AL SERPENTÍN DE LA CONDENSADORA, ASPA DEL VENTILADOR, AJUSTE GENERAL DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA ACABADO COLOR GRIS EN CASO DE REQUERIRLO Y CALIBRACION DE CARGA DE REFRIGERANTE R410.	1	$ 638.655,46	$ 121.344,54	$ 760.000,00
12	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE CONDENSADO COMPACTO DE 7,5 TR O 90.000 BTU 220 VAC. INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL CARCAZAS, FILTROS DE AIRE, LAVADO CON AGUA A PRESIÓN AL SERPENTÍN EVAPORADORA Y BLOWER, APLICACIÓN DE LIQUIDO DESINCRUSTANTE, MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO DE CONTROL (AJUSTE DE BORNERAS, LIMPIEZA DE TARJETA ELECRONICA) LAVADO AL SERPENTÍN DE LA CONDENSADORA, ASPA DEL VENTILADOR, AJUSTE GENERAL DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA ACABADO COLOR GRIS EN CASO DE REQUERIRLO Y CALIBRACION DE CARGA DE REFRIGERANTE R410.	1	$ 823.529,41	$ 156.470,59	$ 980.000,00
13	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE CONDENSADO COMPACTO DE 10 TR O 120.000 BTU 220 VAC. INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL CARCAZAS, FILTROS DE AIRE, LAVADO CON AGUA A PRESIÓN AL SERPENTÍN EVAPORADORA Y BLOWER, APLICACIÓN DE LIQUIDO DESINCRUSTANTE, MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO DE CONTROL (AJUSTE DE BORNERAS, LIMPIEZA DE TARJETA ELECRONICA) LAVADO AL SERPENTÍN DE LA CONDENSADORA, ASPA DEL VENTILADOR, AJUSTE GENERAL DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA ACABADO COLOR GRIS EN CASO DE REQUERIRLO Y CALIBRACION DE CARGA DE REFRIGERANTE R410	1	$ 882.352,94	$ 167.647,06	$ 1.050.000,00
14	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CON UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE TIPO HOSPITALARIO DE 5 TR O 60.000 BTU 220 VAC. INCLUYE: MANTENIMIENTO UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE, LIMPIEZA GENERAL CARCAZAS, FILTROS DE AIRE, LAVADO CON AGUA A PRESIÓN AL SERPENTÍN EVAPORADORA Y BLOWER, APLICACIÓN DE LIQUIDO DESINCRUSTANTE, MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO DE CONTROL (AJUSTE DE BORNERAS, LIMPIEZA DE TARJETA ELECRONICA) LAVADO AL SERPENTÍN UNIDAD CONDENSADORA, ASPA DEL VENTILADOR, AJUSTE GENERAL DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA ACABADO COLOR GRIS ENCASO DE REQUERIRLO Y CALIBRACION DE CARGA DE REFRIGERANTE R410.	1	$ 638.655,46	$ 121.344,54	$ 760.000,00
15	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CON UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE TIPO HOSPITALARIO DE 7.5 TR O 90.000 BTU 220 VAC. INCLUYE: MANTENIMIENTO UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE, LIMPIEZA GENERAL CARCAZAS, FILTROS DE AIRE, LAVADO CON AGUA A PRESIÓN AL SERPENTÍN EVAPORADORA Y BLOWER, APLICACIÓN DE LIQUIDO DESINCRUSTANTE, MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO DE CONTROL (AJUSTE DE BORNERAS, LIMPIEZA DE TARJETA ELECRONICA) LAVADO AL SERPENTÍN UNIDAD CONDENSADORA, ASPA DEL VENTILADOR, AJUSTE GENERAL DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA ACABADO COLOR GRIS ENCASO DE REQUERIRLO Y CALIBRACION DE CARGA DE REFRIGERANTE R410.	1	$ 823.529,41	$ 156.470,59	$ 980.000,00
16	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CON UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE TIPO HOSPITALARIO DE 10 TR O 120.000 BTU 220 VAC. INCLUYE: MANTENIMIENTO UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE, LIMPIEZA GENERAL CARCAZAS, FILTROS DE AIRE, LAVADO CON AGUA A PRESIÓN AL SERPENTÍN	1	$ 882.352,94	$ 167.647,06	$ 1.050.000,00

	EVAPORADORA Y BLOWER, APLICACIÓN DE LIQUIDO DESINCRUSTANTE, MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO DE CONTROL (AJUSTE DE BORNERAS, LIMPIEZA DE TARJETA ELECRONICA) LAVADO AL SERPENTÍN UNIDAD CONDENSADORA, ASPA DEL VENTILADOR, AJUSTE GENERAL DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA ACABADO COLOR GRIS ENCASO DE REQUERIRLO Y CALIBRACION DE CARGA DE REFRIGERANTE R410.				
17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CON UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE TIPO HOSPITALARIO DE 12,5 TR O 150.000 BTU 220 VAC. INCLUYE: MANTENIMIENTO UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE, LIMPIEZA GENERAL CARCAZAS, FILTROS DE AIRE, LAVADO CON AGUA A PRESIÓN AL SERPENTÍN EVAPORADORA Y BLOWER, APLICACIÓN DE LIQUIDO DESINCRUSTANTE, MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO DE CONTROL (AJUSTE DE BORNERAS, LIMPIEZA DE TARJETA ELECRONICA) LAVADO AL SERPENTÍN UNIDAD CONDENSADORA, ASPA DEL VENTILADOR, AJUSTE GENERAL DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA ACABADO COLOR GRIS ENCASO DE REQUERIRLO Y CALIBRACION DE CARGA DE REFRIGERANTE R410.	1	$ 1.050.420,17	$ 199.579,83	$ 1.250.000,00
18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO EQUIPO CUARTO FRIO DE CONSERVACION 36.000 BTU 3 HP 220VAC. INCLUYE MANTENIMIENTO UNIDAD EVAPORADORA, LAVADO CON AGUA A PRESION AL SERPENTIN DE LA EVAPORADORA, LIMPIEZA AL DRENAJE, SISTEMA DE VENTILACION, MANTENIMIENTO A LA UNIDAD CONDENSADORA, LAVADO SERPENTIN DE LA CONDENSADORA, AJUSTE SISTEMA ELECTRICO, LIMPIEZA TARJETA ELECTRONICA Y CALIBRACION DE CARGA REFRIGERANTE.	1	$ 714.285,71	$ 135.714,29	$ 850.000,00
19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO EQUIPO CUARTO FRIO DE CONSERVACION 60.000 BTU 5 HP 220VAC. INCLUYE MANTENIMIENTO UNIDADA EVAPORADORA, LAVADO CON AGUA A PRESION AL SERPENTIN DE LA EVAPORADORA, LIMPIEZA AL DRENAJE, SISTEMA DE VENTILACION, MANTENIMIENTO A LA UNIDAD CONDENSADORA, LAVADO SERPENTIN DE LA CONDENSADORA, AJUSTE SISTEMA ELECTRICO, LIMPIEZA TARJETA ELECTRONICA Y CALIBRACION DE CARGA REFRIGERANTE.	1	$ 798.319,33	$ 151.680,67	$ 950.000,00
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE REFRIGERACION DEL HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA				
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12.000 BTU 220 VAC CONVENCIONAL. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION UNIDAD COMPRESORA DE 1 HP R410A, RECARGA DE GAS ACUERDO PRESIONES DE TRABAJO Y PUESTA EN SERVICIO DEL EQUIPO.	1	$ 378.151,26	$ 71.848,74	$ 450.000,00
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12.000 BTU A 24.000 BTU 220 VAC CONVENCIONAL. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA ELECTRONICA UNIVERSAL Y PUESTA EN SERVICIO DEL EQUIPO.	1	$ 92.436,97	$ 17.563,03	$ 110.000,00
22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12.000 BTU 220 VAC CONVENCIONAL. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPACITORES DE COMPRESOR , VENTILADOR , CAMBIO DE CABLEADO DE FUERZA Y PUESTA EN SERVICIO DEL EQUIPO.	1	$ 126.050,42	$ 23.949,58	$ 150.000,00
23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12.000 A 24000 BTU 220 VAC CONVENCIONAL. INCLUYE: REPARACION DE FUGA, SUMINISTRO Y RECARGA DE GAS R410 Y PUESTA EN SERVICIO DEL EQUIPO.	1	$ 327.731,09	$ 62.268,91	$ 390.000,00
24	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 18.000 BTU 220 VAC CONVENCIONAL. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION UNIDAD COMPRESORA DE 1.5 HP R410A , RECARGA DE GAS ACUERDO PRESIONES DE TRABAJO Y PUESTA EN SERVICIO DEL EQUIPO.	1	$ 495.798,32	$ 94.201,68	$ 590.000,00
25	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 18.000 BTU 220 VAC CONVENCIONAL. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPACITORES DE COMPRESOR , VENTILADOR , CAMBIO DE CABLEADO DE FUERZA Y PUESTA EN SERVICIO DEL EQUIPO.	1	$ 126.050,42	$ 23.949,58	$ 150.000,00
26	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24.000 BTU 220 VAC CONVENCIONAL. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION UNIDAD COMPRESORA DE 2 HP R410A, RECARGA DE GAS ACUERDO PRESIONES DE TRABAJO Y PUESTA EN SERVICIO DEL EQUIPO.	1	$ 663.865,55	$ 126.134,45	$ 790.000,00
27	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24.000 BTU 220 VAC CONVENCIONAL. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPACITORES DE COMPRESOR , VENTILADOR , CAMBIO DE CABLEADO DE FUERZA Y PUESTA EN SERVICIO DEL EQUIPO.	1	$ 126.050,42	$ 23.949,58	$ 150.000,00
28	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT Y CENTRALES DE 36.000 BTU 220 VAC CONVENCIONAL. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION UNIDAD COMPRESORA DE 3 HP R 410A , RECARGA DE GAS ACUERDO PRESIONES DE TRABAJO Y PUESTA EN SERVICIO DEL EQUIPO.	1	$ 1.260.504,20	$ 239.495,80	$ 1.500.000,00
29	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 36.000 BTU 220 VAC CONVENCIONAL. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPACITORES DE COMPRESOR , VENTILADOR , CAMBIO DE CABLEADO DE FUERZA Y PUESTA EN SERVICIO DEL EQUIPO.	1	$ 203.361,34	$ 38.638,66	$ 242.000,00
30	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRALES DE 36.000 A 60.000 BTU 220 VAC CONVENCIONAL. INCLUYE: REPARACION DE FUGA, SUMINISTRO DE FILTRO SECADOR Y RECARGA DE GAS R410 Y PUESTA EN SERVICIO DEL EQUIPO.	1	$ 663.865,55	$ 126.134,45	$ 790.000,00
31	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL DE 60.000 BTU 220 VAC. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION UNIDAD COMPRESORA DE 5 HP R410 A , RECARGA DE GAS REFRIGERANTE ACUERDO PRESIONES DE TRABAJO Y PUESTA EN SERVICIO DEL EQUIPO.	1	$ 2.226.890,76	$ 423.109,24	$ 2.650.000,00
32	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL DE 60.000 BTU 220 VAC. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL Y PUESTA EN SERVICIO DEL EQUIPO.	1	$ 1.008.403,36	$ 191.596,64	$ 1.200.000,00
33	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE CONDENSADO DE 60.000 BTU 220 VAC. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL Y PUESTA EN SERVICIO DEL EQUIPO.	1	$ 1.092.436,97	$ 207.563,03	$ 1.300.000,00
34	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE CONDENSADO DE 7.5 TONELADAS 220 VAC. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL Y PUESTA EN SERVICIO DEL EQUIPO.	1	$ 1.134.453,78	$ 215.546,22	$ 1.350.000,00
35	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE CONDENSADO DE 10 TONELADAS 220 VAC. INCLUYE: SUMINISTRO E	1	$ 1.184.873,95	$ 225.126,05	$ 1.410.000,00

	INSTALACION DE TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL Y PUESTA EN SERVICIO DEL EQUIPO.				
36	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL DE 60.000 BTU 220 VAC. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPACITORES DE CONDENSADORA Y PUESTA EN SERVICIO DEL EQUIPO.	1	$ 294.117,65	$ 55.882,35	$ 350.000,00
37	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL DE 60.000 BTU 220 VAC. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR ELECTRICO Y BLOWER DE UNIDAD EVAPORADORA Y PUESTA EN SERVICIO DEL EQUIPO.	1	$ 378.151,26	$ 71.848,74	$ 450.000,00
38	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL DE 60.000 BTU 220 VAC. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR ELECTRICO Y ASPA DE UNIDAD CONDENSADORA Y PUESTA EN SERVICIO DEL EQUIPO.	1	$ 411.764,71	$ 78.235,29	$ 490.000,00
39	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL DE 36.000 BTU A 60.000 BTU 220 VAC. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOR DE POTENCIA ACUERDO REFERENCIA Y PUESTA EN SERVICIO DEL EQUIPO.	1	$ 210.084,03	$ 39.915,97	$ 250.000,00
40	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL DE 60.000 BTU 220 VAC CONVENCIONAL. INCLUYE: REPARACION DE FUGA, SUMINISTRO DE FILTRO SECADOR Y RECARGA DE GAS R410 Y PUESTA EN SERVICIO DEL EQUIPO.	1	$ 579.831,93	$ 110.168,07	$ 690.000,00
41	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE CONDENSADO 7.5 TR 220 VAC TRIFASICO. INCLUYE: REPARACION DE FUGA, SUMINISTRO DE FILTRO SECADOR Y RECARGA DE GAS R410 Y PUESTA EN SERVICIO DEL EQUIPO.	1	$ 579.831,93	$ 110.168,07	$ 690.000,00
42	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE CONDENSADO 10 TR 220 VAC TRIFASICO. INCLUYE: REPARACION DE FUGA, SUMINISTRO DE FILTRO SECADOR Y RECARGA DE GAS R410 Y PUESTA EN SERVICIO DEL EQUIPO.	1	$ 579.831,93	$ 110.168,07	$ 690.000,00
43	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE CONDENSADO 12.5 TR 220 VAC TRIFASICO. INCLUYE: REPARACION DE FUGA, SUMINISTRO DE FILTRO SECADOR Y RECARGA DE GAS R410 Y PUESTA EN SERVICIO DEL EQUIPO.	1	$ 579.831,93	$ 110.168,07	$ 690.000,00
44	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO HOSPITALARIO CON UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE 5 TR 220 VAC TRIFASICO. INCLUYE: REPARACION DE FUGA, SUMINISTRO DE FILTRO SECADOR Y RECARGA DE GAS R410 Y PUESTA EN SERVICIO DEL EQUIPO.	1	$ 579.831,93	$ 110.168,07	$ 690.000,00
45	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO HOSPITALARIO CON UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE 7.5 TR 220 VAC TRIFASICO. INCLUYE: REPARACION DE FUGA, SUMINISTRO DE FILTRO SECADOR Y RECARGA DE GAS R410 Y PUESTA EN SERVICIO DEL EQUIPO.	1	$ 579.831,93	$ 110.168,07	$ 690.000,00
46	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO HOSPITALARIO CON UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE 10 TR 220 VAC TRIFASICO. INCLUYE: REPARACION DE FUGA, SUMINISTRO DE FILTRO SECADOR Y RECARGA DE GAS R410 Y PUESTA EN SERVICIO DEL EQUIPO.	1	$ 579.831,93	$ 110.168,07	$ 690.000,00
47	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO HOSPITALARIO CON UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE 12,5 TR 220 VAC TRIFASICO. INCLUYE: REPARACION DE FUGA, SUMINISTRO DE FILTRO SECADOR Y RECARGA DE GAS R410 Y PUESTA EN SERVICIO DEL EQUIPO.	1	$ 579.831,93	$ 110.168,07	$ 690.000,00
48	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE CONDENSADO Y HOSPITALARIO CON UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE DE 7,5 TR 220 VAC TRIFASICO. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE UNIDAD COMPRESORA Y RECARGA DE GAS REFRIGERANTE ACUERDO REFERENCIA DEL EQUIPO Y PUESTA EN SERVICIO DEL EQUIPO.	1	$ 2.478.991,60	$ 471.008,40	$ 2.950.000,00
49	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE CONDENSADO Y HOSPITALARIO CON UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE DE 10 TR 220 VAC TRIFASICO. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE UNIDAD COMPRESORA ACUERDO REFERENCIA DEL EQUIPO Y PUESTA EN SERVICIO DEL EQUIPO.	1	$ 2.899.159,66	$ 550.840,34	$ 3.450.000,00
50	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE CONDENSADO Y HOSPITALARIO CON UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE DE 12,5 TR 220 VAC TRIFASICO. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE UNIDAD COMPRESORA Y RECARGA DE GAS REFRIGERANTE ACUERDO REFERENCIA DEL EQUIPO Y PUESTA EN SERVICIO DEL EQUIPO.	1	$ 3.067.226,89	$ 582.773,11	$ 3.650.000,00
51	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE CONDENSADO Y HOSPITALARIO CON UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE DE 5 TR 220 VAC TRIFASICO. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE MOTOR ELECTRICO Y ASPA DE UNIDAD CONDENSADORA ACUERDO REFERENCIA Y PUESTA EN SERVICIO DEL EQUIPO.	1	$ 663.865,55	$ 126.134,45	$ 790.000,00
52	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE CONDENSADO Y HOSPITALARIO CON UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE DE 7.5 TR 220 VAC TRIFASICO. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE MOTOR ELECTRICO DE UNIDAD CONDENSADORA ACUERDO REFERENCIA Y PUESTA EN SERVICIO DEL EQUIPO.	1	$ 798.319,33	$ 151.680,67	$ 950.000,00
53	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE CONDENSADO Y HOSPITALARIO CON UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE DE 10.0 TR 220 VAC TRIFASICO. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE MOTOR ELECTRICO Y ASPA DE UNIDAD CONDENSADORA ACUERDO REFERENCIA Y PUESTA EN SERVICIO DEL EQUIPO.	1	$ 848.739,50	$ 161.260,50	$ 1.010.000,00
54	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE CONDENSADO Y HOSPITALARIO CON UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE DE 12.5 TR 220 VAC TRIFASICO. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE MOTOR ELECTRICO Y ASPA DE UNIDAD CONDENSADORA ACUERDO REFERENCIA Y PUESTA EN SERVICIO DEL EQUIPO.	1	$ 941.176,47	$ 178.823,53	$ 1.120.000,00
55	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE CONDENSADO Y HOSPITALARIO CON UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE DE 5 TR 220 VAC TRIFASICO. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE MOTOR ELECTRICO Y CORREA DE UNIDAD EVAPORADORA ACUERDO REFERENCIA Y PUESTA EN SERVICIO DEL EQUIPO.	1	$ 714.285,71	$ 135.714,29	$ 850.000,00
56	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE CONDENSADO Y HOSPITALARIO CON UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE DE 7.5 TR 220 VAC TRIFASICO. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE MOTOR ELECTRICO Y	1	$ 747.899,16	$ 142.100,84	$ 890.000,00

	CORREA DE UNIDAD EVAPORADORA ACUERDO REFERENCIA Y PUESTA EN SERVICIO DEL EQUIPO.				
57	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE CONDENSADO Y HOSPITALARIO CON UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE DE 10 TR 220 VAC TRIFASICO. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE MOTOR ELECTRICO Y CORREA DE UNIDAD EVAPORADORA ACUERDO REFERENCIA Y PUESTA EN SERVICIO DEL EQUIPO.	1	$ 747.899,16	$ 142.100,84	$ 890.000,00
58	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE CONDENSADO Y HOSPITALARIO CON UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE DE 12.5 TR 220 VAC TRIFASICO. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE MOTOR ELECTRICO Y CORREA DE UNIDAD EVAPORADORA ACUERDO REFERENCIA Y PUESTA EN SERVICIO DEL EQUIPO.	1	$ 773.109,24	$ 146.890,76	$ 920.000,00
59	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE HOSPITALARIO CON UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE DE 5 TR 220 VAC TRIFASICO. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE FILTROS HEPA AL 85% ACUERDO REFERENCIA Y PUESTA EN SERVICIO DEL EQUIPO.	1	$ 272.268,91	$ 51.731,09	$ 324.000,00
60	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE HOSPITALARIO CON UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE DE 7.5 TR 220 VAC TRIFASICO. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE FILTROS HEPA AL 85% ACUERDO REFERENCIA Y PUESTA EN SERVICIO DEL EQUIPO.	1	$ 284.033,61	$ 53.966,39	$ 338.000,00
61	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE HOSPITALARIO CON UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE DE 10 TR 220 VAC TRIFASICO. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE FILTROS HEPA AL 85% ACUERDO REFERENCIA Y PUESTA EN SERVICIO DEL EQUIPO.	1	$ 300.000,00	$ 57.000,00	$ 357.000,00
62	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE HOSPITALARIO CON UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE DE 12,5 TR 220 VAC TRIFASICO. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE FILTROS HEPA AL 85% ACUERDO REFERENCIA Y PUESTA EN SERVICIO DEL EQUIPO.	1	$ 305.042,02	$ 57.957,98	$ 363.000,00
63	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EQUIPO DE REFRIGERACION TIPO CUARTO FRIO DE 3 TR DE CONSERVACION. INCLUYE: REPARACION DE FUGA, SUMINISTRO FILTRO SECADOR Y RECARGA DE GAS ACUERDO REFERENCIA Y PUESTA EN SERVICIO DEL EQUIPO	1	$ 294.117,65	$ 55.882,35	$ 350.000,00
64	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EQUIPO DE REFRIGERACION TIPO CUARTO FRIO DE 5 TR DE CONGELACION. INCLUYE: REPARACION DE FUGA, SUMINISTRO FILTRO SECADOR Y RECARGA DE GAS ACUERDO REFERENCIA Y PUESTA EN SERVICIO DEL EQUIPO.	1	$ 298.319,33	$ 56.680,67	$ 355.000,00
65	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EQUIPO DE REFRIGERACION TIPO CUARTO FRIO DE CONSERVACION. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD COMPRESORA DE 3 TR R 404, RECARGA DE REFRIGERANTE ACUERDO PRESIONES DE TRABAJO Y PUESTA EN SERVICIO DEL EQUIPO.	1	$ 2.226.890,76	$ 423.109,24	$ 2.650.000,00
66	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EQUIPO DE REFRIGERACION TIPO CUARTO FRIO DE CONSERVACION. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD COMPRESORA DE 5 TR R 404, RECARGA DE REFRIGERANTE ACUERDO PRESIONES DE TRABAJO Y PUESTA EN SERVICIO DEL EQUIPO.	1	$ 2.310.924,37	$ 439.075,63	$ 2.750.000,00
67	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EQUIPO DE REFRIGERACION TIPO CUARTO FRIO DE CONSERVACION DE 3 TR. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION MOTOR ELECTRICO Y ASPA DE UNIDAD CONDENSADORA ACUERDO REFERENCIA Y PUESTA EN SERVICIO DEL EQUIPO.	1	$ 546.218,49	$ 103.781,51	$ 650.000,00
68	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EQUIPO DE REFRIGERACION TIPO CUARTO FRIO DE CONSERVACION DE 5 TR. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION MOTOR ELECTRICO Y ASPA DE UNIDAD CONDENSADORA ACUERDO REFERENCIA Y PUESTA EN SERVICIO DEL EQUIPO.	1	$ 663.865,55	$ 126.134,45	$ 790.000,00
69	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EQUIPO DE REFRIGERACION TIPO CUARTO FRIO DE CONSERVACION DE 3 TR A 7.5 TR INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE PRESOSTATO DUAL. ACUERDO REFERENCIA Y PUESTA EN SERVICIO DEL EQUIPO.	1	$ 714.285,71	$ 135.714,29	$ 850.000,00
70	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EQUIPO DE REFRIGERACION TIPO CUARTO FRIO DE CONSERVACION DE 3 TR. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION MOTOR ELECTRICO PARA UNIDAD EVAPORADORA ACUERDO REFERENCIA Y PUESTA EN SERVICIO DEL EQUIPO.	1	$ 579.831,93	$ 110.168,07	$ 690.000,00
71	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EQUIPO DE REFRIGERACION TIPO CUARTO FRIO DE CONSERVACION DE 5 TR. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION MOTOR ELECTRICO Y ASPA PARA UNIDAD EVAPORADORA ACUERDO REFERENCIA Y PUESTA EN SERVICIO DEL EQUIPO.	1	$ 747.899,16	$ 142.100,84	$ 890.000,00
72	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EQUIPO DE REFRIGERACION TIPO CUARTO FRIO DE CONSERVACION DE 3 TR. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE SEPARADOR DE ACEITE PARA UNIDAD CONDENSADORA ACUERDO REFERENCIA Y PUESTA EN SERVICIO DEL EQUIPO.	1	$ 323.949,58	$ 61.550,42	$ 385.500,00

2.1. OBSERVACIONES

NINGUNA

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	NOVENTA Y DOS MILLONES DE PESOS ($ 92.000.000,00)
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	NOVENTA Y DOS MILLONES DE PESOS ($ 92.000.000,00)

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	$92.000.000,00

3.2. OBSERVACIONES

LA EMPRESA CONTRATISTA REALIZÓ LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE 84 AIRES ACONDICIONADOS DE LOS DISPENSARIOS MEDICOS DE COROZAL Y COVEÑAS ASI:

COROZAL

EQUIPOS DE REFRIGERACIÒN COROZAL								VALOR
ITEM	Activo fijo	Número de inventario	Nº EQUIPO	ORDEN DE MANTENIMIENTO	CANTIDAD	UBICACIÒN	CAPACIDAD	
1	165500000994	8004110000000000000268604	175005349	1130002985	1	CONSULORIO A/P #1	12.000 BTU	$ 322.000,00
2	165500001001	8004110000000000000268606	175005351	1130002987	1	CONSULORIO A/P #2	12.000 BTU	$ 322.000,00
3	165500001002	8004110000000000000268607	175005352	1130002988	1	CUARTO DE MEDICOS	24.000 BTU	$ 395.000,00
4	165500000992	8004110000000000000267987	175005318	1130002989	1	ALMACEN	24.000 BTU	$ 395.000,00
5	165500000993	8004110000000000000267988	175005319	1130002990	1	PSICOLOGIA # 1	12.000 BTU	$ 322.000,00
6	165500001000	8004110000000000000268605	175005350	1130002991	1	PSICOLOGIA # 2	12.000 BTU	$ 322.000,00
7	165500000998	8004110000000000000268594	175005339	1130002992	1	OFICINA T. HUMANO	12.000 BTU	$ 322.000,00
8	165500000990	8004110000000000000268602	175005347	1130002993	1	OFICINA ASISTENCIAL	12.000 BTU	$ 322.000,00
9	165500000991	8004110000000000000268603	175005348	1130002994	1	FISIOTERAPIA	12.000 BTU	$ 322.000,00
10	165500000898	8004110000000000000268611	175005356	1130002995	1	MUESTRAS DE LAB	24.000 BTU	$ 395.000,00
11	165500000899	8004110000000000000268612	175005357	1130002996	1	CONSULTORIO # 4	18.000 BTU	$ 352.000,00
12	165500000900	8004110000000000000267977	175005308	1130002997	1	CONSULTORIO # 5	18.000 BTU	$ 352.000,00
13	165500000901	8004110000000000000267978	175005309	1130002998	1	RECEPCION DE LAB	12.000 BTU	$ 322.000,00
14	165500000902	8004110000000000000267979	175005310	1130002999	1	OF GESTOR MTTO	18.000 BTU	$ 352.000,00
15	165500000903	8004110000000000000267980	175005311	1130003000	1	RAYOS X	24.000 BTU	$ 395.000,00
16	165500000904	8004110000000000000267981	175005312	1130003001	1	CENTRAL DE CITAS	12.000 BTU	$ 322.000,00
17	165500000905	8004110000000000000267991	175005322	1130003002	1	CONSULTORIO #1	18.000 BTU	$ 352.000,00
18	165500000906	8004110000000000000268001	175005332	1130003003	1	CONSULTORIO #7	18.000 BTU	$ 352.000,00
19	165500000907	8004110000000000000268002	175005333	1130003004	1	CONSULTORIO #3	18.000 BTU	$ 352.000,00
20	165500000908	8004110000000000000268003	175005334	1130003005	1	OFICINA RAYOS X	12.000 BTU	$ 322.000,00
21	165500000918	8004110000000000000267982	175005313	1130003006	1	ULTRASONIDO	18.000 BTU	$ 352.000,00
22	165500000919	8004110000000000000267983	175005314	1130003007	1	CON. ROSADO	18.000 BTU	$ 352.000,00
23	165500001003	8004110000000000000268608	175005353	1130003008	1	CONSULTORIO #6	18.000 BTU	$ 352.000,00
24	165500001005	8004110000000000000268610	175005355	1130003009	1	CONSULTORIO #8	12.000 BTU	$ 322.000,00

25	165500000924	8004110000000000000268599	175005344	1130003010	1	OBSERVACION	24.000 BTU	$ 395.000,00
26	165500000925	8004110000000000000268600	175005345	1130003011	1	OBSERVACION	24.000 BTU	$ 395.000,00
27	165500000926	8004110000000000000267985	175005316	1130003012	1	ESTERILIZACION	12.000 BTU	$ 322.000,00
28	165500000997	8004110000000000000268007	175005338	1130003013	1	ODONTOLOGIA	24.000 BTU	$ 395.000,00
29	165500000909	8004110000000000000267992	175005323	1130003014	1	ODONTOLOGIA	24.000 BTU	$ 395.000,00
30	165500000910	8004110000000000000267993	175005324	1130003015	1	ADMINISTRACION	36.000 BTU	$ 485.000,00
31	165500000911	8004110000000000000267994	175005325	1130003016	1	QUIMICA- LAB	24.000 BTU	$ 395.000,00
32	165500000912	8004110000000000000267995	175005326	1130003017	1	CONSULTORIO #2	18.000 BTU	$ 352.000,00
33	165500000913	8004110000000000000267996	175005327	1130003018	1	SALUD OPERACIONAL	12.000 BTU	$ 322.000,00
34	165500000914	8004110000000000000267997	175005328	1130003019	1	ATENCION USUARIOS	24.000 BTU	$ 395.000,00
35	165500000915	8004110000000000000267998	175005329	1130003020	1	DIRECCION	24.000 BTU	$ 395.000,00
36	165500000916	8004110000000000000267999	175005330	1130003021	1	PROCEDIMIENTOS	24.000 BTU	$ 395.000,00
37	165500000917	8004110000000000000268000	175005331	1130003022	1	ARCHIVO LOGISTICO(	24.000 BTU	$ 395.000,00
38	165500000927	8004110000000000000268601	175005346	1130003023	1	REFERENCIA	24.000 BTU	$ 395.000,00
39	165500000928	8004110000000000000267986	175005317	1130003024	1	ARCHIVO RAYOS X	24.000 BTU	$ 395.000,00
40	165500000920	8004110000000000000267984	175005315	1130003025	1	CTO ELECTROCARDIOGRAMA	12.000 BTU	$ 322.000,00
41	165500000921	8004110000000000000268004	175005335	1130003026	1	CTO CONDUCTORES	12.000 BTU	$ 322.000,00
42	165500000922	8004110000000000000268005	175005336	1130003027	1	ATENCION PRIORITARIA	36.000 BTU	$ 485.000,00
43	165500000923	8004110000000000000268006	175005337	1130003028	1	ATENCION PRIORITARIA	36.000 BTU	$ 485.000,00
44	165500001008	8004110000000000000268598	175005343	1130003029	1	OBSERVACION AP	12.000 BTU	$ 322.000,00
45	165500001007	8004110000000000000268597	175005342	1130003030	1	TRIAGE	18.000 BTU	$ 352.000,00
46	165500001004	8004110000000000000268609	175005354	1130003031	1	HEMATOLOGIA	24.000 BTU	$ 395.000,00
47	165500000999	8004110000000000000268595	175005340	1130003032	1	AUDITORIO	24.000 BTU	$ 395.000,00
48	165500001006	8004110000000000000268596	175005341	1130003033	1	HISTORIAS CLINICAS	24.000 BTU	$ 395.000,00
49	165500000995	8004110000000000000267989	175005320	1130003034	1	CTO DE RESIDUOS	12.000 BTU	$ 322.000,00
50	165500000996	8004110000000000000267990	175005321	1130003035	1	BODEGA SALUD PUBLICA	12.000 BTU	$ 322.000,00
51	869000010796	8004110000000000000223743	175004213	1130003036	1	FISIOTERAPIA	36.000 BTU	$ 485.000,00
52	869000010795	8004110000000000000223723	175004212	1130003037	1	FISIOTERAPIA	36.000 BTU	$ 485.000,00
						TOTAL		$ 19.203.000,00

COVEÑAS

EQUIPOS DE A/A COVEÑAS									VALOR	
ITEM	Activo fijo	Número de Inventario	Nº EQUIPO	ORDEN MMTO PREVENTIVO	ORDEN MMTO CORRECTIVO	CAPACIDAD	CANTIDAD	UBICACIÒN		
1	165500001025.	8004110000000000000266815.	175005364	1130003038	210001294	12000 Btu	1	Toma de muestras laboratorio	$ 322.000,00	$ 390.000,00
2	165500001026.	8004110000000000000266816.	175005365	1130003039	210001295	12000 Btu	1	Ventanilla laboratorio	$ 322.000,00	$ 390.000,00
3	165500001027.	8004110000000000000266817.	175005366	1130003040	210001296	12000 Btu	1	Rayos X	$ 322.000,00	$ 390.000,00
4	165500001028.	8004110000000000000266818.	175005367	1130003041		12000 Btu	1	Rayos X	$ 322.000,00	
5	165500001029.	8004110000000000000266819.	175005368	1130003042		12000 Btu	1	Consultorio Nutrición	$ 322.000,00	
6	165500001030.	8004110000000000000266820.	175005369	1130003043		12000 Btu	1	Bodega salud Publica	$ 322.000,00	

7	165500001031.	800411000000000000266821.	175005370	1130003044		12000 Btu	1	Oficina Calidad	$ 322.000,00	
8	165500001032.	800411000000000000266822.	175005371	1130003045		12000 Btu	1	Referencia y contra referencia	$ 322.000,00	
9	165500001033.	800411000000000000266823.	175005372	1130003046		12000 Btu	1	Oficina Administración	$ 322.000,00	
10	165500001034.	800411000000000000266824.	175005373	1130003047		12000 Btu	1	Camarote Imp.	$ 322.000,00	
11	165500001035.	800411000000000000266825.	175005374	1130003048		12000 Btu	1	Consultorio 11	$ 322.000,00	
12	165500001036.	800411000000000000266826.	175005375	1130003049		12000 Btu	1	Archivo farmacia	$ 322.000,00	
13	165500001037.	800411000000000000266827.	175005376	1130003050		12000 Btu	1	Consultorio 4	$ 322.000,00	
14	165500001038.	800411000000000000266828.	175005377	1130003051		12000 Btu	1	Consultorio Psicología 3	$ 322.000,00	
15	165500001039.	800411000000000000266829.	175005378	1130003052		12000 Btu	1	Ayudante JDMCOV	$ 322.000,00	
16	165500001040.	800411000000000000266830.	175005379	1130003053		12000 Btu	1	Consultorio AP	$ 322.000,00	
17	165500001009.	800411000000000000268732.	175005385	1130003054		18000 Btu	1	Procesamiento muestras de laboratorio	$ 352.000,00	
18	165500001010.	800411000000000000268733.	175005386	1130003055		18000 Btu	1	Aislamiento respiratorio	$ 352.000,00	
19	165500001011.	800411000000000000268734.	175005387	1130003056		18000 Btu	1	Insumos Vacunación	$ 352.000,00	
20	165500001012.	800411000000000000268735.	175005388	1130003057		18000 Btu	1	Almacén Insumos Médicos	$ 352.000,00	
21	165500001013.	800411000000000000268736.	175005389	1130003058		18000 Btu	1	Historias Clínicas	$ 352.000,00	
22	165500001014.	800411000000000000268737.	175005390	1130003060		18000 Btu	1	Observación Prolongada Hombres	$ 352.000,00	
23	165500001015.	800411000000000000268738.	175005391	1130003061		18000 Btu	1	Odontología	$ 352.000,00	
24	165500001016.	800411000000000000268739.	175005392	1130003062		18000 Btu	1	Odontología	$ 352.000,00	
25	165500001017.	800411000000000000268740.	175005393	1130003063		18000 Btu	1	Fisioterapia	$ 352.000,00	
26	165500001018.	800411000000000000268741.	175005394	1130003064		18000 Btu	1	Fisioterapia	$ 352.000,00	
27	165500001019.	800411000000000000268742.	175005395	1130003065		18000 Btu	1	Fisioterapia	$ 352.000,00	
28	165500001020.	800411000000000000266833.	175005380	1130003066		18000 Btu	1	Salud Publica	$ 352.000,00	
29	165500001021.	800411000000000000266834.	175005381	1130003067		18000 Btu	1	Sala de espera AP	$ 352.000,00	
30	165500001022.	800411000000000000266835.	175005382	1130003068		18000 Btu	1	Observación Prolongada mujeres	$ 352.000,00	
31	165500001023.	800411000000000000266836.	175005383	1130003069		24000 Btu	1	Observación Prolongada Hombres	$ 395.000,00	
32	165500001024.	800411000000000000266837.	175005384	1130003070		24000 Btu	1	Observación AP	$ 395.000,00	
								TOTAL	$ 10.870.000,00	$ 1.170.000,00
										$ 12.040.000,00

SE REALIZAN MANTENIMIENTOS DE LOS AIRES ACONDICIONADO ACUERDOS ÍTEM ESTABLECIDOS DENTRO DEL CONTRATO, LAS ACTIVIDADES SE REALIZARON DURANTE EL MES DE ABRIL ACUERDO REPORTES DE MANTENIMIENTO ENTREGADOS POR EL TECNICO DE LA EMPRESA UNA VEZ TERMINADA LAS ACTIVIDADES, LA CUAL SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO LOS CUALES SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO BAJO LOS PARAMETROS NORMALES.

3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

NO APLICA

4 RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
ACTUAL	42925	28-01-2025	92.000.000	42825	27/03/2025	92.000.000

4.1. OBSERVACIONES

NINGUNA

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCOLOMBIA	AHORROS	78600001974

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	15 DE NOVIEMBRE 2025
PLAZO DE DURACIÓN	08 MESES
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	N/A
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO	15 DE NOVIEMBRE 2025

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	18-44-101105236
FECHA EXPEDICIÓN:	25/03/2025
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	21/03/2025	15/03/2026	$27,600,000.00
CALIDAD DEL SERVICIO	21/03/2025	15/03/2026	$27,600,000.00
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	21/03/2025	15/11/2028	$4,600,000.00

8. RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS SERVICIOS DE SALUD

8.1 FACTURAS RECIBIDAS POR EL SUPERVISOR

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
21-04-2025	DS-225	21-04-2025	N/A	$ 31.243.000,00
			VALOR TOTAL	$ 31.243.000,00

8.2 FACTURAS ENTREGADAS POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE AUDITORIA (ACRE)

FECHA DE ENTREGA A ÁREA DE AUDITORIA POR EL SUPERVISOR	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
21-04-2025	DS-225	21-04-2025	N/A	$ 31.243.000,00
			VALOR TOTAL	$ 31.243.000,00

8.3 FACTURAS RADICADAS PARA TRAMITE DE PAGO

FECHA DE ENTREGA POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE CONTRATOS	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
21-04-2025	DS-225	21-04-2025	N/A	$ 31.243.000,00
			VALOR TOTAL	$ 31.243.000,00

9. FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO				PAGADO			
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR $	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
N/A	N/A	$ 0,00	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 0,00

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$92.000.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 0.00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 0.00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$92.000.000,00
SALDO POR LIBERAR	$92.000.000,00

OBSERVACIONES

SE REALIZA TRAMITE DE PAGO DE LA FACTURA Nº DS 225 EN EL AREA DE ADMINISTRACIÒN PENDIENTE LA ASIGNACIÒN DEL PRESUPUESTO DEL RECURSO 10 PARA EL PAGO DEL SERVICIO.

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

4. Nº ITEM	5, Nº ITEM CONTRATO	6, DESCRIPCIÓN	9, CANTIDAD	VR. UNITARIO	IVA	10. VALOR PRESENTE INCLUIDO IVA	TOTAL
1	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12.000 BTU 220 VAC CONVENCIONAL. INCLUYE: IIMPIEZA GENERAL CARCAZA, FILTROS DE AIRE, LAVADO CON AGUA A PRESIÓN AL SERPENTÍN EVAPORADORA Y BLOWER, APLICACIÓN DE LIQUIDO DESINCRUSTANTE, MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO DE CONTROL (AJUSTE DE BORNERAS, LIMPIEZA DE TARJETA ELECRONICA) LAVADO AL SERPENTÍN DE LA CONDENSADORA, ASPA DEL VENTILADOR, AJUSTE GENERAL DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA ACABADO COLOR BLANCO EN CASO DE REQUERIRLO Y CALIBRACION DE CARGA DE REFRIGERANTE R410.	34	$ 270.588,24	$ 51.411,76	$ 322.000,00	$ 10.948.000,00

2	2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 18.000 BTU 220 VAC CONVENCIONAL. INCLUYE: IIMPIEZA GENERAL CARCAZA, FILTROS DE AIRE, LAVADO CON AGUA A PRESIÓN AL SERPENTÍN EVAPORADORA Y BLOWER, APLICACIÓN DE LIQUIDO DESINCRUSTANTE, MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO DE CONTROL (AJUSTE DE BORNERAS, LIMPIEZA DE TARJETA ELECRONICA) LAVADO AL SERPENTÍN DE LA CONDENSADORA, ASPA DEL VENTILADOR, AJUSTE GENERAL DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA ACABADO COLOR BLANCO EN CASO DE REQUERIRLO Y CALIBRACION DE CARGA DE REFRIGERANTE R410.	25	$ 295.798,32	$ 56.201,68	$ 352.000,00	$ 8.800.000,00
3	3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24.000 BTU 220 VAC CONVENCIONAL. INCLUYE: IIMPIEZA GENERAL CARCAZA, FILTROS DE AIRE, LAVADO CON AGUA A PRESIÓN AL SERPENTÍN EVAPORADORA Y BLOWER, APLICACIÓN DE LIQUIDO DESINCRUSTANTE, MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO DE CONTROL (AJUSTE DE BORNERAS, LIMPIEZA DE TARJETA ELECRONICA) LAVADO AL SERPENTÍN DE LA CONDENSADORA, ASPA DEL VENTILADOR, AJUSTE GENERAL DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA ACABADO EN CASO DE REQUERIRLO COLOR BLANCO Y CALIBRACION DE CARGA DE REFRIGERANTE R410.	20	$ 331.932,77	$ 63.067,23	$ 395.000,00	$ 7.900.000,00
4	4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 36.000 BTU 220 VAC CONVENCIONAL. INCLUYE: IIMPIEZA GENERAL CARCAZA, FILTROS DE AIRE, LAVADO CON AGUA A PRESIÓN AL SERPENTÍN EVAPORADORA Y BLOWER, APLICACIÓN DE LIQUIDO DESINCRUSTANTE, MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO DE CONTROL (AJUSTE DE BORNERAS, LIMPIEZA DE TARJETA ELECRONICA) LAVADO AL SERPENTÍN DE LA CONDENSADORA, ASPA DEL VENTILADOR, AJUSTE GENERAL DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA ACABADO ENCASO DE REQUERIRLO COLOR BLANCO Y CALIBRACION DE CARGA DE REFRIGERANTE R410.	5	$ 407.563,03	$ 77.436,97	$ 485.000,00	$ 2.425.000,00
5	23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12.000 A 24000 BTU 220 VAC CONVENCIONAL. INCLUYE: REPARACION DE FUGA, SUMINISTRO Y RECARGA DE GAS R410 Y PUESTA EN SERVICIO DEL EQUIPO.	3	$ 327.731,09	$ 62.268,91	$ 390.000,00	$ 1.170.000,00
TOTAL			**87**	**$ 1.633.613,45**	**$ 310.386,55**	**$ 1.944.000,00**	**$ 31.243.000,00**

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

SE REALIZAN MANTENIMIENTOS DE LOS AIRES ACONDICIONADO ACUERDOS ÍTEM ESTABLECIDOS DENTRO DEL CONTRATO, LAS ACTIVIDADES SE REALIZARON DURANTE EL MES DE ABRIL ACUERDO REPORTES DE MANTENIMIENTO ENTREGADOS POR EL TECNICO DE LA EMPRESA UNA VEZ TERMINADA LAS ACTIVIDADES, LA CUAL SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO LOS CUALES SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO BAJO LOS PARAMETROS NORMALES.

12. APORTES PARAFISCALES

SI

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

CUMPLIÒ

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

NINGUNA

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

0.00 %

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

SE HA EJECUTADO UN 33.96 % DE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS ACUERDO CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


SE RECEPCIONA FACTURA Nº DS 225 ACUERDO LOS MANTENIMIENTOS REALIZADOS EN EL PERIODO DE ABRIL EN LOS DISPENSARIOS MEDICOS DE COROZAL Y COVEÑAS.

18. **ANEXOS**


Se anexa planillas parafiscales del mes de abril.
Informe de mantenimiento del mes de abril de la empresa

19. **ÁLBUM FOTOGRÁFICO**


DISPENSARIO MEDICO COROZAL

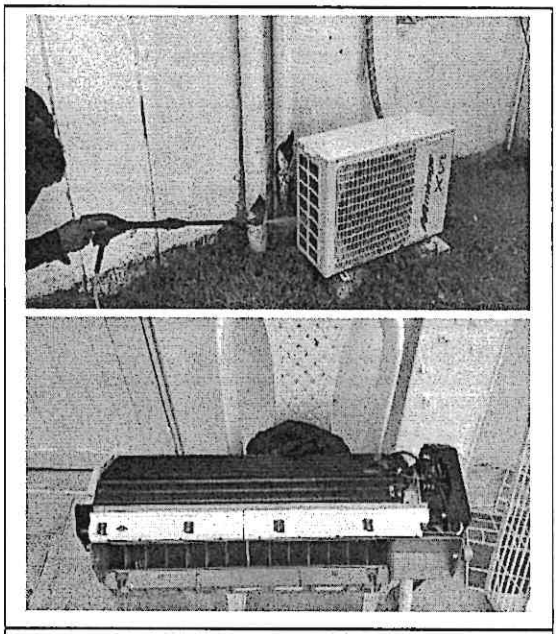


Fotografía No. 1. Aire acondicionado of mtto. 18.000 BTU

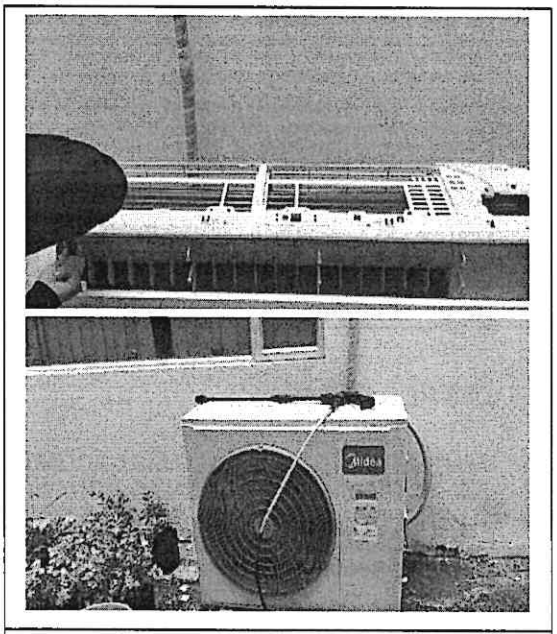


Fotografía No. 2. Aire acondicionado administración. 36.000 BTU

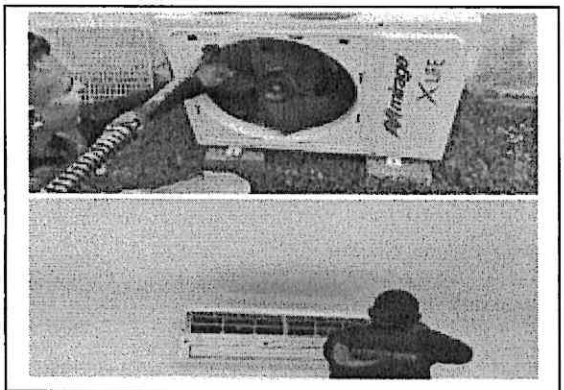


Fotografía No. 3. Aire acondicionado subdirección 24.000 BTU

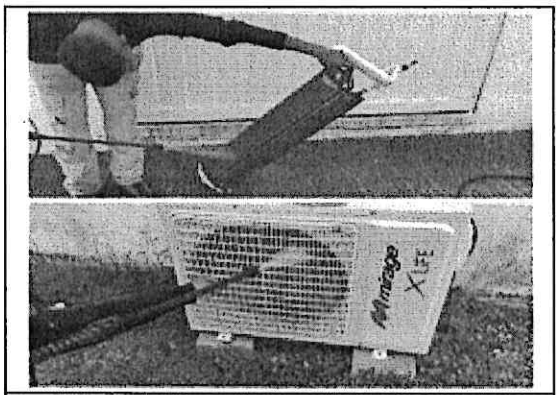


Fotografía No. 4. Aire acondicionado almacén. 24.000 BTU

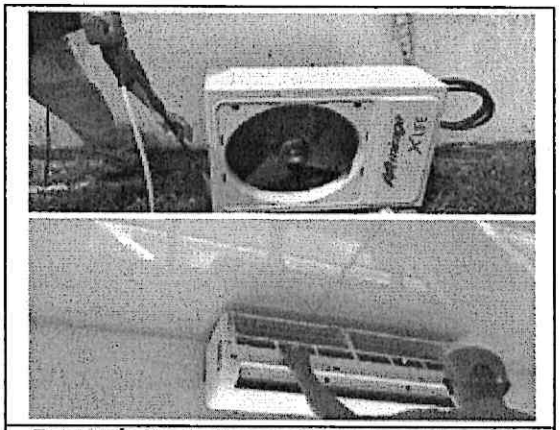


Fotografía No. 5. Aire acondicionado archivo central 1. 24.000 BTU

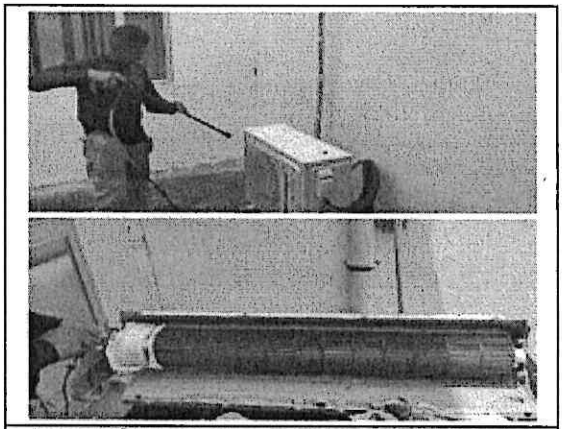


Fotografía No. 6. Aire acondicionado archivo central 2. 24.000 BTU

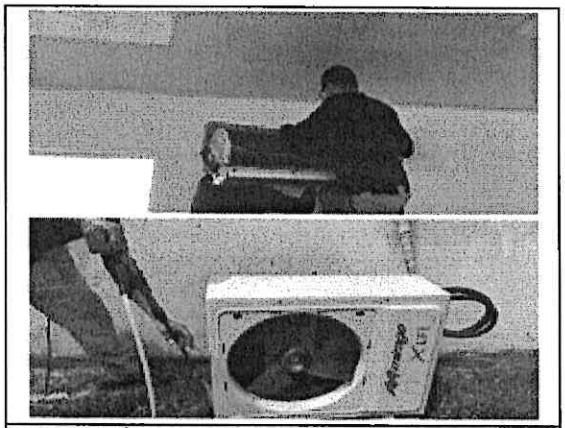


Fotografía No. 7. Aire acondicionado odontología 1. 24.000 BTU

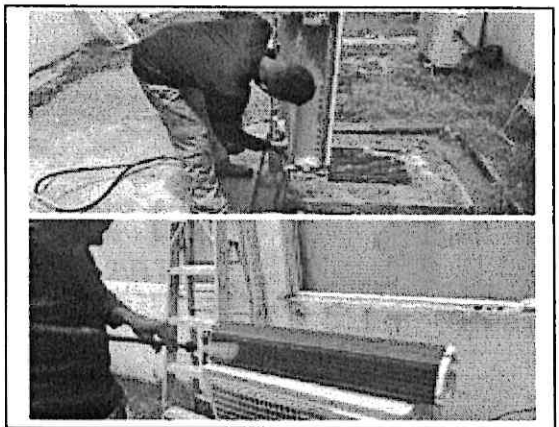


Fotografía No. 8. Aire acondicionado odontología 2. 24.000 BTU

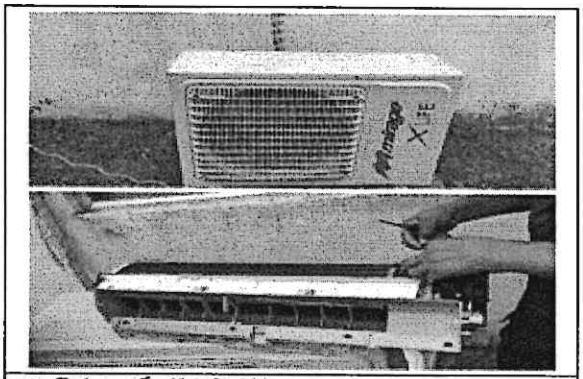


Fotografía No. 9. Aire acondicionado of rayos x. 12.000 BTU

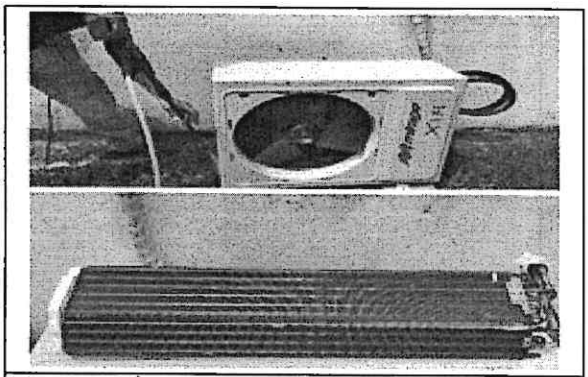


Fotografía No. 10. Aire acondicionado ultrasonido. 18.000 BTU

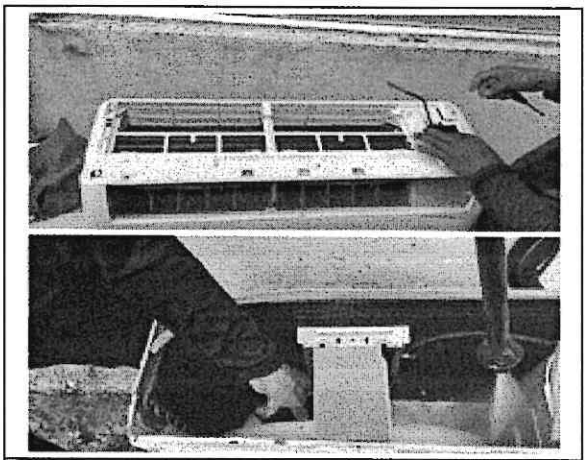

Fotografía No. 11. Aire acondicionado esterilización. 12.000 BTU

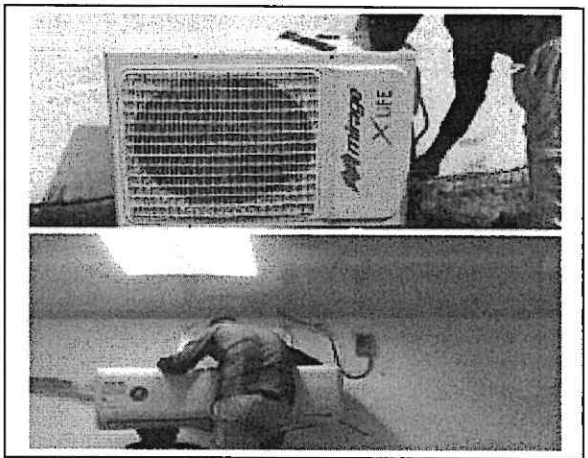


Fotografía No. 12. Aire acondicionado procedimientos 24.000 BTU

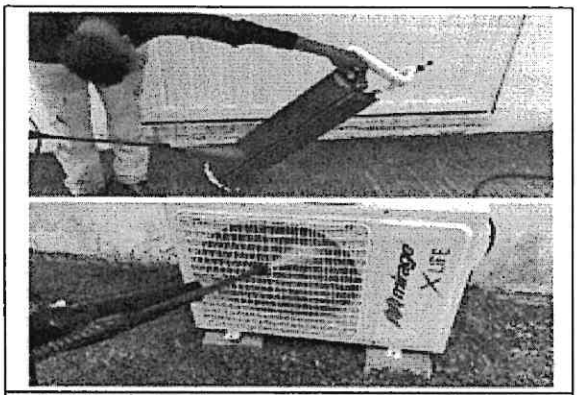

Fotografía No. 13. Aire acondicionado química lab. 24.000 BTU




Fotografía No. 14. Aire acondicionado atención prioritaria 1. 36.000 BTU

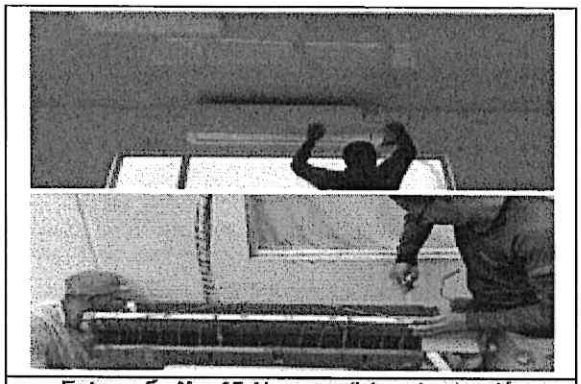


Fotografía No. 15 Aire acondicionado atención prioritaria 1. 36.000 BTU



Fotografía No. 16. Aire acondicionado consultorio 1 18.000 BTU

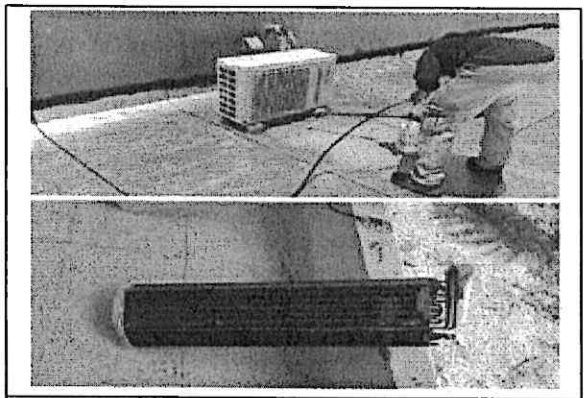

Fotografía No. 17. Aire acondicionado consultorio 2 18.000 BTU

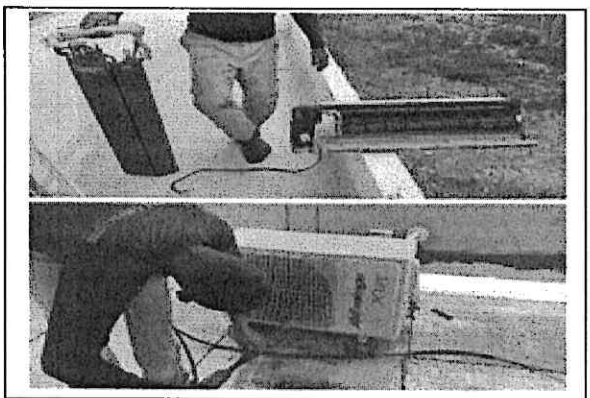

Fotografía No. 18. Aire acondicionado consultorio 3 18.000 BTU



Fotografía No. 19. Aire acondicionado consultorio 4




Fotografía No. 20. Aire acondicionado consultorio 5




Fotografía No. 21. Aire acondicionado psicología 1. 12.000 BTU




Fotografía No. 22. Aire acondicionado psicología 2. 12.000 BTU

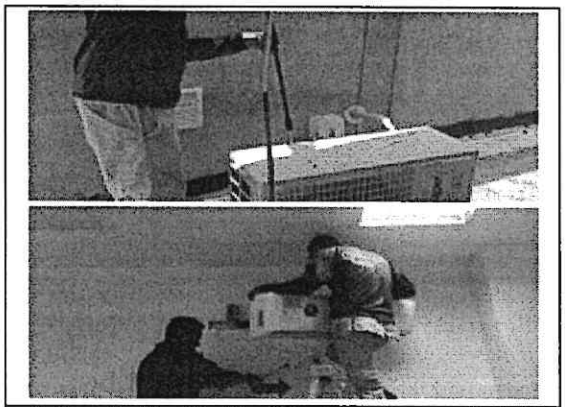


Fotografía No. 23. Aire acondicionado consultorio 6. 18.000 BTU

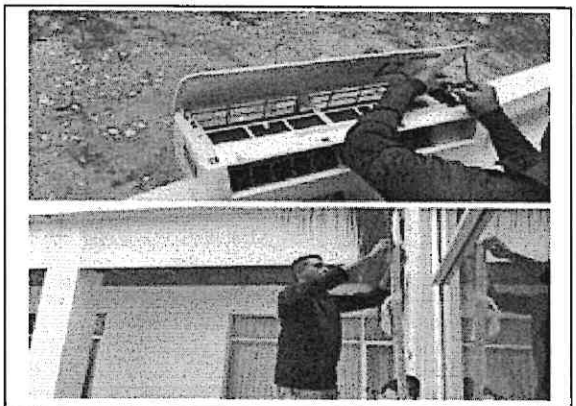


Fotografía No. 24. Aire acondicionado consultorio 7. 18.000 BTU

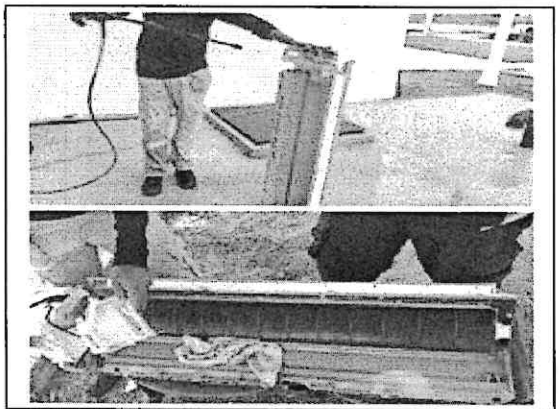


Fotografía No. 26. Aire acondicionado bodega CX. 12.000 BTU

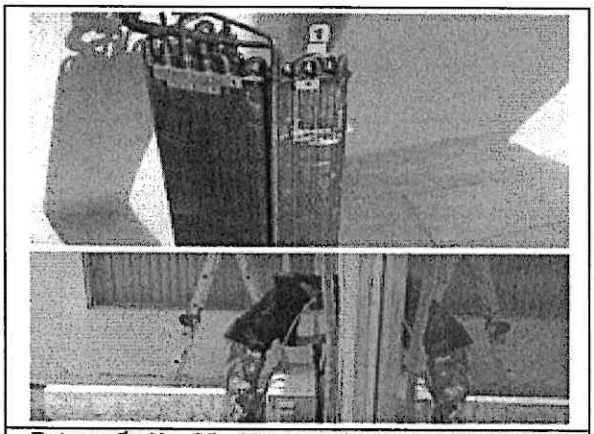


Fotografía No. 25. Aire acondicionado consultorio 8. 12.000 BTU

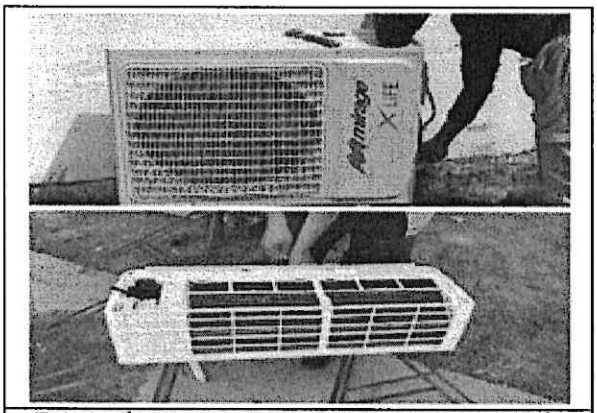


Fotografía No. 28. Aire acondicionado hematología. 24.000 BTU

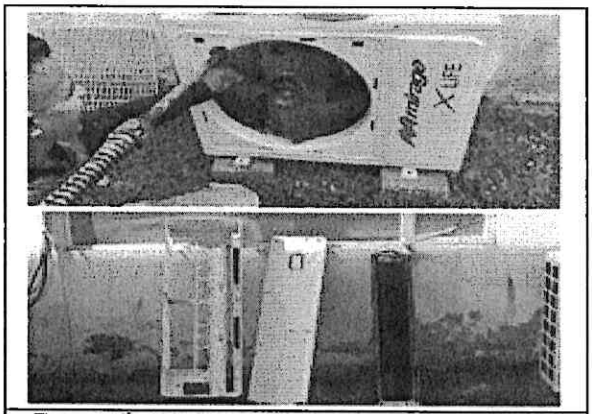


Fotografía No. 27. Aire acondicionado cto residuos. 12.000 BTU

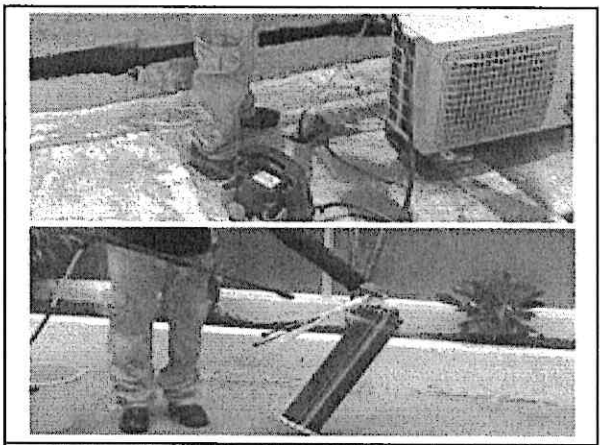

Fotografía No. 30. Aire acondicionado dirección. 24.000 BTU

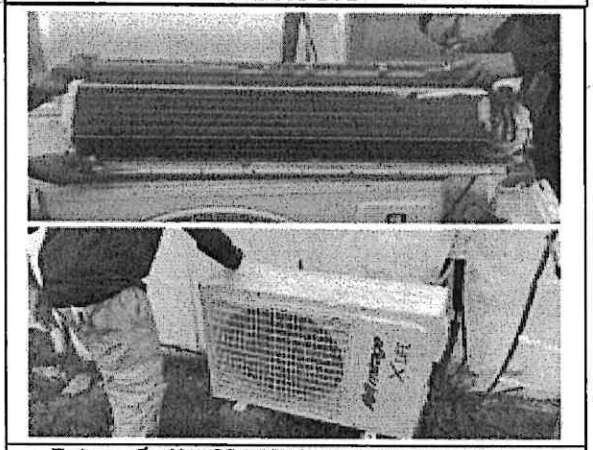


Fotografía No. 29. Aire acondicionado auditorio. 24.000 BTU

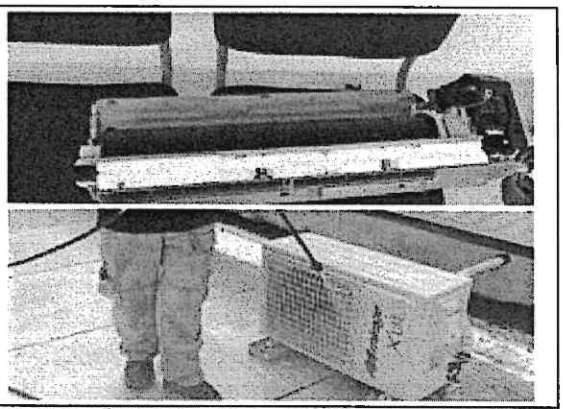


Fotografía No. 31. Aire acondicionado central citas. 12.000 BTU



Fotografía No. 32. Aire acondicionado cto. conductores. 12.000 BTU

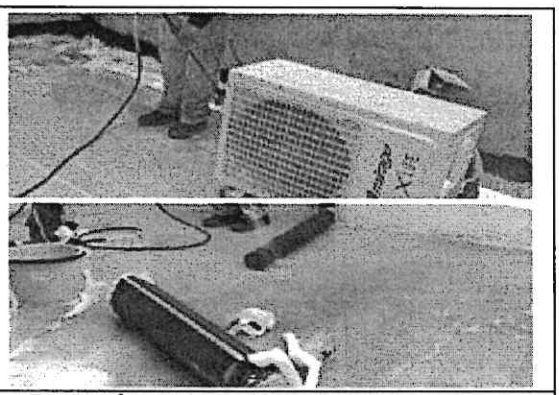


Fotografía No. 33. Aire acondicionado bodega s. generales. 12.000 BTU

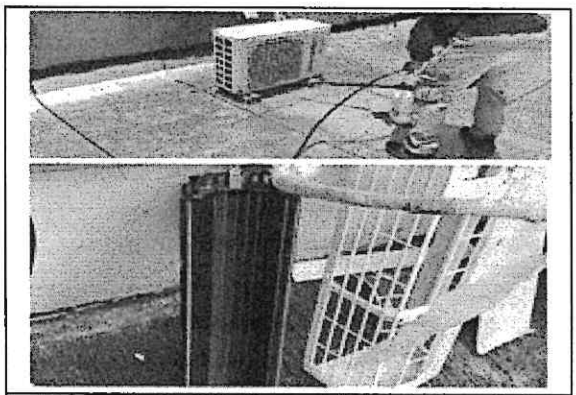


Fotografía No. 34. Aire acondicionado consultorio A/P 1. 12.000 BTU




Fotografía No. 35. Aire acondicionado consultorio A/P 2. 12.000 BTU

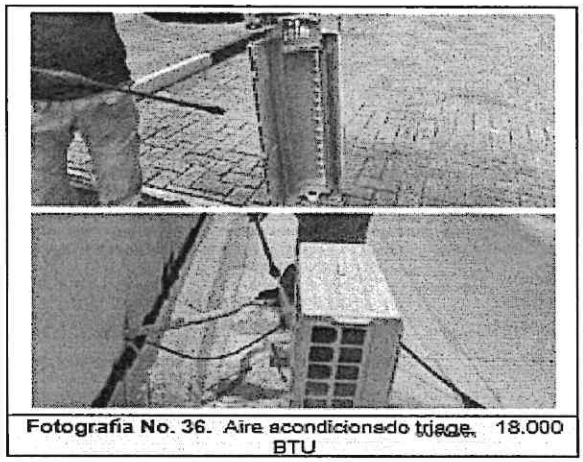


Fotografía No. 36. Aire acondicionado triage. 18.000 BTU

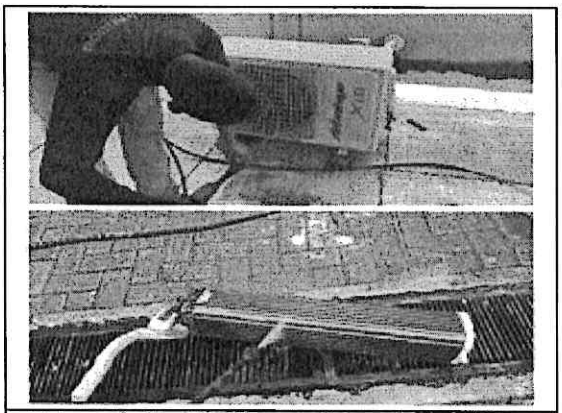


Fotografía No. 37. Aire acondicionado cto médicos. 12.000 BTU

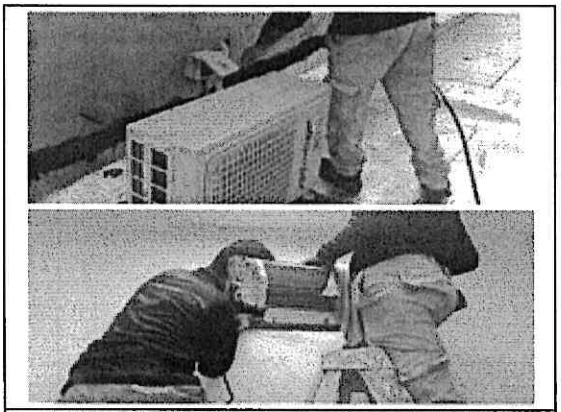


Fotografía No. 38. Aire acondicionado historias clínicas. 24.000 BTU

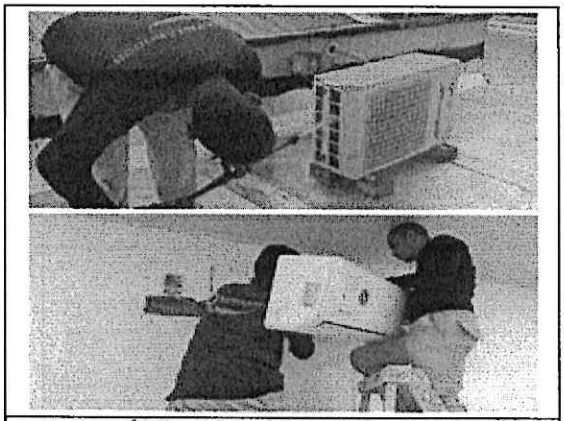


Fotografía No. 39. Aire acondicionado referencia. 24.000 BTU

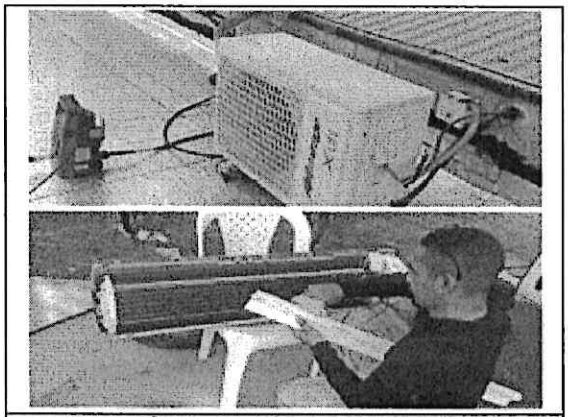


Fotografía No. 40. Aire acondicionado talento humano. 12.000 BTU

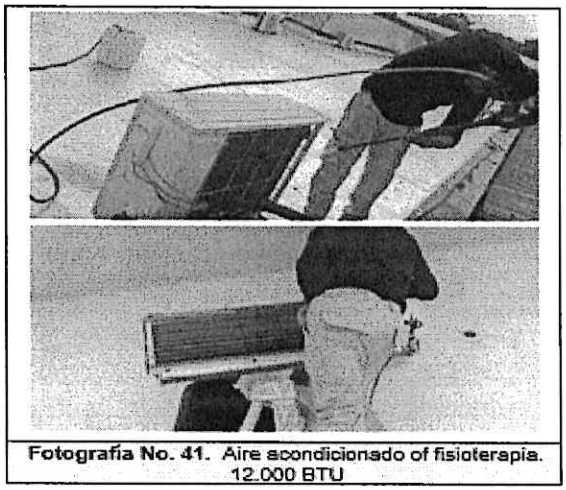


Fotografía No. 41. Aire acondicionado of fisioterapia. 12.000 BTU

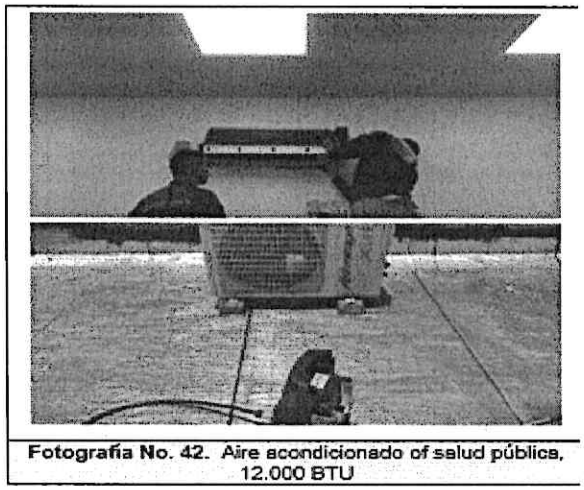


Fotografía No. 42. Aire acondicionado of salud pública, 12.000 BTU

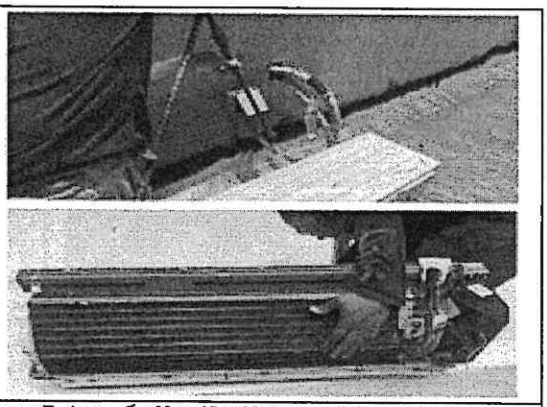


Fotografía No. 43. Aire acondicionado of jefe asistencial. 12.000 BTU

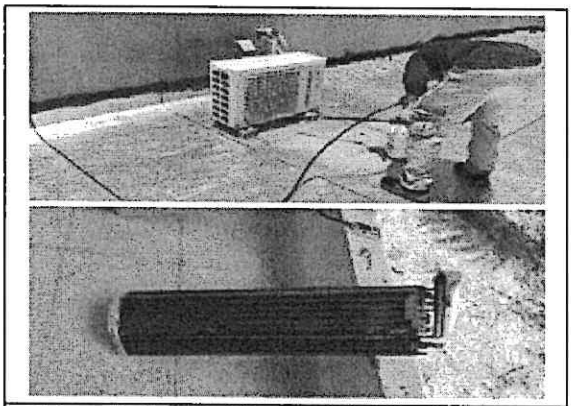


Fotografía No. 44. Aire acondicionado muestras lab. 24.000 BTU

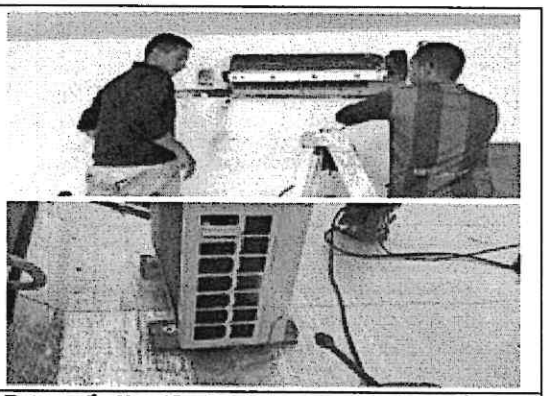

Fotografía No. 45. Aire acondicionado recepción lab. 12.000 BTU

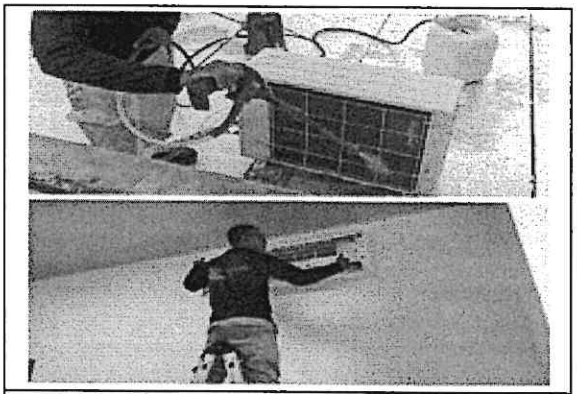

Fotografía No. 46. Aire acondicionado rayos x. 24.000 BTU

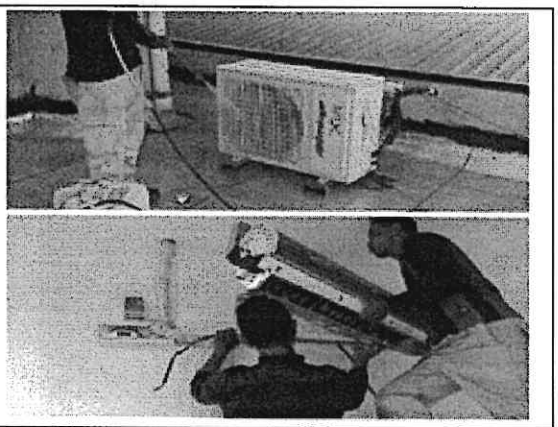

Fotografía No. 47. Aire acondicionado ginecología. 18.000 BTU




Fotografía No. 48. Aire acondicionado Of sope. 12.000 BTU




Fotografía No. 49. Aire acondicionado atención al usuario. 24.000 BTU



Fotografía No. 50. Aire acondicionado archivo pasillo rayos x. 24.000 BTU

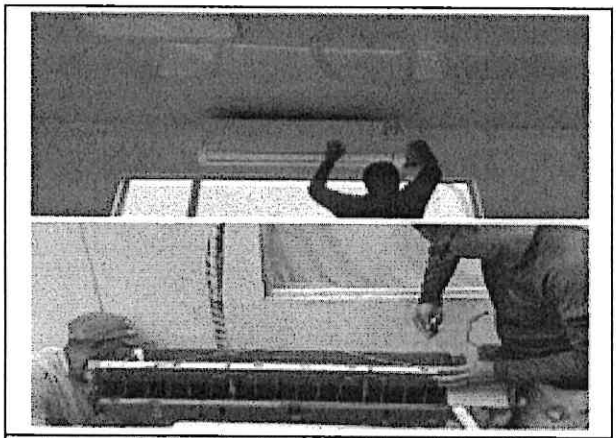


Fotografía No. 51. Aire acondicionado fisioterapia. 36.000 BTU

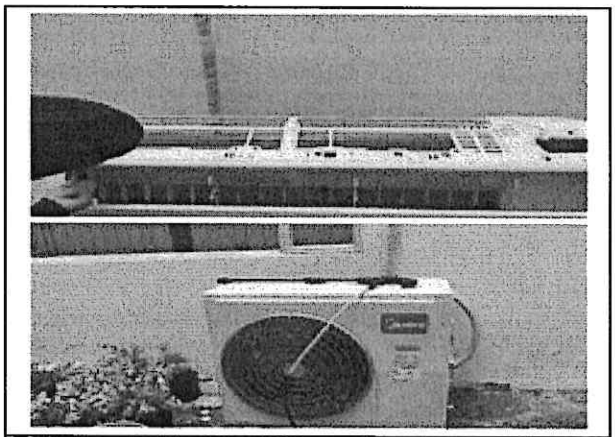


Fotografía No. 52. Aire acondicionado fisioterapia. 36.000 BTU


DISPENSARIO MEDICO COVEÑAS

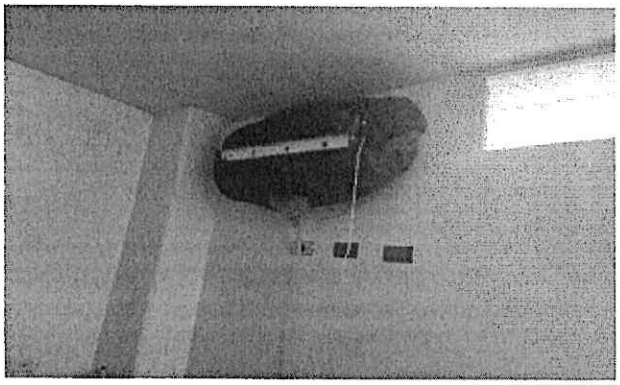




2. Archivo farmacia

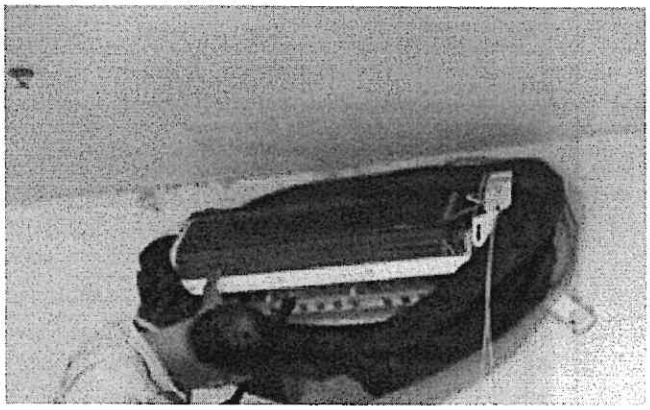

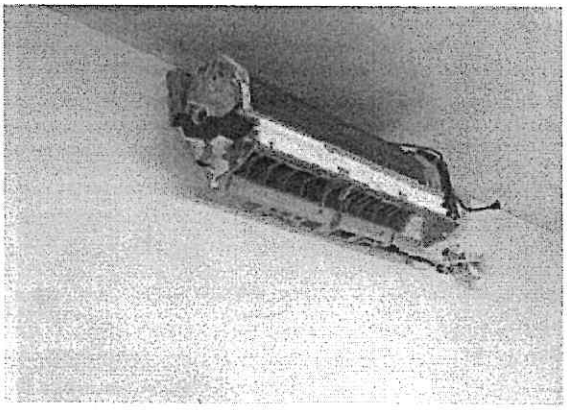

3. Ayudante JDMCOV

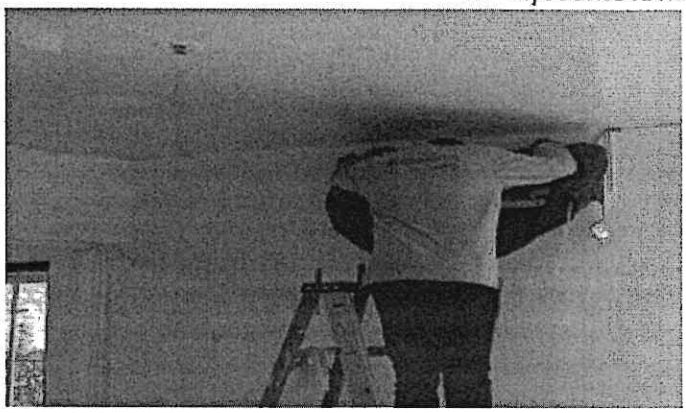



4. Gestión de calidad







5. Administración



6. Sala de espera atención prioritaria

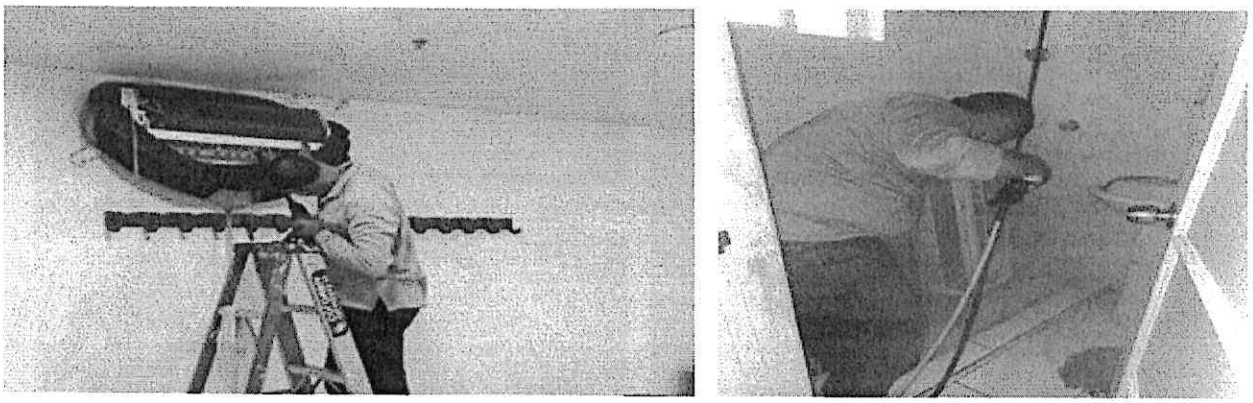

7. Sala de observación atención prioritaria

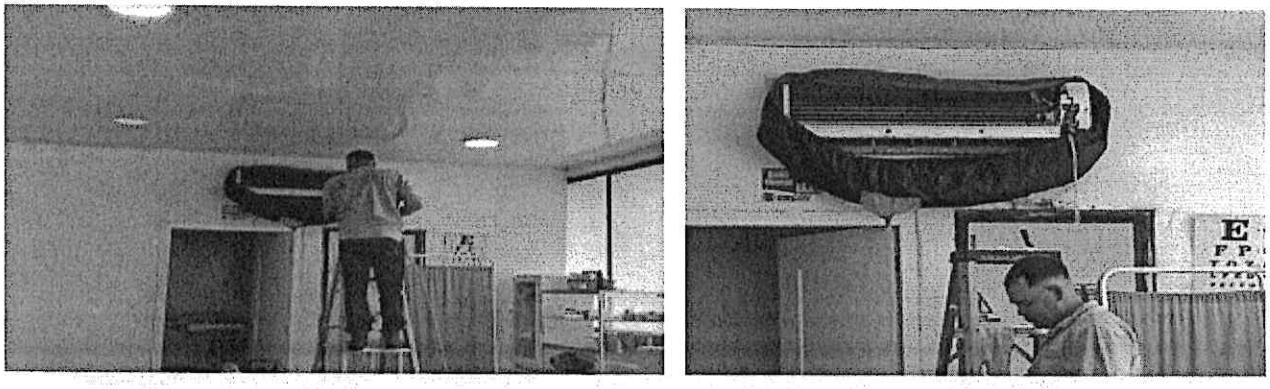

8. Consultorio atención prioritaria





9. Rayos x





10. Laboratorio






11. Consultorio nutrición




12. Bodega salud operacional

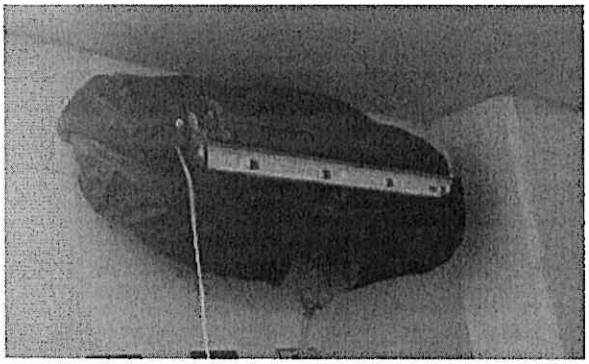13. Referencia y contra referencia




S1 SARMIENTO HERRERA JAIRO EDUARDO
SUPERVISOR CONTRATO N° 315-ARC-DISAN-DHONAC-2025

	ARMADA NACIONAL **DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**	
	GESTION CONTRACTUAL	
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL	
	Versión: 3.0	**Fecha :**25-06-2013

Acta Nª 001 Correspondiente al mes de ABRIL de 2025

DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
Fecha	21 de ABRIL de 2025
Contrato, Orden o convenio Nº	315-ARC-DISAN-DHONAC-2025
Contratista	**DEGAR SOLUTIÒNS S.A.S**
Identificación (Cedula o Nit)	901594034-7
Objeto	CONTRATAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN DEL HOSPITAL NAVAL NIVEL III CARTAGENA Y LA REGIONAL NORTE
Valor Total del Contrato	**NOVENTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($92.000.000,00)** incluido IVA y demás erogaciones que corresponda.
Plazo de Ejecución	El plazo de ejecución del presente contrato será a partir cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato hasta el **15 de noviembre del 2025.**
Forma y Condiciones de Pago	La dirección General de Sanidad Militar - Hospital Naval de Cartagena, se obliga con el Contratista a pagar el valor del contrato en pesos colombianos en PAGOS PARCIALES, una vez recibidos los por parte del supervisor del contrato y realizado el cargue de la factura electrónica en las plataformas SIIF NACIÒN
Número de la factura	**Factura Nº DS 225**
Valor de la Facturas	**$ 31.243.000,00**
Saldo del contrato	$ $ 60.757.000,00 33.96 % EJECUCIÓN
No CDP	CDP No. **42925** de fecha 28/ 01 / 2025 por $ **92.000.000,00**
No RP	CRP No. **42825** de fecha 27/ 03 / 2025 por $ **92.000.000,00**

CARACTERISTICAS DEL BIEN RECIBIDO

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	MARCA	ORDEN PEDIDO Nº	VALOR
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ESM					
Observaciones					

CARACTERISTICAS DE LA OBRA O SERVICIO RECIBIDO

Orden de servicio:

Descripción: Facturas Nº: DS 225

4. N° ITEM	5, N° ITEM CONTRATO	6, DESCRIPCIÓN	9, CANTIDAD	VR. UNITARIO	IVA	10. VALOR PRESENTE INCLUIDO IVA	TOTAL
1	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12.000 BTU 220 VAC CONVENCIONAL. INCLUYE: IIMPIEZA GENERAL CARCAZA, FILTROS DE AIRE, LAVADO CON AGUA A PRESIÓN AL SERPENTÍN EVAPORADORA Y BLOWER, APLICACIÓN DE LIQUIDO DESINCRUSTANTE, MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO DE CONTROL (AJUSTE DE BORNERAS, LIMPIEZA DE TARJETA ELECRONICA) LAVADO AL SERPENTÍN DE LA CONDENSADORA, ASPA DEL VENTILADOR, AJUSTE GENERAL DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA ACABADO COLOR BLANCO EN CASO DE REQUERIRLO Y CALIBRACION DE CARGA DE REFRIGERANTE R410.	34	$ 270.588,24	$ 51.411,76	$ 322.000,00	$ 10.948.000,00

2	2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 18.000 BTU 220 VAC CONVENCIONAL. INCLUYE: IIMPIEZA GENERAL CARCAZA, FILTROS DE AIRE, LAVADO CON AGUA A PRESIÓN AL SERPENTÍN EVAPORADORA Y BLOWER, APLICACIÓN DE LIQUIDO DESINCRUSTANTE, MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO DE CONTROL (AJUSTE DE BORNERAS, LIMPIEZA DE TARJETA ELECRONICA) LAVADO AL SERPENTÍN DE LA CONDENSADORA, ASPA DEL VENTILADOR, AJUSTE GENERAL DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA ACABADO COLOR BLANCO EN CASO DE REQUERIRLO Y CALIBRACION DE CARGA DE REFRIGERANTE R410.	25	$ 295.798,32	$ 56.201,68	$ 352.000,00	$ 8.800.000,00
3	3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24.000 BTU 220 VAC CONVENCIONAL. INCLUYE: IIMPIEZA GENERAL CARCAZA, FILTROS DE AIRE, LAVADO CON AGUA A PRESIÓN AL SERPENTÍN EVAPORADORA Y BLOWER, APLICACIÓN DE LIQUIDO DESINCRUSTANTE, MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO DE CONTROL (AJUSTE DE BORNERAS, LIMPIEZA DE TARJETA ELECRONICA) LAVADO AL SERPENTÍN DE LA CONDENSADORA, ASPA DEL VENTILADOR, AJUSTE GENERAL DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA ACABADO EN CASO DE REQUERIRLO COLOR BLANCO Y CALIBRACION DE CARGA DE REFRIGERANTE R410.	20	$ 331.932,77	$ 63.067,23	$ 395.000,00	$ 7.900.000,00
4	4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 36.000 BTU 220 VAC CONVENCIONAL. INCLUYE: IIMPIEZA GENERAL CARCAZA, FILTROS DE AIRE, LAVADO CON AGUA A PRESIÓN AL SERPENTÍN EVAPORADORA Y BLOWER, APLICACIÓN DE LIQUIDO DESINCRUSTANTE, MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO DE CONTROL (AJUSTE DE BORNERAS, LIMPIEZA DE TARJETA ELECRONICA) LAVADO AL SERPENTÍN DE LA CONDENSADORA, ASPA DEL VENTILADOR, AJUSTE GENERAL DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA ACABADO ENCASO DE REQUERIRLO COLOR BLANCO Y CALIBRACION DE CARGA DE REFRIGERANTE R410.	5	$ 407.563,03	$ 77.436,97	$ 485.000,00	$ 2.425.000,00
5	23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12.000 A 24000 BTU 220 VAC CONVENCIONAL. INCLUYE: REPARACION DE FUGA, SUMINISTRO Y RECARGA DE GAS R410 Y PUESTA EN SERVICIO DEL EQUIPO.	3	$ 327.731,09	$ 62.268,91	$ 390.000,00	$ 1.170.000,00
TOTAL			**87**	**$ 1.633.613,45**	**$ 310.386,55**	**$ 1.944.000,00**	**$ 31.243.000,00**

Observaciones:

1. El suscrito supervisor del CONTRATO No 315-ARC-DISAN-DHONAC-2025, fundamente que el contratista cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato y en el término otorgado para tal fin.
2. Se verificó que el contratista cumpliera con la calidad de los servicios, acuerdo especificaciones técnicas.
3. El contratista cumplió con los pagos parafiscales establecidos dentro del contrato.
4. Se generó factura Nª DS 225 por valor de **$ 31.243.000,00**
5. Se crearon las siguientes órdenes de mantenimiento así:

	ARMADA NACIONAL **DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**
	GESTION CONTRACTUAL
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL
Versión: 3.0	**Fecha :**25-06-2013

MANTENIMIENTOS DE COROZAL

EQUIPOS DE REFRIGERACIÒN COROZAL								VALOR
ITEM	Activo fijo	Número de inventario	Nº EQUIPO	ORDEN DE MANTENIMIENTO	CANTIDAD	UBICACIÒN	CAPACIDAD	
1	165500000994	8004110000000000000268604	175005349	1130002985	1	CONSULORIO A/P #1	12.000 BTU	$ 322.000,00
2	165500001001	8004110000000000000268606	175005351	1130002987	1	CONSULORIO A/P #2	12.000 BTU	$ 322.000,00
3	165500001002	8004110000000000000268607	175005352	1130002988	1	CUARTO DE MEDICOS	24.000 BTU	$ 395.000,00
4	165500000992	8004110000000000000267987	175005318	1130002989	1	ALMACEN	24.000 BTU	$ 395.000,00
5	165500000993	8004110000000000000267988	175005319	1130002990	1	PSICOLOGIA # 1	12.000 BTU	$ 322.000,00
6	165500001000	8004110000000000000268605	175005350	1130002991	1	PSICOLOGIA # 2	12.000 BTU	$ 322.000,00
7	165500000998	8004110000000000000268594	175005339	1130002992	1	OFICINA T. HUMANO	12.000 BTU	$ 322.000,00
8	165500000990	8004110000000000000268602	175005347	1130002993	1	OFICINA ASISTENCIAL	12.000 BTU	$ 322.000,00
9	165500000991	8004110000000000000268603	175005348	1130002994	1	FISIOTERAPIA	12.000 BTU	$ 322.000,00
10	165500000898	8004110000000000000268611	175005356	1130002995	1	MUESTRAS DE LAB	24.000 BTU	$ 395.000,00
11	165500000899	8004110000000000000268612	175005357	1130002996	1	CONSULTORIO # 4	18.000 BTU	$ 352.000,00
12	165500000900	8004110000000000000267977	175005308	1130002997	1	CONSULTORIO # 5	18.000 BTU	$ 352.000,00
13	165500000901	8004110000000000000267978	175005309	1130002998	1	RECEPCION DE LAB	12.000 BTU	$ 322.000,00
14	165500000902	8004110000000000000267979	175005310	1130002999	1	OF GESTOR MTTO	18.000 BTU	$ 352.000,00
15	165500000903	8004110000000000000267980	175005311	1130003000	1	RAYOS X	24.000 BTU	$ 395.000,00
16	165500000904	8004110000000000000267981	175005312	1130003001	1	CENTRAL DE CITAS	12.000 BTU	$ 322.000,00
17	165500000905	8004110000000000000267991	175005322	1130003002	1	CONSULTORIO #1	18.000 BTU	$ 352.000,00
18	165500000906	8004110000000000000268001	175005332	1130003003	1	CONSULTORIO #7	18.000 BTU	$ 352.000,00
19	165500000907	8004110000000000000268002	175005333	1130003004	1	CONSULTORIO #3	18.000 BTU	$ 352.000,00
20	165500000908	8004110000000000000268003	175005334	1130003005	1	OFICINA RAYOS X	12.000 BTU	$ 322.000,00
21	165500000918	8004110000000000000267982	175005313	1130003006	1	ULTRASONIDO	18.000 BTU	$ 352.000,00
22	165500000919	8004110000000000000267983	175005314	1130003007	1	CON. ROSADO	18.000 BTU	$ 352.000,00
23	165500001003	8004110000000000000268608	175005353	1130003008	1	CONSULTORIO #6	18.000 BTU	$ 352.000,00
24	165500001005	8004110000000000000268610	175005355	1130003009	1	CONSULTORIO #8	12.000 BTU	$ 322.000,00
25	165500000924	8004110000000000000268599	175005344	1130003010	1	OBSERVACION	24.000 BTU	$ 395.000,00
26	165500000925	8004110000000000000268600	175005345	1130003011	1	OBSERVACION	24.000 BTU	$ 395.000,00
27	165500000926	8004110000000000000267985	175005316	1130003012	1	ESTERILIZACION	12.000 BTU	$ 322.000,00
28	165500000997	8004110000000000000268007	175005338	1130003013	1	ODONTOLOGIA	24.000 BTU	$ 395.000,00
29	165500000909	8004110000000000000267992	175005323	1130003014	1	ODONTOLOGIA	24.000 BTU	$ 395.000,00
30	165500000910	8004110000000000000267993	175005324	1130003015	1	ADMINISTRACION	36.000 BTU	$ 485.000,00
31	165500000911	8004110000000000000267994	175005325	1130003016	1	QUIMICA- LAB	24.000 BTU	$ 395.000,00
32	165500000912	8004110000000000000267995	175005326	1130003017	1	CONSULTORIO #2	18.000 BTU	$ 352.000,00
33	165500000913	8004110000000000000267996	175005327	1130003018	1	SALUD OPERACIONAL	12.000 BTU	$ 322.000,00

	ARMADA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
	GESTION CONTRACTUAL	
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL	
	Versión: 3.0	Fecha :25-06-2013

34	165500000914	8004110000000000000267997	175005328	1130003019	1	ATENCION USUARIOS	24.000 BTU	$ 395.000,00
35	165500000915	8004110000000000000267998	175005329	1130003020	1	DIRECCION	24.000 BTU	$ 395.000,00
36	165500000916	8004110000000000000267999	175005330	1130003021	1	PROCEDIMIENTOS	24.000 BTU	$ 395.000,00
37	165500000917	8004110000000000000268000	175005331	1130003022	1	ARCHIVO LOGISTICO(	24.000 BTU	$ 395.000,00
38	165500000927	8004110000000000000268601	175005346	1130003023	1	REFERENCIA	24.000 BTU	$ 395.000,00
39	165500000928	8004110000000000000267986	175005317	1130003024	1	ARCHIVO RAYOS X	24.000 BTU	$ 395.000,00
40	165500000920	8004110000000000000267984	175005315	1130003025	1	CTO ELECTROCARDIOGRAMA	12.000 BTU	$ 322.000,00
41	165500000921	8004110000000000000268004	175005335	1130003026	1	CTO CONDUCTORES	12.000 BTU	$ 322.000,00
42	165500000922	8004110000000000000268005	175005336	1130003027	1	ATENCION PRIORITARIA	36.000 BTU	$ 485.000,00
43	165500000923	8004110000000000000268006	175005337	1130003028	1	ATENCION PRIORITARIA	36.000 BTU	$ 485.000,00
44	165500001008	8004110000000000000268598	175005343	1130003029	1	OBSERVACION AP	12.000 BTU	$ 322.000,00
45	165500001007	8004110000000000000268597	175005342	1130003030	1	TRIAGE	18.000 BTU	$ 352.000,00
46	165500001004	8004110000000000000268609	175005354	1130003031	1	HEMATOLOGIA	24.000 BTU	$ 395.000,00
47	165500000999	8004110000000000000268595	175005340	1130003032	1	AUDITORIO	24.000 BTU	$ 395.000,00
48	165500001006	8004110000000000000268596	175005341	1130003033	1	HISTORIAS CLINICAS	24.000 BTU	$ 395.000,00
49	165500000995	8004110000000000000267989	175005320	1130003034	1	CTO DE RESIDUOS	12.000 BTU	$ 322.000,00
50	165500000996	8004110000000000000267990	175005321	1130003035	1	BODEGA SALUD PUBLICA	12.000 BTU	$ 322.000,00
51	869000010796	8004110000000000000223743	175004213	1130003036	1	FISIOTERAPIA	36.000 BTU	$ 485.000,00
52	869000010795	8004110000000000000223723	175004212	1130003037	1	FISIOTERAPIA	36.000 BTU	$ 485.000,00
						TOTAL		$ 19.203.000,00

MANTENIMIENTOS DE COVEÑAS

EQUIPOS DE A/A COVEÑAS									VALOR	
ITEM	Activo fijo	Número de inventario	Nº EQUIPO	ORDEN MMTO PREVENTIVO	ORDEN MMTO CORRECTIVO	CAPACIDAD	CANTIDAD	UBICACIÒN		
1	165500001025.	8004110000000000000266815.	175005364	1130003038	210001294	12000 Btu	1	Toma de muestras laboratorio	$ 322.000,00	$ 390.000,00
2	165500001026.	8004110000000000000266816.	175005365	1130003039	210001295	12000 Btu	1	Ventanilla laboratorio	$ 322.000,00	$ 390.000,00
3	165500001027.	8004110000000000000266817.	175005366	1130003040	210001296	12000 Btu	1	Rayos X	$ 322.000,00	$ 390.000,00
4	165500001028.	8004110000000000000266818.	175005367	1130003041		12000 Btu	1	Rayos X	$ 322.000,00	
5	165500001029.	8004110000000000000266819.	175005368	1130003042		12000 Btu	1	Consultorio Nutrición	$ 322.000,00	
6	165500001030.	8004110000000000000266820.	175005369	1130003043		12000 Btu	1	Bodega salud Publica	$ 322.000,00	
7	165500001031.	8004110000000000000266821.	175005370	1130003044		12000 Btu	1	Oficina Calidad	$ 322.000,00	
8	165500001032.	8004110000000000000266822.	175005371	1130003045		12000 Btu	1	Referencia y contra referencia	$ 322.000,00	
9	165500001033.	8004110000000000000266823.	175005372	1130003046		12000 Btu	1	Oficina Administración	$ 322.000,00	
10	165500001034.	8004110000000000000266824.	175005373	1130003047		12000 Btu	1	Camarote Imp.	$ 322.000,00	
11	165500001035.	8004110000000000000266825.	175005374	1130003048		12000 Btu	1	Consultorio 11	$ 322.000,00	

	ARMADA NACIONAL **DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**	
	GESTION CONTRACTUAL	
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL	
	Versión: 3.0	**Fecha :**25-06-2013

12	165500001036.	8004110000000000000266826.	175005375	1130003049		12000 Btu	1	Archivo farmacia	$ 322.000,00	
13	165500001037.	8004110000000000000266827.	175005376	1130003050		12000 Btu	1	Consultorio 4	$ 322.000,00	
14	165500001038.	8004110000000000000266828.	175005377	1130003051		12000 Btu	1	Consultorio Psicología 3	$ 322.000,00	
15	165500001039.	8004110000000000000266829.	175005378	1130003052		12000 Btu	1	Ayudante JDMCOV	$ 322.000,00	
16	165500001040.	8004110000000000000266830.	175005379	1130003053		12000 Btu	1	Consultorio AP	$ 322.000,00	
17	165500001009.	8004110000000000000268732.	175005385	1130003054		18000 Btu	1	Procesamiento muestras de laboratorio	$ 352.000,00	
18	165500001010.	8004110000000000000268733.	175005386	1130003055		18000 Btu	1	Aislamiento respiratorio	$ 352.000,00	
19	165500001011.	8004110000000000000268734.	175005387	1130003056		18000 Btu	1	Insumos Vacunación	$ 352.000,00	
20	165500001012.	8004110000000000000268735.	175005388	1130003057		18000 Btu	1	Almacén Insumos Médicos	$ 352.000,00	
21	165500001013.	8004110000000000000268736.	175005389	1130003058		18000 Btu	1	Historias Clínicas	$ 352.000,00	
22	165500001014.	8004110000000000000268737.	175005390	1130003060		18000 Btu	1	Observación Prolongada Hombres	$ 352.000,00	
23	165500001015.	8004110000000000000268738.	175005391	1130003061		18000 Btu	1	Odontología	$ 352.000,00	
24	165500001016.	8004110000000000000268739.	175005392	1130003062		18000 Btu	1	Odontología	$ 352.000,00	
25	165500001017.	8004110000000000000268740.	175005393	1130003063		18000 Btu	1	Fisioterapia	$ 352.000,00	
26	165500001018.	8004110000000000000268741.	175005394	1130003064		18000 Btu	1	Fisioterapia	$ 352.000,00	
27	165500001019.	8004110000000000000268742.	175005395	1130003065		18000 Btu	1	Fisioterapia	$ 352.000,00	
28	165500001020.	8004110000000000000266833.	175005380	1130003066		18000 Btu	1	Salud Publica	$ 352.000,00	
29	165500001021.	8004110000000000000266834.	175005381	1130003067		18000 Btu	1	Sala de espera AP	$ 352.000,00	
30	165500001022.	8004110000000000000266835.	175005382	1130003068		18000 Btu	1	Observación Prolongada mujeres	$ 352.000,00	
31	165500001023.	8004110000000000000266836.	175005383	1130003069		24000 Btu	1	Observación Prolongada Hombres	$ 395.000,00	
32	165500001024.	8004110000000000000266837.	175005384	1130003070		24000 Btu	1	Observación AP	$ 395.000,00	
								TOTAL	$ 10.870.000,00	$ 1.170.000,00
										$ 12.040.000,00

Atentamente,

S1MPR SARMIENTO HERRERA JAIRO EDUARDO
SUPERVISOR CONTRATO N° 315-ARC-DISAN-DHONAC-2025
Jairo.sarmiento@armada.mil.co
