

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA			
Fecha de presentación del informe:	ABRIL de 2025	Numero de contrato:	**CD-12-2025-1089**
Datos del Contratista (nombres y apellidos- número de identificación)	**JUAN CARLOS RAPALINO VALLE** **CC. No. 72.181.627**		
Periodo del informe:	Informe correspondiente mes de abril de 2025	Informe número:	03
Objeto del contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIAS A LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y A LOS PROGRAMAS DERIVADOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.		
Valor del contrato	**SON: TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/L ($37.200.000)**		
Supervisor	RAFAEL LAFONT DE SALES C.C.: 8.662.605		
Cargo	SECRETARIO DE DESPACHO SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS		

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

Se realiza revisión de planos digitalizados, de acuerdo a las visitas realizadas en diferentes puntos de la ciudad (localidad suroriente), a las vías mal estado para ser incluidas en el programa de recuperación de la Malla vial y Barrios a la Obra de la Secretaria Distrital de Obras Públicas. Los planos revisados son:

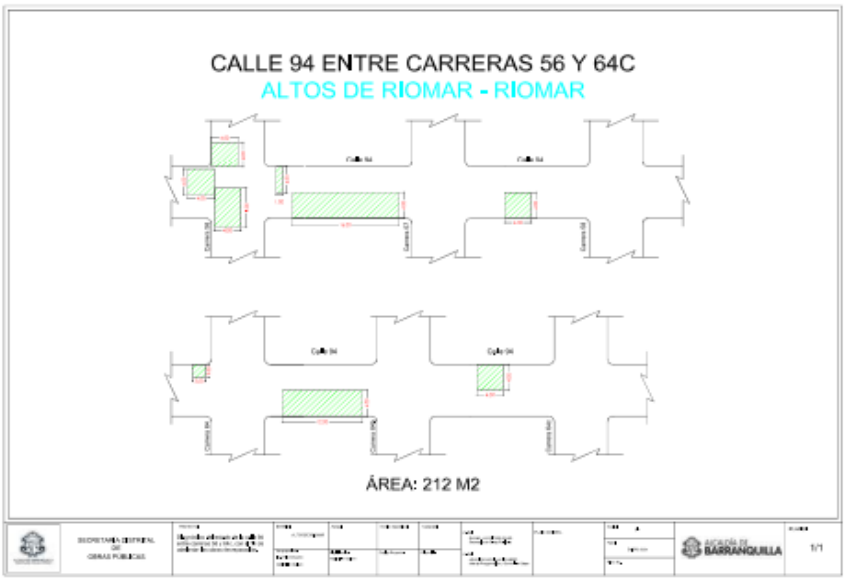

CALLE 96 ENTRE CARRERAS 54 Y 69B
ALTOS DE RIOMAR - RIOMAR

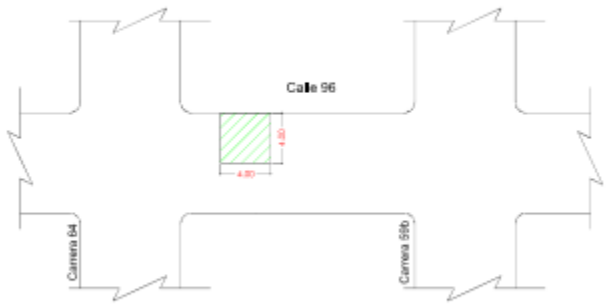


ÁREA: 16 M2

SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

1/1

CALLE 96 ENTRE CARRERAS 58 Y 59
ALTOS DE RIOMAR - RIOMAR

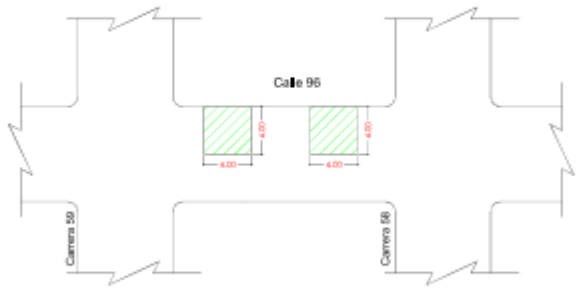


ÁREA: 32 M2

SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA


1/1

CALLE 90 ENTRE CARRERAS 59 Y 59B
ALTOS DE RIOMAR - RIOMAR

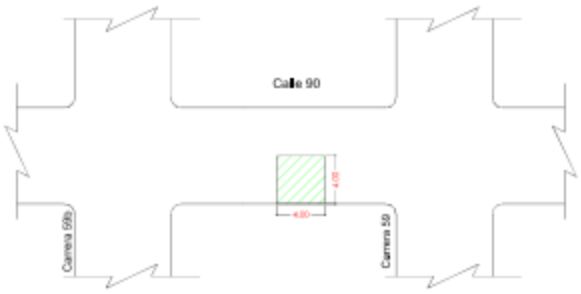

ÁREA: 16 M2


CARRERA 65 ENTRE CALLES 96 Y 96A
ALTOS DE RIOMAR - RIOMAR

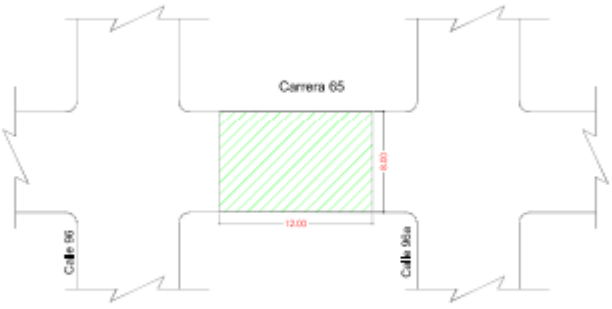

ÁREA: 96 M2

CALLE 73B ENTRE CARRERAS 41C Y 39


BETANIA - NORTE CENTRO HISTÓRICO



ÁREA: 256 M2

CARRERA 59B CON CALLE 96


ALTOS DE RIOMAR - RIOMAR

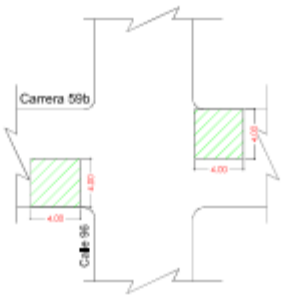

ÁREA: 32 M2

CALLE 73 ENTRE CARRERAS 39 Y 43

BETANIA - NORTE CENTRO HISTÓRICO



ÁREA: 32 M2


SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

1/1

CARRERA 38C CON CALLE 76

BETANIA - NORTE CENTRO HISTÓRICO

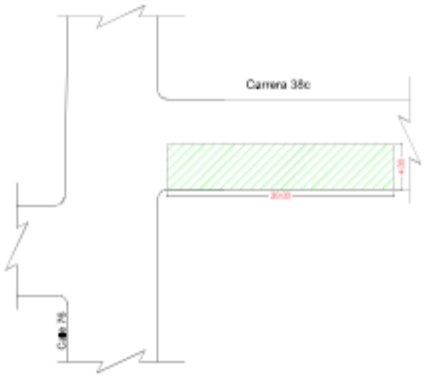

ÁREA: 80 M2


SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

1/1

CARRERA 41 ENTRE CALLES 74 Y 72


BETANIA - NORTE CENTRO HISTÓRICO



ÁREA: 255 M2

CARRERA 38B CON CALLE 74


BETANIA - NORTE CENTRO HISTÓRICO

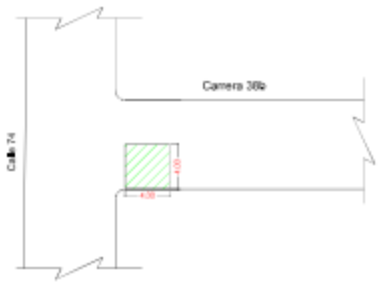

ÁREA: 16 M2

CARRERA 41 CON CALLE 75C

BETANIA - NORTE CENTRO HISTÓRICO

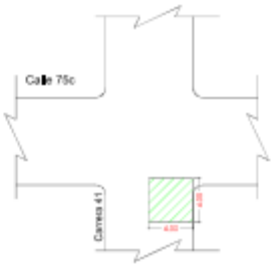

ÁREA: 16 M2


SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

1/1

CALLE 37 CON CARRERA 9D

EL CAMPITO - SUR ORIENTE

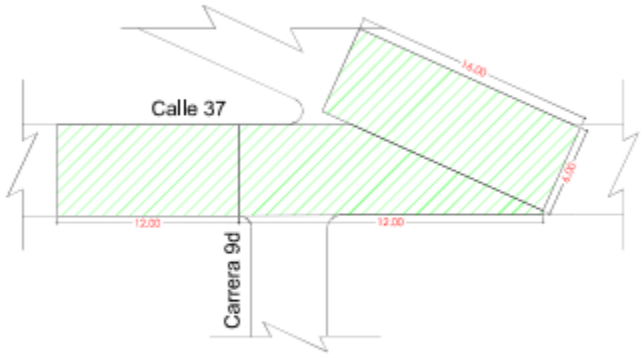

ÁREA: 240 M2


SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

1/1

CALLE 38B ENTRE CARRERAS 11 Y 13C

EL CAMPITO - SUR ORIENTE

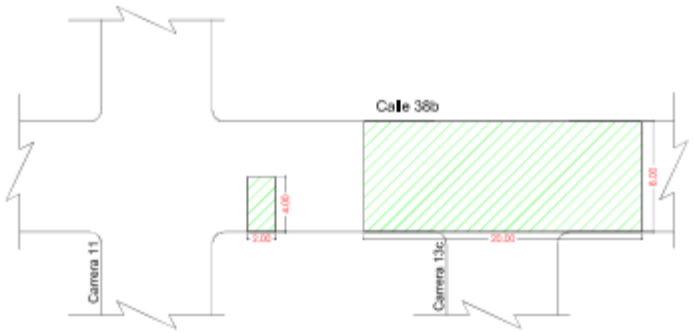

ÁREA: 168 M2

CARRERA 41B ENTRE CALLES 73 Y 73B


BETANIA - SUR OCCIDENTE



ÁREA: 32 M2

CALLE 38B ENTRE CALLES 9C Y 11


EL CAMPITO - SUR ORIENTE

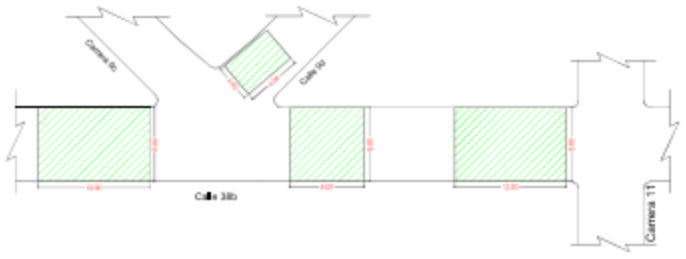

ÁREA: 280 M2

CALLE 100 ENTRE TRANSVERSAL 44 Y CARRERA 43B

MIRAMAR - NORTE CENTRO HISTÓRICO



ÁREA: 120 M2

TRANSVERSAL 44 ENTRE CALLE 99 Y 100


MIRAMAR - NORTE CENTRO HISTÓRICO



ÁREA: 810 M2


CARRERA 43 CON CARRERA 42G1

MIRAMAR - NORTE CENTRO HISTÓRICO

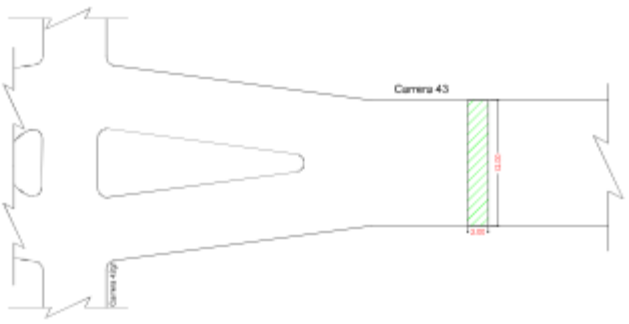


ÁREA: 24 M2

CARRERA 32 CON CALLE 63B
OLAYA - SUR OCCIDENTE

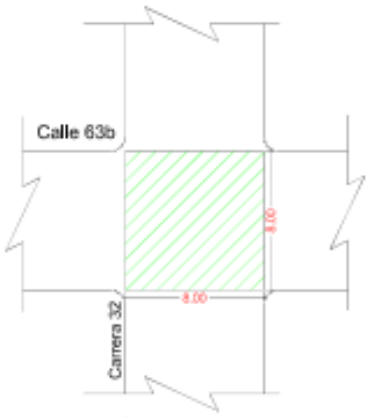

ÁREA: 64 M2


CARRERA 38 ENTRE CALLES 69 Y 72
OLAYA - SUR OCCIDENTE



ÁREA: 64 M2

CALLE 71 ENTRE DIAGONAL 34 Y CARRERA 36


OLAYA - SUR OCCIDENTE

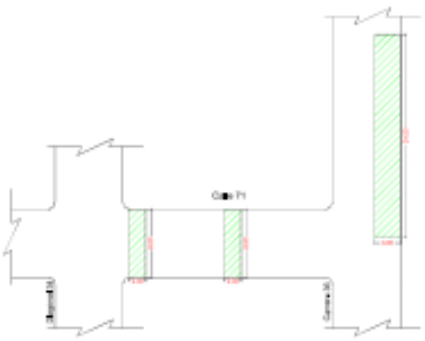

ÁREA: 104 M2


CARRERA 32 ENTRE CALLE 69C Y DIAGONAL 34

OLAYA - SUR OCCIDENTE




ÁREA: 112 M2

CARRERA 21B CON CALLE 64B
SAN FELIPE - SUR OCCIDENTE

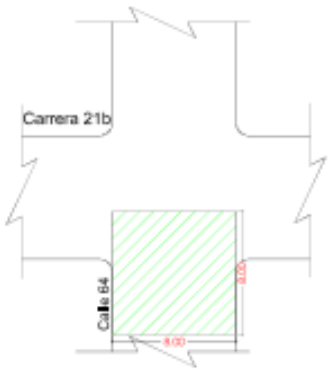

ÁREA: 64 M2

CARRERA 23 ENTRE CARRERAS 65B Y 68
SAN FELIPE - SUR OCCIDENTE



ÁREA: 52 M2

CALLE 72 #26D-09
SAN FELIPE - SUR OCCIDENTE



ÁREA: 6 M2


CARRERA 22C ENTRE CALLES 70C Y 68
SAN FELIPE - SUR OCCIDENTE



ÁREA: 100 M2

CALLE 72 ENTRE CARRERAS 38 Y 60


LAS DELICIAS, COLOMBIA, EL PRADO - NORTE CENTRO HISTÓRICO



ÁREA: 609 M2

CALLE 72 ENTRE CARRERAS 38 Y 60


LAS DELICIAS, COLOMBIA, EL PRADO - NORTE CENTRO HISTÓRICO



ÁREA: 399.5 M2

CALLE 72 ENTRE CARRERAS 38 Y 60


LAS DELICIAS, COLOMBIA, EL PRADO - NORTE CENTRO HISTÓRICO



ÁREA: 662 M2


CALLE 72 ENTRE CARRERAS 38 Y 60

LAS DELICIAS, COLOMBIA, EL PRADO - NORTE CENTRO HISTÓRICO



ÁREA: 313 M2

Se realizó recorridos viviendas terminadas, las cuales fueron intervenidas por medio del Programa de Mejoramiento de Vivienda Saludable de la Secretaría de Obras Públicas de la Alcaldía de Barranquilla, interviniendo puntos internos de la vivienda como cocina, baños, redes eléctricas, pisos, estuco y puestas de los cuartos y baño, las direcciones donde se encuentran ubicadas las viviendas son:
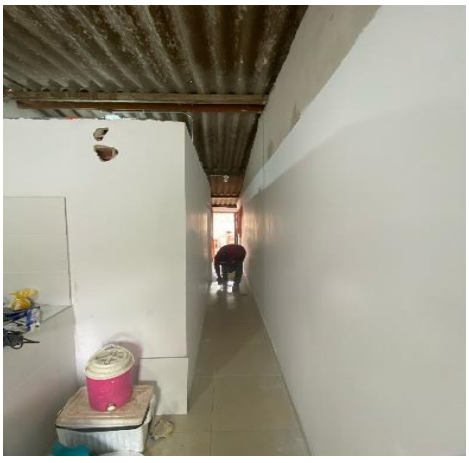
<table>
<tr><th>#</th><th>Postulante</th><th>Barrio</th><th>Dirección</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Mónica Patricia Perdomo Palma</td><td>Villa San Pedro 2</td><td>K 3C1 99 12</td></tr>
<tr><td colspan="4">REGISTRO FOTOGRÁFICO</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">COCINA: Enchape de salpicadero y construcción de mesón, piso en cerámica, cambio de lavaplatos, estuco y pintura.</td><td colspan="2">BAÑO: Demolición de piso, plantilla de piso, enchape de piso, instalación de enchape de muros, instalación de combo sanitario y accesorios, aplicación de estuco y pintura, suministro e instalación de puerta.</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">GENERAL: Instalaciones eléctricas de la vivienda en tubería EMT, puntos de iluminación, tomacorrientes dobles y GFCI, sistema puesta a tierra y cambio de tablero.</td><td colspan="2">AREAS COMUNES: Acabados de estuco y pintura, demolición de plantilla, enchape de pisos en sala comedor y hall, en hall se realizó pañete.</td></tr>
</table>

#	Postulante	Barrio	Dirección
2	Sara Esther Giron Zuñiga	Villa San Pedro 2	K 4A 99B 39

REGISTRO FOTOGRÁFICO





COCINA: instalación de puntos hidrosanitarios, enchape de salpicadero y construcción de mesón, piso en cerámica, cambio de lavaplatos, estuco y pintura.

BAÑO: instalación de puntos hidrosanitarios, demolición de piso, plantilla de piso, enchape de piso, instalación de enchape de muros, instalación de combo sanitario y accesorios, aplicación de estuco y pintura, suministro e instalación de puerta.





ALCOBA: demolición de plantilla, enchape de pisos.


ALCOBA: demolición de plantilla, enchape de pisos.



AREAS COMUNES: Acabados de estuco y pintura, demolición de plantilla, enchape de pisos en sala comedor y hall, adicionalmente se realiza pañete en hall.
Instalaciones eléctricas de la vivienda en tubería EMT, puntos de iluminación, tomacorrientes dobles y GFCI, sistema puesta a tierra y cambio de tablero.

#	Postulante	Barrio	Dirección
3	Marlene Muñoz Muñoz	Villa San Pedro 2	K 4A 99B 57

REGISTRO FOTOGRÁFICO

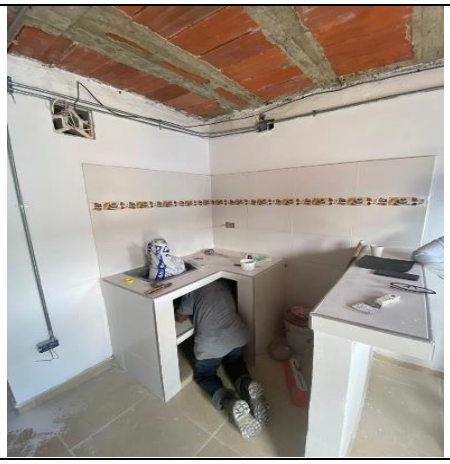




COCINA: Enchape de salpicadero y construcción de mesón, piso en cerámica, cambio de lavaplatos, estuco y pintura.

BAÑO: Demolición de piso, plantilla de piso, enchape de piso, instalación de enchape de muros, instalación de combo sanitario y accesorios, aplicación de estuco y pintura, suministro e instalación de puerta.



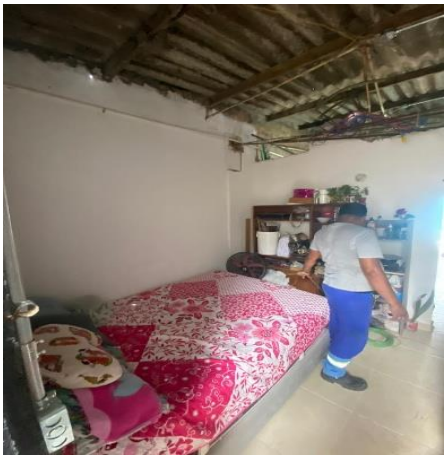


GENERAL: Instalaciones eléctricas de la vivienda en tubería EMT, puntos de iluminación, tomacorrientes dobles y GFCI, sistema puesta a tierra y cambio de tablero.
AREAS COMUNES: Acabados de estuco y pintura, demolición de plantilla, enchape de pisos en sala comedor y hall.

ALCOBA 1: Acabados de estuco y pintura, plantilla de piso y enchape de piso

#	Postulante	Barrio	Dirección
4	Disnalda Guevara Gutierrez	Villa San Pedro 2	K 4A1 99B 87

REGISTRO FOTOGRÁFICO

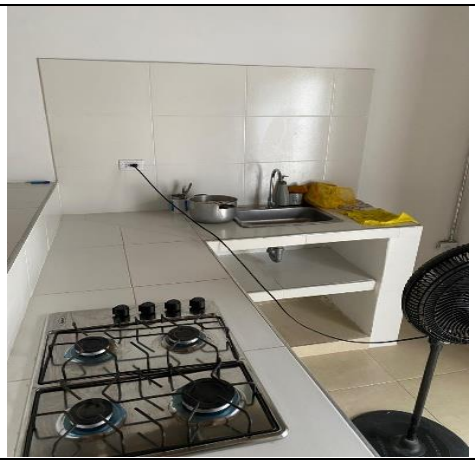



COCINA: Enchape de salpicadero y construcción de mesón, cambio de lavaplatos, estuco y pintura.

GENERAL: Instalaciones eléctricas de la vivienda en tubería EMT, puntos de iluminación, tomacorrientes dobles y GFCI, sistema puesta a tierra y cambio de tablero.
AREAS COMUNES: Acabados de estuco y pintura en hall y sala comedor.





ALCOBA 1: Acabados de estuco y pintura, plantilla de piso y enchape de piso.

BAÑO: Demolición de piso, plantilla de piso, enchape de piso, instalación de enchape de muros, instalación de combo sanitario y accesorios, aplicación de estuco y pintura, suministro e instalación de puerta.

#	Postulante	Barrio	Dirección
5	Bleydis Katherine Romero Hernandez	Villa San Pedro 2	K 4A1 99B 81

REGISTRO FOTOGRÁFICO





COCINA: Enchape de salpicadero y construcción de mesón, cambio de lavaplatos, estuco y pintura.

BAÑO: Demolición de piso, plantilla de piso, enchape de piso, instalación de combo sanitario y accesorios, suministro e instalación de puerta.






ALCOBA 1: Acabados de estuco y pintura, plantilla de piso y enchape de piso.

GENERAL: Instalaciones eléctricas de la vivienda en tubería EMT, puntos de iluminación, tomacorrientes dobles y GFCI, sistema puesta a tierra y cambio de tablero.

#	Postulante	Barrio	Dirección
6	Darlenys Castro Reyes	Villa San Pedro 2	K 4C 99A 16

REGISTRO FOTOGRÁFICO



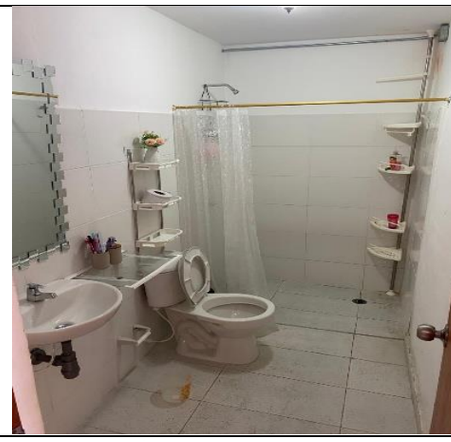

COCINA: Enchape de salpicadero y construcción de mesón, piso en cerámica, cambio de lavaplatos, estuco y pintura.

BAÑO: demolición de piso, plantilla de piso, enchape de piso, instalación de enchape de muros, instalación de combo sanitario y accesorios, aplicación de estuco y pintura, suministro e instalación de puerta.





GENERAL: Instalaciones eléctricas de la vivienda en tubería EMT, puntos de iluminación, tomacorrientes dobles y GFCI, sistema puesta a tierra y cambio de tablero.


AREAS COMUNES: Pañete de muros, estuco y pintura de Hall y sala comedor, demolición de plantilla, enchape de pisos.

ALCOBA 1: Levante de muro divisorio, Adicionalmente se realizó pañete, estuco y pintura, plantilla de piso y enchape de piso.

#	Postulante	Barrio	Dirección
7	Yenis Maria Gamez Sandoval	Villa San Pedro 2	K 4C 99 97


REGISTRO FOTOGRÁFICO



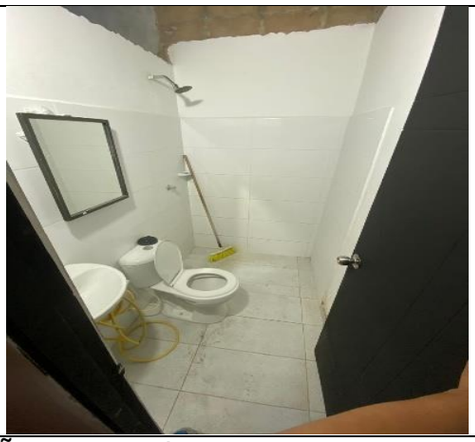

COCINA: Enchape de salpicadero y construcción de mesón, piso en cerámica, cambio de lavaplatos, estuco y pintura.

BAÑO: Demolición de piso, plantilla de piso, enchape de piso, instalación de enchape de muros, instalación de combo sanitario y accesorios, aplicación de estuco y pintura, suministro e instalación de puerta.

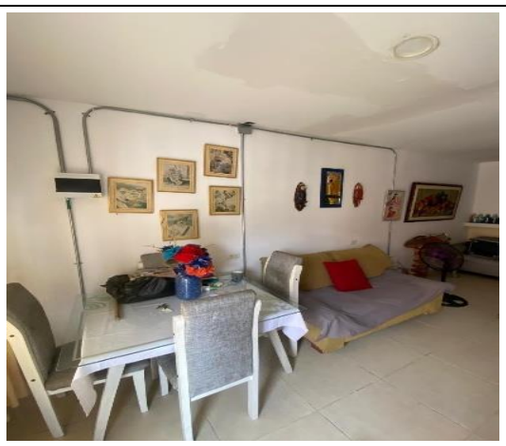



GENERAL: Instalaciones eléctricas de la vivienda en tubería EMT, puntos de iluminación, tomacorrientes dobles y GFCI, sistema puesta a tierra y cambio de tablero.

SALA/COMEDOR: Demolición, plantilla en concreto, instalación de piso, zócalos, estuco, pintura y adecuaciones eléctricas.

#	Postulante	Barrio	Dirección
8	Eulogia Ester Petro Montes	Villa San Pedro 2	K 4C 99 103

REGISTRO FOTOGRÁFICO





COCINA: demolición de piso, plantilla en concreto, piso en cerámica, estuco y pintura.

BAÑO: Demolición de piso, plantilla de piso, enchape de piso, instalación de enchape de muros, instalación de combo sanitario y accesorios, aplicación de estuco y pintura, suministro e instalación de puerta.





SALA/COMEDOR: Demolición, plantilla en concreto, instalación de piso, zócalos, estuco, pintura y adecuaciones eléctricas.

GENERAL: Instalaciones eléctricas de la vivienda en tubería EMT, puntos de iluminación, tomacorrientes dobles y GFCI, sistema puesta a tierra y cambio de tablero.

#	Postulante	Barrio	Dirección
9	Temilda Beltran Carcamo	Villa San Pedro 2	K 4C 99A 70

REGISTRO FOTOGRÁFICO





COCINA: Enchape de salpicadero y construcción de mesón, piso en cerámica, cambio de lavaplatos, estuco y pintura.

BAÑO: Demolición de piso, plantilla de piso, enchape de piso, instalación de enchape de muros, instalación de combo sanitario y accesorios, aplicación de estuco y pintura, suministro e instalación de puerta.





SALA/COMEDOR: Pañete de muros, estuco y pintura sala comedor, demolición de plantilla, enchape de pisos.
GENERAL: Instalaciones eléctricas de la vivienda en tubería EMT, puntos de iluminación, tomacorrientes dobles y GFCI, sistema puesta a tierra y cambio de tablero.

CUBIERTA DE BAÑO: se realizó suministro e instalación de cubierta en zona de baño.

Se realiza seguimiento a los trabajos pavimentación de nuevos tramos viales que se integran a la malla vial del Distrito de Barranquilla, estos trabajos son ejecutados en la calle 15 entre carreras 28 y 30 del barrio Rebolo (sector cancha gota de leche), donde se realizan las siguientes actividades: corte y nivelación de terreno, retiro de materia sobrante, instalación de rieles, pavimentación de vías y reparación de acometida de agua potable por parte de la AAA.

Excavación y reparación de tuberías y pavimentación de vías




Atentamente,

JUAN CARLOS RAPALINO VALLE
C.C. 72.181.627
Contratista
