
Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras	Costo
1	**1**	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO Y CICLO INFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES**	**105 días**	**lun 24/01/22**	**lun 23/05/22**			**$660.000.000,00**
2	**1.1**	**FIRMA DE ACTA DE INICIO**	**0 días**	**lun 24/01/22**	**lun 24/01/22**		**4**	**$0,00**
3	**1.2**	**ETAPA DE DIAGNÓSTICO**	**25 días**	**lun 24/01/22**	**sáb 19/02/22**			**$0,00**
4	1.2.1	Revisión de diseños iniciales	16 días	lun 24/01/22	jue 10/02/22	2	5FC-3 días;7	$0,00
5	1.2.2	Radicación de requisitos para PMT	10 días	lun 7/02/22	jue 17/02/22	4FC-3 días	6CC	$0,00
6	1.2.3	Coordinación con Empresas de servicios públicos	12 días	lun 7/02/22	sáb 19/02/22	5CC	7	$0,00
7	1.2.4	Apropiación de diseños	0 días	sáb 19/02/22	sáb 19/02/22	4;6	10	$0,00
8	**1.3**	**INICIO DE OBRA**	**0 días**	**lun 21/02/22**	**lun 21/02/22**			**$0,00**
9	**1.4**	**CIV'S GRUPO 1**	**45 días**	**lun 21/02/22**	**jue 14/04/22**			**$105.281.260,11**
10	1.4.1	Trámites adicionales para aprobación de PMT	4 días	lun 21/02/22	vie 25/02/22	7	11;21FC+5 días	$0,00
11	***1.4.2***	***Inicio Grupo 1***	***0 días***	***vie 25/02/22***	***vie 25/02/22***	***10***	***12***	***$0,00***
12	1.4.3	Socialización y preliminares de componentes	7 días	vie 25/02/22	sáb 5/03/22	11	13;64CC	$0,00
13	1.4.4	PRELIMINARES	12 días	sáb 5/03/22	vie 18/03/22	12	16CC+2 días	$8.692.932,65
14	1.4.5	RELLENOS, GRANULARES Y PAVIMENTOS	12 días	vie 11/03/22	vie 25/03/22	16CC+3 días	15FC-3 días	$82.017.912,83
15	1.4.6	ESPACIO PUBLICO	15 días	mié 23/03/22	vie 8/04/22	14FC-3 días	17CC+7 días	$6.918.691,63
16	1.4.7	REDES	14 días	mar 8/03/22	jue 24/03/22	13CC+2 días	14CC+3 días	$7.233.963,49
17	1.4.8	ZONAS VERDES	7 días	mié 30/03/22	jue 7/04/22	15CC+7 días	18	$7.561,36
18	1.4.9	SEÑALIZACION VIAL	6 días	jue 7/04/22	jue 14/04/22	17	19	$410.198,15
19	***1.4.10***	***Fin Grupo 1***	***0 días***	***jue 14/04/22***	***jue 14/04/22***	***18***	***65***	***$0,00***
20	**1.5**	**CIV'S GRUPO 2**	**45 días**	**jue 3/03/22**	**sáb 23/04/22**			**$105.281.260,11**
21	1.5.1	Trámites adicionales para aprobación de PMT	4 días	jue 3/03/22	mar 8/03/22	10FC+5 días	22;32FC+7 días	$0,00
22	***1.5.2***	***Inicio Grupo 2***	***0 días***	***mar 8/03/22***	***mar 8/03/22***	***21***	***23***	***$0,00***
23	1.5.3	Socialización y preliminares de componentes	7 días	mar 8/03/22	mié 16/03/22	22	24	$0,00
24	1.5.4	PRELIMINARES	12 días	mié 16/03/22	mié 30/03/22	23	27CC+2 días	$8.692.932,65
25	1.5.5	RELLENOS, GRANULARES Y PAVIMENTOS	12 días	mié 23/03/22	mar 5/04/22	27CC+3 días	26FC-3 días	$82.017.912,83
26	1.5.6	ESPACIO PUBLICO	15 días	vie 1/04/22	mar 19/04/22	25FC-3 días	28CC+7 días	$6.918.691,63
27	1.5.7	REDES	14 días	jue 17/03/22	lun 4/04/22	24CC+2 días	25CC+3 días	$7.233.963,49
28	1.5.8	ZONAS VERDES	7 días	sáb 9/04/22	lun 18/04/22	26CC+7 días	29	$7.561,36
29	1.5.9	SEÑALIZACION VIAL	6 días	lun 18/04/22	sáb 23/04/22	28	30	$410.198,15
30	***1.5.10***	***Fin Grupo 2***	***0 días***	***sáb 23/04/22***	***sáb 23/04/22***	***29***	***65***	***$0,00***
31	**1.6**	**CIV'S GRUPO 3**	**45 días**	**mié 16/03/22**	**vie 6/05/22**			**$105.281.260,11**
32	1.6.1	Trámites adicionales para aprobación de PMT	4 días	mié 16/03/22	mar 22/03/22	21FC+7 días	33;43CC+5 días	$0,00
33	***1.6.2***	***Inicio Grupo 3***	***0 días***	***mar 22/03/22***	***mar 22/03/22***	***32***	***34***	***$0,00***
34	1.6.3	Socialización y preliminares de componentes	7 días	mar 22/03/22	mar 29/03/22	33	35	$0,00
35	1.6.4	PRELIMINARES	12 días	mar 29/03/22	mar 12/04/22	34	38CC+2 días	$8.692.932,65
36	1.6.5	RELLENOS, GRANULARES Y PAVIMENTOS	12 días	lun 4/04/22	lun 18/04/22	38CC+3 días	37FC-3 días	$82.017.912,83
37	1.6.6	ESPACIO PUBLICO	15 días	jue 14/04/22	sáb 30/04/22	36FC-3 días	39CC+7 días	$6.918.691,63
38	1.6.7	REDES	14 días	jue 31/03/22	vie 15/04/22	35CC+2 días	36CC+3 días	$7.233.963,49
39	1.6.8	ZONAS VERDES	7 días	jue 21/04/22	vie 29/04/22	37CC+7 días	40	$7.561,36
40	1.6.9	SEÑALIZACION VIAL	6 días	vie 29/04/22	vie 6/05/22	39	41	$410.198,15
41	***1.6.10***	***Fin Grupo 3***	***0 días***	***vie 6/05/22***	***vie 6/05/22***	***40***	***65***	***$0,00***
42	**1.7**	**CIV'S GRUPO 4**	**45 días**	**mié 23/03/22**	**jue 12/05/22**			**$105.281.260,11**
43	1.7.1	Trámites adicionales para aprobación de PMT	4 días	mié 23/03/22	sáb 26/03/22	32CC+5 días	44;54FC+6 días	$0,00
44	***1.7.2***	***Inicio Grupo 4***	***0 días***	***sáb 26/03/22***	***sáb 26/03/22***	***43***	***45***	***$0,00***
45	1.7.3	Socialización y preliminares de componentes	7 días	lun 28/03/22	lun 4/04/22	44	46	$0,00
46	1.7.4	PRELIMINARES	12 días	lun 4/04/22	lun 18/04/22	45	49CC+2 días	$8.692.932,65
47	1.7.5	RELLENOS, GRANULARES Y PAVIMENTOS	12 días	sáb 9/04/22	vie 22/04/22	49CC+3 días	48FC-3 días	$82.017.912,83
48	1.7.6	ESPACIO PUBLICO	15 días	mié 20/04/22	vie 6/05/22	47FC-3 días	50CC+7 días	$6.918.691,63
49	1.7.7	REDES	14 días	mié 6/04/22	jue 21/04/22	46CC+2 días	47CC+3 días	$7.233.963,49
50	1.7.8	ZONAS VERDES	7 días	mié 27/04/22	jue 5/05/22	48CC+7 días	51	$7.561,36
51	1.7.9	SEÑALIZACION VIAL	6 días	jue 5/05/22	jue 12/05/22	50	52	$410.198,15
52	***1.7.10***	***Fin Grupo 4***	***0 días***	***jue 12/05/22***	***jue 12/05/22***	***51***	***65***	***$0,00***
53	**1.8**	**CIV'S GRUPO 5**	**45 días**	**sáb 2/04/22**	**lun 23/05/22**			**$105.281.260,11**
54	1.8.1	Trámites adicionales para aprobación de PMT	4 días	sáb 2/04/22	jue 7/04/22	43FC+6 días	55	$0,00
55	***1.8.2***	***Inicio Grupo 5***	***0 días***	***jue 7/04/22***	***jue 7/04/22***	***54***	***56***	***$0,00***
56	1.8.3	Socialización y preliminares de componentes	7 días	jue 7/04/22	jue 14/04/22	55	57	$0,00
57	1.8.4	PRELIMINARES	12 días	vie 15/04/22	jue 28/04/22	56	60CC+2 días	$8.692.932,65
58	1.8.5	RELLENOS, GRANULARES Y PAVIMENTOS	12 días	mié 20/04/22	mié 4/05/22	60CC+3 días	59FC-3 días	$82.017.912,83
59	1.8.6	ESPACIO PUBLICO	15 días	sáb 30/04/22	mar 17/05/22	58FC-3 días	61CC+7 días	$6.918.691,63
60	1.8.7	REDES	14 días	lun 18/04/22	mar 3/05/22	57CC+2 días	58CC+3 días	$7.233.963,49
61	1.8.8	ZONAS VERDES	7 días	lun 9/05/22	mar 17/05/22	59CC+7 días	62	$7.561,36
62	1.8.9	SEÑALIZACION VIAL	6 días	mar 17/05/22	lun 23/05/22	61	63	$410.198,15
63	***1.8.10***	***Fin Grupo 5***	***0 días***	***lun 23/05/22***	***lun 23/05/22***	***62***	***65***	***$0,00***
64	**1.9**	**Componentes (SST, Ambiental, PMT) y ajustes**	**76 días**	**vie 25/02/22**	**lun 23/05/22**	**12CC**	**65**	**$133.593.699,45**
65	**1.10**	**FIN DEL CONTRATO**	**0 días**	**lun 23/05/22**	**lun 23/05/22**	**19;64;30;41**		**$0,00**

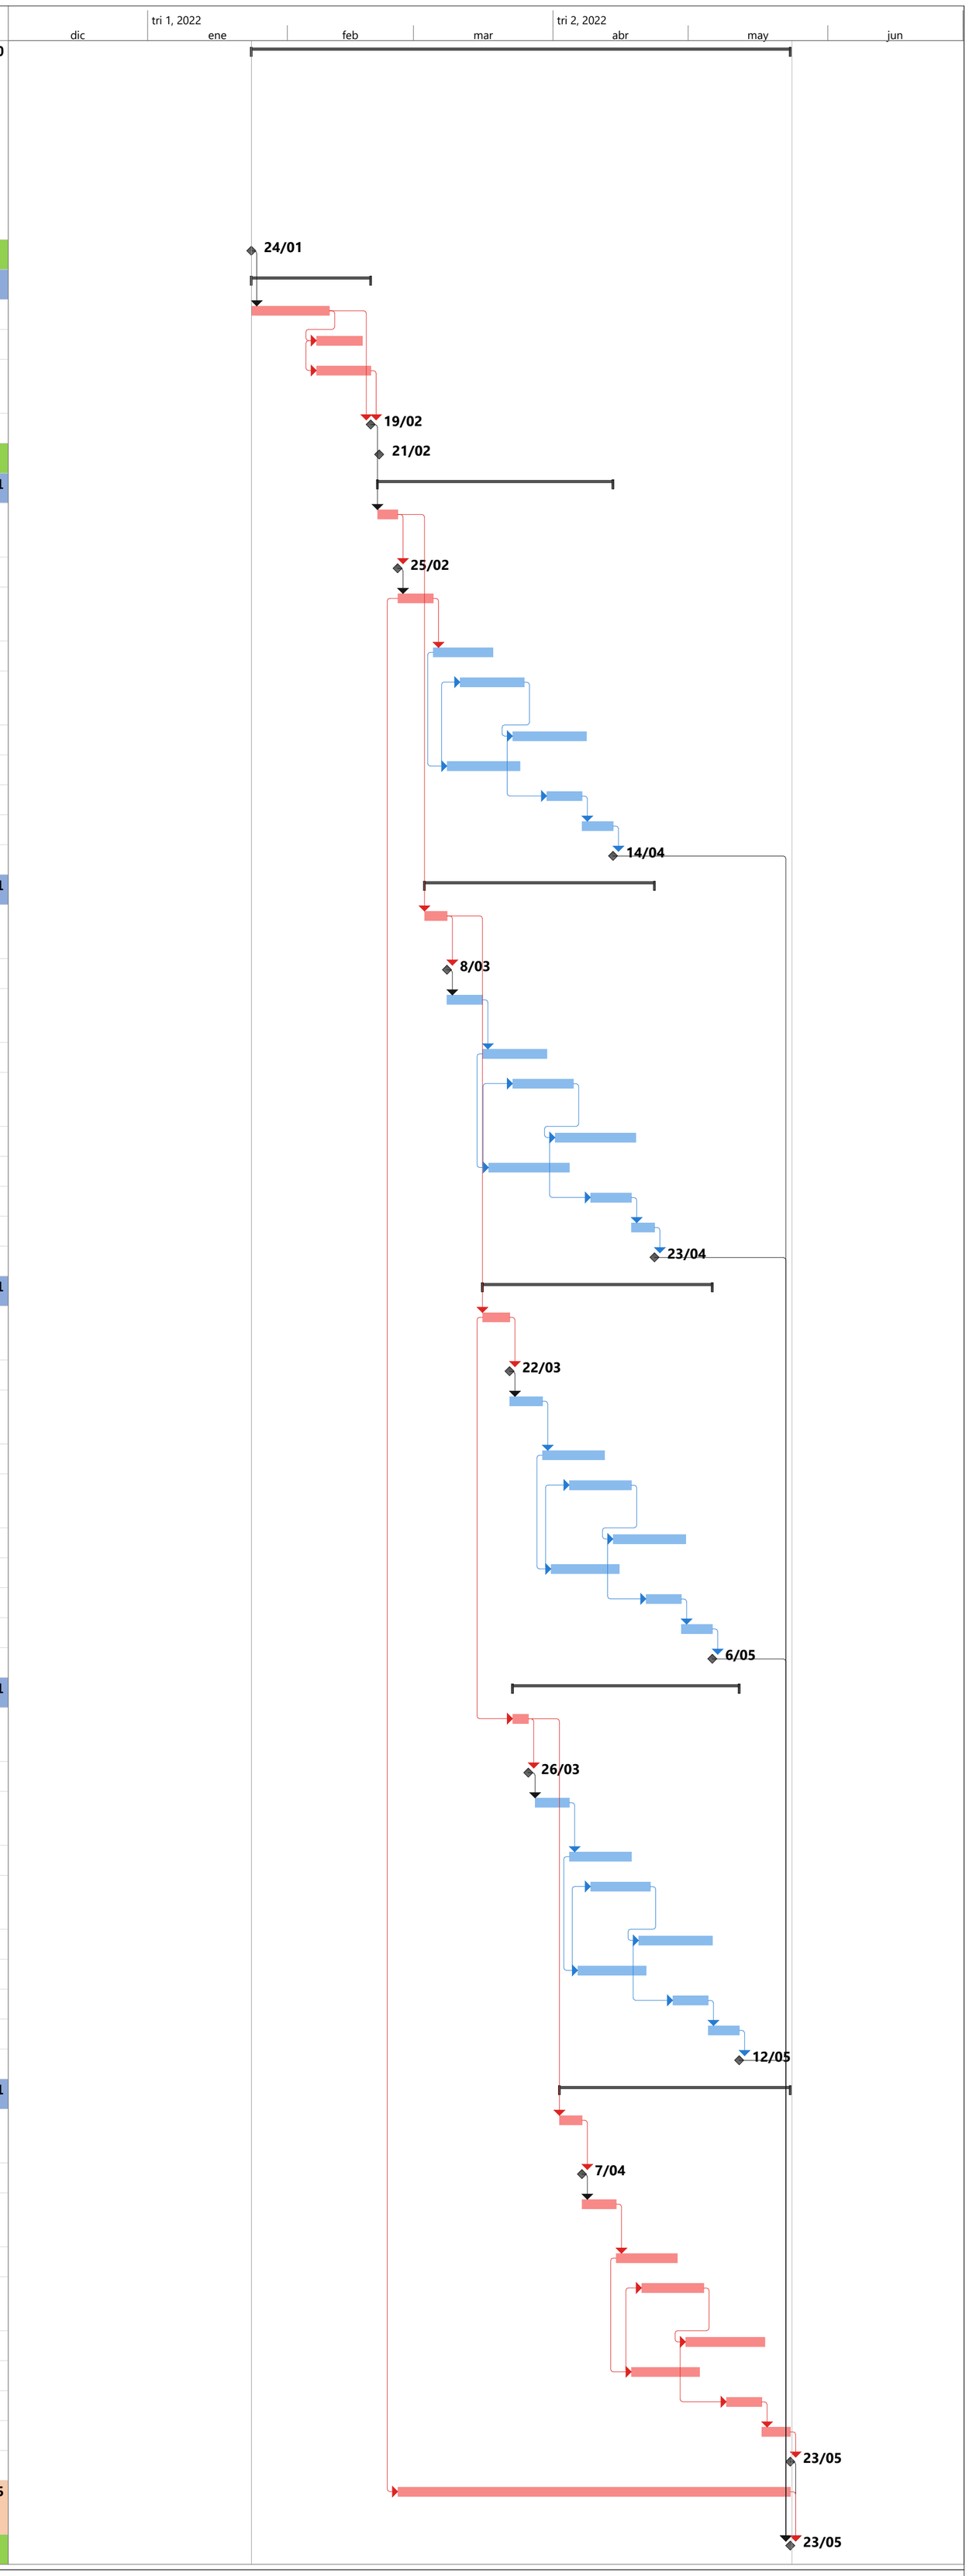

Proyecto: PROGRAMACIÓN BO
Fecha: mar 12/03/24

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Tareas críticas · División crítica · Progreso · Progreso manual
