DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA			
Fecha de presentación del informe:	MAYO / 2025	Numero de contrato:	CD-12-2025-1397
Datos del Contratista (nombres y apellidos-número de identificación)	**NAIROVYS DEL CARMEN AGUILAR TORRES** CC 1045750827		
Periodo del informe:	Informe comprendido al periodo al 15 de mayo de 2025	Informe número:	03
Objeto del contrato:	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y MISIONALES PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DERIVADOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA		
Valor del contrato	SON: **VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS M/L ($24.000.000)**		
Supervisor	RAFAEL LAFONT DE SALES CC 8.662.605		
Cargo	SECRETARIO DE DESPACHO SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS		

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

Apoyo y acompañamiento a los contratistas y supervisores durante seguimiento a los trabajos de pavimentación de nuevos tramos viales que se integran a la malla vial del Distrito de Barranquilla, estos trabajos son ejecutados en la calle 15 entre carreras 28 y 3 del barrio Rebolo, por intermedio de la Secretaria Distrital de Obras Públicas y el Programa Barrios a la Obra, donde se observa la realizan actividades: pavimentación de vías, construcción de andenes y bordillos en las bocacalles, construcción de andenes, trabajos realizados por la empresa AAA y retiro de escombros.










Apoyo durante la revisión de documentación de carpetas, verificando que los postulantes cumplan con los requisitos exigidos para acceder al Programa de Mejoramiento de Vivienda Saludable, los cuales son: documentos de propiedad, predial de la vivienda, fotocopia del documento de identidad del postulante, Sisbén y un recibo de servicios públicos, esta actividad se realizó a viviendas postuladas correspondiente a los barrios estrato 1 y 2 son: **CARRIZAL, CIUDAD MODESTO, LA PAZ, EVARISTO SOURDIS, LIPAYA, SANTO DOMINGO, LA MANGA, LAS AMERICAS, LA PLAYA, SANTUARIO, EL BOSQUE, LAS MALVINAS, EL ROMANCE, SIETE DE ABRIL, CIUDADELA VEINTE DE JULIO, LAS FLOR ES, LA SIERRITA, LA PRADERA, EL PUEBLO, SANTA MARIA, EL POR FIN, VILLA FLOR, CALIFORNIA, LA CORDIALIDAD Y VILLASAN PEDRO II.**

Actualización de nuevos formatos de supervisión vigencia 2025, para contratistas de la Secretaria Distrital de Obras Públicas (servicios profesionales), en los formatos se relacionan el número de cuenta, contrato, información del contratista, objeto del contrato, numero de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) y Registro Presupuestal (RP), monto y plazo del contrato. Los formatos hacen parte del proceso de aprobación de las respectivas cuentas en la plataforma SECOP II. Los formatos corresponden a las cuentas de cobros y la actualización de los formatos corresponden a los siguientes contratos:

CD-12-2025-1016	CD-12-2025-1037	CD-12-2025-1058	CD-12-2025-1079
CD-12-2025-1017	CD-12-2025-1038	CD-12-2025-1059	CD-12-2025-1080
CD-12-2025-1018	CD-12-2025-1039	CD-12-2025-1060	CD-12-2025-1081
CD-12-2025-1019	CD-12-2025-1040	CD-12-2025-1061	CD-12-2025-1082
CD-12-2025-1020	CD-12-2025-1041	CD-12-2025-1062	CD-12-2025-1083
CD-12-2025-1021	CD-12-2025-1042	CD-12-2025-1063	CD-12-2025-1084
CD-12-2025-1022	CD-12-2025-1043	CD-12-2025-1064	CD-12-2025-1085
CD-12-2025-1023	CD-12-2025-1044	CD-12-2025-1065	CD-12-2025-1086
CD-12-2025-1024	CD-12-2025-1045	CD-12-2025-1066	CD-12-2025-1087
CD-12-2025-1025	CD-12-2025-1046	CD-12-2025-1067	CD-12-2025-1088
CD-12-2025-1026	CD-12-2025-1047	CD-12-2025-1068	CD-12-2025-1089
CD-12-2025-1027	CD-12-2025-1048	CD-12-2025-1069	CD-12-2025-1090
CD-12-2025-1028	CD-12-2025-1049	CD-12-2025-1070	CD-12-2025-1091
CD-12-2025-1029	CD-12-2025-1050	CD-12-2025-1071	CD-12-2025-1092
CD-12-2025-1030	CD-12-2025-1051	CD-12-2025-1072	CD-12-2025-1093
CD-12-2025-1031	CD-12-2025-1052	CD-12-2025-1073	CD-12-2025-1094
CD-12-2025-1032	CD-12-2025-1053	CD-12-2025-1074	CD-12-2025-1095
CD-12-2025-1033	CD-12-2025-1054	CD-12-2025-1075	CD-12-2025-1096
CD-12-2025-1034	CD-12-2025-1055	CD-12-2025-1076	CD-12-2025-1097
CD-12-2025-1035	CD-12-2025-1056	CD-12-2025-1077	CD-12-2025-1098

Apoyo durante las visitas previas y posterior, a las viviendas terminadas y entregadas a los beneficiarios del Programa de Mejoramiento de Vivienda Saludable por parte de la Alcaldía Distrital. Durante las visitas a cada vivienda, se hacen registros fotográficos a cada vivienda de los puntos que fueron intervenidos y remodelados, así:
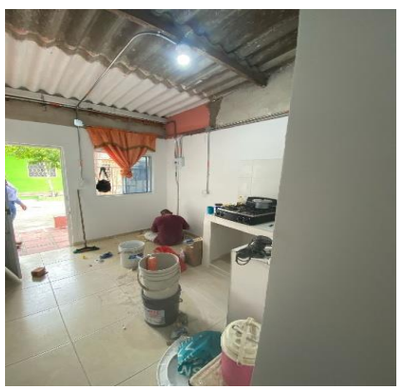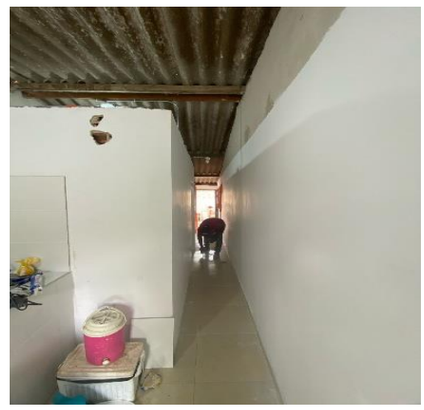
<table>
<tr><th>#</th><th>Postulante</th><th>Barrio</th><th>Dirección</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Mónica Patricia Perdomo Palma</td><td>Villa San Pedro 2</td><td>K 3C1 99 12</td></tr>
<tr><td colspan="4">REGISTRO FOTOGRÁFICO</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">COCINA: Enchape de salpicadero y construcción de mesón, piso en cerámica, cambio de lavaplatos, estuco y pintura.</td><td colspan="2">BAÑO: Demolición de piso, plantilla de piso, enchape de piso, instalación de enchape de muros, instalación de combo sanitario y accesorios, aplicación de estuco y pintura, suministro e instalación de puerta.</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">GENERAL: Instalaciones eléctricas de la vivienda en tubería EMT, puntos de iluminación, tomacorrientes dobles y GFCI, sistema puesta a tierra y cambio de tablero.</td><td colspan="2">AREAS COMUNES: Acabados de estuco y pintura, demolición de plantilla, enchape de pisos en sala comedor y hall, en hall se realizó pañete.</td></tr>
</table>

#	Postulante	Barrio	Dirección
3	Sara Esther Giron Zuñiga	Villa San Pedro 2	K 4A 99B 39

REGISTRO FOTOGRÁFICO





COCINA: instalación de puntos hidrosanitarios, enchape de salpicadero y construcción de mesón, piso en cerámica, cambio de lavaplatos, estuco y pintura.

BAÑO: instalación de puntos hidrosanitarios, demolición de piso, plantilla de piso, enchape de piso, instalación de enchape de muros, instalación de combo sanitario y accesorios, aplicación de estuco y pintura, suministro e instalación de puerta.






ALCOBA: demolición de plantilla, enchape de pisos.

ALCOBA: demolición de plantilla, enchape de pisos.

#	Postulante	Barrio	Dirección
4	Marlene Muñoz Muñoz	Villa San Pedro 2	K 4A 99B 57

REGISTRO FOTOGRÁFICO

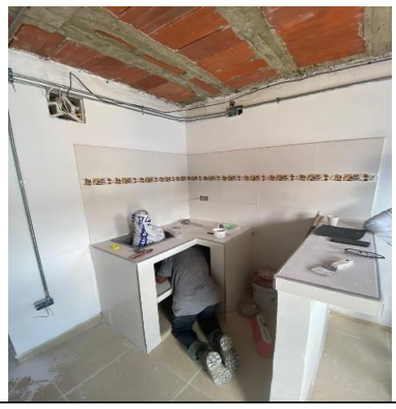




COCINA: Enchape de salpicadero y construcción de mesón, piso en cerámica, cambio de lavaplatos, estuco y pintura.

BAÑO: Demolición de piso, plantilla de piso, enchape de piso, instalación de enchape de muros, instalación de combo sanitario y accesorios, aplicación de estuco y pintura, suministro e instalación de puerta.



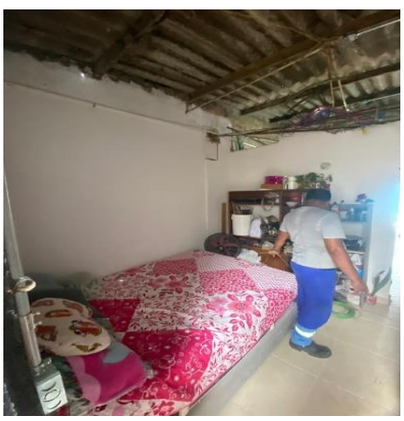

GENERAL: Instalaciones eléctricas de la vivienda en tubería EMT, puntos de iluminación, tomacorrientes dobles y GFCI, sistema puesta a tierra y cambio de tablero.

AREAS COMUNES: Acabados de estuco y pintura, demolición de plantilla, enchape de pisos en sala comedor y hall.

ALCOBA 1: Acabados de estuco y pintura, plantilla de piso y enchape de piso

#	Postulante	Barrio	Dirección
5	Disnalda Guevara Gutierrez	Villa San Pedro 2	K 4A1 99B 87

REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
COCINA: Enchape de salpicadero y construcción de mesón, cambio de lavaplatos, estuco y pintura.	**GENERAL:** Instalaciones eléctricas de la vivienda en tubería EMT, puntos de iluminación, tomacorrientes dobles y GFCI, sistema puesta a tierra y cambio de tablero. **AREAS COMUNES:** Acabados de estuco y pintura en hall y sala comedor.
	
ALCOBA 1: Acabados de estuco y pintura, plantilla de piso y enchape de piso.	**BAÑO:** Demolición de piso, plantilla de piso, enchape de piso, instalación de enchape de muros, instalación de combo sanitario y accesorios, aplicación de estuco y pintura, suministro e instalación de puerta.

#	Postulante	Barrio	Dirección
6	Bleydis Katherine Romero Hernandez	Villa San Pedro 2	K 4A1 99B 81


REGISTRO FOTOGRÁFICO





COCINA: Enchape de salpicadero y construcción de mesón, cambio de lavaplatos, estuco y pintura.

BAÑO: Demolición de piso, plantilla de piso, enchape de piso, instalación de combo sanitario y accesorios, suministro e instalación de puerta.

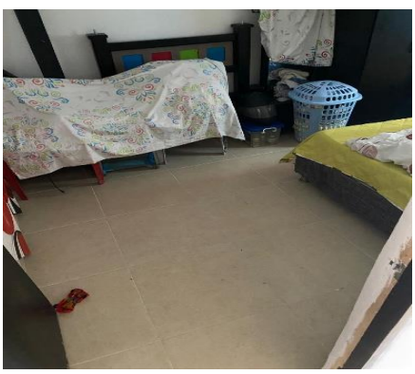



ALCOBA 1: Acabados de estuco y pintura, plantilla de piso y enchape de piso.

GENERAL: Instalaciones eléctricas de la vivienda en tubería EMT, puntos de iluminación, tomacorrientes dobles y GFCI, sistema puesta a tierra y cambio de tablero.

#	Postulante	Barrio	Dirección
7	Darlenys Castro Reyes	Villa San Pedro 2	K 4C 99A 16

REGISTRO FOTOGRÁFICO





COCINA: Enchape de salpicadero y construcción de mesón, piso en cerámica, cambio de lavaplatos, estuco y pintura.

BAÑO: demolición de piso, plantilla de piso, enchape de piso, instalación de enchape de muros, instalación de combo sanitario y accesorios, aplicación de estuco y pintura, suministro e instalación de puerta.






GENERAL: Instalaciones eléctricas de la vivienda en tubería EMT, puntos de iluminación, tomacorrientes dobles y GFCI, sistema puesta a tierra y cambio de tablero.

AREAS COMUNES: Pañete de muros, estuco y pintura de Hall y sala comedor, demolición de plantilla, enchape de pisos.

ALCOBA 1: Levante de muro divisorio, Adicionalmente se realizó pañete, estuco y pintura, plantilla de piso y enchape de piso.
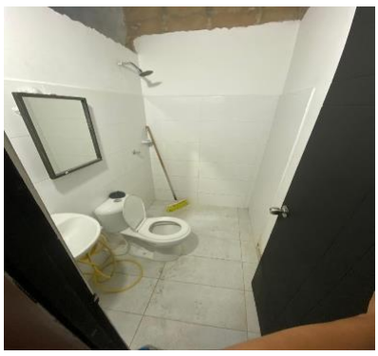
<table>
<tr><th>#</th><th>Postulante</th><th>Barrio</th><th>Dirección</th></tr>
<tr><td>8</td><td>Yenis Maria Gamez Sandoval</td><td>Villa San Pedro 2</td><td>K 4C 99 97</td></tr>
<tr><td colspan="4">REGISTRO FOTOGRÁFICO</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">COCINA: Enchape de salpicadero y construcción de mesón, piso en cerámica, cambio de lavaplatos, estuco y pintura.</td><td colspan="2">BAÑO: Demolición de piso, plantilla de piso, enchape de piso, instalación de enchape de muros, instalación de combo sanitario y accesorios, aplicación de estuco y pintura, suministro e instalación de puerta.</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">GENERAL: Instalaciones eléctricas de la vivienda en tubería EMT, puntos de iluminación, tomacorrientes dobles y GFCI, sistema puesta a tierra y cambio de tablero.</td><td colspan="2">SALA/COMEDOR: Demolición, plantilla en concreto, instalación de piso, zócalos, estuco, pintura y adecuaciones eléctricas.</td></tr>
</table>

#	Postulante	Barrio	Dirección
9	Eulogia Ester Petro Montes	Villa San Pedro 2	K 4C 99 103

REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
COCINA: demolición de piso, plantilla en concreto, piso en cerámica, estuco y pintura.	**BAÑO:** Demolición de piso, plantilla de piso, enchape de piso, instalación de enchape de muros, instalación de combo sanitario y accesorios, aplicación de estuco y pintura, suministro e instalación de puerta.
	
SALA/COMEDOR: Demolición, plantilla en concreto, instalación de piso, zócalos, estuco, pintura y adecuaciones eléctricas.	**GENERAL:** Instalaciones eléctricas de la vivienda en tubería EMT, puntos de iluminación, tomacorrientes dobles y GFCI, sistema puesta a tierra y cambio de tablero.

#	Postulante	Barrio	Dirección
10	Temilda Beltran Carcamo	Villa San Pedro 2	K 4C 99A 70

REGISTRO FOTOGRÁFICO





COCINA: Enchape de salpicadero y construcción de mesón, piso en cerámica, cambio de lavaplatos, estuco y pintura.

BAÑO: Demolición de piso, plantilla de piso, enchape de piso, instalación de enchape de muros, instalación de combo sanitario y accesorios, aplicación de estuco y pintura, suministro e instalación de puerta.





SALA/COMEDOR: Pañete de muros, estuco y pintura sala comedor, demolición de plantilla, enchape de pisos.

GENERAL: Instalaciones eléctricas de la vivienda en tubería EMT, puntos de iluminación, tomacorrientes dobles y GFCI, sistema puesta a tierra y cambio de tablero.

CUBIERTA DE BAÑO: se realizó suministro e instalación de cubierta en zona de baño.

Atentamente,

Nairovys aguilar torres

NAIROVYS DEL CARMEN AGUILAR TORRES
C.C Nº **1.045.750.827**
