# Convenio 012 FONAM 2024 (PNN Farallones de Cali – Eprodesa ONG)

# Informe de instalación (Actividad 13 – Sistema Séptico)

**2024**

**Dirección:** Calle 47 C Norte No. 2 i N - 15 • Cali - Colombia • Código Postal: 760001
**PBX:** (602) 485 3206 • Cel Comercial: 320 727 0447
www.eprodesaong.com (+57) 320 727 0447

**Actividad 13:** Instalar un (1) sistema séptico en el predio priorizado.

**Metodología**

- ✓ Compra de sistema séptico y accesorios, según prioridades del usuario y del parque.
- ✓ Transporte mayor y menor del sistema al sitio de entrega.
- ✓ Instalación del sistema en conjunto con el usuario.
- ✓ Firma del acta de entrega.

**Descripción del producto obtenido**


Se adquirió el sistema séptico de conformidad con las siguientes características:

“Sistema séptico integrado en tanque cilíndrico horizontal 2000 lt medidas 230x114 x 123 cm tee sanitaria sencilla x 2 accesorios varios para conexión a casa con 3 tubos de 4" por 3 metros / 3 uniones de 4” / 2 codos 45° 4" incluye 1/8 soldadura y limpiador. incluye 5 bultos de grava 3/4 pulgada por sistema incluye 5 bultos de grava 3/4 pulgada por sistema, incluir el costo de transporte desde el punto de descarga al predio y la apertura de los huecos en terreno donde se indique”

Este pozo séptico fue transportado al predio de Ana Cristina Sánchez, ubicado en la cuenca del rio Pance. Posteriormente se procedió a su instalación lo cual incluyó capacitación acerca del manejo del mismo desde las salidas de aguas negras y grises de las viviendas hasta la zona de desagüe del campo de infiltración.



## Acta de entrega e instalación

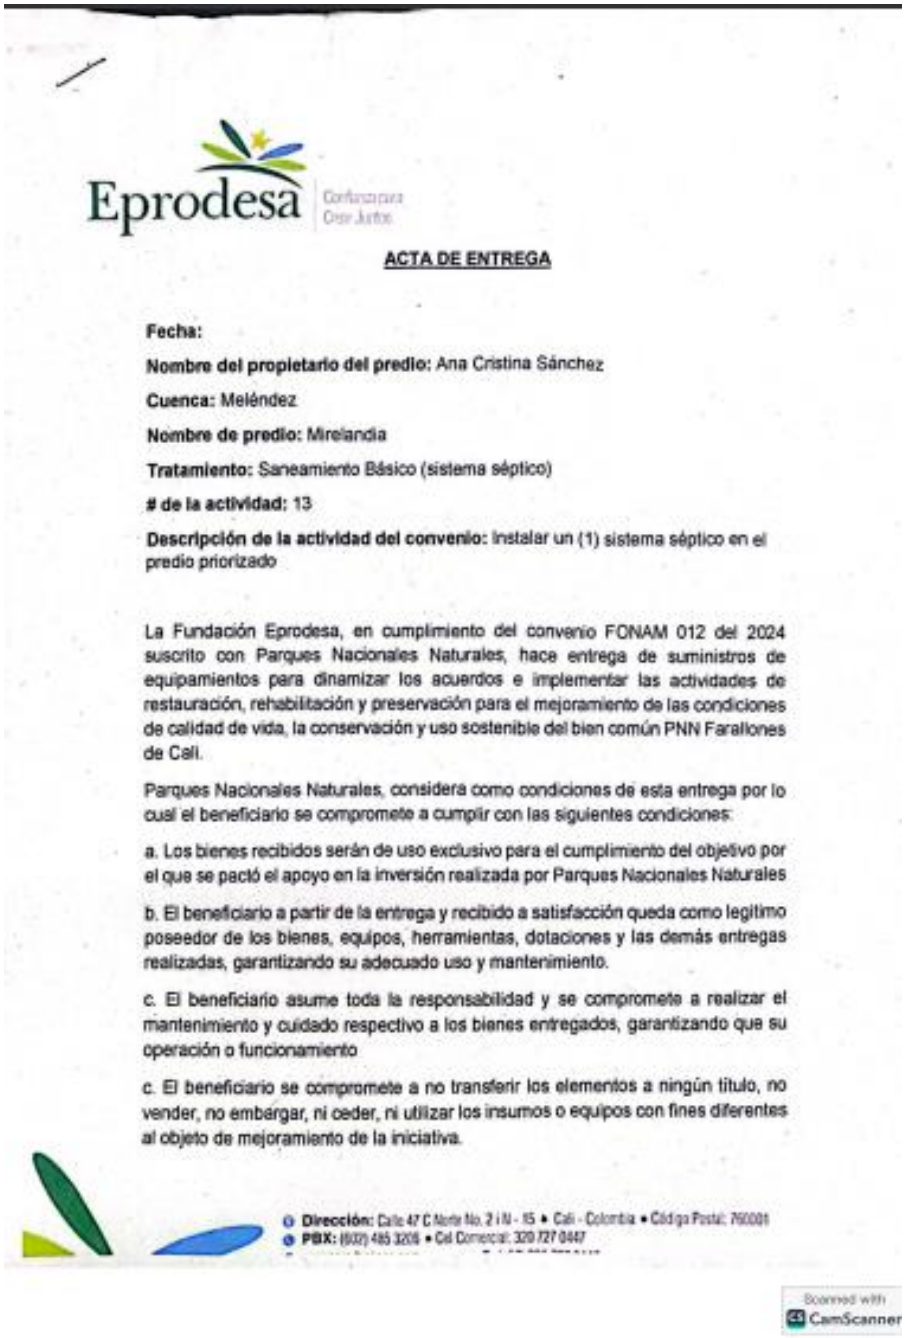

Eprodesa Confianza para Crear Juntos

**ACTA DE ENTREGA**

**Fecha:**

**Nombre del propietario del predio:** Ana Cristina Sánchez

**Cuenca:** Meléndez

**Nombre de predio:** Mirelandia

**Tratamiento:** Saneamiento Básico (sistema séptico)

**# de la actividad:** 13

**Descripción de la actividad del convenio:** Instalar un (1) sistema séptico en el predio priorizado

La Fundación Eprodesa, en cumplimiento del convenio FONAM 012 del 2024 suscrito con Parques Nacionales Naturales, hace entrega de suministros de equipamientos para dinamizar los acuerdos e implementar las actividades de restauración, rehabilitación y preservación para el mejoramiento de las condiciones de calidad de vida, la conservación y uso sostenible del bien común PNN Farallones de Cali.

Parques Nacionales Naturales, considera como condiciones de esta entrega por lo cual el beneficiario se compromete a cumplir con las siguientes condiciones:

a. Los bienes recibidos serán de uso exclusivo para el cumplimiento del objetivo por el que se pactó el apoyo en la inversión realizada por Parques Nacionales Naturales


b. El beneficiario a partir de la entrega y recibido a satisfacción queda como legítimo poseedor de los bienes, equipos, herramientas, dotaciones y las demás entregas realizadas, garantizando su adecuado uso y mantenimiento.

c. El beneficiario asume toda la responsabilidad y se compromete a realizar el mantenimiento y cuidado respectivo a los bienes entregados, garantizando que su operación o funcionamiento

c. El beneficiario se compromete a no transferir los elementos a ningún título, no vender, no embargar, ni ceder, ni utilizar los insumos o equipos con fines diferentes al objeto de mejoramiento de la iniciativa.

Dirección: Calle 47 C Norte No. 2 i N - 15 • Cali - Colombia • Código Postal: 760001
PBX: (602) 485 3206 • Cel Comercial: 320 727 0447

Scanned with CamScanner

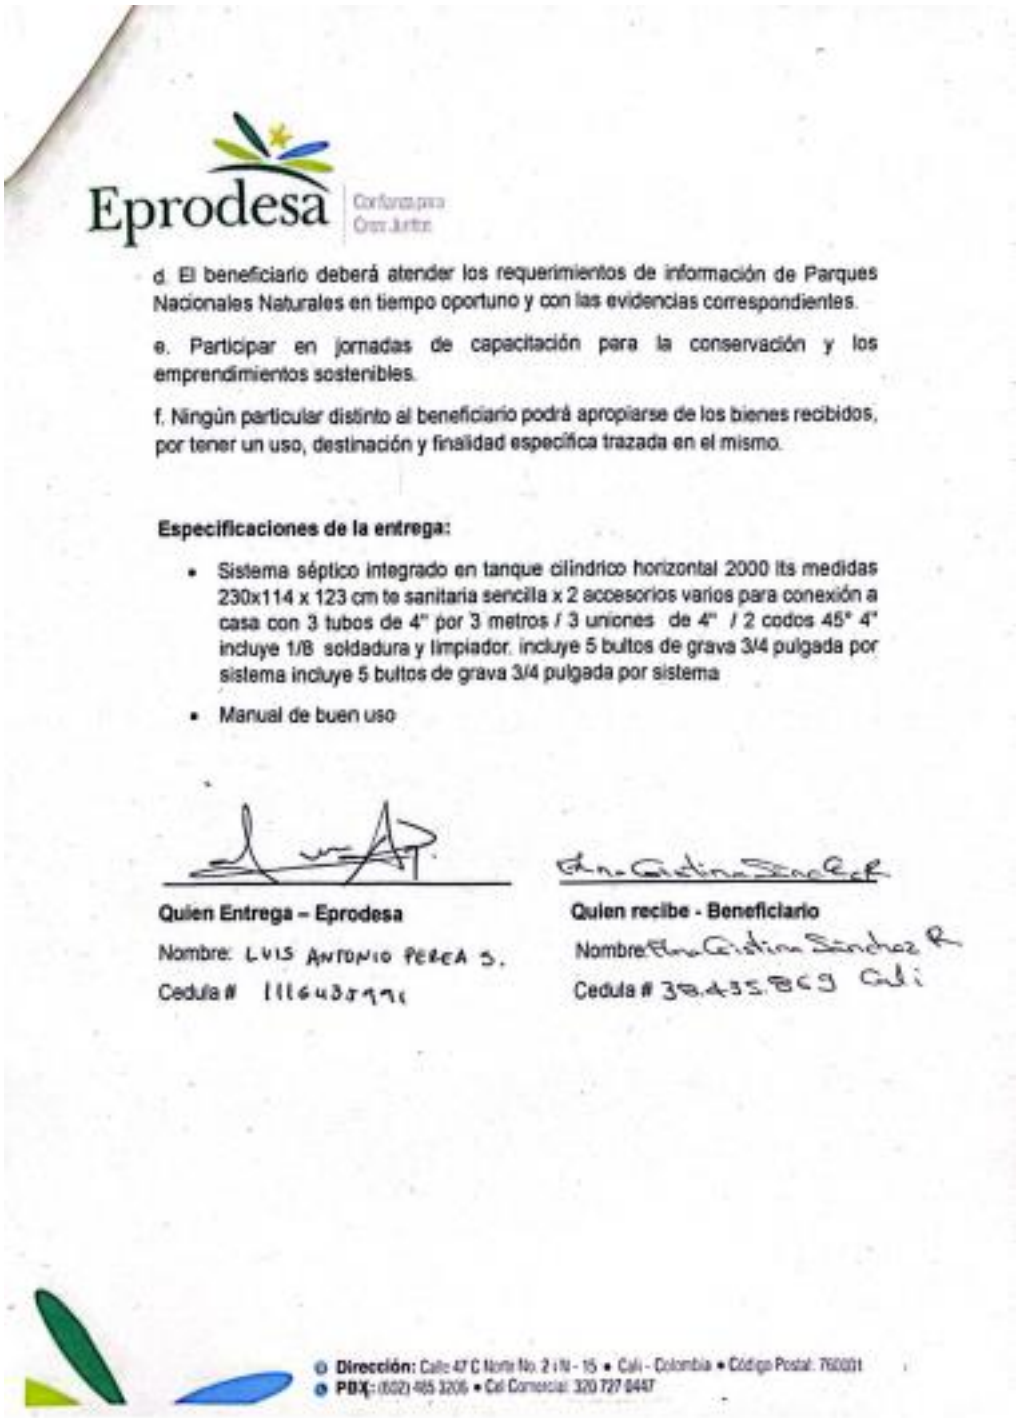

Eprodesa
Confianza para
Crear Juntos

d. El beneficiario deberá atender los requerimientos de información de Parques Nacionales Naturales en tiempo oportuno y con las evidencias correspondientes.

e. Participar en jornadas de capacitación para la conservación y los emprendimientos sostenibles.

f. Ningún particular distinto al beneficiario podrá apropiarse de los bienes recibidos, por tener un uso, destinación y finalidad específica trazada en el mismo.

**Especificaciones de la entrega:**

- Sistema séptico integrado en tanque cilindrico horizontal 2000 lts medidas 230x114 x 123 cm te sanitaria sencilla x 2 accesorios varios para conexión a casa con 3 tubos de 4" por 3 metros / 3 uniones de 4" / 2 codos 45° 4" incluye 1/8 soldadura y limpiador. incluye 5 bultos de grava 3/4 pulgada por sistema incluye 5 bultos de grava 3/4 pulgada por sistema
- Manual de buen uso

**Quien Entrega – Eprodesa**

Nombre: LUIS ANTONIO PERCA S.

Cedula # 1116437991

**Quien recibe - Beneficiario**

Nombre: Ana Cristina Sánchez R

Cedula # 38.435.869 Cali

Dirección: Calle 47 C Norte No. 2 i N - 15 • Cali - Colombia • Código Postal: 760001
PBX: (602) 485 3206 • Cel Comercial: 320 727 0447

Scanned with CamScanner

Eprodesa
Confianza para Crear Juntos

**Registro fotográfico de entrega e instalación**







**Dirección:** Calle 47 C Norte No. 2 i N - 15 • Cali - Colombia • Código Postal: 760001
**PBX:** (602) 485 3206 • Cel Comercial: 320 727 0447
www.eprodesaong.com (+57) 320 727 0447

Eprodesa
Confianza para
Crear Juntos





**Dirección:** Calle 47 C Norte No. 2 i N - 15 • Cali - Colombia • Código Postal: 760001
**PBX:** (602) 485 3206 • Cel Comercial: 320 727 0447
www.eprodesaong.com (+57) 320 727 0447

**Manual de buen uso.**




Convenio 012 FONAM 2024 (PNN Farallones de Cali – Eprodesa ONG)

Asistencia técnica a comunidades rurales en la operación y mantenimiento de pozos sépticos

2024

(Copiado y adaptado de la guía "Programa de intervención de asistencia técnica a comunidades rurales en la operación y mantenimiento de pozos sépticos de la UESVALLE y la Gobernacion del Valle del Cauca")

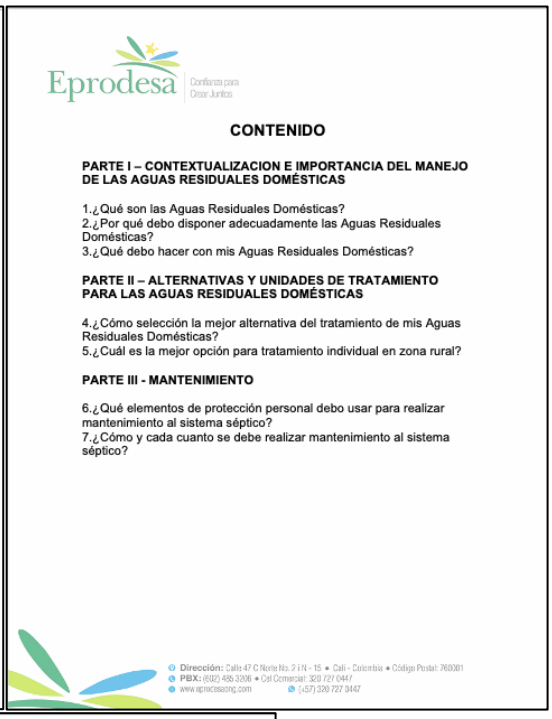

CONTENIDO


PARTE I – CONTEXTUALIZACION E IMPORTANCIA DEL MANEJO DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS

1.¿Qué son las Aguas Residuales Domésticas?
2.¿Por qué debo disponer adecuadamente las Aguas Residuales Domésticas?
3.¿Qué debo hacer con mis Aguas Residuales Domésticas?

PARTE II – ALTERNATIVAS Y UNIDADES DE TRATAMIENTO PARA LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS

4.¿Cómo selección la mejor alternativa del tratamiento de mis Aguas Residuales Domésticas?
5.¿Cuál es la mejor opción para tratamiento individual en zona rural?

PARTE III - MANTENIMIENTO

6.¿Qué elementos de protección personal debo usar para realizar mantenimiento al sistema séptico?
7.¿Cómo y cada cuanto se debe realizar mantenimiento al sistema séptico?





**Verificador ubicado en la carpeta (link de drive):** Actividad 13
