DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
ce6d575784be9c8e836c53ae35a142d3276d055b92c580a62b9295d368a092b25459f9954c905dd218849f928e0f6fe5

Número de Factura: FEV-5
Fecha de Emisión: 29/05/2025
Fecha de Vencimiento: 30/05/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido: AYEM002
Fecha de orden de pedido: 29/05/2025

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: AYMARA EMPRESARIAL S.A.S.
Nombre Comercial: AYMARA EMPRESARIAL S.A.S.
Nit del Emisor: 901260960
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7912

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Paicol
Dirección: CL 6 5 11 LC 1 BRR CENTRO
Teléfono / Móvil: 3173421049
Correo: aymaraempresarial@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE PAICOL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891180194
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Paicol
Dirección: Calle 000
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: presupuesto@paicolhuila.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	OBRA DE CONTRUCCION	PAGO FINAL MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE FERIAS DEL MUNICIPIO DE PAICOL HUILA EN EL MARCO DE LA VERSION XLI DE LA FERIA CULTURAL COMERCIAL AGROINDUSTRIAL TURISTICA MERCADO GANADERO Y VI MERCADO CAMPESINO	NIU	1,00	$ 39.854.272,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 39.854.272,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
29/05/2025 13:08:03
Documento validado por la DIAN:
29/05/2025 13:08:04
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		39854272
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		39854272
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		39854272
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 39854272

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		39.854.272,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		39.854.272,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		39.854.272,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 39.854.272,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764086221868 Rango desde: 1 Rango hasta: 100 Vigencia: 2026-12-27

		MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE FERIAS DEL MUNICIPIO DE PAICOL, HUILA, EN EL MARCO DE LA VERSIÓN XLI DE LA FERIA CULTURAL, COMERCIAL, AGROINDUSTRIAL, TURÍSTICA, MERCADO GANADERO Y VI MERCADO CAMPESINO.									
	CONTRATO N°:	109 DE 2025	CONTRATISTA:	AYMARA EMPRESARIAL S.A.S.	FECHA INICIO:	25 DE ABRIL DE 2025	PLAZO INICIAL:	1 MES	VALOR TOTAL:	$39.854.273	
	TIPO CONTRATO:	DE OBRA	NIT:	901260960-9	OTRO SI N° 01:	N.A.	PRÓRROGA N° 1:	N.A.	ACTA N°:	2	
	MODALIDAD:	MÍNIMA CUANTÍA	REPRES. LEGAL:	LORENA RAMÍREZ ALVARADO	SUSPENSIÓN N° 1:	N.A.	PRÓRROGA N° 2:	N.A.	FECHA ACTA:	17 DE MAYO DE 2025	
	PÓLIZA CUMPLIMI:	CHU-100046252	C.C.	1.079.410.124	REINICIO:	N.A.	PLAZO TOTAL:	1 MES	VALOR ACTA:	$39.854.272	
ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAICOL - DEPARTAMENTO DEL HUILA	PÓLIZA R. CIVIL:	CHU-100008616	INTERVENTOR:	N.A.	OTRO SI N° 02	N.A.	VALOR INICIAL:	$36.560.880	% EJECUTADO:	$ 39.854.272	
	CDP:	2025000173	REPRES. LEGAL:	N.A.	FECHA TERMINACIÓN:	17 DE MAYO DE 2025	VALOR ADICIONAL 1:	$3.293.393	SALDO POR PAGAR	$1,00	
NIT: 891.180.194-4	RP:	2025000325	SUPERVISOR:	MIGUEL ALBERTO DURÁN SALAS			VALOR ADICIONAL 2:	N.A.			

ACTA FINAL

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES				ACTA PARCIAL N° 1		ACTA PARCIAL N° 2		ACTA FINAL		CONDICIONES FINALES		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL ACTA 2	CANT	VALOR TOTAL ACTA 3	CANT	VALOR TOTAL	CANT ACUMULADA	VALOR TOTALACUMULADO	PORCENTAJE ACUMULADO
A.	RUEDO DE PLAZA DE TOROS Y UNIDADES SANITARIAS				$ 13.635.886				$ 4.249.942						$ 17.885.828		$ 17.885.828	
1.	DEMOLICIONES																	
1.1.	Demolición de muro en ladrillo, incluye retiro de material y disposición final.	M2	3,00	$ 21.000	$ 63.000									3,00	$ 63.000	3,00	$ 63.000	100%
2.	ESTRUCTURAS																	
2.1.	Columna en concreto 3000 PSI, sección de 0.20 m x 0.12 m, h= 3,0 m, incluye acero de refuerzo (4 N° 3 - E 1/4" C/0.15 m).	ML	6,00	$ 115.000	$ 690.000	-	-1,00	$ 115.000	-$ 115.000					5,00	$ 575.000	5,00	$ 575.000	100%
3.	CUBIERTA																	
3.1.	Suministro e instalación de cubierta en teja de zinc, cal. 33; para cubierta de baños.	M2	23,94	$ 45.000	$ 1.077.300	-	-23,94	$ 45.000	-$ 1.077.300					0,00	$ 0	0,00	$ 0	
NP 3.1.1	Suministro e instalación de cubierta en teja Arquitectónica cal. 30; para cubierta de baños.	M2					40,7	$ 50.376	$ 2.050.303					40,70	$ 2.050.303	40,70	$ 2.050.303	100%
3.2.	Suministro e instalación de correa en perfil metálico de 40 x 100 x 1.9 mm x 6 m, incluye soldadura, pintura y anticorrosivo, para cubierta de baños.	ML	12,00	$ 37.800	$ 453.600	+	7,18	$ 37.800	$ 271.404					19,18	$ 725.004	19,18	$ 725.004	100%
4.	PAÑETE																	
4.1.	Resane de pañete 1:4 para muros.	M2	25,20	$ 25.700	$ 647.640	-	-18,00	$ 25.700	-$ 462.600					7,20	$ 185.040	7,20	$ 185.040	100%
5.	PINTURA																	
5.1.	Pintura en vinilo tipo I (1 mano), color blanco para exteriores, incluye ruedo de graderia (1 cara), ruedo de la arena (2 caras) y caseta.	M2	525,00	$ 15.500	$ 8.137.500	+	231,17	$ 15.500	$ 3.583.135					756,17	$ 11.720.635	756,17	$ 11.720.635	100%
5.2.	Pintura en vinilo tipo I (1 mano), color blanco para interior de baños.	M2	36,50	$ 20.200	$ 737.300									36,50	$ 737.300	36,50	$ 737.300	100%
6	CARPINTERÍA METÁLICA																	
6.1.	Suministro e instalación de Portón de 2 hojas, alto: 2,50 m, ancho: 2,00 m; incluye pintura con anticorrosivo y pintura en esmalte color negro.	UND	1,00	$ 1.200.000	$ 1.200.000									1,00	$ 1.200.000	1,00	$ 1.200.000	100%
6.2.	Instalación de puerta metálica para ingreso a caseta, sección de 1,00 m * 2,00 m.	UND	1,00	$ 60.000	$ 60.000									1,00	$ 60.000	1,00	$ 60.000	100%
6.3.	Mantenimiento de portón de ingreso al ruedo de la plaza de toros, incluye soldadura, pintura con anticorrosivo y pintura en esmalte color negro.	UND	1,00	$ 303.548	$ 303.548									1,00	$ 303.548	1,00	$ 303.548	100%
7.	ASEO GENERAL																	
7.1.	Limpieza y lavado general de graderia y baños.	GLB	1,00	$ 265.998	$ 265.998									1,00	$ 265.998	1,00	$ 265.998	100%

B.	CORRALES PLAZA DE FERIAS				$ 11.504.640				-$ 1.692.950					$ 9.811.690			$ 9.811.690	
1.	CUBIERTA BÁSCULA																	
1.1.	Desmonte de cubierta existente.	M2	48,00	$ 15.550	$ 746.400									48,00	$ 746.400	48,00	$ 746.400	100%
1.2.	Suministro e instalación de tuberia aguas negras de 3", Cal. 14, para soporte de cubierta, 12 puntos con longitud de 2.82 m, según diseño. Cada punto incuye excavación manual h= 0.50 m y dado en concreto de 3000 PSI, sección de 0.20 m x 0.20 m x 0.50 m, pintura en anticorrosivo para tuberia.	UND	12,00	$ 184.317	$ 2.211.804									12,00	$ 2.211.804	12,00	$ 2.211.804	100%
1.3.	Suministro e instalación de correa en perfil metálico de 40 x 100 x 1.9 mm, x 6 m, incluye soldadura, pintura y anticorrosivo; según diseño.	ML	150,80	$ 37.800	$ 5.700.240	-	-80,4	$ 37.800	-$ 3.039.120					70,40	$ 2.661.120	70,40	$ 2.661.120	100%
1.4.	Suministro e instalación de cubierta en teja de zinc, cal. 33; para cubierta de báscula.	M2	48,00	$ 45.000	$ 2.160.000	-	-48	$ 45.000	-$ 2.160.000					0,00	$ 0	0,00	$ 0	
NP 1.4.1.	Suministro e instalación de cubierta en teja Arquitectónica cal. 30; para cubierta de báscula.	M2					69,6	$ 50.376	$ 3.506.170					69,60	$ 3.506.170	69,60	$ 3.506.170	100%
2	CORRALES																	
2.1.	Suministro e instalación de red hidráulica para corrales, incluye excavación y accesorios para su instalación, según diseño.	ML	42,00	$ 16.338	$ 686.196									42,00	$ 686.196	42,00	$ 686.196	100%
C.	INGRESO A LA PLAZA DE FERIAS				$ 2.557.110				-$ 61.997					$ 2.495.113			$ 2.495.113	
3.	SUMIDERO																	
3.1.	Excavación manual sección de 0,6 m x 4 m, h= 0,50 m. Incluye retiro y disposición del material sobrante.	M3	1,80	$ 32.000	$ 57.600									1,80	$ 57.600	1,80	$ 57.600	100%
3.2.	Construcción de caja de sumidero en concreto reforzado de 3000 PSI y acero de 1/2", sección de 0,6 m x 4 m; h= 0,4; e muro= 0,15 m y e placa piso= 0,10 m; según diseño. Incluye recebo compactado e= 0,1 m.	ML	4,00	$ 402.961	$ 1.611.844									4,00	$ 1.611.844	4,00	$ 1.611.844	100%
3.3	Suministro e instalación de reja metálica, en ángulo de 1 1/2" x 3/16" y platina de 1 1/2" x 3/16", c/0,25 M.	ML	4,00	$ 206.658	$ 826.632	-	-0,3	$ 206.658	-$ 61.997					3,70	$ 764.635	3,70	$ 764.635	100%
3.4.	Suministro e instalación de tuberia PVC de 4 pulgadas para desague.	ML	2,00	$ 30.517	$ 61.034									2,00	$ 61.034	2,00	$ 61.034	100%
TOTAL COSTOS DIRECTOS					$ 27.697.636				$ 2.494.994					$ 30.192.630			$ 30.192.630	
(A.I.U = 32%)					$ 8.863.244				$ 798.398					$ 9.661.642			$ 9.661.642	
ADMINISTRACION (A=25%)				25%	$ 6.924.409				$ 623.749					$ 7.548.158			$ 7.548.158	
IMPREVISTOS (I=2%)				2%	$ 553.953				$ 49.900					$ 603.853			$ 603.853	
UTILIDAD (U=5%)				5%	$ 1.384.882				$ 124.750					$ 1.509.632			$ 1.509.632	
VALOR TOTAL OBRA					$ 36.560.880				$ 3.293.393					$ 39.854.272			$ 39.854.272	

VALOR DEL CONTRATO: TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS ($36.560.880,oo)

VALOR ADICIONAL: TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($3.293.393,oo)

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ($39.854.273,oo)

VALOR DE LA PRESENTE ACTA: **TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($39.854.272,oo)**

ING. MIGUEL ALBERTO DURAN SALAS.
Secretario de Planeación e Infraestructura
SUPERVISOR

AYMARA EMPRESARIAL S.A.S.
LORENA RAMÍREZ ALVARADO
CONTRATISTA

Nit. 901.260.960-9
E-mail. aymaraempresarial@gmail.com
Tel. 3173431114

COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN

CONTRATO DE OBRA N° 109 de 2025, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PAICOL, HUILA Y AYMARA EMPRESARIAL S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:

"MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE FERIAS DEL MUNICIPIO DE PAICOL, HUILA, EN EL MARCO DE LA VERSIÓN XLI DE LA FERIA CULTURAL, COMERCIAL, AGROINDUSTRIAL, TURÍSTICA, MERCADO GANADERO Y VI MERCADO CAMPESINO"

INFORME FINAL DE OBRA

SUPERVISOR

MIGUEL ALBERTO DURAN SALAS
SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

PERIODO DE PAGO
DEL 25 DE ABRIL DE 2025 AL 17 DE MAYO DE 2025

Nit. 901.260.960-9
E-mail. aymaraempresarial@gmail.com
Tel. 3173431114

INTRODUCCIÓN

En el presente Informe Final de obra, se describen las actividades ejecutadas por el contratista AYMARA EMPRESARIAL S.A.S, desde el día veinticinco (25) de abril al día diecisiete (17) de mayo de 2025, con el fin de dar cumplimiento total al Contrato de Obra N° 109 de 2025, cuyo objeto es MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE FERIAS DEL MUNICIPIO DE PAICOL, HUILA, EN EL MARCO DE LA VERSIÓN XLI DE LA FERIA CULTURAL, COMERCIAL, AGROINDUSTRIAL, TURÍSTICA, MERCADO GANADERO Y VI MERCADO CAMPESINO.

Se hace descripción técnica y fotográfica de las actividades de obra ejecutadas en el periodo de pago mencionado, mostrando el desarrollo del contrato y el resultado obtenido, dando alcance satisfactorio al objeto contratado.

Nit. 901.260.960-9
E-mail. aymaraempresarial@gmail.com
Tel. 3173431114

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

MUNICIPIO	PAICOL – HUILA
CONTRATO No.	CONTRATO DE OBRA N° 109 DE 2025.
ID CONTRATO EN SECOP II	CO1.PCCNTR.7786921
OBJETO	MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE FERIAS DEL MUNICIPIO DE PAICOL, HUILA, EN EL MARCO DE LA VERSIÓN XLI DE LA FERIA CULTURAL, COMERCIAL, AGROINDUSTRIAL, TURÍSTICA, MERCADO GANADERO Y VI MERCADO CAMPESINO.
CONTRATISTA	AYMARA EMPRESARIAL S.A.S.
CC. NO. / NIT.	901260960-9
REPRESENTANTE LEGAL	LORENA RAMÍREZ ALVARADO.
C.C.	1.079.410.124 DE TESALIA HUILA.
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	El contrato será ejecutado desde la suscripción del acta de inicio, en un plazo de UN (01) MES. El Contrato mantendrá vigencia por el plazo de ejecución y vigencia de cuatro (04) meses más; de tal forma que, si llegando ese día, el contrato no se hubiere ejecutado en su totalidad, tanto el contratista como el contratante, aceptan liquidar el contrato liberando a favor del Municipio la suma no ejecutada. El plazo pactado será cumplido con sujeción a lo previsto en la invitación. Las partes podrán dar por terminado el contrato de forma anticipada sin que esto afecte los valores asegurados y la vigencia de las pólizas expedidas.
VALOR DEL CONTRATO	El valor del contrato es por la suma de TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS ($36.560.880,oo) M/CTE IVA INCLUIDO, equivalentes a 25,68 SMMLV para el año de aceptación de la oferta 2025.
VALOR A ADICIONAR	TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($3.293.393,oo) M/CTE.
VALOR TOTAL	TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ($39.854.273,oo) M/CTE.
FORMA DE PAGO.	El Municipio de Paicol Huila, pagará al Contratista el valor resultante del contrato en un (01) solo pago, previa ejecución del objeto contractual, con la presentación de la factura o documentos equivalente y certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto

	contractual debidamente suscrita por el supervisor de la presente actuación contractual. Todo pago está sujeto a la Programación Anual Mensualidad de Caja PAC del Municipio, sin generar intereses moratorios. La entrega de los elementos o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no se hallan supeditados, en ningún caso, al giro del Municipio. **Nota 1.-** Los pagos se realizarán, presentación de la factura o documento equivalente, informe de actividades, la acreditación del pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato. **Nota 2.-** El contratista deberá informar al Municipio la cuenta bancaria (ahorros o corriente), abierta a su nombre, en la cual le serán consignados o transferidos electrónicamente, los pagos que por concepto de la cancelación del valor del contrato le efectúe El Municipio.
C.D.P. INICIAL No.	2025000173 del 13 de marzo de 2025.
C.D.P. A ADICIONAR No.	2025000173 del 13 de marzo de 2025.
R.P. INICIAL No.	2025000325 del 15 de abril de 2025.
ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL.
PÓLIZA CUMPLIMIENTO Y CALIDAD DEL BIEN	CHU-100046252
PÓLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	CHU-100008616
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS	Veinticinco (25) de abril de 2025.
FECHA DE INICIO	Veinticinco (25) de abril de 2025.
FECHA DEL OTROSÍ N° 01	Nueve (09) de mayo de 2025.
SUPERVISOR	**MIGUEL ALBERTO DURÁN SALAS,** Secretario de Planeación y Obras Públicas.

2. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

El presente Contrato de obra se generó de la participación en el Proceso de Contratación INVITACIÓN N° DHMP-IMC-SPOP-011 DE 2025, publicada en el Portal Único de Contratación SECOP II por parte de la Alcaldía de Municipal de Paicol Huila, el cual fue adjudicado a la Empresa AYMARA EMPRESARIAL S.A.S., identificada con NIT 901260960-9, representada Legalmente por la señora LORENA RAMÍREZ ALVARADO, identificada con cedula de ciudadanía N° 1.079.410.124 de Tesalia Huila, suscrito mediante Comunicación de Aceptación No. 109 del 2025, celebrado entre las partes.

El Contrato de obra dio inicio el día veinticinco (25) de abril de 2025, con plazo de ejecución de UN (01) MES, y por valor de TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS ($36.560.880,oo) M/CTE IVA INCLUIDO, equivalentes a 25,68 SMMLV para el año de aceptación de la oferta 2025.

Que la ejecución del Contrato de obra se desarrollo en la Plaza de Ferias del Municipio de Paicol.

Que iniciada la ejecución de las actividades de obra, la Asociación de Ganaderos del Municipio de Paicol Huila, solicitó a la Alcaldía Municipal el Cambio de diseño de la cubierta de la báscula ubicada en la Plaza de Ferias, manifestando: *"... que la cubierta existente está muy antigua y se construyó solo por la necesidad de proteger la báscula, sin embargo, en la actualidad por funcionalidad se requiere una cubierta más extensa, por lo que recomendamos se realice cubierta a un (01) agua y de 6 metros de ancho por 11 metros de largo; cambiando el diseño actual de cubierta a dos (02) aguas de 4 metros de ancho por 11 metros de largo..."*

Lo anterior genero la suscripción de Acta de Justificación para Mayores y menores cantidades de obra, creación de nuevos ítems y Adicional N° 01 de 2025, donde se expuso:

"...se realizó visita técnica por parte de la Secretaría de Planeación y Obras Públicas del Municipio de Paicol al sitio donde se desarrolla la obra con el fin de verificar la ejecución de los ítems del contrato y evaluar la solicitud presentada por parte de la Asociación de Ganaderos de Paicol Huila "ASOGANPAI", relacionada con el cambio de diseño de la cubierta en el área donde funciona la báscula."

Que el balance de obra se dio en base a las siguientes consideraciones:

"

1. *Que con relación a la solicitud de la cubierta donde funciona la báscula, se replanteó el diseño, con el fin de mejorar el espacio donde se realizan exposiciones de Alta Genética en los eventos feriales del Municipio y donde se presta servicio de corrales, ampliando el área de cubierta a 66 m² (11 m x 6 m) y a un (01) agua, como se muestra en el diseño adjunto.*

2. *Que se verificó que con relación al ítem de pintura es necesario ejecutar mayor cantidad de metros cuadrados a los establecidos en el presupuesto oficial, debido que la parte exterior*

del ruedo de la Plaza de Ferias no se contempló para ser intervenida, pero se encuentra manchada y con afectación de la pintura aplicada el año anterior.

3. *Que con relación a la instalación de cubierta se determinó el cambio de la teja de zinc cal. 33 por la teja arquitectónica cal. 30, debido que son menos propensas a curvarse, agrietarse con el tiempo y presentan mayor durabilidad y resistencia (más gruesas) contra los daños causados por el viento y hojas secas.*

4. *Que, durante la ejecución de las actividades del Contrato, se han generaron mayores y menores cantidades de obra en los siguientes ítems:*

A. RUEDO DE PLAZA DE TOROS Y UNIDADES SANITARIAS

2.1. Columna en concreto 3000 PSI, sección de 0.20 m x 0.12 m, h= 3,0 m, incluye acero de refuerzo (4 N° 3 - E 1/4" C/0.15 m): *Para el ítem se ejecutó menos metros lineales por la altura alcanzada de cada una de las columnas, construidas como apoyo para el portón a instalar.*

4.1. Resane de pañete 1:4 para muros: *Para el ítem en mención se ejecutó menor cantidad de resane en obra.*

C. INGRESO A LA PLAZA DE FERIAS

3.3. Suministro e instalación de reja metálica, en ángulo de 1 1/2" x 3/16" y platina de 1 1/2" x 3/16", c/0,25 M: *En el presente ítem se disminuyen los metros lineales de reja metálica a instalar debido que se reduce la longitud por el espesor del muro..."*

Que adicional a la Justificación de Mayores y menores cantidades de obra, el Municipio con el fin de dar cumplimiento al alcance del objeto autorizo adicionar la suma de TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($3.293.393,oo) M/CTE., para un valor total del Contrato de obra de TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ($39.854.273,oo) M/CTE.

Que la suscripción del Otrosí N° 01 al Contrato de obra, se dio el día nueve (09) de mayo de 2025, quedando establecido el presupuesto final del proyecto.

Que una vez desarrollada la obra en su totalidad, se dio terminación el día diecisiete (17) de mayo de 2025.

Nit. 901.260.960-9
E-mail. aymaraempresarial@gmail.com
Tel. 3173431114

3. PRESUPUESTO DE OBRA

Que el Presupuesto final del Contrato de obra N° 109 de 2025, se estableció de la siguiente manera:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT ACUM.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
A.	**RUEDO DE PLAZA DE TOROS Y UNIDADES SANITARIAS**				**$ 17.885.828**
1.	**DEMOLICIONES**				
1.1.	DEMOLICIÓN DE MURO EN LADRILLO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICIÓN FINAL.	M2	3,00	$ 21.000	$ 63.000
2.	**ESTRUCTURAS**				
2.1.	COLUMNA EN CONCRETO 3000 PSI, SECCIÓN DE 0.20 M X 0.12 M, H= 3,0 M, INCLUYE ACERO DE REFUERZO (4 N° 3 - E 1/4" C/0.15 M).	ML	5,00	$ 115.000	$ 575.000
3.	**CUBIERTA**				
3.1.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA DE ZINC, CAL. 33; PARA CUBIERTA DE BAÑOS.	M2	0,00	$ 45.000	$ 0
NP 3.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA ARQUITECTÓNICA CAL. 30; PARA CUBIERTA DE BAÑOS.	M2	40,70	$ 50.376	$ 2.050.303
3.2.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREA EN PERFIL METÁLICO DE 40 X 100 X 1.9 MM X 6 M, INCLUYE SOLDADURA, PINTURA Y ANTICORROSIVO, PARA CUBIERTA DE BAÑOS.	ML	19,18	$ 37.800	$ 725.004
4.	**PAÑETE**				
4.1.	RESANE DE PAÑETE 1:4 PARA MUROS.	M2	7,20	$ 25.700	$ 185.040
5.	**PINTURA**				
5.1.	PINTURA EN VINILO TIPO I (1 MANO), COLOR BLANCO PARA EXTERIORES, INCLUYE RUEDO DE GRADERÍA (1 CARA), RUEDO DE LA ARENA (2 CARAS) Y CASETA.	M2	756,17	$ 15.500	$ 11.720.635
5.2.	PINTURA EN VINILO TIPO I (1 MANO), COLOR BLANCO PARA INTERIOR DE BAÑOS.	M2	36,50	$ 20.200	$ 737.300
6	**CARPINTERÍA METÁLICA**				
6.1.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTÓN DE 2 HOJAS, ALTO: 2,50 M, ANCHO: 2,00 M; INCLUYE PINTURA CON ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE COLOR NEGRO.	UND	1,00	$ 1.200.000	$ 1.200.000
6.2.	INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA PARA INGRESO A CASETA, SECCIÓN DE 1,00 M * 2,00 M.	UND	1,00	$ 60.000	$ 60.000
6.3.	MANTENIMIENTO DE PORTÓN DE INGRESO AL RUEDO DE LA PLAZA DE TOROS, INCLUYE SOLDADURA, PINTURA CON ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE COLOR NEGRO.	UND	1,00	$ 303.548	$ 303.548
7.	**ASEO GENERAL**				

Nit. 901.260.960-9
E-mail. aymaraempresarial@gmail.com
Tel. 3173431114

7.1.	LIMPIEZA Y LAVADO GENERAL DE GRADERÍA Y BAÑOS.	GLB	1,00	$ 265.998	$ 265.998
B.	**CORRALES PLAZA DE FERIAS**				**$ 9.811.690**
1.	**CUBIERTA BÁSCULA**				
1.1.	DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE.	M2	48,00	$ 15.550	$ 746.400
1.2.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA AGUAS NEGRAS DE 3", CAL. 14, PARA SOPORTE DE CUBIERTA, 12 PUNTOS CON LONGITUD DE 2.82 M, SEGÚN DISEÑO. CADA PUNTO INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL H= 0.50 M Y DADO EN CONCRETO DE 3000 PSI, SECCIÓN DE 0.20 M X 0.20 M X 0.50 M, PINTURA EN ANTICORROSIVO PARA TUBERÍA.	UND	12,00	$ 184.317	$ 2.211.804
1.3.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREA EN PERFIL METÁLICO DE 40 X 100 X 1.9 MM, X 6 M, INCLUYE SOLDADURA, PINTURA Y ANTICORROSIVO; SEGÚN DISEÑO.	ML	70,40	$ 37.800	$ 2.661.120
1.4.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA DE ZINC, CAL. 33; PARA CUBIERTA DE BÁSCULA.	M2	0,00	$ 45.000	$ 0
NP 1.4.1.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA ARQUITECTÓNICA CAL. 30; PARA CUBIERTA DE BÁSCULA.	M2	69,60	$ 50.376	$ 3.506.170
2	**CORRALES**				
2.1.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED HIDRÁULICA PARA CORRALES, INCLUYE EXCAVACIÓN Y ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN, SEGÚN DISEÑO.	ML	42,00	$ 16.338	$ 686.196
C.	**INGRESO A LA PLAZA DE FERIAS**				**$ 2.495.113**
3.	**SUMIDERO**				
3.1.	EXCAVACIÓN MANUAL SECCIÓN DE 0,6 M X 4 M, H= 0,50 M. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL SOBRANTE.	M3	1,80	$ 32.000	$ 57.600
3.2.	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE SUMIDERO EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI Y ACERO DE 1/2", SECCIÓN DE 0,6 M X 4 M; H= 0,4; E MURO= 0,15 M Y E PLACA PISO= 0,10 M; SEGÚN DISEÑO. INCLUYE RECEBO COMPACTADO E= 0,1 M.	ML	4,00	$ 402.961	$ 1.611.844
3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA, EN ÁNGULO DE 1 1/2" X 3/16" Y PLATINA DE 1 1/2" X 3/16", C/0,25 M.	ML	3,70	$ 206.658	$ 764.635
3.4.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 4 PULGADAS PARA DESAGÜE.	ML	2,00	$ 30.517	$ 61.034
TOTAL COSTOS DIRECTOS					**$ 30.192.630**
(A.I.U = 32%)					**$ 9.661.642**
ADMINISTRACIÓN (A=25%)					$ 7.548.158
IMPREVISTOS (I=2%)					$ 603.853

Nit. 901.260.960-9
E-mail. aymaraempresarial@gmail.com
Tel. 3173431114

UTILIDAD (U=5%)			$ 1.509.632
VALOR TOTAL OBRA			**$ 39.854.272**

4. BALANCE FINANCIERO


Valor inicialmente contratado:	$ 36.560.880	
Valor adicional:	$ 3.293.393	
Valor Acta final:		$ 39.854.272
Saldo a favor del Municipio:		$ 1,00
Sumas iguales:	**$39.854.273**	**$39.854.273**

5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

CAPÍTULOS DE LA SECCIÓN A. PRESUPUESTO RUEDO DE PLAZA DE TOROS Y UNIDADES SANITARIAS.

CAPITULO 1. DEMOLICIONES:


Se realizó demolición de muro en ladrillo con el fin de instalar portón de ingreso a ruedo de la Plaza de Ferias.

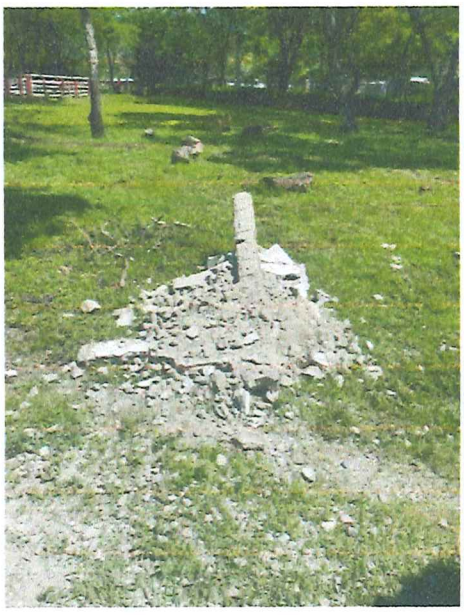
Nit. 901.260.960-9
E-mail. aymaraempresarial@gmail.com
Tel. 3173431114

CAPITULO 2. ESTRUCTURAS:

Se ejecutó la construcción de dos (02) columnas en concreto de 3000 psi, sección de 0.20 m x 0.12 m, acero de refuerzo (4 n° 3 - e 1/4" c/0.15 m), para instalación de portón de ingreso a ruedo de la palza de ferias.



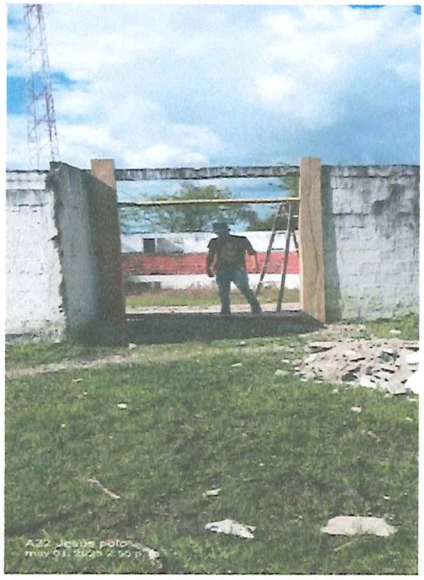

CAPITULO 3. CUBIERTA:

Se ejecutó el desmonte de cubierta existente en baños, se instaló perfil metálico pintado de 40x100 mm y teja arquitectónica cal. 30., con el fin de mejorar las afectaciones que se presentaban en los baños debido al mal estado de la cubierta en teja de zinc.








Nit. 901.260.960-9
E-mail. aymaraempresarial@gmail.com
Tel. 3173431114


CAPITULO 4. PAÑETE:
Se ejecutó resane de muros en los ruedos de la plaza de ferias, baños e ingresos.

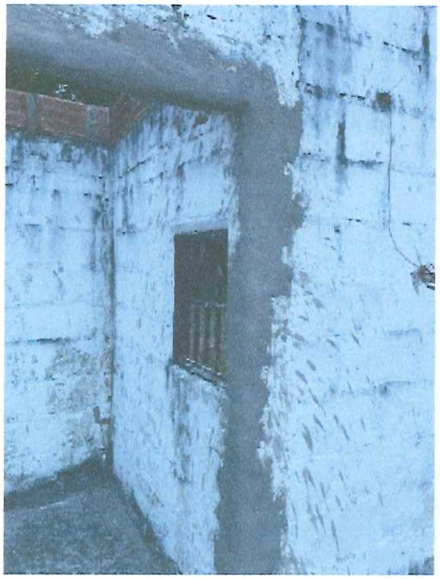





CAPITULO 5. PINTURA:
Se ejecutó pintura en vinilo tipo I color blanco para ruedo de gradería, ruedo de arena, unidades sanitarias y caseta.

Nit. 901.260.960-9
E-mail. aymaraempresarial@gmail.com
Tel. 3173431114

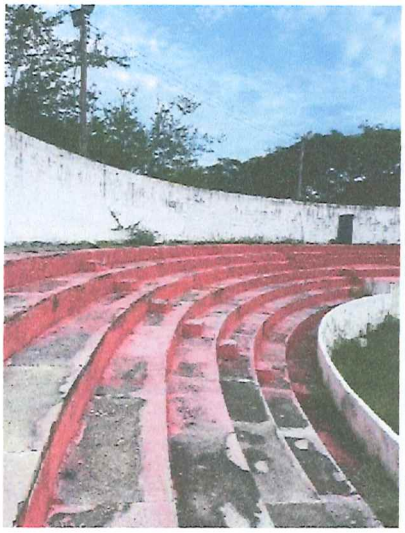





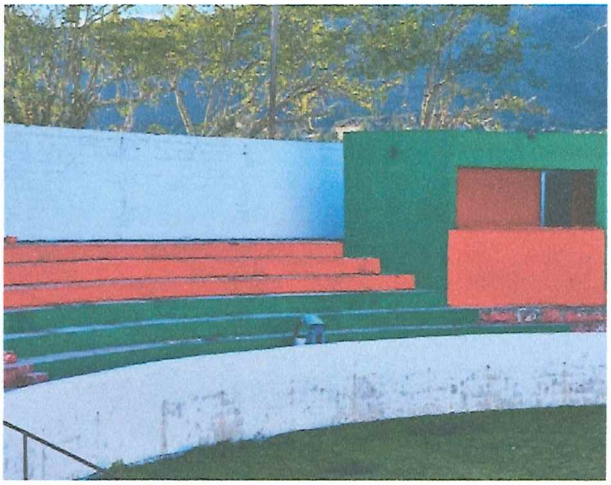

Dirección
Paicol Huila Colombia


Nit. 901.260.960-9
E-mail. aymaraempresarial@gmail.com
Tel. 3173431114

CAPITULO 6. CARPINTERÍA METÁLICA:

Se realizó mantenimiento de portón de ingreso al ruedo de la plaza de toros, instalación de puerta metálica para ingreso a caseta, sección de 1,00 m * 2,00 m y suministro e instalación de portón de 2 hojas, alto: 2,50 m, ancho: 2,00 m, a ingreso de la Plaza de Ferias.





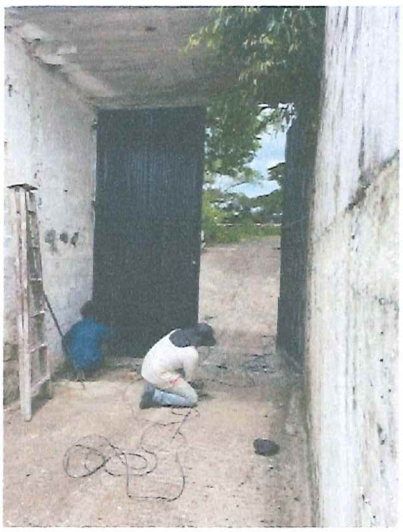




CAPITULO 7. ASEO GENERAL:

Se realizó aseo general a gradería, unidades sanitarias y Plaza de Ferias en general.

Nit. 901.260.960-9
E-mail. aymaraempresarial@gmail.com
Tel. 3173431114



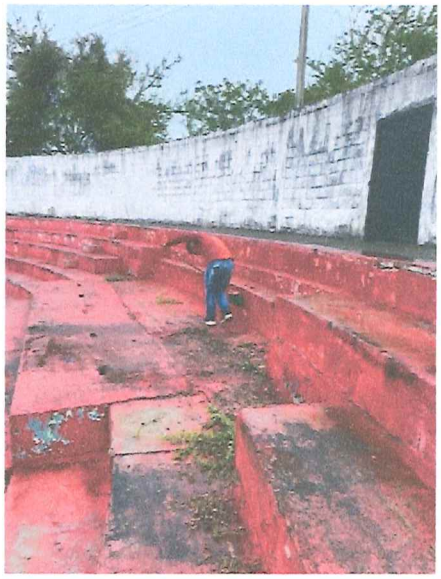






CAPÍTULOS DE LA SECCIÓN B. CORRALES PLAZA DE FERIAS.

CAPITULO 1. CUBIERTA BÁSCULA:

Se ejecutó el desmonte de cubierta existente en la zona donde se encuentra ubicada la Báscula, se suministró e instaló tubería aguas negras de 3", cal. 14, para soporte de cubierta, 12 puntos, cada punto incluyo excavación manual h= 0.50 m y dado en concreto de 3000 psi, sección de 0.20

Nit. 901.260.960-9
E-mail. aymaraempresarial@gmail.com
Tel. 3173431114

m x 0.20 m x 0.50 m., perfil metálico de 40x100 mm y teja arquitectónica cal. 30. A toda la estructura se le aplico anticorrosivo y pintura en esmalte color negro.

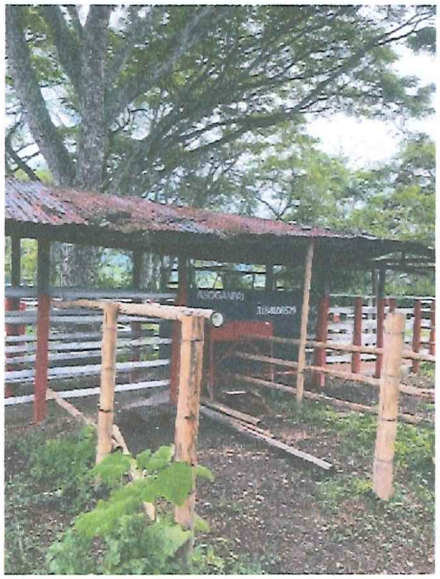





CAPITULO 2. CORRALES:

se ejecutó el suministro e instalación de red hidráulica para corrales, incluyendo excavación y accesorios para su instalación.


Nit. 901.260.960-9
E-mail. aymaraempresarial@gmail.com
Tel. 3173431114




CAPÍTULOS DE LA SECCIÓN C. INGRESO A LA PLAZA DE FERIAS.

CAPITULO 1. SUMIDERO:

Se ejecutó excavación manual sección de 0,6 m x 4 m, h= 0,50 m., construcción de caja de sumidero en concreto reforzado de 3000 psi y acero de 1/2", sección de 0,6 m x 4 m; h= 0,4; e muro= 0,15 m y e placa piso= 0,10 m; suministro e instalación de reja metálica, en ángulo de 1 1/2" x 3/16" y platina de 1 1/2" x 3/16", c/0,25 m y suministro e instalación de tubería PVC de 4 pulgadas para desagüe.

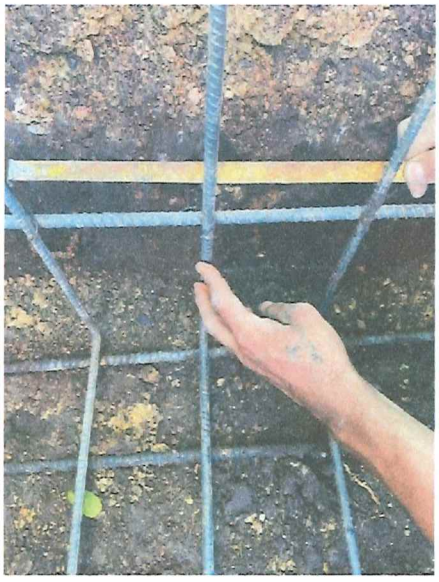






6. OBSERVACIONES:

La realización de las obras trascurrió sin anormalidades relevantes, trabajando con mano de obra calificada y no calificada del municipio de Paicol, cumpliendo con todos los parámetros y especificaciones técnicas dadas por la supervisión del contrato; a lo cual se concluye que las obras se ejecutaron sin ningún problema.

El Contrato se desarrolló a cabalidad con el balance aprobado por la entidad, las actividades que se ejecutan corresponden a lo estipulado en el presupuesto oficial y se ejecutan con el equipo requerido y en buenas condiciones técnicas, de manera que la obra tiene un avance final del 100%.

7. CONCLUSIONES:

- La Empresa AYMARA EMPRESARIAL S.A.S., en su proyección realizada para la ejecución de la Obra de "MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE FERIAS DEL MUNICIPIO DE PAICOL, HUILA, EN EL MARCO DE LA VERSIÓN XLI DE LA FERIA CULTURAL, COMERCIAL, AGROINDUSTRIAL, TURÍSTICA, MERCADO GANADERO Y VI MERCADO CAMPESINO", ha dado un cumplimiento a un 100% por ciento de las metas propuestas, cumpliendo con las expectativas de la entidad contratante, en cuento a tiempo y calidad de la Obra.
- Las obras se ejecutaron con el equipo requerido, mano de obra apropiada y en buenas condiciones técnicas.

Nit. 901.260.960-9
E-mail. aymaraempresarial@gmail.com
Tel. 3173431114

- Los materiales utilizados cumplen con las especificaciones de calidad y empleados en las dosificaciones recomendadas alcanzaron las especificaciones para cada uno de los ítems relacionados.

AYMARA EMPRESARIAL S.A.S.
RL LORENA RAMÍREZ ALVARADO

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901260960	9	AYMARA EMPRESARIAL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CALLE 8 # 11 -52	PAICOL-HUILA	3174210491	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1514202313	9486857784	E	2025/04/14	2025/05/29	BANCO DAVIVIENDA	45	$107,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION													SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	Irl	Fecha Inicio Irl	Fecha Fin Irl	Vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				$45,600						$35,600	
																				$45,600						$35,600	
																				$45,600						$35,600	
						$1,200,000	No	Variable	PORVENIR	6	$284,700	16%	SIN RIESGO	$45,600	$0	$0	$0	$0	$0	$45,600		NUEVA E.P.S.	6	$284,700	12.5%	$35,600	
																				$45,600						$35,600	

2025/05/29 11:26 a.m.

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerada SENA e ICBF
	$35,600						$9,600						$1,500				$4,800		$7,200		$0		$0	
	$35,600						$9,600						$1,500				$4,800		$7,200		$0		$0	
	$35,600						$9,600						$1,500				$4,800		$7,200		$0		$0	
$0	$35,600		COMFAMILIAR HUILA	6	$240,000	4%	$9,600	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	6	$284,700	0.522%	1	$1,500	6	$240,000	2%	$4,800	3%	$7,200	0%	$0	0%	$0	No
	$35,600						$9,600						$1,500				$4,800		$7,200		$0		$0	

2025/05/29 11:26 a.m.

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901260960	9	AYMARA EMPRESARIAL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CALLE 8 # 11 -52	PAICOL-HUILA	3174210491	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1514202313	9486858120	E	2025/05/15	2025/05/29	BANCO DAVIVIENDA	14	$298,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION													SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	Irl	Fecha Inicio Irl	Fecha Fin Irl	Vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				$129,100						$100,900	
																				$129,100						$100,900	
																				$129,100						$100,900	
						$1,200,000	No	Variable	PORVENIR	17	$806,650	16%	SIN RIESGO	$129,100	$0	$0	$0	$0	$0	$129,100		NUEVA E.P.S.	17	$806,650	12.5%	$100,900	
																				$129,100						$100,900	

2025/05/29 11:25 a.m.

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$100,900						$27,200						$4,300				$13,600		$20,400		$0		$0	
	$100,900						$27,200						$4,300				$13,600		$20,400		$0		$0	
$0	$100,900		COMFAMILIAR HUILA	17	$680,000	4%	$27,200	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	17	$806,650	0.522%	1	$4,300	17	$680,000	2%	$13,600	3%	$20,400	0%	$0	0%	$0	No
	$100,900						$27,200						$4,300				$13,600		$20,400		$0		$0	

2025/05/29 11:25 a.m.

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901260960	9	AYMARA EMPRESARIAL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CALLE 8 # 11 -52	PAICOL-HUILA	3174210491	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1514202313	9486861042	E	2025/05/15	2025/05/29	BANCO DAVIVIENDA	14	$111,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION												SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	Irl	Fecha Inicio Irl	Fecha Fin Irl	Vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
																				$46,400						$36,300
																				$46,400						$36,300
						$1,450,000	No	Variable	COLPENSIONES	6	$290,000	16%	SIN RIESGO	$46,400	$0	$0	$0	$0	$0	$46,400		SANITAS	6	$290,000	12.5%	$36,300	
																				$46,400						$36,300

2025/05/29 11:26 a.m.

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES									
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$36,300						$11,600						$1,600				$5,800		$8,700		$0		$0	
	$36,300						$11,600						$1,600				$5,800		$8,700		$0		$0	
	$36,300						$11,600						$1,600				$5,800		$8,700		$0		$0	
$0	$36,300		COMFAMILIAR HUILA	6	$290,000	4%	$11,600	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	6	$290,000	0.522%	1	$1,600	6	$290,000	2%	$5,800	3%	$8,700	0%	$0	0%	$0	No
	$36,300						$11,600						$1,600				$5,800		$8,700		$0		$0	

2025/05/29 11:26 a.m.

Nit. 901.260.960-9
E-mail. aymaraempresarial@gmail.com
Tel. 3173431114

CERTIFIACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES – ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

Luego de examinar de acuerdo con las nomas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la empresa AYMARA EMPRESARIAL SAS, con nit. 901260960-9 certifico que de acuerdo a lo establecido en el articulo 65 de la ley 1819 de 2016, articulo 114-1 del estatuto tributario la sociedad cumple con los parámetros establecidos para estar exonerada del pago de aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), del instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) y las cotizaciones al régimen contributivo de salud, en lo referente a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Dada en Tesalia, Huila a los 29 días del mes de mayo de 2025.

Cordialmente,

Camila Andrea Castillo Prdomo
C.C 1.079.411.965 de Tesalia
R.L. AYMARA EMPRESARIAL S.A.S.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.079.411.965**

CASTILLO PERDOMO
APELLIDOS

CAMILA ANDREA
NOMBRES

Camila Andrea Castillo P.
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **13-MAR-1997**
NEIVA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO


1.58	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

08-ABR-2015 TESALIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-1902500-00712948-F-1079411965-20150604 **0044**45693A 1 42167942


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
297213-T
CAMILA ANDREA
CASTILLO PERDOMO
C.C. 1079411965
RES. INSCRIPCION 1976
DEL 18/05/2022
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL
320528
343709

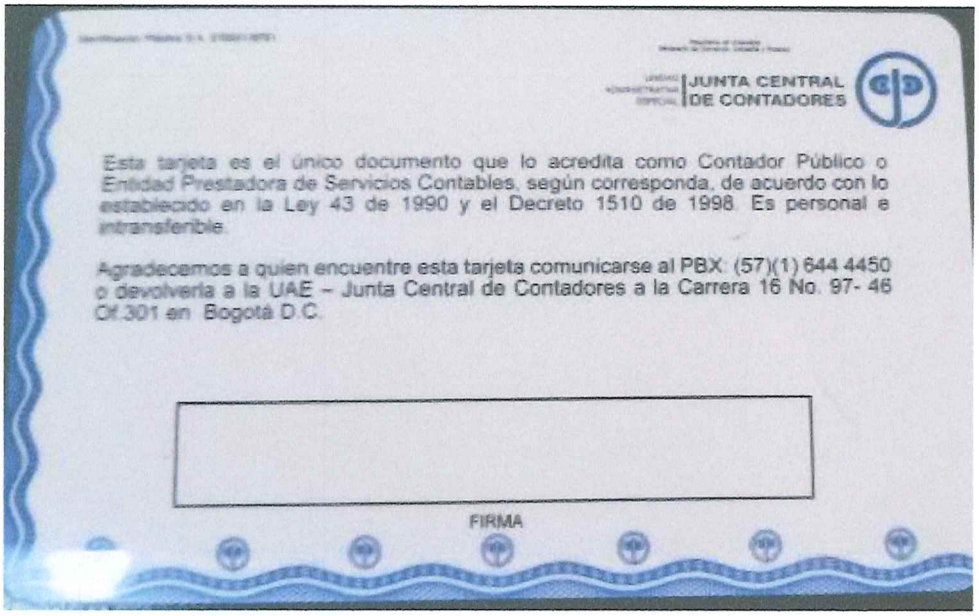
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.
FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E D 9 9 E 2 C 1 1 C B 7 2 5 B D

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CAMILA ANDREA CASTILLO PERDOMO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1079411965 de TESALIA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 297213-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Trabajo

No. Radicado: 08SE2025904139600003628
Fecha: 2025-05-29 07:17:03 am
Remitente: Sede: D. T. HUILA
Depen: INSPECCIÓN LA PLATA
Destinatario AYMARA EMPRESARIAL S.A.S
Anexos: 0 Folios: 1
08SE2025904139600003628

EL SUSCRITO DIRECTOR TERRITORIAL DE HUILA DEL MINISTERIO DEL TRABAJO

HACE CONSTAR QUE:

Una vez verificado el sistema de información de reclamaciones, investigaciones administrativo-laborales y sanciones de la Dirección Territorial de Huila, respecto al solicitante relacionado a continuación, se evidencio lo siguiente:

Radicado de la solicitud	05EE2025904139600002753
Nombre y/o Razón Social	AYMARA EMPRESARIAL S.A.S
Identificación	901260960-9

En el periodo comprendido entre el 29/05/2024 al 28/05/2025 correspondiente al último año contado a partir de la fecha de expedición:

- **SANCIONES:** No. Registra
- **RECLAMACIONES:** No. Registra
- **INVESTIGACIONES**: No. Registra

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, para los fines legales pertinentes y tiene validez en los municipios de la Jurisdicción que le corresponden a la Dirección Territorial del Huila del Ministerio del Trabajo, de conformidad con lo estipulado en el artículo primero, numeral 20 de la Resolución 3455 del 16/11/2021 del Ministerio del Trabajo.

Neiva Huila, jueves, 29 de mayo de 2025

Camilo Chacue Collazos
CAMILO CHACUE COLLAZOS
Director Territorial del Huila

Elaboro: mandradel
Reviso/ Aprobó: cchacue

Para verificar la validez de este documento escaneé el código QR, el cual lo redireccionará al repositorio de evidencia digital de Mintrabajo.

Banco Agrario de Colombia
El Banco que hace crecer el campo

Nit : 800.037.800-8

CERTIFICACION

El Banco Agrario de Colombia, certifica que: AYMARA EMPRESARIAL SAS, identificado(a) con NIT JURIDICAS No. 9012609609, se encuentra vinculado(a) con nuestra entidad en el producto de: AHO - CUENTAS AHORROS, número 4-392-33-01437-2, con una antigüedad de TRES (3) año(s).

Se expide en PAICOL, a los veinte y nueve (29) días del mes de mayo de 2025, con destino a: A QUIEN LE INTERESE

Banco Agrario de Colombia
OF. PAICOL - HUILA

DIRECTOR (A) OFICINA

FIRMA AUTORIZADA
