"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

CONTRATO IDRD N° SG-4060



INFORME AMBIENTAL No 4
PERIODO DEL 1 AL 28 FEBRERO 2025
VERSIÓN 2
CONTRATO BELZCON I-BOGOTÁ,
MARZO DE 2025

IDRD
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
Fecha de firmado: 2025.04.28 13:59:04 COT
Firmado digitalmente desde SGD-OrfeoJADE

CONTROL DE CAMBIOS AL CONTENIDO DEL DOCUMENTO		
Versión No.	**Fecha de elaboración**	**Control de cambios**
1	Febrero 2025	Versión original del documento
2	Marzo 2025	Ajuste de acuerdo con las observaciones de la interventoría

ELABORÓ	REVISÓ Y APROBO
ING. ADRIANA PACHON FAJARDO	ING. ENRIQUE GUZMAN
RESIDENTE AMBIENTAL	DIRECTOR DE OBRA

TABLA DE CONTENIDO

CONTRATO IDRD N° SG-4060 1
1. INTRODUCCIÓN 5
2. OBJETIVOS 5
2.1. Objetivo General 5
2.2. Objetivos Específicos 5
3. GENERALIDADES DEL PROYECTO 6
4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 8
5. DESARROLLO DEL COMPONENTE AMBIENTAL 10
5.1 Permisos y tramites ambientales ante la Secretaría de Ambiente 10
5.2 Descripción de actividades constructivas desarrolladas 10
5.2.1 Actividades Ejecutadas (Emergencias) 10
5.2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS 11
6. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 12
6.1 A1 CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE GESTIÓN AMBIENTAL 12
6.2 A2 CAPACITACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN PARA EL PERSONAL DE OBRA 12
6.3 D-1 CONTROL DE RUIDO Y EMISIONES ATMOSFERICAS 13
6.4 D-2 MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 15
6.5 D3 Manejo integral de residuos ordinarios, peligrosos, especiales y RCD. 17
6.6 D4 Manejo Integral de cuerpos de agua y sumideros 19
6.7 D5 Manejo ambiental de campamentos fijos y/o temporales y centros de acopio 20
6.8 D-6 Manejo de maquinaria, equipos y vehículos 21
7. CONCLUSIONES 22

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 Parques Autorizados 6
Tabla 2 Información del Contrato 8
Tabla 3 Personal Ambiental 12
Tabla 4 Capacitaciones 12
Tabla 5 Gestores de RCD 15
Tabla 6 Proveedores 15
Tabla 7 Relación de materiales 16
Tabla 8 Relación de otros materiales 16
Tabla 9 Generación de RCD 17
Tabla 10 Seguimiento de indicador de aprovechamiento 19
Tabla 11 Indicador de Circularidad 19
Tabla 12 Relación de Vehículos 21
Tabla 13 Relación de maquinaria 21

LISTA DE ANEXOS

Anexo 1 Registro de Capacitación 13
Anexo 2 Documentos de Gestores 15
Anexo 3 Control de materiales 16
Anexo 4 Gestión de Residuos 17

1. INTRODUCCIÓN

Este documento corresponde al primer informe de cumplimiento en la gestión ambiental con respecto al contrato de obra CONTRATO No. 4060 DE 2024. Cuyo objeto contractual es "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES DE LA RED DE PROXIMIDAD QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES"

Para este propósito se diseñó una metodología que califica el cumplimiento ambiental para el período a través de las fichas del Plan de Manejo Ambiental. En este informe se resume el avance constructivo de las obras y el desarrollo de las actividades del Plan de Manejo Ambiental, efectuadas en el periodo comprendido entre el 1 al 28 de febrero 2025, de acuerdo con la ejecución de las actividades constructivas de las instituciones intervenidas.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

Elaborar un Informe mensual dando cumplimiento en la gestión ambiental del proyecto con respecto al contrato de obra CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES DE LA RED DE PROXIMIDAD QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES.

2.2. Objetivos Específicos

- Establecer los compromisos relacionados con el manejo ambiental que se desarrollan en la ejecución de la obra.
- Desarrollar los compromisos ambientales que permitan efectuar los seguimientos de las diferentes entidades que tienen competencia en el proyecto.
- Establecer claramente las acciones referentes al Componente de actividades de obra que se implementan y mantienen durante la ejecución del contrato.
- Establecer los procedimientos ambientales para el manejo de los diferentes impactos que se generan con las actividades de obra.

3. GENERALIDADES DEL PROYECTO

El contrato 4060 de 2024 se firmó entre Belzcon S.A.S. y el Instituto de Recreación y Deporte IDRD, con acta de inicio del 1 al 28 de febrero de 2025, este proyecto pretende beneficiar a los habitantes de tres del distrito capital.

Pretende atender de manera oportuna las labores de mantenimiento, adecuación, mejoramiento integral, recuperación de la infraestructura física, el suministro, desmonte e instalación de las piezas, y/o partes del mobiliario urbano, módulos de juegos infantiles y estructuras deportivas, de los parques de la Red de Proximidad del Sistema Distrital de Parques del IDRD a monto agotable.

Para la fecha de presentación de este informe se tiene un listado de 61 parques distribuidos en las tres localidades de intervención; para este periodo se encuentran los siguientes parques en ejecución:

Tabla 1 Parques Autorizados

ITEM	NOMBRE DEL PARQUE
1	PARQUE NACIONAL
2	SAUZALITO
3	GILMA JIMENEZ
4	PIJAOS
5	PALERMO SUR
6	URBANIZACIÓN CALLE 170 / ALAMEDA
7	SERVITA
8	DESARROLLO VERBENAL I
9	URBANIZACIÓN TOBERIN
10	NUEVA URBANIZACIÓN EL CEDRITO
11	PARQUE DE LOS NIÑOS
12	PRD EL SALITRE
13	COUNTRY
14	CEFE SAN CRISTOBAL
15	UNIDAD DEPORTIVA SALITRE UDS
16	PALACIO DE LOS DEPORTES
17	PARQUE LOS NOVIOS

18	MANTENIMIENTO ECOMUROS
19	SIMON BOLIVAR
20	RECREO
21	JAZMÍN
22	PTAR SALITRE
23	VALLES DE CAFAM
24	RENACIMIENTO
25	INDEPENDENCIA
26	PORVENIR
27	TIMIZA
28	PALESTINA
29	MIRAVALLE F8
30	LOMBARDIA
31	VILLA DE LOS SAUCES
32	SANTA ISABEL
33	GAVILANES
34	GORGONZOLA
35	FLORENCIA
36	PRADERA SUR
37	PEPITA
38	TRONQUITOS
39	AMERICAS OCCIDENTAL
40	ATALAYAS
41	LUCES VILLARICA
42	MARRUECOS
43	BELLAVISTA DINDALITO-CANCHA
44	CHICALA
45	TIBABUYES
46	BURGOS BRITALIA
47	HAYUELOS F5
48	HAYUELOS

49	ALFONSO LOPEZ
50	EUROPA
51	SANTA CLARA
52	SAN JOSE
53	GILMA 2 F5
54	GILMA F8
55	GILMA F11
56	TEJAR
57	MOLINOS
58	PRADO PINZÓN
59	EJIDOS F11
60	CARMELO FÚTBOL 11
61	SANTA CLARA

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El objeto del contrato es: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES DE LA RED DE PROXIMIDAD QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES"

A continuación, se describe la información del contrato junto con sus suspensiones y prorrogas del mismo. La información del contrato se presenta a continuación

Tabla 2 Información del Contrato

	CONTRATANTE INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
Supervisión Técnica:	ANGÉLICA MARÍA ROMERO HERNANDEZ

	INTERVENTORÍA Contrato IDRD-SG-4080-2024
Interventoría:	SOLIUN
Director de	RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

Interventoría:	
Residente Ambiental Interventoría	NATALI ESPINOSA SIERRA
Objeto:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD.
Duración del contrato:	OCHO (8) MESES
Fecha de inicio del proyecto:	20 DE NOVIEMBRE 2024
Fecha de Terminación:	19 DE JULIO 2025

CONTRATISTA **Contrato IDRD SG – 4060 – 2024**	
Contratista:	CONSORCIO BELZCON I.
Director de Obra:	ENRIQUE GUZMAN
Profesional Ambiental	ADRIANA PACHON FAJARDO
Objeto:	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES DE LA RED DE PROXIMIDAD QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES
Duración del contrato:	OCHO (8) MESES
Fecha de inicio del proyecto:	20 DE NOVIEMBRE 2024
Fecha de Terminación:	19 DE JULIO 2025

Fuente: Consorcio Belzcon IDRD 1

5. DESARROLLO DEL COMPONENTE AMBIENTAL

5.1 Permisos y tramites ambientales ante la Secretaría de Ambiente

Apertura del PIN Ambiental

De acuerdo con el radicado No. SDA2024ER246198, la Secretaría Distrital de Ambiente se asignó el PIN ambiental **No. 26732**

5.2 Descripción de actividades constructivas desarrolladas

De conformidad con la priorización entregada por parte del Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD, a continuación, se presentan las actividades constructivas realizadas en el periodo del 1 al 28 de febrero de 2025.

5.2.1 Actividades Ejecutadas (Emergencias)

- **PARQUE ESTADIO OLAYA HERRERA**
  - Atención de emergencia hidráulica, escape de agua parte interna.
  - Enchape de piso zona baño mujeres
  - Reinstalación de sanitario zona baños mujeres

- **PARQUE ARBORIZADORA ALTA**
  - Demolición de enchape de muros en zona baños coliseo
  - Demonte de válvulas tipo push en sanitarios zona baños coliseo
  - Suministro e instalación de válvulas tipo push en sanitarios zona baños coliseo
  - Enchape de muros en zona baños coliseo

- **PARQUE SAUZALITO**
  - Durante este periodo se realizaron actividades:
  - Emergencia por rotura de tubería agua caliente.
  - Retiro de cielorraso baño mujeres.
  - Cambio de tubería agua caliente desde los registros hasta las duchas.
  - Reemplazo de baldosa enchape para poder ingresar a tubería duchas.
  - Cambio de registros agua fría agua caliente baños mujeres baños hombres.
  - Cambio de tubería agua caliente duchas baños hombres.
  - Cambio de registro baño hombres.
  - Reemplazo de enchapes donde se cambiaron registros.
  - Desmonte y montaje cielorraso para arreglo cambio de tuberías baños hombres.
  - Cambio de tubería agua caliente de ingreso desde cuarto máquinas a baños.
  - Suministro e instalación cielo raso nuevo, bañó de mujeres.

- **PARQUE SAN ANDRES**
  - Limpieza de canales del coliseo que se encuentran tapadas por residuos y hojas.
- **ESTADIO DE TECHO**
  - Reinstalación de sillas en las tribunas Nor occidental, sur occidental, norte y oriental.
  - Revisión de tapas de concreto de parqueadero que se encuentran en mal estado.
- **PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS**

  - Durante este periodo se realizaron actividades:
  - Pintura muros ingreso zona norte, ingreso norte 2 e ingreso zona infantil (sur).
  - Pintura puerta ingreso parque en zona ingreso infantil e ingreso puerta norte 2.

5.2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

- **PARQUE PATIO BONITO**
  - Durante este periodo se ejecutaron las siguientes actividades:
  - Resane con mortero en regatas de inyectores zona de piscinas
  - Franjas en granito blanco lavado zona de piscinas

- **PARQUE NACIONAL (PM-02) ENRIQUE OLAYA HERRERA**
  - Trasiego manual y acopio de RCD.
  - Destronque, pulida, re-emboquillado y sello de piso en granito zona patinódromo.
  - Limpieza, pintura anticorrosivo y esmalte en baranda zona patinódromo.
  - Resane de fisuras en muros zona patinodromo.
  - Pintura tipo Koraza en muros zona patinodromo.
  - Instalación de baranda M80 zona patinodromo.
  - Demolición de enchape en muros zona baños calle 39.
  - Desmonte de válvulas tipo push en sanitarios zona baños calle 39.

- **PARQUE PIJAOS JORGE E. CABALIER**
  - Descapote y excavación manual frente a graderías costado occidental cancha sintética.
  - Instalación de Geotextil zona andén frente a las graderías costado occidental.
  - Instalación de material granular (tipo PEA) para base para andén zona graderías costado occidental.
  - Instalación de bordillo A-80 costado occidental frente a graderías para confinar andén.
  - Retiro de cerramiento de malla eslabonada altura de 2 m.
  - Corte de tubería de 2" estructura de soporte de malla eslabonada.

- **PARQUE EL PORVENIR**
  - Retiro y disposición final de RCD.

- Suministro e instalación de postes metálicos H:12 m.
- Suministro e instalación de cerramiento en malla tipo nailon.

- **PARQUE CIUDAD MONTES**
  - Mantenimiento de pintura debajo de la cubierta de la zona de enfermería y zona aledaña.
  - Cambio de enchape dañado en el shut de basuras.

- **PARQUE TIMIZA**
  - Desmonte de baranda zona sendero lago.
  - Demolición manual de sardinel zona senderos lago.
  - Desmonte de adoquín zona sendero lago.
  - Descapote manual zona sendero lago.

6. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

En este ítem se describirá el cumplimiento a las medidas contempladas en el Plan de Manejo Ambiental en cada uno de los parques intervenidos dando alcance al contrato.:

6.1 A1 CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE GESTIÓN AMBIENTAL

Se cuenta con el personal mínimo requerido para el componente ambiental descrito a continuación

Tabla 3 Personal Ambiental

CARGO	NOMBRE
Residente Ambiental	Adriana Pachón Fajardo

Fuente: Consorcio Belzcon IDRD 1

El soporte de la aprobación del personal fue remitido en el informe No, 2

6.2 A2 CAPACITACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN PARA EL PERSONAL DE OBRA

Durante el periodo del informe se realizaron las siguientes actividades de capacitación

Tabla 4 Capacitaciones

FECHA	TEMA
10 FEBRERO 2024	Socialización PMA y programas ambientales Manejo de acopios de materiales y RCD Orden aseo y limpieza de las áreas de trabajo

Fuente: Consorcio Belzcon IDRD 1


Anexo 1 Registro de Capacitación


Se asistió a los comités semanales programados en conjunto con interventoría y la supervisión del IDRD.

6.3 D-1 CONTROL DE RUIDO Y EMISIONES ATMOSFERICAS

De acuerdo con las actividades constructivas realizadas durante el periodo del informe en los parques intervenidos se realizó la instalación de cerramientos de áreas de trabajo y acopios, como se indica en el registro fotográfico a continuación:

Ilustración 1 Registro fotográfico cerramientos

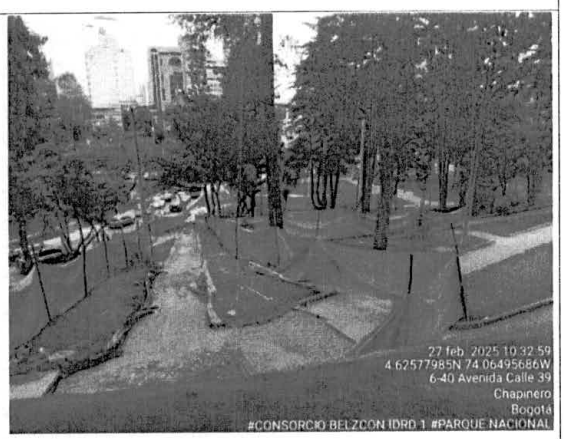PARQUE NACIONAL	
	
INSTALACIÓN DE CERRAMIENTOS	
	
CARPADO DE VOLQUETAS	CERRAMIENTO

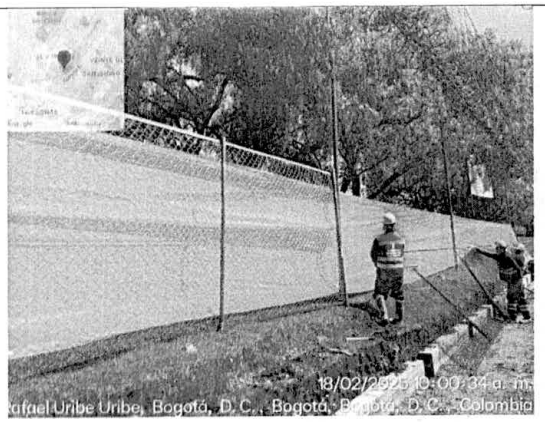PARQUE PIJAOS	
	
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTOS	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTOS
PARQUE TIMIZA	
	
INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTOS	

Fuente: Consorcio Belzcon IDRD 1

Adicional se contemplan las medidas para el control de las emisiones atmosféricas (material particulado) tales como:

- No se realizan quemas de residuos en ninguno de los frentes de obra
- Se realizan jornadas de orden y aseo permanentes en cada frente de obra
- Se realiza la limpieza de las vías de los frentes de obra y carpado de volquetas para disminuir los aportes de material particulado en la atmosfera

6.4 D-2 MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

1. Seguimiento de proveedores y gestores

Durante el periodo se utilizaron los siguientes gestores de residuos - RCD

Tabla 5 Gestores de RCD

GESTOR	LOCALIZACIÓN	RESOLUCIÓN
MAQUINAS AMARILLAS	Las Manas	Resolución 1480 del 04/12/2014 Resolución 0228 del 07/03/2016
CEMEX	Av. Villavicencio (Boyacá) #72-04 sur	Resolución 1280 del 15/06/2017
CHATARRERIA AMBIENTAL LA ESMERALDA	Carrera 72 A No. 70 - 55 (Bogotá)	Informe Técnico No. 02696 - 2019IE301932 Rad de aprobación: 2019EE303076

Fuente: Consorcio Belzcon IDRD 1

Tabla 6 Proveedores

GESTOR	LOCALIZACIÓN	RESOLUCIÓN	APROBACIÓN
SECAM JR	Carrera 7 D Este Calle 115 Sur	COMUNICADO CAR 20232082175 DEL 11/09/2023	26/02/2025
CODEOBRAS	Kilometro 1.5 Bogotá Siberia – Costado Sur	COMUNICADO CAR 20252004394 DEL 04/02/2025	26/02/2025

Fuente: Consorcio Belzcon IDRD 1

Anexo 2 Documentos de Gestores

2. Manejo de materiales

De acuerdo con las actividades constructivas en el periodo del informe se utilizaron los materiales constructivos, que fueron adquiridos y reportados en el periodo del 1 al 28 de

febrero, para el caso del concreto, este fue mezclado en cada frente de trabajo, para las actividades que así lo requirieron.

Tabla 7 Relación de materiales

MES	PROVEEDOR	TIPO DE MATERIAL	m3	Ton
NOVIEMBRE	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL NOVIEMBRE			**0**	**0**
DICIEMBRE	DROMOS	B400	76	129,2
DICIEMBRE	DROMOS	B600	14,33	24,36
DICIEMBRE	DROMOS	RAJON	15	25,5
DICIEMBRE	FORZA	B600	15	25,5
DICIEMBRE	IN SITU	MATERIAL EXCAVACIÓN	41,5	72,62
DICIEMBRE	LADRILLERA SAN JOAQUIN	LADRILLO TOLETE MACIZO 6000 UND	10,37	21
TOTAL DICIEMBRE			**172,2**	**298,18**
ENERO	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL ENERO			**0**	**0**
FEBRERO	CODEOBRAS	AR-PEA	50	85
FEBRERO	DROMOS	B600	29,72	50,52
FEBRERO	LADRILLERA SAN JOAQUIN	LADRILLO TOLETE MACIZO 3000 UND	5,19	10,5
FEBRERO	SECAM JR	SBG-PEA RECICLADA	7	11,90
TOTAL FEBRERO			**91,91**	**157,92**

Fuente: Consorcio Belzcon IDRD 1

Tabla 8 Relación de otros materiales

MES	TIPO DE MATERIAL	UND	Ton
ENERO	CEMENTO GRIS X 50KG	64	N/A

Fuente: Consorcio Belzcon IDRD 1

Anexo 3 Control de materiales

6.5 D3 Manejo integral de residuos ordinarios, peligrosos, especiales y RCD.

3. Manejo integral de los residuos solidos

De acuerdo con las actividades de demolición en el frente de trabajo se generaron los siguientes volúmenes de RCD, los cuales fueron dispuestos como se muestra en la tabla a continuación.

Tabla 9 Generación de RCD

GESTOR	EXCAVACIÓN m^3	DEMOLICIÓN m^3	PESO EN TONELADAS
RECICLADOS INDUSTRIALES		15	19,5
GRECO		15	19,2
TOTAL NOVIEMBRE	**0**	**30**	**38,7**
RECICLADOS INDUSTRIALES		14	18,20
TOTAL DICIEMBRE	**0**	**14**	**18,20**
MAQUINAS AMARILLAS	90		115,44
CEMEX	14		20,52
TOTAL ENERO	**104**	**0**	**135,96**
MAQUINAS AMARILLAS	65		97,9
CEMEX	7		10,26
TOTAL FEBRERO	**72**	**0**	**108,16**

Fuente: Consorcio Belzcon IDRD 1

Arexo 4 Gestión de Residuos

405

Ilustración 2 Registro Fotográfico Retiro de RCD

PARQUE NACIONAL





RETIRO DE RCD

PARQUE PIJAOS





RETIRO DE RCD

Fuente: Consorcio Belzcon IDRD 1

4. Seguimiento y consolidado de material reutilizado.

A continuación, se relacionan los indicadores de aprovechamiento e RCD de acuerdo con el decreto 507 del 2023.

406

Tabla 10 Seguimiento de indicador de aprovechamiento

Periodo	Envío a planta de aprovechamiento + reutilización in situ + entrega a recuperador específico + compra de material reciclado	Cantidad total generada sin material total de excavación	%
20 al 30 noviembre 2024	38.7	38.7	100%
1 al 31 de diciembre 2024	91,12	91,12	100%
1 a 31 de enero del 2025	0	0	0%
1 al 28 de febrero del 2025	96,90	96,90	100%

Fuente: Consorcio Belzcon IDRD 1

Tabla 11 Indicador de Circularidad

Periodo	Cantidad de RCD aprovechado en la obra (t)/Cantidad de materiales que ingresan a la obra	%
20 al 30 noviembre 2024	0	0
1 al 31 de diciembre 2024	72,62/298,18 =0,24	24,35
1 al 31 de enero del 2025	0	0
1 al 28 de febrero del 2025	96,9/157,92=0,61	61,36

Fuente: Consorcio Belzcon IDRD 1



6.6 D4 Manejo Integral de cuerpos de agua y sumideros


1. En el periodo del informe no se requirió realizar protección de sumideros ni cuerpos de agua.
2. No se realizó ningún tipo de reparación ni lavado de vehículos ni maquinaria, en el frente de obra y menos en cercanía a sumideros.
3. En los frentes de obra no se instalaron unidades sanitarias portátiles, ya que se utilizaron las existentes en cada parque intervenido.

6.7 D5 Manejo ambiental de campamentos fijos y/o temporales y centros de acopio

Durante el periodo del informe no se realizó la instalación de campamentos de obra temporales, sin embargo se realizó el uso de los puntos ecológicos de los parques intervenidos para el manejo de los residuos, se realizó la protección y cerramiento de acopios, así como el orden y aseo de las áreas de trabajo.

Ilustración 3 Registro fotográfico manejo de áreas de trabajo
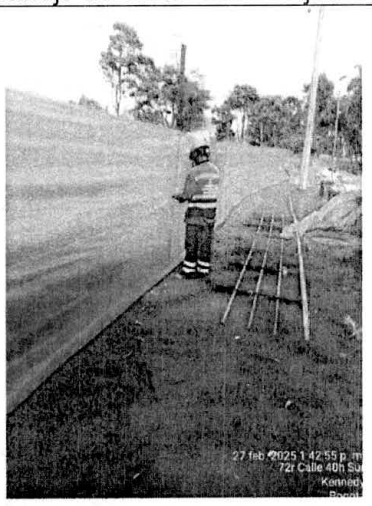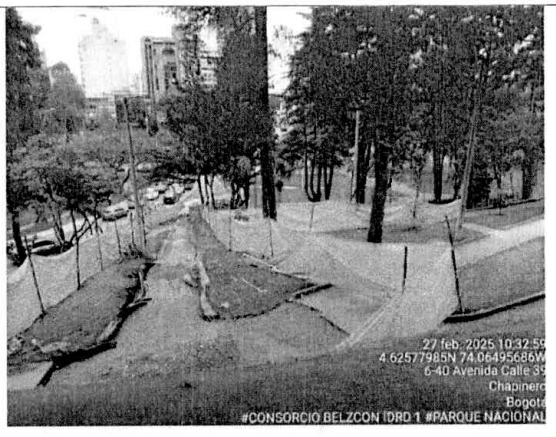
<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>PROTECCIÓN DE ACOPIOS</td><td>MANTENIMIENTO DE ACOPIOS</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>CERRAMIENTOS DE ÁRBOLES</td><td>AISLAMIENTOS DE ÁREAS DE TRABAJO</td></tr>
</table>

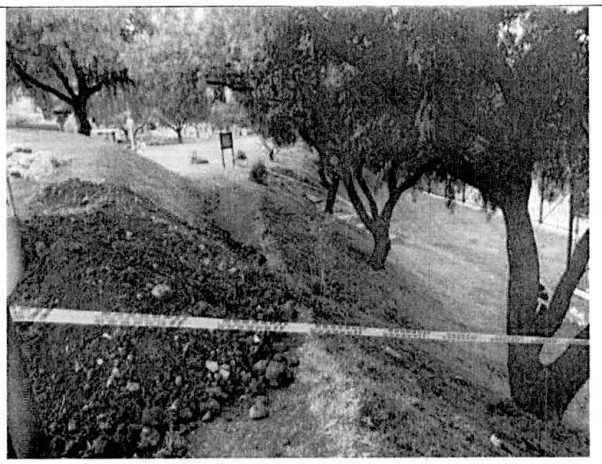	
CERRAMIENTO DE ÁRBOLES	AISLAMIENTO DE ÁREAS DE TRABAJO

Fuente: Consorcio Belzcon IDRD 1

6.8 D-6 Manejo de maquinaria, equipos y vehículos

Para el periodo del informe se utilizaron los siguientes vehículos.

Tabla 12 Relación de Vehículos

TIPO DE VEHICULO	PLACA	PIN	REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA
VOLQUETA	TAW447	22167	27/08/2025
VOLQUETA	USC745	560	21/10/2025

Fuente: Consorcio Belzcon IDRD 1

Tabla 13 Relación de maquinaria

EQUIPO	REFERENCIA
MINICARCADOR	NEW HOLAND L175

Fuente: Consorcio Belzcon IDRD 1

La documentación correspondiente a equipos vehículos y maquinaria es reportada en el informe de SST

409

7. CONCLUSIONES

- Se ejecutaron actividades constructivas y retiro de RCD con gestores autorizados.
- Se realiza seguimiento en el frente de obra para el control de los impactos ambientales generados.
- Se cuentan con las certificaciones de materiales y RCD correspondientes a los periodos anteriores.

	PLAN ANUAL DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE LA GESTIÓN AMBIENTAL	PMA-01
		VERSION 1
CONSORCIO BELZCON IDRD 1		FECHA 26-12-2024
FECHA ACTUALIZACIÓN: 26/DICIEMBRE/2024		

1. OBJETIVO	**1.** Implementar el Plan de manejo ambiental, durante la ejecución del proyecto con el fin de minimizar los impactos ambientales identificados y evaluados por la matriz de identificación y valoración de impactos, cumpliendo con los requerimientos legales y contractuales.
	2. Cumplir a cabalidad con el prgrama de capacitaciones y entrenamiento a los trabajadores en los temas referentes al PMA, con la finalidad de fortalecer sus competencias en el tema ambiental.
	3. Gestionar adecuadamente los recursos asignados
	4. Evaluar el cumplimiento de los requisitos Ambiental
2. META	Cumplir con el 90% de las actividades programadas en el Plan Anual de Trabajo y Cronograma de la Gestión Ambiental. La medición del indicador de cumplimiento de actividades se realizará mensualmente. *
3. ALCANCE	Aplica para todos los trabajadores, contratistas y subcontratistas.
4. RESPONSABILIDADES	Cumplir y ejecutar el Plan Anual de Trabajo y Cronograma de la Gestión Ambiental.

5. ETAPAS Y PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN (10 MESES)

ACTIVIDADES	RECURSOS ASIGNADOS	DIRIGIDO A	RESPONSABLES	ESTADO	MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				%	REGISTRO O SOPORTE	OBSERVACIÓN
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
Cuando se cumpla, se marca con 1 en **E. (Ejecutado)**																							
5.1 ETAPA PRELIMINAR																							
Actividades de apropiación, ajustes y/o armonización de estudios y diseños.	Humanos, Tecnológicos y Físicos	N/A	Director de Obra, Asesora Ambiental	P*																	100%		
				E																			
Radicación del PMA en la interventoria y aprobación del documento por la misma.	Humanos, Tecnológicos y Físicos	Interventoria	Director de Obra, Asesora Ambiental	P*																	100%		
				E																			
5.1.1 GENERALES																							
Inducción ambiental Ingreso de personal nuevo	Humanos, Financieros, Tecnológicos y Físicos	Todo el personal del contrato	Residente Ambiental e inspectoras SSTMA	P*																	64%		
				E																			
Revisión y actualización matriz de identificación y valoración de impactos ambientales	Humanos, Tecnológicos y Físicos	N/A	Residente Ambiental	P*																	100%		
				E																			

CONSORCIO BELZCON IDRD 1	PLAN ANUAL DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE LA GESTIÓN AMBIENTAL	PMA-01
		VERSION 1
FECHA ACTUALIZACIÓN: 26/DICIEMBRE/2024		FECHA 26-12-2024

1. OBJETIVO	1. Implementar el Plan de manejo ambiental, durante la ejecución del proyecto con el fin de minimizar los impactos ambientales identificados y evaluados por la matriz de identificación y valoración de impactos, cumpliendo con los requerimientos legales y contractuales.
	2. Cumplir a cabalidad con el prgrama de capacitaciones y entrenamiento a los trabajadores en los temas referentes al PMA, con la finalidad de fortalecer sus competencias en el tema ambiental.
	3. Gestionar adecuadamente los recursos asignados
	4. Evaluar el cumplimiento de los requisitos Ambiental
2. META	Cumplir con el 90% de las actividades programadas en el Plan Anual de Trabajo y Cronograma de la Gestión Ambiental. La medición del indicador de cumplimiento de actividades se realizará mensualmente.
3. ALCANCE	Aplica para todos los trabajadores, contratistas y subcontratistas.
4. RESPONSABILIDADES	Cumplir y ejecutar el Plan Anual de Trabajo y Cronograma de la Gestión Ambiental.

5. ETAPAS Y PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN (10 MESES)

ACTIVIDADES	RECURSOS ASIGNADOS	DIRIGIDO A	RESPONSABLES	ESTADO	MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				%	REGISTRO O SOPORTE	OBSERVACIÓN
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
5.2 ETAPA CONSTRUCTIVAS (Implementación Fichas Ambientales PMA)																							
5.2.1 CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL																							
Realizar la conformación de la Brigada de Orden Aseo y Limpieza (BOAL)	Humanos y Físicos	BOAL	Residente Ambiental	P* E*																	100%		
5.2.2 CAPACITACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN PARA EL PERSONAL DE OBRA																							
Socialización del PMA y de los programas ambientales	Humanos, Tecnológicos, Financieros y Físicos	Todo el personal del contrato	Residente Ambiental	P* E*																	100%		
Capacitación a la brigada de aseo y limpieza (BOAL) en los siguientes temas: *Manejo de emergencias en la obra - Tipos de elementos de proteccion personal a emplear en la obra y su correcto uso *Generalidades del PMA *Funciones de la brigada de orden, aseo y limpieza.	Humanos, Tecnológicos, Financieros y Físicos	BOAL	Residente Ambiental	P* E*																	0%		
Capacitación manejo de emergencias ambientales en obra.	Humanos, Tecnológicos, Financieros y Físicos	Todo el personal del contrato	Residente Ambiental	P* E*																	100%		
Capacitación Gestión Integral de Residuos Sólidos (RESOL) y Residuos Peligrosos (RESPEL).	Humanos, Tecnológicos, Financieros y Físicos	Inspectores de obra - Ayudantes de obra	Residente Ambiental	P* E*																	0%		
Capacitación procedimiento de auxiliares de tráfico.	Humanos, Tecnológicos, Financieros y Físicos	Auxiliares de tráfico	Residente Ambiental	P* E*																	0%		
Capacitación ambiental manejo teja asbesto cemento, afectaciones ambientales y a la salud humana	Humanos,tecnologicos, fiancieos y fisicos	Todo el personal del contrato	Residente Ambiental	P* E*																	0%		
Capacitación Manejo Ambientalmente Responsable de Actividades Constructivas. (Gestión Integral de RCD, protección de sumideros).	Humanos, Tecnológicos, Financieros y Físicos	Todo el personal del contrato	Residente Ambiental	P* E*																	50%		
Reinducción SGA	Humanos, Tecnológicos, Financieros y Físicos	Todo el personal del contrato	Residente Ambiental	P* E*																	#¡DIV/0!		
5.2.3 CONTROL DE RUIDO Y EMISIONES ATMOSFÉRICAS																							
Seguimiento documentación maquinaria y equipos	Humanos y Fiscos	Conductores - Operadores	Residente Ambiental y SST	P* E*																	67%		
5.2.4 MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES PÉTREOS DE CONSTRUCCIÓN.																							
Reporte suministro de materiales a la supervición del contrato	Humanos, Tecnológicos y Físicos	SDE- Interventoría	Residente Ambiental	P* E*																	40%		

412

	PLAN ANUAL DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE LA GESTIÓN AMBIENTAL	PMA-01
		VERSION 1
CONSORCIO BELZCON IDRD 1		FECHA 26-12-2024
FECHA ACTUALIZACIÓN: 26/DICIEMBRE/2024		

1. OBJETIVO	1. Implementar el Plan de manejo ambiental, durante la ejecución del proyecto con el fin de minimizar los impactos ambientales identificados y evaluados por la matriz de identificación y valoración de impactos, cumpliendo con los requerimientos legales y contractuales.
	2. Cumplir a cabalidad con el prgrama de capacitaciones y entrenamiento a los trabajadores en los temas referentes al PMA, con la finalidad de fortalecer sus competencias en el tema ambiental.
	3. Gestionar adecuadamente los recursos asignados
	4. Evaluar el cumplimiento de los requisitos Ambiental
2. META	Cumplir con el 90% de las actividades programadas en el Plan Anual de Trabajo y Cronograma de la Gestión Ambiental. La medición del indicador de cumplimiento de actividades se realizará mensualmente.
3. ALCANCE	Aplica para todos los trabajadores, contratistas y subcontratistas.
4. RESPONSABILIDADES	Cumplir y ejecutar el Plan Anual de Trabajo y Cronograma de la Gestión Ambiental.

5. ETAPAS Y PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN (10 MESES)

ACTIVIDADES	RECURSOS ASIGNADOS	DIRIGIDO A	RESPONSABLES	ESTADO	MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				%	REGISTRO O SOPORTE	OBSERVACIÓN
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
Solicitud a proveedores de certificados del suministro de material	Humanos, Tecnológicos, Financieros y Físicos	Proveedores	Residente Ambiental	P*																	40%		
				E*																			
Instalar los sitios de acopio temporales de los materiales y realizar el respectivo cerramiento y señalización.	Humanos, Tecnológicos, Financieros y Físicos	Residente de Obra - Inspector de Obra - Ayudantes de Obra	Residente de obra, Residente ambiental Ambiental, BOAL, inspectores	P*																	40%		
				E*																			
5.2.5 MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS ORDINARIOS, ESPECIALES Y RCD																							
Seguimiento a la gestión de los residuos sólidos ordinarios.	Humanos y Físicos	BOAL	Residente Ambiental, BOAL e inspectores	P*																	0%		
				E*																			
Seguimiento a la gestión de los residuos especiales.	Humanos y Físicos	BOAL	Residente Ambiental, BOAL e inspectores	P*																	0%		
				E*																			
Instalar los sitios de acopio temporales de los RCD y realizar el respectivo cerramiento y señalización.	Humanos, Tecnológicos, Financieros y Físicos	Residente de Obra - Inspector de obra	Residente de Obra, Residente Ambiental, Residente SST e inspectores	P*																	20%		
				E*																			
Reporte disposición de RCD a la supervisión del Contrato	Humanos, Tecnológicos y Físicos	SDE - Interventoria	Residente Ambiental	P*																	40%		
				E*																			
Solicitud de la certificación de la entrega y disposición de los RCD.	Humanos, Tecnológicos, Financieros y Físicos	Sitios de Disposición final de RCD	Residente Ambiental	P*																	25%		
				E*																			
5.2.6 MANEJO INTEGRAL DE CUERPOS DE AGUA Y SUMIDEROS																							

413

	PLAN ANUAL DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE LA GESTIÓN AMBIENTAL	PMA-01
		VERSION 1
CONSORCIO BELZCON IDRD 1		FECHA 26-12-2024
FECHA ACTUALIZACIÓN: 26/DICIEMBRE/2024		

1. OBJETIVO	1. Implementar el Plan de manejo ambiental, durante la ejecución del proyecto con el fin de minimizar los impactos ambientales identificados y evaluados por la matriz de identificación y valoración de impactos, cumpliendo con los requerimientos legales y contractuales.
	2. Cumplir a cabalidad con el prgrama de capacitaciones y entrenamiento a los trabajadores en los temas referentes al PMA, con la finalidad de fortalecer sus competencias en el tema ambiental.
	3. Gestionar adecuadamente los recursos asignados
	4. Evaluar el cumplimiento de los requisitos Ambiental
2. META	Cumplir con el 90% de las actividades programadas en el Plan Anual de Trabajo y Cronograma de la Gestión Ambiental. La medición del indicador de cumplimiento de actividades se realizará mensualmente.
3. ALCANCE	Aplica para todos los trabajadores, contratistas y subcontratistas.
4. RESPONSABILIDADES	Cumplir y ejecutar el Plan Anual de Trabajo y Cronograma de la Gestión Ambiental.

5. ETAPAS Y PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN (10 MESES)

ACTIVIDADES	RECURSOS ASIGNADOS	DIRIGIDO A	RESPONSABLES	ESTADO	MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				%	REGISTRO O SOPORTE	OBSERVACIÓN
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
Revisión, inventario y protección de sumideros	Humanos y Físicos	Inspectores de obra - Ayudantes de obra	Residente de Obra, Residente Ambiental y BOAL	P*																	33%		DE ACUERDO CON LOS PARQUES INTERVENIDOS NO SE HAN IDENTIFICADO SUMIDEROS PARA REALIZAR SU PROTECCIÓN
				Ej*																			
Limpieza y protección de sumideros	Humanos y Físicos	Residente de Obra - Inspectores de obra - Ayudantes de obra	Residente de Obra, Residente Ambiental y BOAL	P*																	0%		
				Ej*				N/A		N/A				N/A				N/A					
5.2.7 MANEJO AMBIENTAL DE CAMPAMENTOS FIJOS Y/O TEMPORALES Y CENTROS DE ACOPIO.																							
Verificar la instalación de campamentos de obra	Humanos, Financieros y Físicos	N/A	Residente de Obra, Residente Ambiental, Residente SST e inspectores	P*																	0%		DE ACUERDO CON LOS PARQUES INTERVENIDOS NO SE HA REQUERIDO LA INSTALACIÓN DE CAMPAMENTOS FIJOS TEMPORALES ASI MISMO NO SE HA REQUERIDO LA INSTALACION DE UNIDADES SANITARIAS PORTATILES
				Ej*																			
Desmantelamiento de campamento, vestier, unidades sanitarias	Humanos y Físicos	N/A	Residente de Obra, Residente Ambiental, Residente SST e inspectores	P*																	0%		
				Ej*																			
Verificar el mantenimiento y/o aseo general de las unidades sanitaria en los campamentos y frentes de obra	Humanos y Físicos	BOAL - Ayudantes de Obra	Residente de Obra, Residente Ambiental, Residente SST e inspectores	P*																	0%		
				Ej*																			
5.2.9 MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS.																							
Verificar la ejecución de las inspeciones preoperacionales de vehiculos y maquinaria.	Humanos y Físicos	Operadores-Conductores	Residente de Obra, Residente Ambiental, Residente SST e inspectores	P*																	26%		
				Ej*																			
5.2.10 PLAN DE SEÑALIZACIÓN																							
Implementar el total de la señalización Ambiental: Informativa, preventiva y obligatoria	Humanos, Financieros y Físicos	N/A	Residente Ambiental e inpectores	P*																	14%		
				Ej*																			
Implementar el total de la señalización del Plan de Manejo de tráfico (PMT)	Humanos, Financieros y Físicos	Residente de Obra - Inspector de Obra - Ayudantes de Obra	Residente Ambiental e inpectores	P*																	0%		NO SE HA REQUERIDO LA INSTALACIÓN
				Ej*				N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
5.2.11 ACTIVIDADES PROPIAS DEL CONTRATO																							
Asistencia a comité integral semanal	Humanos	N/A	Residente Ambiental	P*																	33%		
				Ej*																			
Elaboración informe mensual de la gestión ambiental	Humanos, Tecnológicos y Físicos	SDE Interventoria	Residente Ambiental	P*																	25%		
				Ej*																			
6. ETAPA DE CIERRE																							
Elaboración Informe de Cierre Ambiental	Humanos	Contratista - Interventoria	Residente Ambiental	P*																	#¡DIV/0!		
				Ej*																			

CONSORCIO BELZCON IDRD 1 FECHA ACTUALIZACIÓN: 26/DICIEMBRE/2024	PLAN ANUAL DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE LA GESTIÓN AMBIENTAL	PMA-01 VERSION 1 FECHA 26-12-2024

1. OBJETIVO	1. Implementar el Plan de manejo ambiental, durante la ejecución del proyecto con el fin de minimizar los impactos ambientales identificados y evaluados por la matriz de identificación y valoración de impactos, cumpliendo con los requerimientos legales y contractuales.
	2. Cumplir a cabalidad con el prgrama de capacitaciones y entrenamiento a los trabajadores en los temas referentes al PMA, con la finalidad de fortalecer sus competencias en el tema ambiental.
	3. Gestionar adecuadamente los recursos asignados
	4. Evaluar el cumplimiento de los requisitos Ambiental
2. META	Cumplir con el 90% de las actividades programadas en el Plan Anual de Trabajo y Cronograma de la Gestión Ambiental. La medición del indicador de cumplimiento de actividades se realizará mensualmente.
3. ALCANCE	Aplica para todos los trabajadores, contratistas y subcontratistas.
4. RESPONSABILIDADES	Cumplir y ejecutar el Plan Anual de Trabajo y Cronograma de la Gestión Ambiental.


5. ETAPAS Y PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN (10 MESES)

ACTIVIDADES	RECURSOS ASIGNADOS	DIRIGIDO A	RESPONSABLES	ESTADO	MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				%	REGISTRO O SOPORTE	OBSERVACIÓN
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			

7. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

FORMULA	VARIABLES	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4
$\frac{\#\ \text{Actividades Ejecutadas}}{\#\ \text{de Actividades Programadas}} * 100$	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	24	36	35	32
	ACTIVIDADES EJECUTADAS	14	28	6	6
	RESULTADO	58%	78%	17%	19%
	META	100%	100%	100%	100%

9. RESPONSABLES

FIRMA:		FIRMA:	
ELABORÓ:	ADRIANA PACHON FAJARDO	REVISÓ:	ENRIQUE GUZMAN
CARGO:	ESPECIALISTA AMBIENTAL	CARGO:	DIRECTOR DE OBRA

	CONTROL DE ASISTENCIA	CBZC-FR-SST-07 VERSIÓN: 01 PAG.1 DE 1 2024/11/24

FECHA:	10-02-25	HORA INICIO:	7:00	HORA FIN:	9:00	ACTIVIDAD	
LUGAR:	PARQUES					INDUCCIÓN	
TEMAS:	SOCIALIZACIÓN PMA, PROGRAMAS AMBIENTALES. MANEJO DE ACOPIOS RCD Y MATERIALES ORDEN ASEO Y LIMPIEZA					REINDUCCIÓN	
						REUNIÓN	
						CAPACITACION	✓
INSTRUCTOR Y CARGO:	ADRIANA PACHON TAPIERO					OTRA	
FIRMA DEL INSTRUCTOR:							
OBJETIVO:	Realizar socialización de temas ambientales al personal de OSM						

PARTICIPANTES

No.	NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
	Delmiro Serrato Ara.	Oficial.	
	José Mauricio Muñoz Rodriguez	Ayudante.	
	Jhon Santana Rodriguez	Inspector	Santanas
	José Javier Velásquez.	Ayudante	
	Daniel Felipe Villareal	Ayudante	Daniel F.
	Ricardo Ramos Valencia	Oficial	

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

Gmail

ADRIANA PACHON <apachon.bzc@gmail.com>

Solicitud de aprobación gestor ambiental

SS Consultoria Ambiental Soluciones Sostenibles <ss.solucionessostenibles@gmail.com> 25 de febrero de 2025, 14:57

Para: ADRIANA PACHON <apachon.bzc@gmail.com>
Cc: Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Cordial saludo Ing. Adriana,

De manera atenta se informa que una vez verificada la documentación y registro activo como recuperador específico de la empresa Chatarrería Ambiental la Esmeralda, se aprueba para la gestión de los residuos de metales (acero, hierro, cobre, aluminio, zinc, estaño) potencialmente aprovechables.

De igual manera, se recuerda que específicamente para los RAEES, el Decreto 284 de 2018, adiciona al Decreto 1076 de 2015, el Artículo 2.2.7A.2.3, el cual en su Parágrafo 1 establece "Los usuarios o consumidores podrán entregar los RAEE a través de un gestor licenciado por la autoridad ambiental competente, siempre que no existan los medios o los mecanismos para la devolución de los mismos al productor o al comercializador.". Por lo anterior, en caso de ser necesario, se deberá presentar a esta interventoría para su verificación y aprobación, los permisos y/o conceptos de la autoridad ambiental competente, para el gestor de los RAEES que se generen en el marco del contrato en ejecución.

Atte

--

Ing. Natali Espinosa Sierra

MsC Gestión y Auditorías Ambientales

[El texto citado está oculto]

917

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C | BOGOTÁ Secretaría de Ambiente

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL AL SECTOR PÚBLICO

SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL APROBADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE								
No.	**NOMBRE**	**LOCALIDAD**	**RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN**	**PIN**	**RADICADO DE APROBACIÓN**	**Fecha de Radicado**	**Tipo de material autorizado para disponer en el sitio**	**OBSERVACIÓN**
1	PMRRA Central de Mezclas S.A.	Bogotá Ciudad Bolivar	Resolución SDA No. 01280 de 2017	16481	Radicado SDA: 2017EE111539	15/06/2017	En los predios del Registro Minero de Cantera No. 056 de Central de Mezclas S.A. no se desarrollan actividades de extracción, beneficio y transformación de materiales de construcción, no obstante se ejecutaron actividades de disposición de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), dando cumplimiento al Artículo 2 de la Resolución 4626 del 3 de junio de 2010.	

DIRECTORIO AMBIENTAL SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL APROBADOS POR EL ANLA								
No.	**NOMBRE**	**LOCALIDAD**	**RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN**	**PIN**	**ENTIDAD QUE AUTORIZA**	**AÑO**	**MATERIALES A DISPONER**	**CONTACTO**
1	LAS MANAS -Maquinas Amarillas -	Bogotá Ciudad Bolivar	RESOLUCIÓN 1480 DE 2014 RESOLUCIÓN 228 DE 2016	8418	ANLA	2014	Disposición final de RCD, escombros, excavación, y materiales estériles	
2	SAN ANTONIO Ingeominería Outsourcing	Bogotá Ciudad Bolivar	RESOLUCIÓN 836 DE JULIO DE 2015 y RESOLUCIÓN 1110 DE 2017 RADICADOS SDA: 2015ER155816 Y 2022ER236891	9730	ANLA	2015	Disposición final de RCD, escombros, excavación, y materiales estériles	Cel: 3243798749 Correo electrónico: notificacionesingeomineria@gmail.com
3	CEMEX - LA FISCALA	Bogotá Usme	RESOLUCIÓN 1506 DE 28 DE JULIO DE 2006	1778	ANLA	2006	Disposición final de RCD, escombros, excavación, y materiales estériles	
4	CEMEX - TUNJUELO	Bogotá Ciudad Bolivar	RESOLUCIÓN 1480 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2014	3418	ANLA	2014	Disposición final de RCD, escombros, excavación, y materiales estériles	

CTA-CENTRO DE TRATAMIENTO Y APROVECHAMIENTO APROBADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE								
No.	**NOMBRE**	**LOCALIDAD**	**DIRECCIÓN**	**PIN**	**RADICADO DE APROBACIÓN**	**AÑO**	**MATERIALES AUTORIZADOS**	**CONTACTO**
1	MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.	Bogotá Ciudad Bolivar	Avenida Calle 71 Sur No. 12 – 20 (Nomenclatura Actual) o Avenida Boyacá No. 76 – 08 Sur		RADICADO SDA: 2019EE100840	03/04/2019	Aprovechamiento y Tratamiento de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD). **- Sin operación**	Cel 321 4690709 Tel: 702 3060
2	AMCON COLOMBIA S.A.S.	Bogotá y otros	Calle 23 No 116 – 31	18073	Informe Técnico 789 de 2020 Rad. 2020IE81051 Radicado SDA 2020EE84482	11/05/2020	Tratamiento y aprovechamiento de residuos de origen pétreo (concreto, arcilla, asfalto, piedra, sobrante de mortero), de manera in situ, para transformarlos en (concreto, mortero, relleno, drenante, bases /sub – bases).	Cel 317 359 5840 Tel: 746 00 35
3	Ecoplanet Soluciones AR S.A.S.	Bogotá Engativá	Calle 63C No. 113 – 24		RADICADO SDA No. 2019EE301364 - 2020IE46738	24/12/2019	Acopio y transformación de Drywall.	Cel: 310 8852812
4	GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA - GRECO S.A.S.	Bogotá y otros	Av. Carrera 1 No. 56 - 55 SUR		RADICADO SDA No. 2020IE223591	10/12/2020	Residuos de construcción y demolición pétreos, arenas, gravas, gravillas, rocas de excavación, mampostería estructural, no estructural, cerámicas, sobrantes de mezclas de cementos, concretos y mezclas asfálticas	Cel: 315 8729749
5	Cemex Colombia S.A.	Bogotá Ciudad Bolivar	Carrera 17 No. 71 - 10 sur	22599	Informe Técnico 0649 de 2023 Rad. SDA 2023IE31895	14/02/2023	RCD de origen pétreo proveniente de demolición de estructuras verticales o elementos viales como concreto, mortero, unidades de albañilería de concreto, agregados no tratados, áridos tratados con cementantes hidráulicos, unidades de albañilería de arcilla, ladrillos, tejas y asfalto.	Tel: 603 9000 correo electrónico: juridica@cemex.com
6	Recolectora El Triunfo S.A.S.	Bogotá	Calle 78 No. 68H - 39		Informe Técnico 03038 de 2023 Rad. SDA 2023IE130001	09/06/2023	Acopio y transformación de Drywall.	Tel: 3112699560 - 3167500645 Correo electrónico: papeleseltriunfo@hotmail.com

818

RECUPERADORES ESPECIFICOS APROBADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

Solo pueden almacenar, acopiar y clasificar el material autorizado, pero no podrán realizar la transformación de los mismos.

No.	NOMBRE	LOCALIZACIÓN	PIN-RSSP	ENTIDAD QUE AUTORIZA	RADICADO DE APROBACIÓN	AÑO	MATERIALES AUTORIZADOS	CONTACTO
1	RECOLECTORA EL TRIUNFO S.A.S.	Carrera 68 C No. 74 B- 43		SDA	RADICADO SDA - 2018ER50154 - 2018EE78872 y proceso 5017986	12/04/2018	La empresa Recolectora El Triunfo S.A.S. realiza dentro de sus actividades la recolección, acopio y comercialización de residuos aprovechables como lo son: Papel- Cartón, Plástico, madera, Metales, Otros como PVC- Drywall- Cable eléctrico.	Tel: 3112699560 - 3167500645 Correo electrónico: papeleseltriunfo@hotmail.com
2	CHATARRERIA AMBIENTAL FM S.A.S.	Calle 79 No. 69B-35	14367	SDA	RADICADO SDA: 2018EE266302-	15/11/2018	La empresa Chatarrería Ambiental FM S.A.S., dentro de sus actividades económicas realiza recolección, transporte almacenamiento y comercialización de residuos aprovechables dentro de los que se puede mencionar: Chatarra y otros metales, aluminio, Cartón, PVC, Madera, Drywall.	Tel:3138030169
3	METALES & VARILLAS A.M S.A.S.	Calle 78 No. 69 B - 60		SDA	RADICADO SDA 2019EE20080	25/01/2019	La empresa Metales y varillas realiza dentro de sus actividades realiza recolección, acopio y comercialización de residuos aprovechables como lo son: Papel- Cartón, Plástico, madera, Metales, Otros como PVC- Drywall-Icopor	Tel: 3125466526
4	RECICLAJES MARTHA S.A.S.	Carrera 69 K No. 73 A 87	16988	SDA	RADICADO SDA 2019EE56883	2019	Aprobado como Recuperador Especifico de RCD aprovechables: Papel , cartón, plástico, madera y otros (drywall - Icopor)	Tel: 5413749
5	RECUPERADORA AMBIENTAL LAS VEGAS	Carrera 69Q No. 78 – 80	23139	SDA	Radicación: 2019EE82550	11/04/2019	Aprobado como Recuperador Especifico de RCD: Papel- Cartón, Plástico, PVC, Drywall , icopor, Madera y Metales (acero, hierro, cobre, aluminio, zinc, estaño).	Tel: 3104868514
6	EXIRECICLABLES MC S.A.S.	Calle 79 No. 68 G – 67	23132	SDA	Informe Técnico No. 01282 del 16 de agosto de 2019, del 16 agosto de 2019 mediante Rad. 2019IE187492 COE: 2019EE192359	23/08/2019	Tipo de material autorizado para disponer: papel- cartón, plástico, PVC, drywall, poliestireno expandido (icopor), madera, vidrio y metales (acero, hierro, cobre, aluminio, zinc, estaño).	Tel: 9269832
7	SOLUCIONES AMBIENTALES A&J S.A.S	Calle 74 Bis Sur No. 87C – 27		SDA	Informe Técnico No. 01797, 28 de octubre del 2019 con Rad. 2019IE253080 Radicado de notificación: 2019EE276297	28/10/2019	Recolección, almacenamiento y comercialización de Residuos aprovechables como lo son: papel cartón, plástico, madera, vidrio y metales (acero, hierro, cobre, aluminio, zinc, estaño)	Cel: 310 2101973 - 321 3435076
8	Papeles el Norte S.A.S.	Carrera 51 No. 128 – 35	24252	SDA	Informe Técnico No. 6280 SDA No. 2023IE260843	7/11/2023	Recolección, acopio y comercialización de residuos aprovechables como lo son: Papel- Cartón, Plástico, Madera, Metales, Otros como Drywall	Cel: 3103437589 email: papeleselnorte@hotmail.com web: www.papeleselnorte.com
9	Ecoplanet Soluciones AR SAS	Calle 63C No. 113 – 24		SDA	Informe Técnico de Aprobación 2020EI47033 Proceso 4691953	16/01/2020	Recolección, acopio de materiales aprovechables Madera, plástico, metálicos y otros: icopor y drywall.	Tel: 3108852812
10	BIORECICLAJE CASALLAS S.A.S.	Calle 77 No. 69 K 51	17856	SDA	Informe Técnico de Aprobación: No. 02120. Radicado Informe: 2020IE238044	20/12/2020	Se permite la recolección, acopio y comercialización de residuos aprovechables como: Papel, Cartón, Plástico, Madera, Metales, Otros como PVC, Drywall- Icopor	Tel: 3108810805
11	ECO Environment de Colombia S.A.S.	Av. carrera 72 No. 39C 09 sur		SDA	Informe Técnico: SDA No.2020IE56195 COE: 2020EE56234	11/03/2020	Recolección, acopio y comercialización de residuos aprovechables como lo son: papel, cartón, plástico, vidrio, madera, metales.	Tenga en cuenta que el certificado solo será valido con la firma del representante legal: Eduardo Andrés Fedraza Segura Tel: 3115847164
12	C&L SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S.	Calle 12 A No 83 09	17962	SDA	Informe Técnico No. 00841 SDA No.2020IE85600 Rad de aprobación: 2020EE87632	26/05/2020	Recolección, acopio y comercialización de residuos aprovechables como lo son: Papel- Cartón, Plástico, madera, Metales, Otros como PVC- Drywall	Tel: 7027172
13	GESTIONES AMBIENTALES CASTAÑEDA S.A.S.	Carrera 69P No. 73 – 46	19027	SDA	Rad. de aprobación: 2020EE240766 Informe técnico: No. 01682 (2020IE211001)	30/12/2020	Material autorizado para recepcionar: papel, plástico, PVC, chatarra y drywall.	Cel 313 6408520
14	Chatarrería Ambiental La Esmeralda	Carrera 72 A No. 70 - 55 (Bogotá)		SDA	Informe Técnico No. 02696 - 2019IE301932 Rad de aprobación: 2019EE303076	27/12/2019	Recolección, acopio y comercialización de los residuos de metales (acero, hierro, cobre, aluminio, zinc, estaño) potencialmente aprovechables	Tel: 3107580302
15	Soluciones Ambientales REMET	Temporalmente suspendido. Suspención a partir del 01 de junio de 2024		SDA	Informe Técnico No. 00215 - 2021IE23982 Proceso de aprobación: 5007832	8/02/2021	Recolección, acopio y comercialización de los residuos aprovechables como lo son: Papel- Cartón, Plástico, madera, metales (acero, hierro, cobre, aluminio, zinc, estaño) y otros como PVC- Drywall	Tel: 3138736873 - 3204134368
16	GLOBO METAL F.M S.A.S	Av. calle 24 No. 122 - 45		SDA	Informe de aprobación: 2021IE120141 Rad. de Aprobación: 2021EE135851	17/06/2021	Tipo de residuos autorizados a recepcionar: Papel, Cartón, Plástico, PVC, Drywall, Icopor, Madera y Metales (acero, hierro, cobre, aluminio, zinc, estaño)	Cel: 3213700326
17	CAR Ingeniería S.A.S.	Av. Carrera 114 No. 72G – 14	17593	SDA	Proceso Informe Técnico SDA No. 5154940 Radicado SDA: 2021IE153611	9/07/2021	Papel- Cartón, Plástico, Madera, Metales, otros como drywall e Icopor (pollaestireno expandido)	Cel: 316 291 0374 - 319 714 8393 las certificaciones serán válidas solo con la firma del representante legal y/o persona con apoderamiento de CAR INGENIERÍA S.A.S.

219

18	Depósito San Vicente 1 S.A.S	Carrera 69K No. 74B - 99	19259	SDA	Informe Técnico No. 03591 Radicado SDA No. 2021IE198062	16/09/2021	Recolección, acopio temporal y comercialización de residuos aprovechables como: Papel, cartón, plástico, PVC, Drywall, icopor (poliestireno expandido), madera y metales (acero, hierro, cobre, aluminio, zinc, estaño).	Cel: 310 243 4342 - 313 444 6520 **Observación:** Tenga en cuenta que el certificado solo será válido con la firma del representante legal.
19	GREEN WORLD J.E. SAS	Carrera 18C No. 58A – 17 sur	24118	SDA	Informe Técnico No. 06001 Radicado SDA No. 2023IE247042	23/10/2023	Recolección, acopio temporal y comercialización de residuos aprovechables como lo son: madera, plásticos, metales, cartón, papel, PVC y drywall	Cel: 313 6174512 Correo electrónico: worldgreen718@gmail.com
20	Cooperativa de Trabajo Asociado Ecoambiental El Porvenir	Carrera 24 No. 1F - 27	22274	SDA	Informe Técnico No. 07588 Radicado SDA No. 2022IE314416	6/12/2022	Recolección, acopio temporal y comercialización de residuos aprovechables como lo son: Papel, Cartón, Plástico, PVC, Drywall, Madera y Metales (acero, hierro, cobre, aluminio, zinc, estaño).	Tel: 60 1 2467834 Correo electrónico: gerencia@cooperativaporvenir.com
21	Reciclajes LyV S.A.S	Carrera 116A No. 63B – 37	23646	SDA	Informe Técnico No. 04931 Radicado SDA No. 2023IE208516	8/09/2023	Recolección, acopio y comercialización de residuos aprovechables como lo son: madera, plásticos, metales, cartón, papel, vidrio, PVC y drywall.	Cel: 3192764400 Correo electrónico: reciclajes62531@gmail.com
22	ASOCIACION NACIONAL DE RECUPERADORES AMBIENTALES – ASONDRA -	Diagonal 16A No. 100 – 27		SDA	Informe Técnico No. 07632 Radicado SDA No. 2022IE316407	9/12/2022	Recolección, acopio temporal y comercialización de residuos aprovechables como lo son: Papel, Cartón, Plástico, PVC, Icopor, Madera, Vidrio, Drywall y Metales (acero, hierro, cobre, aluminio, zinc, estaño).	Tel: 60 1 937 0066 - 301 529 0415 Correo electrónico: asondra444@gmail.com
23	Reciclaje Nuevo Horizonte Bogotá S.A.S.	Suspendido a partir del 17 de junio de 2024 Carrera 87B No 86 - 04	22605	SDA	Informe Técnico No. 06424 Radicado SDA No. 2022IE278376	27/10/2022	Recolección, acopio y comercialización de residuos aprovechables como lo son: Papel- Cartón, Plástico, Madera, Metales, otros como vidrio, superboard, drywall e icopor.	Cel: 3124529873 Correo electrónico: horizontebogotasas@gmail.com
24	Reciclajes Majito S.A.S.	Temporalmente suspendido por cambio de dirección. Suspención a partir del 01 de junio de 2024	23677	SDA	Informe Técnico No. 04934 Radicado SDA No.2023IE208627	8/09/2023	Recolección, acopio y comercialización de residuos aprovechables como lo son: madera, plásticos, metales, cartón, papel, vidrio, icopor, acrílico, PVC y drywall.	Cel: 3217752429 Correo electrónico: reciclajesmajito2023@gmail.com
25	Recuperadora Ambiental CBC S.A.S.	Transversal 88A No. 83A – 20	23725	SDA	Informe Técnico No. 04668 Radicado SDA No. 2023IE199155	29/08/2023	Recolección, acopio y comercialización de residuos aprovechables como lo son: Papel, Cartón, Plástico, PVC, Drywall, vidrio, icopor (poliestireno expandido), Madera y Metales (acero, hierro, cobre, aluminio, zinc, estaño).	Cel: 3204347640 Correo electrónico: cbc.recuperadorambiental@outlook.es
26	Chatarrería mi Tolima S A	Av. calle 80 No. 69P - 20	24411	SDA	Informe Técnico No. 07114 Radicado SDA No.2023IE284399	1/12/2023	Recolección, acopio y comercialización de residuos aprovechables como lo son: madera, plástico, metal, papel, cartón, chatarra, PVC, icopor y drywall, provenientes de proyectos constructivos.	Correo electrónico: cmitolima@gmail.com / chatarrerias@gmail.com Teléfono fijo: 601 751 95 35 Celular: 314 401 75 13
27	Ovidio García Marín	Carrera 13 Bis No. 50B – 24 Sur	24682	SDA	Informe Técnico No. 00381 Radicado SDA No.2024IE10964	15/01/2024	Recolección, acopio y comercialización de residuos aprovechables como lo son: Papel, Cartón, Plástico, Madera y Metales (acero, hierro, cobre, aluminio, zinc, estaño)	Cel: 3112457204 Correo electrónico: garciaovidio798@gmail.com
28	Recolectora Ambiental BM S.A.S.	Carrera 69K No. 79 - 02	24678	SDA	Informe Técnico No. 00604 Radicado SDA No. 2024IE17196	22/01/2024	Recolección, acopio y comercialización de residuos aprovechables como lo son: Madera, plásticos, metales, cartón, papel, vidrio, icopor, PVC y drywall	Cel: 3133097090 - 3138655249 Correo electrónico: recolectoraambientalbm@gmail.com
29	ECO Reciclaje LHJ S.A.S.	Calle 68 No. 70 – 22	25695	SDA	Informe Técnico No. 02976 Radicado SDA No. 2024IE128055	18/06/2024	Recolección, acopio y comercialización de residuos aprovechables como lo son: plástico – icopor, madera, metales, papel, cartón, drywall, vidrio, PVC y acrílico	Correo electrónico: ecoreciclajelhj@gmail.com Cel: 315 7044947 – 321 9844367
30	EKO Reciclaje la Nueva Era S.A.S.	Carreara 70 No. 67 B - 27	25684	SDA	Informe Técnico No. 02683 Radicado SDA No.2024IE110843	23/05/2024	Recolección, acopio temporal y comercialización de residuos aprovechables como lo son: madera, plásticos, metales, cobre, cartón, papel, vidrio, PVC y drywall.	Correo electónico: ekoreciclajelanuevaera@gmail.com

NOTA:

- Si el gestor objeto de su consulta no fue aprobado por la SDA y no se encuentra en el listado, deberá solicitar directamente a la Autoridad Ambiental que lo autorizó, la resolución o acto administrativo de aprobación.

- En caso de contar con Pin y que este no se ncuentre en el listado, puede comunicarse a la linea 3778904 e informar el pin asignado, para que dicha información sea actualizada en el documento.

Puede consultar los gestores autorizados por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, a travez del siguiente enlace:

420

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE AMBIENTE

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE Folios: 1 Anexos: No.
Radicación #: 2019EE303076 Proc #: 4657101 Fecha: 27-12-2019
Tercero: 19320145-1 - CHATARRERIA AMBIENTAL LA ESMERALDA
Dep Radicadora: SUBDIRECCION DE CONTROL AMBIENTAL AL SECTOR PUBLICO (E)
Clase Doc: Externo Tipo Doc: Oficio de Salida

Bogotá D.C.

Señores
CHATARRERÍA AMBIENTAL LA ESMERALDA
Atn. Álvaro Ballén Forero
Representante Legal
Carrera 72 A No. 70 – 55
Teléfono: 310 7580302
Ciudad

Referencia: Respuesta radicado SDA No. **2019ER284259** – Derecho de Petición para trámite de registro como Recuperador Especifico de la empresa CHATARRERÍA AMBIENTAL LA ESMERALDA., ubicada en la Carrera 72 A No. 70 - 55, Localidad de Engativá.

Cordial saludo:

La Subdirección de Control Ambiental al Sector Público –SCASP- de la Secretaría Distrital de Ambiente –SDA, como autoridad ambiental del perímetro urbano del Distrito Capital, en cumplimiento de su misión según lo estipulado en el decreto 109 de 2009 *"Por el cual se modifica la estructura de la Secretaría Distrital de Ambiente y se dictan otras disposiciones"*; en atención al derecho de petición de la referencia, informa que profesionales de la Subdirección realizaron visita técnica el pasado 10 de diciembre 2019, al predio ubicado en la **Carrera 72 A No. 70 – 55** con Chip Catastral **AAA0061LMRU**, donde funciona la empresa **CHATARRERÍA AMBIENTAL LA ESMERALDA**, identificada con **Nit. 19320145-1**, UPZ Boyacá Real del barrio Boyacá de la localidad de Engativá.

En dicha visita se realizó recorrido a la bodega de almacenamiento de residuos y se verificó la información enviada a la SCASP mediante radicados SDA No. 2019ER51835, 2019ER126434, 2019ER208815, 2019ER209356, 2019ER206021, 2019ER205641, 2019ER183603 y 2019ER284259, a través de los cuales se realizó la solicitud de inscripción de la empresa **CHATARRERÍA AMBIENTAL LA ESMERALDA**, como recuperador específico aprobado por la SDA.

La empresa CHATARRERÍA AMBIENTAL LA ESMERALDA, se dedica a actividades de recolección, acopio y comercialización de residuos aprovechables metálicos (acero, hierro, cobre, aluminio, zinc, estaño); de acuerdo a lo solicitado en el formato de registro mediante radicado SDA No. 2019ER284259.

A partir de todo lo evaluado y verificado en vista, se informa que la SDA, **APRUEBA** a la empresa CHATARRERÍA AMBIENTAL LA ESMERALDA, identificada con Nit. 19320145-1 ubicada en la Carrera 72 A No. 70 - 55 con Chip Catastral AAA0061LMRU, UPZ Boyacá

Real del barrio Boyacá de la localidad de Engativá, como Recuperador Específico mediante el respectivo **Informe Técnico No. 02696, 26 de diciembre del 2019**.

La anterior aprobación se mantiene siempre y cuando no se cambien las características ya descritas y no se desarrollen actividades diferentes a la recolección, acopio y comercialización de los materiales aprovechables que fueron mencionados en el informe emitido. En el caso en que existan modificaciones en las actividades y/o se implementen otras, como en el evento de adquisición de una nueva bodega para la actividad desarrollada se deberá informar a la Secretaría Distrital de Ambiente para tramitar un nuevo concepto.

Es obligación del nuevo Recuperador Especifico, garantizar el adecuado manejo y disposición del material recolectado y acopiado por CHATARRERÍA AMBIENTAL LA ESMERALDA, para ello debe contar con las certificaciones de disposición final del material, en las cuales especifiquen su tratamiento.

Se debe tener en cuenta que el informe adjunto, en ningún momento se asimila a un permiso de carácter ambiental. Cualquier información adicional que se requiera al respecto, no duden en contactarnos.

Atentamente,

PATRICIA MARIA GONZALEZ RAMIREZ
SUBDIRECCION DE CONTROL AMBIENTAL AL SECTOR PUBLICO (E)

Anexos: Informe Técnico No. 02696 del 26 de diciembre 2019 en trece (13) folios

Proyectó: YASMIN CATERINE BURBANO NARVAEZ
Revisó: SERGIO ALONSO IZQUIERDO GELVIS
ALEJANDRA LIZCANO MEDINA

Gmail

ADRIANA PACHON <apachon.bzc@gmail.com>

SOLICITUD INCLUSION PROVEEDOR Y GESTOR

SS Consultoria Ambiental Soluciones Sostenibles <ss.solucionessostenibles@gmail.com> 26 de febrero de 2025, 10:38

Para: ADRIANA PACHON <apachon.bzc@gmail.com>
Cc: Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Cordial saludo Ing. Adriana,

De manera atenta se informa que a partir del concepto emitido por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, en el comunicado 20252004394 del 04/02/2025, a partir del cual indican que "puede comercializar el material derivado del proceso de los RCD, ya que estos fueron gestionados bajo el registro No.05 como planta de aprovechamiento, por tal motivo dicho material puedes ser certificado dentro del proceso de aprovechamiento bajo este registro...". Esta interventoría Aprueba a la empresa CODEOBRAS S.A.S, con el NIT: 800.169.155-1, como proveedor de materiales derivados del aprovechamiento de los RCD, para el contrato en ejecución.

Atte

--

Ing. Natali Espinosa Sierra

MsC Gestión y Auditorías Ambientales

[El texto citado está oculto]

424

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Dirección de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental
República de Colombia

CUNDINAMARCA

CAR 04/02/2025 08:11
Al Contestar cite este No.: **20252004394**
Origen: Dirección de Evaluación, Seguimi
Destino:CODEOBRAS S.A.S.
Anexos: Fol: 2

Bogotá,

Ingeniero
GERMAN RAMIRO CASTAÑEDA
Representante Legal
CODEOBRAS S.A.S.
Tel: 8966368
Km 1,5 Vía Bogotá-Siberia. Costado Sur
codeobras@gmail.com
Cota (Cundinamarca)

ASUNTO: Respuesta al radicado 20251005166: DERECHO PETICION CODEOBRAS

Cordial Saludo,

En atención al radicado No. 20251005166 de fecha 20 de enero de 2025, con asunto: *DERECHO PETICION CODEOBRAS*, desde la Dirección de Evaluación Seguimiento y Control Ambiental - DESCA, y el grupo de residuos de construcción y demolición RCD, se informa lo siguiente:

En referencia a lo expuesto en el derecho de petición, respecto al primer punto de la solicitud en el momento se está realizando la revisión de la documentación allegada por parte del solicitante por medio del radicado No. 20251003847 del 16 de enero de 2025, por tal motivo dicha información está siendo tenida en cuenta para la emisión del informe técnico en referencia al registro.

Respecto al segunda petición se le informa al solicitante que puede comercializar el material derivado del proceso de los RCD, ya que estos fueron gestionados bajo el registro No.05 como planta de aprovechamiento, por tal motivo dicho material puedes ser certificado dentro del proceso de aprovechamiento bajo este registro ya que la empresa **CODEOBRAS**, solicito la cancelación del registro de forma voluntaria y no por motivos de sanciones ambientales o incumplimiento de las medidas de manejo ambiental, la cual se efectuó el día 18 de noviembre de 2024, por tal motivo dicho material procesado o trasformado fue realizado bajo este registro y cumple con las medidas mínimas de manejo ambiental estipuladas en la Resolución 0472 de 2017 y la Resolución 1257 de 2021.

Por último, se le recuerda a la persona jurídica **CODEOBRAS** que en el momento de emisión del presente comunicado no puede certificar la recepción de RCD hasta que se le comunique por los canales oficiales de comunicación que tiene la Corporación sobre el resultado de la aprobación del nuevo registro como gestor de RCD en modalidad de planta de aprovechamiento.

4/25

Cualquier aclaración o información adicional, gustosamente la brindaremos en los teléfonos (1) 5801111 Extensión 2200, en el horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., o a través del correo electrónico sau@car.gov.co

Atentamente,

CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SUAREZ
Director DESCA

Respuesta a: 20251005166 del 20/01/2025

Elaboró: Julian Dario Fajardo Nuñez / DESCA
Revisó: Santiago Farfan Ochoa / DESCA
Alberto Acero Aguirre / DESCA

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Dirección de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental
República de Colombia

CAR 11/09/2023 16:08
Al contestar cite este No.: **20232082175**
Origen: Dirección de Evaluación, Seguim
Destino:RUBIELA RADA ORTIZ
Anexos: Fol: 2

Bogotá,

Señor(a)
RUBIELA RADA ORTIZ
Representante Legal
Carrera 71D # 57-10 sur
a.panqueva@secamjr.com
Bogotá

ASUNTO: Respuesta al radicado 20231082784: SOLICITUD OFICIO REGISTRO CAR 001

Cordial Saludo,

En atención al Radicado CAR No. 20231082784 del 25 de agosto de 2023, en el cual la empresa SECAM JR SAS, solicita información sobre el estado de su registro No. 001 como gestor en modalidad de planta de aprovechamiento de residuos de construcción y demolición, adicionalmente solicita aclaraciones e información respecto a permisos asociados a la actividad de fabricación de materiales prefabricados, la Dirección de Evaluación Seguimiento y Control Ambiental DESCA desde su grupo de Residuos de Construcción y Demolición – RCD, comunicar lo siguiente:

1. Una vez efectuada la búsqueda en el Sistema de Administración de Expedientes – SAE de la Corporación utilizando el nombre SECAM JR EU, como producto de dicha búsqueda se encontró en TRÁMITE el Expediente Sancionatorio CAR No. 71477 relacionado con afectación al recurso agua. Sin embargo, a la fecha no existe sanción ni medida de suspensión de actividades.

2. Así mismo se realizó la búsqueda por el nombre del predio correspondiente a NUEVA ESPERANZA LOTE 4 y se encontró en TRAMITE el Expediente CAR No. 45693 y el Expediente 84850, relacionados con la afectación del recurso suelo. Sin embargo, a la fecha no existe sanción ni medida de suspensión de actividades.

3. En el marco de la gestión de residuos de construcción y demolición RCD y la normatividad ambiental aplicable vigente, el Gestor SECAM JR S.A.S., con Registro CAR No. 001 en la modalidad de planta de aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición – RCD, ubicado en el predio denominado Nueva Esperanza Lote 4, Barrio Uval, Localidad de Usme. Bogotá D.C., a la fecha se encuentra ACTIVO en el listado de gestores publicado en la página web de la Corporación.

4. Según la solicitud realizada respecto a la fabricación de materiales prefabricados destacar las siguientes consideraciones:

- En materia de Gestión de residuos de Construcción y Demolición – RCD, la

427

incorporación y desarrollo de esta actividad utilizando RCD como insumo, implicaría la actualización de la documentación técnica allegada a la corporación para la cual se otorgó el Registro inicialmente.

Por último, recordar a la empresa SECAM JR S.A.S., que el registro como Gestor de RCD en la modalidad de planta de aprovechamiento, no concede permisos ni licencias ambientales, o exime la responsabilidad de su trámite.

Atentamente,

BRYAN GUILLERMO MARTINEZ GONZALEZ
Director DESCA

Respuesta a: 20231082784 del 25/08/2023

Elaboró: Oscar Ivan Vargas Padilla / DESCA
Revisó: Darwin Erney Duarte Castro / DESCA
Alberto Acero Aguirre / DESCA

428

DTINI
202523500138571
Información Pública
Al responder cite este número

Bogotá D.C., Febrero 05 de 2025

Señora
RUBIELA RADA ORTIZ
SECAM JR SAS
KR 71 D 57 10 Sur.
110741
a.panqueva@secamjr.com
Bogotá - Bogotá DC

REF: Envío Respuesta al Radicado Número 202552600157722.

Asunto: Renovación de vigencia Registro No. 514 - 2019 en el Directorio de Proveedores de Materiales de Construcción, Sitios de Disposición final, Transformación y Aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición RCD del IDU.

Respetada señora:

En atención al radicado de la referencia, relacionado con la Renovación de vigencia del Registro IDU No. 514 - 2019, en la categoría de *Transformación y Aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición – RCD*, del Directorio de Proveedores[1], una vez revisada la información aportada, y teniendo en consideración entre otros documentos los siguientes:

1. Copia del Certificado de Existencia y Representación Legal de la Cámara de Comercio de Bogotá, con fecha de expedición del 20 de enero de 2025, con matrícula mercantil a nombre de Secam JR SAS, NIT: 830.507.163-0, representada legalmente por Rubiela Rada Ortiz, identificada con cédula de ciudadanía No. 28.935.312 de San Luis - Tolima, quien suscribe el formato FOIC07 de inscripción o renovación en el Directorio de proveedores.

2. Copia del pronunciamiento de la Dirección de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, expedido el 16/12/2024 con el No. 20242106607, suscrito por Carlos Eduardo Rodríguez Suarez, en su calidad de director, en el que informa:

   "ASUNTO: Respuesta al radicado 20241125543: SOLICITUD OFICIO CAR REGISTRO GESTOR 001

[1] Resolución No. 001330 del 01 de abril de 2019, "Por medio de la cual se establecen los lineamientos del Directorio de Proveedores de Materiales de Construcción, Sitios de Disposición final, Transformación y Aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición RCD del IDU".

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web
https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia
Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

DTINI
202523500138571
Información Pública
Al responder cite este número

Cordial saludo,

En atención al radicado No. 20241125543 del 11 de diciembre de 2024, en el que se solicita lo siguiente "(...) Me permito solicitar amablemente a ustedes la emisión de un oficio mediante el cual se informe que SECAM JR S.A.S. y la actividad de la planta, a la fecha no cuenta con ninguna medida de suspensión de actividades o sancionatorios y que el registro como gestor RCD 001 en el predio denominado Nueva Esperanza Lote 4, Barrio Uval, Localidad de Usme. Bogotá D.C., cumple con las obligaciones establecidas en los permisos ambientales otorgados de la actividad desarrollada y se encuentra vigente en el marco de la Resolución No. 1257 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible "Por la cual se modifica la Resolución 0472 de 2017 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD y se adoptan otras disposiciones". (...)" La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, desde la Dirección de Evaluación Seguimiento y Control Ambiental – DESCA y su grupo de Residuos de Construcción y Demolición – RCD, comunicar lo siguiente:

1. El gestor SECAM JR S.A.S., con registro CAR No. 01 ubicado en el predio denominado Nueva Esperanza Lote 4, Barrio Uval, Localidad de Usme, se encuentra vigente y ACTIVO en el listado de gestores de Residuos de Construcción y Demolición – RCD publicado en la página web de la Corporación. (Fecha de actualización 04 de diciembre de 2024).

2. El listado de gestores de puntos limpios, plantas de aprovechamiento y sitios de disposición final de Residuos de Construcción y Demolición - RCD, inscritos ante la jurisdicción CAR se puede consultar en la página Web de la CAR, dentro de la base de datos Gestores de Residuos de Construcción y Demolición - RCD. La ruta para realizar la consulta es la siguiente: Temas Ambientales/ Residuos/Residuos de Construcción y Demolición - Base de Datos Gestores de Residuos de Construcción y Demolición https://www.car.gov.co/vercontenido/3795."

Esta Dirección Técnica, informa que la documentación presentada cumple con los requisitos establecidos en la Resolución IDU No. 001330 de 2019, por cuanto procede a realizar la Renovación de vigencia del Registro número 514 - 2019, dentro del "*Directorio Ambiental de Proveedores de Materiales de Construcción, Sitios de Disposición final, Transformación y Aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición RCD del IDU*", en la categoría de *Transformación y Aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición – RCD*, a nombre de Secam JR SAS, cuya planta se encuentra ubicada en la Carrera 7D este No. 115 Sur, Lote 4, en la Localidad de Usme, de la Ciudad de Bogotá D.C.

Esta Renovación cuenta con vigencia de un (1) año, a partir del 04 de marzo de 2025 y podrá ser cancelada en cualquier momento por este Instituto conforme a las

Te invitamos a Hacer uso del formulario de Radicación Web
https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia
Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

siguientes causales establecidas en el artículo 7° de la Resolución IDU No. 001330 de 2019, así:

- *"Cuando se imponga medidas sancionatorias o cualquier suspensión que implique el cese de actividades del proveedor por parte de la autoridad competente.*

- *Cuando deje de cumplir alguno de los requisitos de inscripción o renovación establecidos en el procedimiento de Actualización Directorio Ambiental de Proveedores."*

Es de mencionar que la empresa Secam JR SAS, deberá garantizar que el tratamiento y aprovechamiento de los Residuos de Construcción y Demolición – RCD, provenientes de las diferentes obras de los contratistas del IDU, se realice en área del predio donde se ubica la Planta en mención; y que para efectos técnicos se encuentra amojonado como aparece en la siguiente gráfica:



Fuente: Instituto de Desarrollo Urbano – IDU

Igualmente, se establece por disposición de la misma Resolución IDU No. 001330, en su artículo 9º, que todo proveedor inscrito con registro activo, dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes, deberá reportar a esta Dirección Técnica[2] los volúmenes de las cantidades de materiales suministrados únicamente a Contratos del

2 Hoy Dirección Técnica de Inteligencia de Negocio e Innovación, de conformidad con la modificación de la denominación de la dependencia establecida en los artículos 2 y 14 del Acuerdo 06 de 2021 expedido por el Consejo Directivo del IDU.

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web
https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia
Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

Calle 22 No 6 - 27
Código Postal 11031
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Línea 195
FO-DO-07_V15

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

431

DTINI
20252350013857 1
Información Pública
Al responder cite este número

IDU, en el formato FOIC06, dispuesto en el siguiente enlace de la página Web del Instituto: https://www.idu.gov.co/page/siipviales/ambiental/portafolio.

Es importante aclarar que el citado Formato FOIC06 de Reporte que presentan ante este Directorio, es diferente a la Certificación de venta del material que es entregada al Contratista IDU.

Finalmente, es de informar, que se remite copia de la presente comunicación a la Dirección de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, para conocimiento y fines pertinentes en el marco de sus competencias como autoridad ambiental.

Cordialmente,

SULLY MAGALIS ROJAS BAYONA
Directora Técnica de Inteligencia de Negocio e Innovación
Firma mecánica generada el 05-02-2025 04:21:46 PM autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Con Copia a: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - Bogotá DC - Bogotá - AC 24 60 50 - sau@car.gov.co - correspondencia@car.gov.co

Elaboró: NELSON ANDRES ROMERO CARDENAS-Dirección Técnica de Inteligencia de Negocio e Innovación

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web
https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia
Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

432

Gmail

ADRIANA PACHON <apachon.bzc@gmail.com>

SOLICITUD INCLUSION GESTOR SECAM JR

SS Consultoria Ambiental Soluciones Sostenibles <ss.solucionessostenibles@gmail.com> 26 de febrero de 2025, 11:07
Para: ADRIANA PACHON <apachon.bzc@gmail.com>
Cc: Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Cordial saludo Ing. Adriana,

De manera atenta se informa que una vez revisada la documentación enviada, y verificación por parte de esta interventoría del Listado de Gestores de RCD Inscritos en la Jurisdicción CAR
(Fecha de actualización 21 de febrero 2025), se evidencia que la empresa SECAM JR SA, identificada con N.I.T. 830507163-0, se encuentra activa como planta de aprovechamiento.

INSCRITOS EN LA CAR EN EL MARCO DE LAS RESOLUCIONES MADS No. 0472 DE 2017 y 1257 DE 2021							
No. DE REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL	ESTADO DEL REGISTRO/ FECHA	Nit/CC titular del registro	MUNICIPIO	PREDIO/LOCALIZACION	TIPO DE RCD A APROVECHAR	CONTACTO
1	SECAM JR SAS	ACTIVO 02/05/2018	830507163-0	BOGOTA RURAL	Lote 4/ Carrera 7 D Este Calle 115Sur	1.1 1.2 1.3	Cel: 3015981851

Por lo anterior, se aprueba su inclusión como planta de aprovechamiento de RCD y proveedor de materiales derivados del aprovechamiento de los RCD, para el contrato en ejecución.

Atte

--

Ing. Natali Espinosa Sierra

MsC Gestión y Auditorías Ambientales

[El texto citado está oculto]

433

SITIOS APROBADOS DE ADECUACIÓN DE SUELOS CON FINES AGRÍCOLAS - CAR					
NOMBRE / RAZON SOCIAL	MUNICIPIO	LOCALIZACION	AUTO DECISORIO	OBSERVACIONES MATERIALES A DISPONER	CONTACTO
PRACTICAS AMBIENTALES S.A.S.	Mosquera	La merindad 1 y 2 - Vereda San Jorge	Res. 2660 de 21/011/2014	suelo organico, material de excavación	Tel.: 757 9729
PRACTICAS AMBIENTALES S.A.S.	Madrid	San Diego - Vereda El Corzo	Res. 2659 de 21/11/2014	suelo organico, material de excavación	Tel.: 757 9729
SOCIEDAD PAISAJO S.A.S	Mosquera	Vereda San José	Res. 2325 de 2015	suelo organico, material de excavación	Tel.: 316 2254
RAFAEL ROMERO	Mosquera	San José	Resolución 3976 del 14/12/16	suelo organico, material de excavación	Cel.: 321 365 3360
JAIME WILLS	Mosquera	San José	Resolución 2895 de 29/09/17	suelo organico, material de excavación	Tel.: 636 4465
JAIME MURCIA	Cota	Vereda Pueblo Viejo - Predio La Libertad	Resolución 2976 del 24/12/2015	suelo organico, material de excavación	Cel.: 311 561 1238
TRANSPORTES LAND	Mosquera	Vereda Balsillas	Resolución 0726 del 18 de marzo de 2019	suelo organico, material de excavación	cel: 3212010645

SITIOS DISPOSICIÓN FINAL DE RCD					
NOMBRE O RAZON SOCIAL	MUNICIPIO	LOCALIZACIÓN	APROBACION	MATERIALES A DISPONER	CONTACTO
MAGIR S.A.S. - ESP	Soacha	Vereda Panamá	Resolución CAR 0680 de 01/04/2016	Escombros, concretos y agregados sueltos de construcción, capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación, ladrillo, acero, concreto y similares	Cel.: 320 830 6335
EL VINCULO	Soacha	KM. 1.4 VIA SOACHA SIBATE	Resolución 1536 DE 2015 Alcaldía Soacha	Escombros, concretos y agregados sueltos de construcción, capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación, ladrillo, acero, concreto y similares	Tel.: 7251891
AGREGADOS Y RELLENOS TERRENA S.A.S. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P.	Mosquera	Vereda Balsillas	Resolución CAR No 2051 del 03/08/2017 PMRRA	Escombros, concretos y agregados sueltos de construcción, capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación, ladrillo, acero, concreto y similares	Tel.: 691 4898

SITIOS DISPOSICIÓN FINAL DE RCD EN EL MARCO DE LA RESOLUCIÓN 0472 DE 2017 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE				
NOMBRE O RAZON SOCIAL	MUNICIPIO	LOCALIZACIÓN	REGISTRO	CONTACTO
MINERSA	La Calera	Vereda Aurora Alta	002	Tel.: 317 4863
LAGUNA BLANCA	Bojacá	Vereda Cubia	003	Cel: 3138054034
EMPRESA SAN JOSE GREEN GROUP SAS	Soacha	Predio ubicado en San Jose - Piedra Gorda Las Manas, Vereda Panamá	004	Cel: 3106665535
PREDIO LA ESPERANZA	Ciudad Bolivar	Barrio La Torre - Barrio Tierra Buena 2,5 Km	005	Cel: 3102449382
CAMPO ALEGRE BAJO	Fusagasuga	Vereda La Venta	006	Cel: 3229466027

4134

GESTORES PLANTAS TRATAMIENTO RCDS EN EL MARCO DE LA RESOLUCIÓN 0472 DE 2017 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE				
NOMBRE O RAZON SOCIAL	MUNICIPIO	LOCALIZACIÓN	REGISTRO	CONTACTO
SECAM JR	BOGOTA	Carrera 7 D Este Calle 115 Sur	001	Cel.: 3002414969
DROMOS	MOSQUERA	Kilómetro 3.8 Zona Industrial Balsillas	002	Tel.: 742 5376
INCOMINERÍA	MOSQUERA	Kilómetro 3.5 Zona Industrial Balsillas (Entrada por Los Puentes)	003	Cel.: 322 475 2219
CICLOMAT	COTA	Autopista Medellín Kilómetro 1.2 vía Siberia - Bogotá entrada Parque Industrial La Florida 600 metros al sur de la calle 80	004	Tel.: 487 4315
CICLOMAT - CODEOBRAS	COTA	Autopista Medellín Kilómetro 1.2 vía Siberia - Bogotá entrada Parque Industrial La Florida 600 metros al sur de la calle 80	005	Tel.: 487 4315
AGREGADOS ARENAS Y GRAVAS S.A.S.	TENJO	Via Siberia - Medellín Kilómetro 3 Vereda La punta	006	Cel: 3003114712
CUNDICOAL	COGUA	Kilometro 7 Vs Ubaté Vereda El Olivo	007	Cel.: 311 477 1536
UAERMV	BOGOTA	Parque Minero Industrial "El Mochuelo" Kilómetro 3 Vía Pasquilla. Ciudad Bolivar	008	Tel.: 747 0909
EL VINCULO	SOACHA	KM. 1.4 VIA SOACHA SIBATE	009	Tel.: 7251891
PUENTE PIEDRA S.A.S.	MADRID	Vereda La Cuesta	010	Cel:3187509487
TRANSFORMACION NATURAL S.A.S.	MOSQUERA	Vereda Balsillas	011	Cel:3187509487
CMOP (Centro de Mantenimiento, Operación y Producción) MHC - MARIO HUERTAS COTES	MADRID	Km 12, Vía Bogotá - Medellín	012	Cel: 3204903172
Granulados Reciclados de Colombia - GRECO S.A.S.	COTA	Vereda Sibería, sector La Florida, en la zona agroindustrial	013	Cel: 3138876569
GRANJEROS SAS	MOSQUERA	Vereda Balsillas	014	Cel :3203045038
RECICLADOS INDUSTRIALES	COTA	Km 1.5 Costado sur Vía Bogotá -Siberia	015	Cel: 3102925151
ALBORAL S.A.	MOSQUERA	Vereda Balsillas	016	Cel: 3153393288
CONSORCIO DESARROLLOS ECO-AMBIENTALES	SOACHA	Vereda Panamá	017	Tel: 4857683
LAMINADOS LAB S.A.S	SOACHA	carrera 13 No. 13-22 sur sector de Santa Ana	018	Cel: 3002146821
Centro de Aprovechamiento de residuos de Construcción y Demolición - CARCD	MOSQUERA	Vereda Balsillas	019	Cel: 3124326986 - 3124326992
C.C.Q. CONSTRUCCIONES S.A.S.	BOJACA	Vereda Fute	020	CEL: 3208483448
RECICLADOS INDUSTRIALES	MOSQUERA	Vereda San José	021	Cel: 3102925151
ASMINCOL	SIBATE	Vereda La Unión	022	Cel: 3102886432

GESTORES PUNTOS LIMPIOS RCDS EN EL MARCO DE LA RESOLUCIÓN 0472 DE 2017 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE				
PLANTA PRODUCTIVA DE ACONDICIONAMIENTO DE SUELOS Y CULTIVOS DE FRUTAS TIPO EXPORTACIÓN - EXPORHUILA S.A.S	COTA	INTEXZONA LOTE 93. VEREDA SIBERIA	001	Cel: 3108583796
MAAT SOLUCIONES AMBIENTALES	COTA	AUT. MEDELLIN KM3.9BOGOTÁ-SIBERIA	002	Tel: 7425410
AGREGADOS ARENAS Y GRAVAS S.A.S.	TENJO	Via Siberia - Medellín Kilómetro 3 Vereda La punta	003	Cel: 3003114712

435

Gmail

ADRIANA PACHON <apachon.bzc@gmail.com>

SOLICITUD CERTIFICACIÓN SUMINISTRO

1 mensaje

ADRIANA PACHON <apachon.bzc@gmail.com> 8 de marzo de 2025, 18:39
Para: Contacto@codeobras.com

Buenos días

Mediante el presente solicitamos por favor sea emitida certificación de suministro de acuerdo con la información anexa, a continuación se relaciona la información del contrato

EMPRESA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
TIPO DOC	NIT
NO. DOC	901.886.663-3
PERIODO A CERTIFICAR	**FEBRERO**
REPRESENTANTE LEGAL	WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR
DIRECCIÓN	Cl. 105 #46 – 26 piso 2,
TELÉFONO	300 8506053
CORREO ELECTRÓNICO	apachon.bcz@gmail.com
MUNICIPIO O DISTRITO	BOGOTÁ D.C
OBRA O CONTRATO	CONTRATO IDRD N° SG-4060
PIN DE OBRA	26732

Cordialmente

Adriana Pachon Fajardo
Residente Ambiental

6 adjuntos



CODEOBRAS3.jpeg
169K




CODEOBRAS_4.jpeg
181K

436



CODEOBRAS 1.jpeg
97K



CODEOBRA1.jpeg
181K



CODEOBRAS2.jpeg
171K



CODEOBRAS5.jpeg
385K

437

PARQUE PISAOS

438

AS

FUTURO!.

30 AÑOS

CONSTRUCCIÓN Y
CONSULTORÍA DE OBRAS CIVILES
NIT.: 800.169.155-1

REMISION

12		Proyecto [illegible]	
5	Dirección	Ciudad Bogota	Orde
	Conductor Orlando Murcia		Placa

Despachamos a ud.(s) los siguientes artículos

	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo
	7	M^3	AR. PEA

	Transportador	Despachado por
	Firma	Firma ANA

AS

FUTURO!.

30 AÑOS

CONSTRUCCIÓN Y
CONSULTORÍA DE OBRAS CIVILES
NIT.: 800.169.155-1

REMISION

439

Proyecto

Dirección

Ciudad Bogota

Orden d

Placa Ve

Conductor Wilman.

Despachamos a ud.(s) los siguientes artículos

	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo
2	15	m3.	AR. PEA

Transportador

Firma

Despachado por

Firma Dairo

Tra

Firm

PARQUE PIJAOS

BRAS

S FUTURO!.

30 AÑOS

CONSTRUCCIÓN Y
CONSULTORÍA DE OBRAS CIVILES
NIT.: 800.169.155-1

REMISIO 440

Proyecto Parque Pijao

Ciudad Bogota

325 Dirección

Conductor Orlando Moreia

Despachamos a ud.(s) los siguientes artículos

	Cantidad	Unidad	Descripción del Artícu
7	7	M^3	AR PEA

Transportador

Firma

Despachado por

Firma ANA

PARQUE PIJAOS

494

AS
FUTURO!.

30 AÑOS

CONSTRUCCIÓN Y
CONSULTORÍA DE OBRAS CIVILES
NIT.: 800.169.155-1

REMISION


12		Proyecto Parque Pijaos	
25	Dirección	Ciudad Bogota	Ord
	Conductor Orlando Murcia		Plac

Despachamos a ud.(s) los siguientes artículos

Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo
7	M^3	AR PEA

	Transportador Firma	Despachado por Firma ANA

PARQUE PIJAOS.



30 AÑOS

CONSTRUCCIÓN Y
CONSULTORÍA DE OBRAS CIVILES
NIT.: 800.169.155-1

REMISION

JRO!.

Proyecto Parque Pijaos

Dirección

Ciudad Bogotá

Orden de Co

Conductor Orlando Garcia

Placa Vehícul

Despachamos a ud.(s) los siguientes artículos

Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo
7	M³	AR PEA

Transportador

Firma

Despachado por

Firma ANA

Transpor

Firma

PARQUE PIJAOS

EOBRAS

IMOS FUTURO!.

30 AÑOS

CONSTRUCCIÓN Y
CONSULTORÍA DE OBRAS CIVILES
NIT.: 800.169.155-1

REMISION 9

MR.

A 2023 Dirección

Proyecto Parque. Pijao.

Ciudad Bogota.

Orden de Comp

Placa Vehículo

Conductor Orlando Mursia

Despachamos a ud.(s) los siguientes artículos

cia	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo
DEA	7	m3-	AR. PEA

Transportador

Firma

Despachado por

Firma Davo.

Transport

Firma

Gmail

ADRIANA PACHON <apachon.bzc@gmail.com>

SOLICITUD CERTIFICADO SUMINISTRO IDRD

1 mensaje

ADRIANA PACHON <apachon.bzc@gmail.com> 04 de marzo de 2025, 9:37
Para: Auxiliar Comercial Dromos pavimentos <auxiliar.comercial@dromos.co>

Buenos días

mediante el presente solicitamos por favor sea emitida certificación de suministro de acuerdo con la información anexa, a continuación se relaciona la información del contrato

EMPRESA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
TIPO DOC	NIT
NO. DOC	901.886.663-3
PERIODO A CERTIFICAR	**FEBRERO**
REPRESENTANTE LEGAL	WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR
DIRECCIÓN	Cl. 105 #46 – 26 piso 2,
TELÉFONO	300 8506053
CORREO ELECTRÓNICO	apachon.bcz@gmail.com
MUNICIPIO O DISTRITO	BOGOTÁ D.C
OBRA O CONTRATO	CONTRATO IDRD N° SG-4060
PIN DE OBRA	26732


Cordialmente

Adriana Pachon Fajardo
Residente Ambiental

3 adjuntos



DROMOS.jpeg
73K

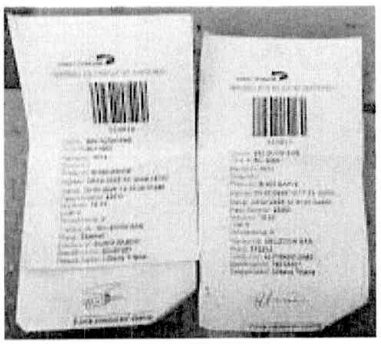

DROMOS FEB.jpeg
84K




DROMOS 1.jpeg
107K



511551

Cliente: **BELZCON SAS**
Obra: **IDRD 4060**
Remisión: **0011**
Dirección:
Producto: **B-600 EA=19**
Ingreso: **27-02-2025 06:23:21 14890**
Salida: **27-02-2025 06:46:53 37630**
Peso Material: **22740**
Volumen: **14.86**
Lote: **0**
Temperatura: **0**
Transporta: **BELZCON SAS**
Placa: **TAW447**
Conductor: **HUGO PARDO**
Identificacion: **80051201**
Despachador: **Lilliana Triana**

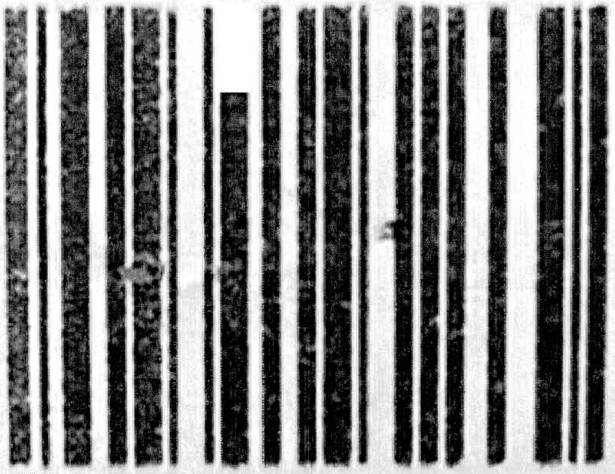

511551

Cliente: **BELZCON SAS**
Obra: **IDRD 4060**
Remisión: **0011**
Dirección:
Producto: **B-600 EA=19**
Ingreso: **27-02-2025 06:23:21 14890**
Salida: **27-02-2025 06:46:53 37630**
Peso Material: **22740**
Volumen: **14.86**
Lote: **0**
Temperatura: **0**
Transporta: **BELZCON SAS**
Placa: **TAW447**
Conductor: **HUGO PARDO**
Identificacion: **80051201**
Despachador: **Lilliana Triana**

947



512673

Cliente: **BELZCON SAS**
Obra: **IDRD 4060**
Remisión: **0012**
Dirección:
Producto: **B-600 EA=19**
Ingreso: **27-02-2025 15:41:51 14810**
Salida **27-02-2025 15:54:40 37930**
Peso Material: **23120**
Volumen: **15.11**
Lote: **0**
Temperatura: **0**
Transporta: **BELZCON SAS**
Placa: **TAW447**
Conductor: **HUGO PARDO**
Identificacion: **80051201**
Despachador: **Lilliana Triana**

448

DROMOS

RECIBO ENTREGA DE MATERIAL

514818

Cliente: **BELZCON SAS**
Obra: **IDRD 4060**
Remisión: **0014**
Dirección:
Producto: **B-600 EA=19**
Ingreso: **28-02-2025 12:18:49 14730**
Salida: **28-02-2025 12:35:26 37240**
Peso Material: **22510**
Volumen: **14.71**
Lote: **0**
Temperatura: **0**
Transporta: **BELZCON SAS**
Placa: **TAW447**
Conductor: **HUGO PARDO**
Identificacion: **80051201**
Despachador: **Liliana Triana**

Firma conductor cliente

DROMOS

RECIBO ENTREGA DE MATERIAL

514815

Cliente: **BELZCON SAS**
Obra: **IDRD 4060**
Remisión: **0015**
Dirección:
Producto: **B-600 EA=19**
Ingreso: **28-02-2025 12:17:13 12000**
Salida: **28-02-2025 12:31:41 34880**
Peso Material: **22980**
Volumen: **15.02**
Lote: **0**
Temperatura: **0**
Transporta: **BELZCON SAS**
Placa: **TTZ263**
Conductor: **ALFONSO DIAZ**
Identificacion: **79734201**
Despachador: **Liliana Triana**

Gmail

ADRIANA PACHON <apachon.bzc@gmail.com>

SOLICITUD CERTIFICACIÓN FEBRERO

1 mensaje

ADRIANA PACHON <apachon.bzc@gmail.com> 8 de marzo de 2025, 18:45
Para: sanjoaquin@ladrillerasanjoaquin.com

Buenos días

mediante el presente solicitamos por favor sea emitida certificación de suministro de acuerdo con la información anexa, a continuación se relaciona la información del contrato

EMPRESA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
TIPO DOC	NIT
NO. DOC	901.886.663-3
PERIODO A CERTIFICAR	**FEBRERO**
REPRESENTANTE LEGAL	WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR
DIRECCIÓN	Cl. 105 #46 – 26 piso 2,
TELÉFONO	3107069144
CORREO ELECTRÓNICO	apachon.bcz@gmail.com
MUNICIPIO O DISTRITO	BOGOTÁ D.C
OBRA O CONTRATO	CONTRATO IDRD N° SG-4060
PIN DE OBRA	26732

Cordialmente

Adriana Pachon Fajardo
Residente Ambiental
Belzcon SAS

REMISIÓN LADRILLO TOLETE MACIZO - PARQUE NACIONAL (1).pdf
330K

450

LADRILLERA SAN JOAQUÍN SAS

NIT 832.009.008-8

Oficina: Carrera 1A No. 11-130 - T2 Of. 429 - Ofichía
Planta: Km. 12 Vía Zipaquira -Ubaté
Cel: 3118995677 - 3108563477

REMISION 37718

Fecha: 26/02/2025

Señor (es):	Belzcon Sas	**Contacto:**		**Transportador:**	CESAR CELY,
Ciudad:	BOGOTA	**Celular:**		**Conductor:**	CESAR CELY,
Dirección:	Calle 36 No 6 - 41 costado sur Parque Nacional Enrique Olaya (localidad Santa fe)			**Placa:**	SUA897

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD
LTM624	Ladrillo tolete macizo	3000

Despachado por: VIVIANA CAMELO	Vale: / Factura:	El material de arcilla se descarga a borde de planchón, despues de recibido en obra no se aceptan reclamos ni devoluciones
Observaciones	Transportador: CESAR CELY, Firma	Recibido a satisfacción: Nombre, firma y sello John Santana

451

Powered by CamScanner

Gmail

ADRIANA PACHON <apachon.bzc@gmail.com>

SOLICITUD CERTIFICACIÓN SUMINISTRO

1 mensaje

ADRIANA PACHON <apachon.bzc@gmail.com> 8 de marzo de 2025, 18:30
Para: solicitudes.soacha@secamjr.com

Buenos días

mediante el presente solicitamos por favor sea emitida certificación de suministro de acuerdo con la información anexa, a continuación se relaciona la información del contrato

EMPRESA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
TIPO DOC	NIT
NO. DOC	901.886.663-3
PERIODO A CERTIFICAR	**FEBRERO**
REPRESENTANTE LEGAL	WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR
DIRECCIÓN	Cl. 105 #46 – 26 piso 2,
TELÉFONO	300 8506053
CORREO ELECTRÓNICO	apachon.bcz@gmail.com
MUNICIPIO O DISTRITO	BOGOTÁ D.C
OBRA O CONTRATO	CONTRATO IDRD N° SG-4060
PIN DE OBRA	26732

Cordialmente

Adriana Pachon Fajardo
Residente Ambiental



SECAM FEB.jpeg
143K

452

SECAM JR

NIT: 830.507.163-0

GESTOR RCDS REGISTRO CAR-00

RES.0472-2017 MIN AMBIENTE

DESARROLLO - CEL - 314 [illegible]

Recibo Número: 1317

Placa: U5C745

Bruto: 14000

Tara: 6070

Neto: 7930

Precio: 0

Entrada: 14/02/2025 3:27:41 p. m.

Salida: 14/02/2025 3:44:41 p. m.

Empresa: OMR

Producto: SUB BASE GRAN TIPO PEA

Conductor: ORLANDO MURCIA

Origen: PARQUE PLAZA

453

CEMEX	ANEXO IV - CONSTANCIA DE GESTIÓN
APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN SDA NO. 1280 DE 2017, MEDIANTE RESOLUCIÓN ANLA NO. 1506 -2006 Y 1480-2014.	APROBADO MEDIANTE PINES 8418-1778
# NTR --	

1. DATOS DEL GENERADOR	
PIN-GEN	26732
Nombre del proyecto (obra)	CONTRATO IDRD N° SG-4060 CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD
Nombre o razón social	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
Documento de identificación o NIT	9018866633
Representante Legal	WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR
Dirección domicilio	Cl. 105 #46 – 26 piso 2
Teléfono	3008506053
Correo electrónico	apachon.bcz@gmail.com
Dirección de generación de RCD	PARQUES

2. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE LOS RCD				
Transportador:	Razón social	CONSORCIO BELZCO IDRD 1	No. de Icentifcación	901886633

Vehículos asociados:	Tipo	Placa	No. PIN TRANS
	Volqueta sencilla y/o doble, tractomula (entre otros)	USC745	560

No. Constancias de Gestión Provisional recibidas al transportador	2

3. GESTIÓN INTEGRAL RCD (ALMACENAMIENTO, TRATAMIENTO, APROVECHAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL)

Gestor	Punto Limpio		Sitio de disposición final	X	Recuperador Especifico	
	Receptor		Planta de tratamiento y aprovechamiento		Otro (¿Cuál?)	

PIN del gestor	8418-1778	Datos del Gestor	
NTR		Nombre o Razón Social	CEMEX COLOMBIA S.A.
Fecha de recepción RCD	01 - 2025	Identificación o NIT	860.002.523-1
		Representante Legal	CARLOS ANDRÉS BONILLA SABOGAL
		Dirección	Av. Boyacá No. 72 - 04 sur
		Municipio	Bogotá, D.C. Colombia
		Teléfono de contacto	3112209197

01 RCD susceptibles de aprovechamiento			
01 01 Excavación		Ton	m3
01 01 01	Coberturas vegetales		
01 01 02	Tierras limpias de excavación		
01 01 03	Limos		
01 01 04	Materiales petreos de excavación		
01 01 05	Otros residuos de excavación	20.52	14

01 02 Productos de cimentación y pilotaje		Ton	m3
01 02 01	Arcillas		
01 02 02	Bentonitas		
01 02 03	Otros residuos de cimentación y pilotaje		

01 03 Petreos		Ton	m3
01 03 01	Concretos		
01 03 02	Gravas		
01 03 03	Cantos		
01 03 04	Ladrillos		
01 03 05	Arenas		
01 03 06	Morteros		
01 03 07	Materiales cerámicos		
01 03 08	Residuos de material asfáltico		
01 03 09	Bases y sub bases granulares		
01 03 10	Otros residuos pétreos		

455

Nombre del encargado obra (Director de obra, representante legal, residente técnico ambiental, o quien haga sus veces)			
CC		Firma	

Nombre del representante legal gestor	SALOME ESTEPHANIA FIQUE ESPITIA		Salome Fique. SALOME ESTEPHANIA FIQUE ESPITIA COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL CENTRO DE CIRCULARIDAD CEMEX COLOMBIA S.A.
CC	860.002.523-1	Firma	

Consecutivo para la verificación del certificado: PzOrV/bT-40351, generado en: 2025-02-26

La presente certificación tendrá una fecha máxima de verificación de 30 días calendario a partir de su recepción, para solicitud de ajustes y cambios de la misma por parte de CEMEX COLOMBIA S.A.

© 2024, CEMEX COLOMBIA S.A. Todos los derechos reservados

CEMEX	ANEXO IV - CONSTANCIA DE GESTIÓN
APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN SDA NO. 1280 DE 2017, MEDIANTE RESOLUCIÓN ANLA NO. 1506 -2006 Y 1480-2014.	APROBADO MEDIANTE PINES 8418-1778
	# NTR --

1. DATOS DEL GENERADOR	
PIN-GEN	26732
Nombre del proyecto (obra)	CONTRATO IDRD N° SG-4060 CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD
Nombre o razón social	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
Documento de identificación o NIT	9018866633
Representante Legal	WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR
Dirección domicilio	Cl. 105 #46 – 26 piso 2
Teléfono	3008506053
Correo electrónico	apachon.bcz@gmail.com
Dirección de generación de RCD	PARQUES

2. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE LOS RCD				
Transportador:	Razón social	CONSORCIO BELZCO IDRD 1	No. de Identifcación	901886633

Vehículos asociados:	Tipo	Placa	No. PIN TRANS
	Volqueta sencilla y/o doble, tractomula (entre otros)	USC745	560

No. Constancias de Gestión Provisional recibidas al transportador	2

3. GESTIÓN INTEGRAL RCD (ALMACENAMIENTO, TRATAMIENTO, APROVECHAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL)

Gestor	Punto Limpio		Sitio de disposición final	X	Recuperador Especifico	
	Receptor		Planta de tratamiento y aprovechamiento		Otro (¿Cuál?)	

PIN del gestor	8418-1778	Datos del Gestor	
NTR		Nombre o Razón Social	CEMEX COLOMBIA S.A.
Fecha de recepción RCD	01 - 2025	Identificación o NIT	860.002.523-1
		Representante Legal	CARLOS ANDRÉS BONILLA SABOGAL
		Dirección	Av. Boyacá No. 72 - 04 sur
		Municipio	Bogotá, D.C. Colombia
		Teléfono de contacto	3112209197

01 RCD susceptibles de aprovechamiento			
01 01 Excavación		Ton	m3
01 01 01	Coberturas vegetales		
01 01 02	Tierras limpias de excavación		
01 01 03	Limos		
01 01 04	Materiales petreos de excavación		
01 01 05	Otros residuos de excavación	20.52	14

01 02 Productos de cimentación y pilotaje		Ton	m3
01 02 01	Arcillas		
01 02 02	Bentonitas		
01 02 03	Otros residuos de cimentación y pilotaje		

01 03 Petreos		Ton	m3
01 03 01	Concretos		
01 03 02	Gravas		
01 03 03	Cantos		
01 03 04	Ladrillos		
01 03 05	Arenas		
01 03 06	Morteros		
01 03 07	Materiales cerámicos		
01 03 08	Residuos de material asfáltico		
01 03 09	Bases y sub bases granulares		
01 03 10	Otros residuos pétreos		

Nombre del encargado obra (Director de obra, representante legal, residente técnico ambiental, o quien haga sus veces)			
CC		Firma	

Nombre del representante legal gestor	SALOME ESTEPHANIA FIQUE ESPITIA		Salome Fique. SALOME ESTEPHANIA FIQUE ESPITIA COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL CENTRO DE CIRCULARIDAD CEMEX COLOMBIA S.A.
CC	860.002.523-1	Firma	

Consecutivo para la verificación del certificado: PzOrV/bT-40351, generado en: 2025-02-26

La presente certificación tendrá una fecha máxima de verificación de 30 días calendario a partir de su recepción, para solicitud de ajustes y cambios de la misma por parte de CEMEX COLOMBIA S.A.

© 2024, CEMEX COLOMBIA S.A. Todos los derechos reservados

MÁQUINAS AMARILLAS

Bogotá, 10 de febrero de 2025

CERT-196-2025

Sitio de disposición de material de escombros y estériles las manas (residuos de construcción y demolición) PIN 8418 - SDA secretaria distrital del medio ambiente autorizados mediante resolución número 1480 de 2014 ANLA, dando cumplimiento a la Resolución 1257 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo, escombrera Las Manas.

CERTIFICA QUE:

DATOS EL GESTOR	
Nombre o razón social	MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Número de identificación	NIT: 900.459.311-1
Representante Legal	HERNANDO LAVERDE MANJARRES
Teléfono	+57 (601) 7023060
Correo electrónico	comercial@maquiamarillas.com
Dirección	AV BOYACÁ 71 SUR # 12 - 20
Municipio o Distrito	BOGOTÁ D.C.
Gestor	DISPOSICION FINAL
DATOS BASICOS DEL GENERADOR	
Pin de la obra	26732
Nombre de la obra	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD
Nombre o razón social	BELZCON SAS
Documento de identificación o NIT	901252860
Representante Legal	BELZNER SALAZAR WILLY PATRICK
Dirección domicilio	Cl 105 46 26 P 2
Teléfono	601 8052552
Correo electrónico	facturacion.bzc@gmail.com
CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO	

TIPO DE RESIDUO	***CANTIDAD M3***	***CANTIDAD TON***
1. Residuos de Construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento	*0,00*	*0,00*
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	*90,00*	*115,44*
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás	*0,00*	*0,00*
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillo y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos, concretos hidráulicos, entre otros	*0,00*	*0,00*
1.4 No petreos: Vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos, tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrilico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, maderay compuestos de madera, cartón-yeso (drywall) entre otros	*0,00*	*0,00*
Totales:	***90,00***	***115,44***

Fecha de Recepción RCD el día 30 de enero de 2025 hasta el día 30 de enero de 2025

Verifique la autenticidad de este certificado escaneando el código Qr ubicado en la esquina superior derecha

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.

Aprobó: ANDREA ALVAREZ GARZON

Gmail

ADRIANA PACHON <ambientalcmametrolinea@gmail.com>

SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DISPOSICIÓN

1 message

ADRIANA PACHON <ambientalcmametrolinea@gmail.com> Tue, Mar 4, 2025 at 1:46 PM
To: certificacionesrcd@cemex.com

Cordial Saludo

Mediante la presente solicitamos sea generado Certificado de Disposición de RCD correspondiente al periodo del mes de febrero de acuerdo con la información anexa.

Cordialmente

Adriana Pachon Fajardo
Especialista Ambiental
3107069144

2 attachments



CEMEX FEB.jpeg
200K

SOLICITUD DE CERTIFICACION CEMEX IDRD (1).xlsx
36K

462

CONSTANCIA DE REC

FECHA Y HOR

FOLIC

PEDI

)ISPOSICIÓN EXCSECA SENCILLO

COMBRERA TUNJUELO 8600025231

COMBRERA TUNJUELO

012

VENTA: ZTA

MBRERA-TUNJUELO

al Llano Sur 72-04

)1000 Bogota CO

560 48000

CLIEN

Usuario :EDIN DAVIDI

ORIGI

FEDEX RCD

01 FEB 2025

DESPACHADO

Este documento presta merito ejecutivo

Gmail

ADRIANA PACHON <apachon.bzc@gmail.com>

SOLICITUD CERTIFICADO SUMINISTRO IDRD

1 mensaje

ADRIANA PACHON <apachon.bzc@gmail.com> 04 de marzo de 2025, 9:37
Para: Auxiliar Comercial Dromos pavimentos <auxiliar.comercial@dromos.co>

Buenos días

mediante el presente solicitamos por favor sea emitida certificación de suministro de acuerdo con la información anexa, a continuación se relaciona la información del contrato

EMPRESA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
TIPO DOC	NIT
NO. DOC	901.886.663-3
PERIODO A CERTIFICAR	**FEBRERO**
REPRESENTANTE LEGAL	WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR
DIRECCIÓN	Cl. 105 #46 – 26 piso 2,
TELÉFONO	300 8506053
CORREO ELECTRÓNICO	apachon.bcz@gmail.com
MUNICIPIO O DISTRITO	BOGOTÁ D.C
OBRA O CONTRATO	CONTRATO IDRD N° SG-4060
PIN DE OBRA	26732


Cordialmente

Adriana Pachon Fajardo
Residente Ambiental

3 adjuntos



DROMOS.jpeg
73K

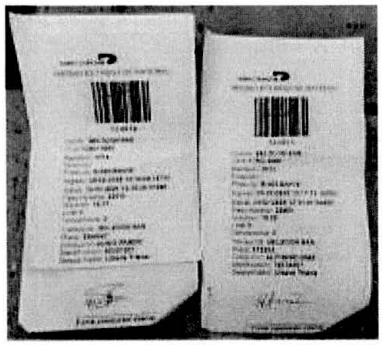

DROMOS FEB.jpeg
84K



DROMOS 1.jpeg
107K

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS MANAS
NIT: 900.459.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel. 7023048/60/65

Res. 1480 de 2014 de la ANLA

Remisión N: RM-160089
Fecha: 2025-02-26 15:36:16
Cajero: Luis
Placa: TAM447 PIN Volqueta: 22167
CLIENTE: CONSORCIO BELZCON IDRD 1
Recibo No. 0010 N.V: 0
Obra: TODAS
Viaje: DOBLE- EXCAVACIÓN TIERRA, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 15,0
TOTAL: ..... Credito

.....
FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

Scanned with CamScanner

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS MANAS
NIT: 900.459.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel. 7023048/60/65

Res. 1460 de 2014 de la ANLA

Remision N: RM-160008
Fecha: 2025-02-26 12:34:22
Cajero: Luis
Placa: TAW447 PIN Volqueta: 22167
CLIENTE: CONSORCIO BELZCON IDRD 1
Recibo No. 0009 N.V: 0
Obra: TODAS
Viaje: DOBLE- EXCAVACIÓN TIERRA, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 16,0
TOTAL: ..... Credito

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

Scanned with CamScanner

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS MANAS
NIT: 900.459.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel. 7023048/60/65

Res. 1480 de 2014 de la ANLA

Remisión N: RM-158093
Fecha: 2025-02-15 11:11:12
Cajero: Luis
Placa: USC745 PIN Volqueta: 560
CLIENTE: CONSORCIO BELZCON IDRD
1
Recibo No. 0059 N.V: 0
Obra: TODAS
Viaje: SENCILLO- EXCAVACIÓN TIERRA, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 7,0
TOTAL: ..... Credito

466

Reconformación Morfológica LAS MANAS S.A.S.

NIT: 900.459.311-1

Kr 17 No. 142 - 25 Tel. 7023045/60/65

Res. 1480 de 2014 de la ANLA

Remisión N: RM-157803

Fecha: 2025-02-14 10:18:41

Cajera: Luis

Placa: USC745 PIN Volqueta: 560

CLIENTE: CONSORCIO BELZCON IDRD

1

Recibo No. 0056 N.V: 0

Obra: TODAS

Viaje: SENCILLO- EXCAVACIÓN TIERRA, ARCILLAS, RECEBOS

Mts: 7,0

TOTAL: ..... Credito

467

Reconformación Morfológica LAS MANAS

NIT: 900.459.311-1

Kr 17 No. 142 - 25 Tel. 7023045/60/65

Res. 1480 de 2014 de la ANLA

Remision N: RM-157277

Fecha: 2025-02-11 16:04:29

Cajero: Luis

Placa: USC745 PIN Volqueta: 560

CLIENTE: CONSORCIO BELZCON IDRD

1

Recibo No. 0054 N.V: 0

Obra: TODAS

Viaje: SENCILLO- EXCAVACIÓN TIERRA, ARCILLAS, RECEBOS

Mts: 7,0

TOTAL: ..... Credito

468

Reconformación Morfológica LAS MANAS

NIT: 900.459.311-1

Kr 17 No. 142 - 25Tel. 7023048/60/65

Res. 1480 de 2014 de la ANLA

Remisión N: RM-157914

Fecha: 2025-02-14 14:17:57

Cajero: Luis

Placa: USC745 PIN Volqueta: 560

CLIENTE: CONSORCIO BELZCON 1DRD 1

Recibo No. 0057 N.V: 0

Obra: TODAS

Viaje: SENCILLO- EXCAVACION TIERRA, ARCILLAS, RECEBOS

Mts: 7.0

TOTAL: ..... Credito

FIRMA CONDUCTOR

Reconformación Morfológica LAS MANAS
NIT: 900.459.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel. 7023046/60/65

Res. 1480 de 2014 de la ANLA

Remisión N: RM-157713
Fecha: 2025-02-13 16:10:20
Cajero: Luis
Placa: USC745 PIN Volqueta: 560
CLIENTE: CONSORCIO BELZCON IDRD 1
Recibo No. 0055 N.V: 0
Obra: TODAS
Viaje: SENCILLO- EXCAVACIÓN TIERRA, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 7.0
TOTAL: ..... Credito

BOGOTÁ	**ANEXO V. INFORME DE APROVECHAMIENTO IN SITU**

Mes del Aprovechamiento:	**FEBRERO DE 2025**
Nombre del Proyecto:	CONTRATO IDRD 4060 -2024 -
PIN-GEN: 26732	

1. Registro fotografico del "antes" del sitio que va a ser utilizado para la reutilización, con referencia de la zona.


Descripcion: Adecuacion de terreno para instalación de subbase





2. Esquema del área a usar para la reutilización de los RCD's (Especifique las dimensiones del área para reutilizar)

Alto: 0,35	Ancho:	2	Largo	87,1



3. Tipo de material a emplear en la reutilización:

Descripcion detallada: Subbase Granular Reciclada

4. Descripción del proceso a realizar: Definir el origen del residuo y el coeficiente de compactación del material.

Se realiza la instalación de subbase reciclada para la conformación del terrerno, con un coeficiente de compactación del 1,25%


5. Registro fotográfico durante la reutilización:

Descripción: Instalación de subbase y compactacion para la conformación de terrreno





6. Registro fotográfico de la finalización del proceso de reutilización:

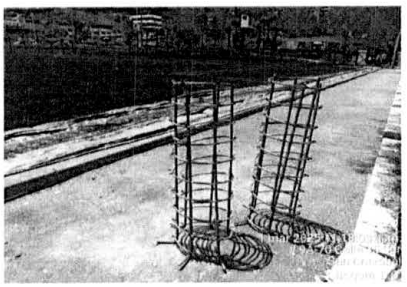

Información de la Reutilización:

7. Cantidad de material proveniente de Plantas de Tratamiento y/o Aprovechamiento móviles : 96,1 **(Ton)**

7.1. PIN TRAT/APROV (planta de tratamiento y/o aprovechamiento móvil): N/A (Ton)

8. Volumen total reutilizado: **57m3**

9. Duración del proceso: 1 **(meses)**

10. Área final recuperada: 174,2 m2

11. Valor del % de la reutilización, respecto al total del material utilizado para la construcción de la obra: 61%**(%)**

12 . Comentarios, Conclusiones y/o Justificación de la no reutilización:

De acuerdo con las actividades contructivas realizadas en el periodo, no se requirió el aprovechamiento de materiales

ENRIQUE GUZMAN

Firma del Representante Legal o Director de obra

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ Secretaría de Ambiente	**ANEXO VI. CONSTANCIA DE MATERIALS PÉTREOS Y NO PÉTREOS VALORIZADOS DE RCD**

1. DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO	
Nombre o razón social	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
Documento de identificación o NIT	901.886.663-3
Representante Legal	WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR,
Dirección	Calle 105 No. 46-26 Piso 2 (Bogotá)
Teléfono	3107069144
Correo electrónico	apachon.bzc@gmail.com
Municipio o distrito	BOGOTÁ
Nombre de la Obra	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES DE LA RED DE PROXIMIDAD QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES
PIN-GEN	
2. DATOS BÁSICOS DEL PROVEEDOR	
PIN-PROV	
Nombre o razón social	
Documento de identificación o NIT	
Representante Legal	
Dirección domicilio	
Teléfono	
Correo electrónico	

3. CANTIDADES DE MATERIALES VALORIZADOS DE RCD SUMINISTRADOS AL GENERADOR

Nota 1. La información reportada en este anexo, se entenderá que esta presentada baja la gravedad de juramento.
Nota 2. Se debe anexar certificados, soportes de estudios técnicos de laboratorios, y/o ficha técnica de la composición del material valorizado

TIPO DE MATERIAL	CANTIDAD (Ton)	CARACTERISTICAS /COMPOSICIÓN
AR-PEA	85	SUBBASE GRANULAR RECICLADO
SBG PEA	11,9	SUBBASE GRANULAR RECICLADO
Total RCD suministrados (Ton)	96,9	
Fecha de suministro de mater	FEBRERO 1 AL 28 FEBRERO 2025	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:
NIT 901.886.663-3

BOGOTÁ

ANEXO REPORTE RCD FEBRERO 2025

ETAPA CONSTRUCTIVA	TIPO DE RCD	CANTIDAD DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN VALORIZADOS DE RCD USADOS EN OBRA (Toneladas)	CANTIDAD DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN VALORIZADOS DE RCD USADOS EN OBRA (m3)	ORIGEN	CANTIDAD REAL DE LOS RCD GENERADOS EN (Toneladas)	CANTIDAD REAL DE LOS RCD GENERADOS EN (m3)	TIPO DE GESTIÓN (Marque con una X la gestión que se adelantara para losRCD)				
							Disposició n Final	Reutilización	Reciclaje	Otros	Lugar de Disposición Final
Demolición, Excavación y cimentación Construcción	**01 Residuos de Construcción y Demolición susceptibles de aprovechamiento**										
	01 01 Excavación										
	01 01 01 Coberturas vegetales										
	01 01 02 Tierras limpias de excavación										
	01 01 03 Limos										
	01 01 04 Materiales pétreos productos de la excavación				108,16	72	X				CEMEX - 7 MAQUINAS AMARILLAS - 65
	01 01 05 Otros residuos de excavación										
	01 02 Productos de Cimentación y Pilotaje										
	01 02 01 Arcillas										
	01 02 02 Bentonitas										
	01 02 03 Otros residuos de cimentación y pilotaje										
	01 03 Pétreos										
	01 03 01 Concretos										
	01 03 02 Gravas										
	01 03 03 Cantos										
	01 03 04 Ladrillos										
	01 03 05 Arenas										
	01 03 06 Morteros										
	01 03 07 Materiales Cerámicos										
	01 03 08 Residuos de material asfáltico	96,9	57	0	0	0		X			CODEOBRAS - 85 SECAM JR -11,90
	01 03 09 Bases y sub bases granulares										
	01 03 10 Otros residuos pétreos										
	01 04 No pétreos										
	01 04 01 Madera										
	01 04 02 Plásticos										
	01 04 03 Vidrio										
	01 04 04 Papel y Cartón										
	01 04 05 Gomas y cauchos										
	01 04 06 Cartón yeso (drywall)										
	01 04 07 Acrílico										
	01 04 08 Mezclas bituminosas y alquitrán										
	01 04 09 Materiales a base fibrocemento										
	01 04 10 Otros residuos no pétreos										
	01 05 Metales										
	01 05 01 Acero y hierro										
	01 05 02 Zinc										
	01 05 03 Cobre										
	01 05 04 Aluminio										
	01 05 05 Otros metales										
	02 RCD - No susceptibles de aprovechamiento										
	02 01 Los que por su estado no pueden ser aprovechados										
	02 02 Los que tengan características de peligrosidad										
	02 02 01 Residuos con contenido de asbesto o amiantos y productos que lo contengan										
	02 02 02 Otros residuos con caracteristicas de peligrosidad.										

**El origen debe indicar si es un material o elemento de construcción virgen o reciclado.*

***Nota Aclaratoria. La información reportada en este anexo se entenderá que esta presentada bajo la gravedad de juramento.*

	INDICADORES RCD FEBRERO 2025	**CONTRATO 4060 2024**

ITEM	INDICADOR	TONELADA	% DE APROV
1	Cantidad de RCD generado en obra (t) % (t total)	108,16	100%
2	Cantidad de RCD aprovechado en la obra (t)/Cantidad de materiales que ingresan a la obra **CIRCULARIDAD**	0,61	61,36%
4	Cantidad de RCD entregado en planta de aprovechamiento de RCD (t) % (t entregadas / t total)	0	0,00%
6	Cantidad de RCD llevado a sitio de disposición final de RCD (t) % (t entregadas / t total)	108,16	100,00%
7	**Meta acumulada total de aprovechamiento**	**0,61**	**100,00%**

	INDICADORES RCD FEBRERO 2025	CONTRATO 4060 2024

ITEM	INDICADOR	TONELADA	% DE APROV
1	Cantidad de RCD generado en obra (t) % (t total)	108,16	100%
2	Cantidad de RCD aprovechado en la obra (t)/Cantidad de materiales que ingresan a la obra **CIRCULARIDAD**	0,61	61,36%
4	Cantidad de RCD entregado en planta de aprovechamiento de RCD (t) % (t entregadas / t total)	0	0,00%
6	Cantidad de RCD llevado a sitio de disposición final de RCD (t) % (t entregadas / t total)	108,16	100,00%
7	**Meta acumulada total de aprovechamiento**	**0,61**	**100,00%**

fecha_transporte	placa_transporto	pin_transportador2798	clasif_sitio_disp	etapa_RCD	responsable_despacho	nombre_sitio_recep	dir_sitio_recep	vol_mü,,,,,,,,
15/02/2025	USC745	560	2	3	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	MAQUINAS AMARILLAS	7	11,9
14/02/2025	USC745	560	2	3	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	MAQUINAS AMARILLAS	7	11,9
11/2/2025	USC745	560	2	3	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	MAQUINAS AMARILLAS	7	11,9
14/02/2025	USC745	560	2	3	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	MAQUINAS AMARILLAS	7	11,9
13/02/2025	USC745	560	2	3	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	MAQUINAS AMARILLAS	7	11,9
26/02/2025	TAW447	22167	2	3	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	MAQUINAS AMARILLAS	15	19,2
26/02/2025	TAW447	22167	2	3	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	MAQUINAS AMARILLAS	15	19,2
1/2/2025	USC745	560	2	3	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CEMEX	7	10,26
