
Nombre y logo contratista	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES			Ubicación	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia
	EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA	HOJA			

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**LP-001-2024**	**OBJETO:**	**''REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL''**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024**			**CORTE No.**	**2**	**FECHA:**	**31/10/2024**
INTERVENTORIA:	**PROYECTOS 2L SAS**						
ITEM No.	**1,1**	**DESCRIPCION ITEM:**	**Localización, ajustes de diseño y replanteo**			**UNIDAD DE MEDIDA:**	**M2**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
PISO 7 COMISION DE DISCIPLINA				187,32	1	**187,32**
PISO 8 COMISION DE DISCIPLINA				237,88	1	**237,88**
TOTAL ITEM						**425,20**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**425,20**


Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: Daniel sierra RESIDENTE DE OBRA	Nombre: Ferney Peña DIRECTOR DE OBRA	Nombre: Carolina Perez RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: Luis Galvis DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Nombre y logo contratista	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES			Ubicación	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia
	EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA	HOJA			

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**LP-001-2024**	**OBJETO:**	**''REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL''**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024**			**CORTE No.**	**2**	**FECHA:**	**31/10/2024**
INTERVENTORIA:	**PROYECTOS 2L SAS**						
ITEM No.	**1,6**	**DESCRIPCION ITEM:**	**Desmonte de piso laminado (Incluye desmonte piso, polietileno, jumbolon existentes, trasiego y disposición final)**			**UNIDAD DE MEDIDA:**	**M2**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA









DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
PISO 7 COMISION DE DISCIPLINA				187,32	1	**187,32**
PISO 8 COMISION DE DISCIPLINA				237,88	1	**237,88**
OFICINA 412 CORTE SUPREMA				56,11	1	**56,11**
OFICINA 413 CORTE SUPREMA				51,82	1	**51,82**
OFICINA 307 CONCEJO DE ESTADO				77,09	1	**77,09**
OFICINA 310 CONCEJO DE ESTADO				50,23	1	**50,23**
OFICINA 411 CONCEJO DE ESTADO				50,17	1	**50,17**
TOTAL ITEM						**710,63**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**710,63**


Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: Daniel sierra RESIDENTE DE OBRA	Nombre: Ferney Peña DIRECTOR DE OBRA	Nombre: Carolina Perez RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: Luis Galvis DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Nombre y logo contratista	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA	HOJA	Ubicación	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	LP-001-2024	OBJETO:	"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL"				
CONTRATISTA:	CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024			CORTE No.	2	FECHA:	31/10/2024
INTERVENTORIA:	PROYECTOS 2L SAS						
ITEM No.	1,8	DESCRIPCION ITEM:	Desmonte de divisiones de Oficina. (Incluye trasiego y disposición final)			UNIDAD DE MEDIDA:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	PISO 7 COMISION DE DISCIPLINA		63,16	2,55	161,06	1	**161,06**
	PISO 8 COMISION DE DISCIPLINA		87,22	2,75	239,86	1	**239,86**
						TOTAL ITEM	**400,91**
						CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES	**0,00**
						CANTIDAD CORTE ACTUAL	**400,91**

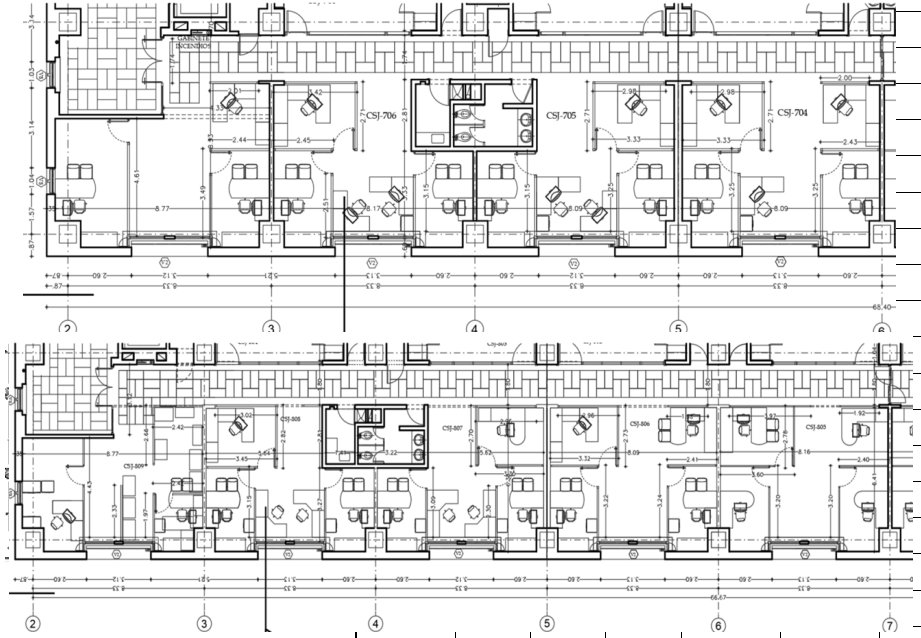


Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma Nombre: Daniel sierra RESIDENTE DE OBRA	Firma Nombre: Ferney Peña DIRECTOR DE OBRA	Firma Nombre: Carolina Perez RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Firma Nombre: Luis Galvis DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Nombre y logo contratista	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA	HOJA		Ubicación	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**LP-001-2024**	**OBJETO:**	**''REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL''**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024**			**CORTE No.**	**2**	**FECHA:**	**31/10/2024**
INTERVENTORIA:	**PROYECTOS 2L SAS**						
ITEM No.	**1,15**	**DESCRIPCION ITEM:**	**Desmonte de lámparas. (Incluye trasiego y disposición final)**			**UNIDAD DE MEDIDA:**	**UNI**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA







DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES Ancho	Longitud	Altura	MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
PISO 7 COMISION DE DISCIPLINA				35,00	1	**35,00**
PISO 8 COMISION DE DISCIPLINA				48,00	1	**48,00**
TOTAL ITEM						**83,00**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**83,00**


Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: Daniel Sierra RESIDENTE DE OBRA	Nombre: Ferney Peña DIRECTOR DE OBRA	Nombre: Carolina Perez RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: Luis Galvis DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Nombre y logo contratista	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA	HOJA		Ubicación	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**LP-001-2024**	**OBJETO:**	''REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL''				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024**			**CORTE No.**	**2**	**FECHA:**	**31/10/2024**
INTERVENTORIA:	**PROYECTOS 2L SAS**						
ITEM No.	**1,45**	**DESCRIPCION ITEM:**	**Desmolición de muro en fibrocemento. (Incluye desmontes, retiro estructura, accesorios, acarreo, transporte y disposición final)**			**UNIDAD DE MEDIDA:**	**m2**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	PISO 7 COMISION DE DISCIPLINA		21,20	2,55	54,06	1	**54,06**
	PISO 8 COMISION DE DISCIPLINA		23,97	2,75	65,92	1	**65,92**

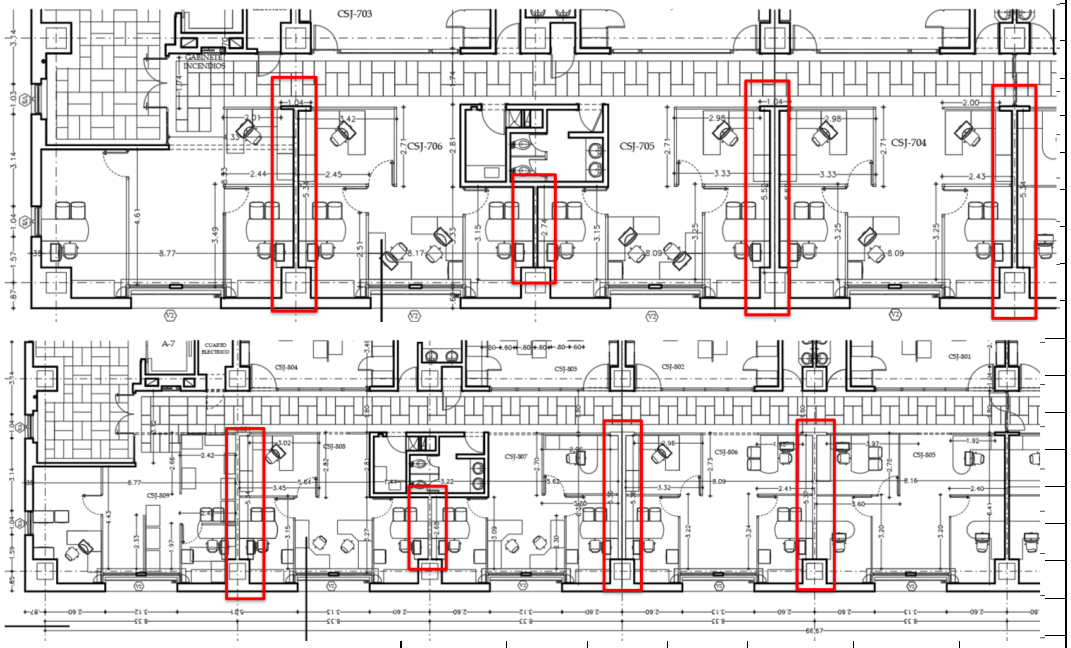





TOTAL ITEM	**119,98**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES	**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL	**119,98**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: Daniel Ibarra RESIDENTE DE OBRA	Nombre: Ferney Peña DIRECTOR DE OBRA	Nombre: Carolina Perez RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: Luis Galvis DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Nombre y logo contratista	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA	HOJA		Ubicación	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**LP-001-2024**	**OBJETO:**	**''REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL''**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024**			**CORTE No.**	**2**	**FECHA:**	**31/10/2024**
INTERVENTORIA:	**PROYECTOS 2L SAS**						
ITEM No.	**10,4**	**DESCRIPCION ITEM:**	**Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)**			**UNIDAD DE MEDIDA:**	**M2**


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	OFICINA 410 CORTE SUPREMA				46,00	1	**46,00**
	OFICINA 412 CORTE SUPREMA				46,00	1	**46,00**
	OFICINA 413 CORTE SUPREMA				46,00	1	**46,00**
	OFICINA 411 CONCEJO DE ESTADO				46,00	1	**46,00**
 							
	TOTAL ITEM						**184,00**
	CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
	CANTIDAD CORTE ACTUAL						**184,00**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: Daniel Sierra RESIDENTE DE OBRA	Nombre: Ferney Peña DIRECTOR DE OBRA	Nombre: Carolina Perez RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: Luis Galvis DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Nombre y logo contratista	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA	HOJA		Ubicación	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**LP-001-2024**	**OBJETO:**	**''REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL''**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024**			**CORTE No.**	**2**	**FECHA:**	**31/10/2024**
INTERVENTORIA:	**PROYECTOS 2L SAS**						
ITEM No.	**11,17**	**DESCRIPCION ITEM:**	**Piso laminado 8mm tráfico ac4-32. (Incluye suministro e instalación, polietileno, jumbolón, perfiles, accesorios)**			**UNIDAD DE MEDIDA:**	**M2**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
 	OFICINA 412 CORTE SUPREMA				56,11	1	**56,11**
	OFICINA 413 CORTE SUPREMA				51,82	1	**51,82**
	OFICINA 307 CONCEJO DE ESTADO				77,09	1	**77,09**
	OFICINA 310 CONCEJO DE ESTADO				50,23	1	**50,23**
	OFICINA 411 CONCEJO DE ESTADO				50,17	1	**50,17**
	TOTAL ITEM						**285,43**
	CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
	CANTIDAD CORTE ACTUAL						**285,43**


Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: Daniel Sierra RESIDENTE DE OBRA	Nombre: Ferney Peña DIRECTOR DE OBRA	Nombre: Carolina Perez RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: Luis Galvis DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Nombre y logo contratista	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA	HOJA		Ubicación	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**LP-001-2024**	**OBJETO:**	**''REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL''**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024**			**CORTE No.**	**2**	**FECHA:**	**31/10/2024**
INTERVENTORIA:	**PROYECTOS 2L SAS**						
ITEM No.	**22,21**	**DESCRIPCION ITEM:**	**Restauración puestos de trabajo de los magistrados sala plena**			**UNIDAD DE MEDIDA:**	**un**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

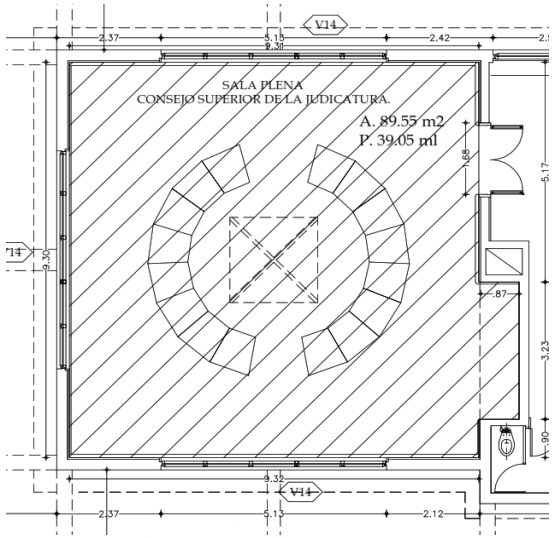

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
SALA PLENA PALACIO DE JUSTICIA				16	37%	**5,92**
TOTAL ITEM						**5,92**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**10,08**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**5,92**

NOTA: EL 5,92 UNIDADES CORRESPONDE L SALDO DE LAS 16 MESAS DE LOS MAGISTRADOS RESTANTES POR COBRAR


Firma	Revisó: Firma	Aprobó: Firma	Firma
Nombre: Daniel sierra RESIDENTE DE OBRA	Nombre: Ferney Peña DIRECTOR DE OBRA	Nombre: Carolina Perez RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: Luis Galvis DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Nombre y logo contratista	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES			Ubicación	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia
	EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA	HOJA			

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**LP-001-2024**	**OBJETO:**	**''REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL''**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024**			**CORTE No.**	**2**	**FECHA:**	**31/10/2024**
INTERVENTORIA:	**PROYECTOS 2L SAS**						
ITEM No.	**22,22**	**DESCRIPCION ITEM:**	**Mantenimiento de enchape en madera de muros incluye desmonte y montaje**			**UNIDAD DE MEDIDA:**	**m2**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

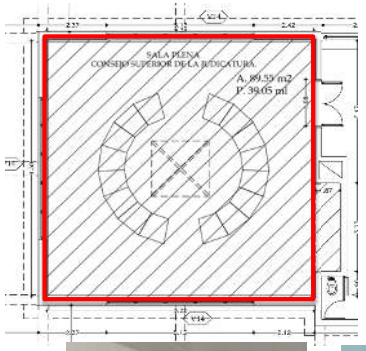







DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
SALA PLENA PALACIO DE JUSTICIA		23,04	1,54	35,48	38%	**13,48**
TOTAL ITEM						**13,48**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**22,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**13,48**


Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: Daniel sierra RESIDENTE DE OBRA	Nombre: Ferney Peña DIRECTOR DE OBRA	Nombre: Carolina Perez RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: Luis Galvis DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Nombre y logo contratista	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA	HOJA		Ubicación	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**LP-001-2024**	**OBJETO:**	**''REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL''**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024**			**CORTE No.**	**2**	**FECHA:**	**31/10/2024**
INTERVENTORIA:	**PROYECTOS 2L SAS**						
ITEM No.	**22,23**	**DESCRIPCION ITEM:**	**Mantenimiento de zocalo en madera de muros incluye desmonte y montaje)**			**UNIDAD DE MEDIDA:**	**ml**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

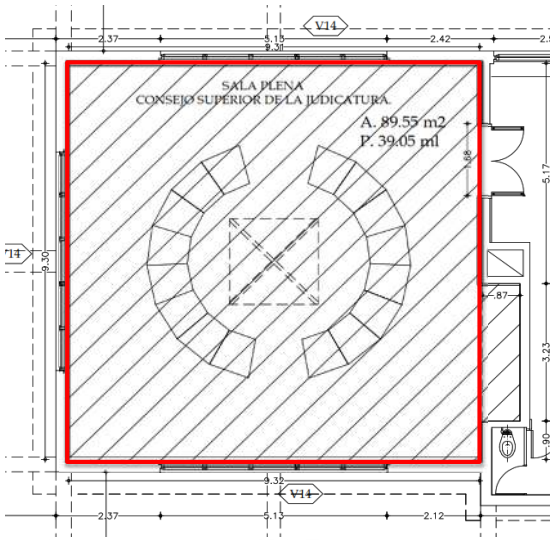

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
SALA PLENA PALACIO DE JUSTICIA		35,6		35,48	47%	**16,68**
TOTAL ITEM						**16,68**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**18,80**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**16,68**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: Daniel sierra RESIDENTE DE OBRA	Nombre: Ferney Peña DIRECTOR DE OBRA	Nombre: Carolina Perez RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: Luis Galvis DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Nombre y logo contratista	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA	HOJA		Ubicación	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**LP-001-2024**	**OBJETO:**	**"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL"**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024**			**CORTE No.**	**2**	**FECHA:**	**31/10/2024**
INTERVENTORIA:	**PROYECTOS 2L SAS**						
ITEM No.	**2,1**	**DESCRIPCION ITEM:**	**FACHADA PUERTA VENTANA EN VIDRIO MARCOS EN MADERA. Restauracion de módulo de fachada puerta ventana despachos en madera y vidrio a dos caras (interna y externa). Incluye protección requerida en muebles, piso, muros, vidrios del área, lijado general, enmasillado y restauracion, base en tintilla color por definir similar al existente y acabado en laca catalisada semi mate. El metraje incluye marcos en vidrio y puerta marco tipo.**			**UNIDAD DE MEDIDA:**	**M2**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA







DESCRIPCION /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
OFICINA 412 CORTE SUPREMA		5,01	2,47	12,37	0,5	**6,19**
OFICINA 413 CORTE SUPREMA		5,14	2,47	12,70	0,5	**6,35**
OFICINA 410 CORTE SUPREMA		5,14	2,47	12,70	0,5	**6,35**
OFICINA 411 CONCEJO DE ESTADO		5,24	2,47	12,94	0,5	**6,47**
CONCEJO SUPERIOR 501		5,36	2,44	13,08	1	**13,08**
CONCEJO SUPERIOR 502		5,34	2,44	13,03	1	**13,03**
CONCEJO SUPERIOR 503		5,32	2,44	12,98	1	**12,98**
CONCEJO SUPERIOR 504		5,32	2,44	12,98	1	**12,98**
CONCEJO SUPERIOR 701		5,36	2,44	13,08	1	**13,08**
CONCEJO SUPERIOR 702		5,36	2,44	13,08	1	**13,08**
CONCEJO SUPERIOR 703		5,36	2,44	13,08	1	**13,08**
CONCEJO SUPERIOR 801		5,36	2,44	13,08	1	**13,08**
CONCEJO SUPERIOR 802		5,36	2,44	13,08	1	**13,08**
CONCEJO SUPERIOR 803		5,36	2,44	13,08	1	**13,08**
CONCEJO SUPERIOR 804		5,36	2,44	13,08	1	**13,08**
TOTAL ITEM						**168,97**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**168,97**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: Daniel Sierra RESIDENTE DE OBRA	Nombre: Ferney Peña DIRECTOR DE OBRA	Nombre: Carolina Perez RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: Luis Galvis DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Nombre y logo contratista	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA	HOJA		Ubicación	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	LP-001-2024	OBJETO:	"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL"				
CONTRATISTA:	CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024			CORTE No.	2	FECHA:	31/10/2024
INTERVENTORIA:	PROYECTOS 2L SAS						
ITEM No.	2,2	DESCRIPCION ITEM:	BIBLIOTECA EMPOTRADA DESPACHO. Restauracion de biblioteca despacho en madera puertas en marco madera y vidrio. Incluye protección requerida en muebles, piso, muros, vidrios del área, lijado general, enmasillado y restauracion de areas afectadas, base en tintilla color por definir similar al existente y acabado en laca catalisada semi mate. El metraje incluye frontales y parte interna, entrepaños y puertas marco en vidrio. Durante la ejecucion de la actividad se protejeran los demas muebles, muros, piso y vidrios evitando afectaciones al area intervenida.			UNIDAD DE MEDIDA:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA







DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
OFICINA 412 CORTE SUPREMA				14,78	1	**14,78**
OFICINA 413 CORTE SUPREMA				14,84	1	**14,84**
OFICINA 410 CORTE SUPREMA				14,78	1	**14,78**
OFICINA 411 CONCEJO DE ESTADO				15,03	1	**15,03**
TOTAL ITEM						**59,43**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**59,43**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: Daniel Sierra RESIDENTE DE OBRA	Nombre: Ferney Peña DIRECTOR DE OBRA	Nombre: Carolina Perez RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: Luis Galvis DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Nombre y logo contratista	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA	HOJA		Ubicación	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**LP-001-2024**	**OBJETO:**	**''REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL''**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024**			**CORTE No.**	**2**	**FECHA:**	**31/10/2024**
INTERVENTORIA:	**PROYECTOS 2L SAS**						
ITEM No.	**2,3**	**DESCRIPCION ITEM:**	**BIBLIOTECA EMPOTRADA DESPACHO. Restauracion de biblioteca despacho en madera puertas en marco madera y vidrio. Incluye protección requerida en muebles, piso, muros, vidrios del área, lijado general, enmasillado y restauracion de areas afectadas, base en tintilla color por definir similar al existente y acabado en laca catalisada semi mate. El metraje incluye frontales y parte interna, entrepaños y puertas marco en vidrio. Durante la ejecucion de la actividad se protejeran los demas muebles, muros, piso y vidrios evitando afectaciones al area intervenida.**			**UNIDAD DE MEDIDA:**	**M2**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
OFICINA 412 CORTE SUPREMA		6,254			1	**6,25**
OFICINA 413 CORTE SUPREMA		6,23			1	**6,23**
OFICINA 410 CORTE SUPREMA		6,254			1	**6,25**
OFICINA 411 CONCEJO DE ESTADO		6,24			1	**6,24**
TOTAL ITEM						**24,98**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**24,98**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: Daniel sierra RESIDENTE DE OBRA	Nombre: Ferney Peña DIRECTOR DE OBRA	Nombre: Carolina Perez RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: Luis Galvis DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Nombre y logo contratista	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA	HOJA		Ubicación	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**LP-001-2024**	**OBJETO:**	**''REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL''**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024**			**CORTE No.**	**2**	**FECHA:**	**31/10/2024**
INTERVENTORIA:	**PROYECTOS 2L SAS**						
ITEM No.	**2,4**	**DESCRIPCION ITEM:**	**CENEFA Y PLAFÓN EN MADERA. Restauracion de cenefa corniza en madera techo pared. Incluye protección requerida en muebles, piso, muros, vidrios del área, lijado general, enmasillado y restauracion de areas afectadas, base en tintilla color por definir similar al existente y acabado en laca catalisada semi mate. el metraje incluye corniza y cenefa. h 8-15cm**			**UNIDAD DE MEDIDA:**	**ML**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
OFICINA 412 CORTE SUPREMA		57,35			1	**57,35**
OFICINA 413 CORTE SUPREMA		52,46			1	**52,46**
OFICINA 410 CORTE SUPREMA		57,35			1	**57,35**
OFICINA 411 CONCEJO DE ESTADO		57,35			1	**57,35**
TOTAL ITEM						**224,51**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**224,51**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: Daniel sierra RESIDENTE DE OBRA	Nombre: Ferney Peña DIRECTOR DE OBRA	Nombre: Carolina Perez RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: Luis Galvis DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Nombre y logo contratista	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA	HOJA		Ubicación	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**LP-001-2024**	**OBJETO:**	**''REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL''**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024**			**CORTE No.**	**2**	**FECHA:**	**31/10/2024**
INTERVENTORIA:	**PROYECTOS 2L SAS**						
ITEM No.	**2,5**	**DESCRIPCION ITEM:**	**PUERTA TIPO ACCESO A DESPACHO. Restauracion de puerta y marco en madera acseso a despacho. Incluye protección requerida en muebles, piso, muros, vidrios del área, lijado general, enmasillado y restauracion de areas afectadas, base en tintilla color por definir similar al existente y acabado en laca catalisada semi mate. el metraje incluye superficie horizontal tipo mesa. (1,00 x 2,4 m)**			**UNIDAD DE MEDIDA:**	**M2**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
OFICINA 412 CORTE SUPREMA				1,00	1	**1,00**
OFICINA 413 CORTE SUPREMA				1,00	1	**1,00**
OFICINA 410 CORTE SUPREMA				1,00	1	**1,00**
OFICINA 411 CONCEJO DE ESTADO				1,00	1	**1,00**
TOTAL ITEM						**4,00**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**4,00**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: Daniel sierra RESIDENTE DE OBRA	Nombre: Ferney Peña DIRECTOR DE OBRA	Nombre: Carolina Perez RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: Luis Galvis DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Nombre y logo contratista	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA	HOJA		Ubicación	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**LP-001-2024**	**OBJETO:**	**''REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL''**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024**			**CORTE No.**	**2**	**FECHA:**	**31/10/2024**
INTERVENTORIA:	**PROYECTOS 2L SAS**						
ITEM No.	**2,6**	**DESCRIPCION ITEM:**	**PUERTA TIPO ACCESO A DESPACHO. Restauracion de puerta y marco en madera acseso a despacho. Incluye protección requerida en muebles, piso, muros, vidrios del área, lijado general, enmasillado y restauracion de areas afectadas, base en tintilla color por definir similar al existente y acabado en laca catalisada semi mate. el metraje incluye superficie horizontal tipo mesa. (1,00 x 2,4 m)**			**UNIDAD DE MEDIDA:**	**M2**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
OFICINA 412 CORTE SUPREMA (BAÑO)				1,00	1	**1,00**
OFICINA 413 CORTE SUPREMA (BAÑO)				1,00	1	**1,00**
OFICINA 410 CORTE SUPREMA (BAÑO)				1,00	1	**1,00**
OFICINA 411 CONCEJO DE ESTADO (BAÑO)				1,00	1	**1,00**
TOTAL ITEM						**4,00**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**4,00**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: Daniel sierra RESIDENTE DE OBRA	Nombre: Ferney Peña DIRECTOR DE OBRA	Nombre: Carolina Perez RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: Luis Galvis DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Nombre y logo contratista	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA	HOJA		Ubicación	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**LP-001-2024**	**OBJETO:**	**''REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL''**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024**			**CORTE No.**	**2**	**FECHA:**	**31/10/2024**
INTERVENTORIA:	**PROYECTOS 2L SAS**						
ITEM No.	**2,7**	**DESCRIPCION ITEM:**	**ENCHAPE MADERA MURO Y PUERTA ARCHIVO. Restauracion de muro enchapado en madera y puertas archivo secretaria acceso a despacho. Incluye protección requerida en muebles, piso, muros, vidrios del área, lijado general, enmasillado y restauracion de areas afectadas, base en tintilla color por definir similar al existente y acabado en laca catalisada semi mate. el metraje incluye superficie horizontal tipo mesa.**			**UNIDAD DE MEDIDA:**	**M2**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
OFICINA 411 CONCEJO DE ESTADO		3,38	2,45	8,28	1	**8,28**
TOTAL ITEM						**8,28**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**8,28**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: Daniel Sierra RESIDENTE DE OBRA	Nombre: Ferney Peña DIRECTOR DE OBRA	Nombre: Carolina Perez RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: Luis Galvis DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Nombre y logo contratista	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA	HOJA		Ubicación	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**LP-001-2024**	**OBJETO:**	**''REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL''**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024**			**CORTE No.**	**2**	**FECHA:**	**31/10/2024**
INTERVENTORIA:	**PROYECTOS 2L SAS**						
ITEM No.	**2,8**	**DESCRIPCION ITEM:**	**MUEBLE BAÑO. Restauracion de puertas mueble baño despacho. Incluye protección requerida en muebles, piso, muros, vidrios del área, lijado general, enmasillado y restauracion de areas afectadas, base en tintilla color por definir similar al existente y acabado en laca catalisada semi mate. el metraje incluye superficie horizontal tipo mesa . (medidas cuando la medida es de menos de 1 m2 se cobra por pieza)**			**UNIDAD DE MEDIDA:**	**ML**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
OFICINA 412 CORTE SUPREMA (BAÑO)				1,20	1	**1,20**
OFICINA 413 CORTE SUPREMA (BAÑO)				1,20	1	**1,20**
OFICINA 410 CORTE SUPREMA (BAÑO)				1,20	1	**1,20**
OFICINA 411 CONCEJO DE ESTADO (BAÑO)				1,20	1	**1,20**
TOTAL ITEM						**4,80**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**4,80**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: Daniel Sierra RESIDENTE DE OBRA	Nombre: Ferney Peña DIRECTOR DE OBRA	Nombre: Carolina Perez RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: Luis Galvis DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
