-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA NIT 899.999.061-9 CONTRATO 1367-2024

Tarea #2467090

Tipo de tarea
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONTRATO 1367 - 2024


Descripcion
Supercade 20 de julio item 6

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUALCONTRATO 1367-2024

DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA NIT:899.999.061-9
ASESORIAS Y ACABADOS AVILA SAS NIT:901.126.360-7
CONTRATO No: 1367- 2024

OBJETO:
Prestar servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo, que incluye el suministro de insumos y repuestos de las Plantas Eléctricas ubicadas en las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.

CIUDAD Bogotá	**DEPENDENCIA** Secretaria general de la alcaldía mayor
SEDE Supercade 20 de julio	**Fecha** 30/04/2025
MARCA Cummins	**CAPACIDAD** 100 kva
SERIE 69580242	**PLACA DE INVENTARIO** 24080
VERIFICACIÓN DE NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR REALIZADO	**VERIFICACIÓN DE NIVEL DE FLUIDOS Y ESTADO DE BORNES Y DEMÁS CONDICIONES DE LAS BATERÍAS** REALIZADO
VERIFICAR CARGABILIDAD DE LA BATERÍA REALIZADO	**VERIFICACIÓN DE NIVEL DE REFRIGERANTE** REALIZADO
VERIFICACIÓN DE PRESENCIA DE FUGAS EN EL CIRCUITO DE ACEITE Y EN EL CIRCUITO DE REFRIGERANTE REALIZADO	**LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES EN TABLERO Y EQUIPO** REALIZADO
PRUEBAS EN VACÍO Y REGISTRO DE PARÁMETROS DE OPERACIÓN: VOLTAJES, AMPERAJES, TEMPERATURA Y PRESIÓN DEL ACEITE, FRECUENCIA DE SALIDA DEL GENERADOR Y REGÍMENES DEL GENERADOR REALIZADO	**ASPIRADO Y/O LIMPIEZA DE TABLERO ELÉCTRICO DE CONTROL E INSPECCIÓN DEL MISMO, QUE INCLUYA: VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE CONEXIONES, REVISIÓN DEL CICLO DE CONTROL, REVISIÓN DEL ESTADO DE PULSADORES, MULETILLAS Y PILOTOS** REALIZADO
INSPECCIÓN DEL DUCTO DE EMISIÓN DE GASES REALIZADO	**REVISAR ESTADO DE CORREAS** REALIZADO
LIMPIEZA DE ELEMENTO FILTRANTE DE AIRE REALIZADO	**LIMPIEZA DE GENERADOR Y MOTOR (A MANIOBRA EN FRIO)** REALIZADO


ASEO EN INSTALACIONES Y SEGURIDAD: LIMPIEZA EXTERIOR DEL EQUIPO, ASPECTOS TÉCNICOS DE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE MODO QUE NO HAYA RIESGOS, IMPREVISTOS Y DEMÁS REALIZADO	**REALIZAR VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE LOS FILTROS** REALIZADO
LIMPIAR FILTRO DE AIRE REALIZADO	**VERIFICAR TENSIÓN DE CORREAS** REALIZADO
COMPLETAR REFRIGERANTE Y VERIFICACIÓN DE CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN REALIZADO	**VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL** REALIZADO
ELABORAR, ACTUALIZAR, Y PUBLICAR EN DOCUMENTO FÍSICO LAMINADO, LA HOJA DE VIDA DE LOS EQUIPOS INTERVENIDOS, EN UN LUGAR VISIBLE CERCA DE ELLOS, Y ENTREGAR COPIA DE LA MISMA AL SUPERVISOR DEL CONTRATO. ESTA ACTIVIDAD INCLUYE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS DATOS DEL EQUIPO INTERVENIDO (NÚMERO DE PLACA, MARCA, MODELO, SERIE, AÑO DE FABRICACIÓN, POTENCIA, NÚMERO DE MOTOR (SI APLICA), DIRECCIÓN DE UBICACIÓN, UNIDAD RESPONSABLE, Y CUALQUIER OTRO DATO QUE SE CONSIDERE NECESARIO REALIZADO	**VERIFICAR Y DIAGNOSTICAR LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y LÓGICAS DE LA CONEXIÓN DE CADA EQUIPO, REALIZAR LAS MEDICIONES DE VOLTAJE CORRESPONDIENTES Y LAS RECOMENDACIONES A QUE HAYA LUGAR** REALIZADO
LIMPIEZA, VERIFICACIÓN, Y MEDICIÓN A LOS SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN (ACOMETIDAS, TABLEROS, PROTECCIONES, TUBERÍAS, CÁRCAMOS, CONEXIÓN A TIERRA, ETC.), TRANSFERENCIAS, SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL REALIZADO	**ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE A LA ÚLTIMA VERSIÓN DEL FABRICANTE. (CUANDO SE REQUIERA)** NO APLICA
PROGRAMACIÓN DE PARÁMETROS DE OPERACIÓN PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS (CUANDO SE REQUIERA) NO APLICA	**LIMPIEZA A LOS SISTEMAS DE CONTROL DE PLAGAS** NO APLICA
DIAGNOSTICO se realiza mantenimiento preventivo a la planta se efectúa prueba en vacío se toman mediciones ac/dc quedando el equipo operativo dentro de los parámetros normales Sin novedad	**FIRMA DE ENCARGADO EN SITIO**  **Firmado por: Carol Valenzuela**
FIRMA DEL TÉCNICO  **Firmado por: Omar Estepa**	
19) REGISTRO FOTOGRÁFICO	


HONOR X7a
50MP Quad Camera


ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
SECRETARIA GENERAL
24080-2010
TF
2024
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
SECRETARIA GENERAL
24088





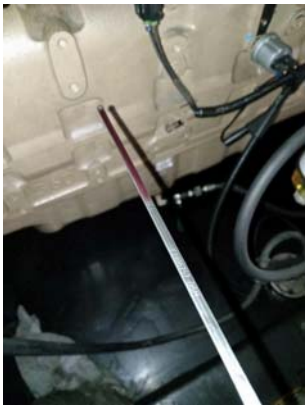










STAMFORD


RPM 1797
Hz 59.9
