VENTA DE EQUIPO MEDICO, ALQUILER U.C.I. NEONATAL-ADULTO, SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

ALARIS MEDICA
Nit 830.101.347 - 5

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
TIPO RESPONSABILIDAD R-99-PN
ACT.ECONOMICA ICA 4659 TARIFA11.04*1.000
ACT.ECONOMICA ICA 3319 TARIFA 9.66*1.000

Consulte AQUI el estado de la factura DIAN

FECHA Y HORA DE VALIDACION DIAN:
12/10/2023 4:09:11 p. m.

NIT. 830,101,347-3

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA		
FE 1040		
FECHA		
12	10	2023
FECHA DE VENCIMIENTO		
10	01	2024

NOMBRE: ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA **NIT.** 891,800,231 - 0

DIRECCION CR 11 27 27 **TELEFONO** 7405036

FORMA DE PAGO: CREDITO A 90 DIAS **CIUDAD:** Tunja

REMISIONES

RESOLUCIÓN DIAN No 18764043452018 FECHA 27 ene. 2023 Vigencia 18 meses NUMERACIÓN AUTORIZADA DEL1001 AL 2000

CANTIDAD	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
	CONTRATO 549-2023 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS REDES DE GASES MEDICINALES DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA		0
.00	-Mantenimiento Preventivo General de tomas Medicinales: Limpieza externa, cambio de orings y verificación de ajuste y conexión de acoples. Kit O-rings para mantenimiento preventivo tomas chemetron	50,000	20,600,000
5.00	-Mantenimiento Caja de Corte Simple, incluye prueba de fugas, retoque pintura instalación de etiqueta y limpieza.	59,000	295,000
14.00	-Mantenimiento Caja de Corte Doble, incluye prueba de fugas, retoque pintura instalación de etiqueta y limpieza.	75,000	1,050,000
16.00	-Mantenimiento Caja de Corte Triple, incluye prueba de fugas, retoque pintura instalación de etiqueta y limpieza.	95,000	1,520,000
1.00	-Mantenimiento Caja de Corte Cuádruple, incluye prueba de fugas, retoque pintura instalación de etiqueta y limpieza.	200,000	200,000
10.00	-Mantenimiento alarma de área de 1-10 señales, Incluye revisión y limpieza de los componentes, medición de voltaje y pruebas de caída de presión real	77,000	770,000
1.00	-Mantenimiento alarma maestra de 1-10 señales, Incluye revisión y limpieza de los componentes, medición de voltaje y pruebas de caída de presión real	376,000	376,000
1.00	-Mantenimiento preventivo y correctivo a central de gases medicinales (Manifold de oxígeno, Manifold de aire, Válvulas central semiautomático aire medicinal, oxígeno y aire succión), incluye pruebas de fuga, retoque pintura instalación de etiqueta limpieza	916,000	916,000

OBSERVACIONES:

SON: TREINTA MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL CIENTO TREINTA PESOS . - . - . -

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO San Rafael de Tunja

EN EL SAN RAFA TRABAJAMOS CON EL ALMA

OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS REDES DE GASES MEDICINALES DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

VALOR INICIAL: $ 30.615.130.00
FECHA DE INICIO: 23 DE AGOSTO DE 2023
PLAZO: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ACTA RECIBO FINAL

CONTRATO: 549 DE 2023

CONTRATANTE: E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA
CONTRATISTA: ALARIS MEDICA S.A.S.
SUPERVISOR: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
FECHA: 12 de octubre 2023

ITEM	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	CONDICIONES ORIGINALES		PRESENTA ACTA DE RECIBO	
				VR UNITARIO	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL
1	Mantenimiento Preventivo General de tomas Medicinales: Limpieza externa, cambio de orings y verificación de ajuste y conexión de acoples. Kit O-ring para Mantenimiento Preventivo de tomas Chemetron	UN	412	$ 50.000,00	$ 20.600.000,00	412	$ 20.600.000,00
2	Mantenimiento Caja de Corte Simple, incluye prueba de fugas, retoque pintura instalación de etiqueta y limpieza.	UN	5	$ 59.000,00	$ 295.000,00	5	$ 295.000,00
3	Mantenimiento Caja de Corte Doble, incluye prueba de fugas, retoque pintura instalación de etiqueta y limpieza.	UN	14	$ 75.000,00	$ 1.050.000,00	14	$ 1.050.000,00
4	Mantenimiento Caja de Corte Triple, incluye prueba de fugas, retoque pintura instalación de etiqueta y limpieza.	UN	16	$ 95.000,00	$ 1.520.000,00	16	$ 1.520.000,00
5	Mantenimiento Caja de Corte Cuádruple, incluye prueba de fugas, retoque pintura instalación de etiqueta y limpieza	UN	1	$ 200.000,00	$ 200.000,00	1	$ 200.000,00
6	Mantenimiento alarma de área de 1-10 señales, Incluye revisión y limpieza de los componentes, medición de voltaje y pruebas de caída de presión real	UN	10	$ 77.000,00	$ 770.000,00	10	$ 770.000,00
7	Mantenimiento alarma maestra de 1-10 señales, Incluye revisión y limpieza de los componentes, medición de voltaje y pruebas de caída de presión real	UN	1	$ 376.000,00	$ 376.000,00	1	$ 376.000,00
8	Mantenimiento preventivo y correctivo a central de gases medicinales (Manifold oxigeno, Manifold aire, Válvulas, Central semiautomático aire medicinal, oxigeno y aire succión), Incluye prueba de fugas, retoque pintura instalación de etiqueta y limpieza.	UN	1	$ 916.000,00	$ 916.000,00	1	$ 916.000,00
SUBTOTAL					$ 25.727.000,00		$ 25.727.000,00
IVA 19%					$ 4.888.130,00		$ 4.888.130,00
TOTAL GENERAL					**$ 30.615.130**		**$ 30.615.130**

VIVIANA ASTRID SALES MIELES
Representante Legal

HECTOR JAVIER DIAZ CERON
Lider de Mantenimiento

EL LIDER DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

CERTIFICA

Que la empresa **ALARIS MEDICA S.A.S,** identificado con NIT. 830.101.347-5 realizó a satisfacción durante el mes de octubre de 2023 el MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS REDES DE GASES MEDICINALES DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA, de acuerdo con lo establecido en el contrato número 549 de 2023. Soportado con factura número FE 1040 de fecha 12 de octubre de 2023.

Por lo anterior es viable el pago por un valor de **TREINTA MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL CIENTO TREINTA PESOS M/CTE ($ 30.615.130.oo).**

Tunja, 12 de octubre de 2023.

HECTOR JAVIER DIAZ CERON
Líder de Mantenimiento

Proyectó: Jonatan Ayala Pérez.

CERTIFICACION ACREDITANDO PAGO DE APORTES
(ART. 50 LEY 789/2002) (Personas Jurídicas)

Nombre o Razón Social del proponente: **ALARIS MEDICA SAS**

El Representa Legal de **ALARIS MEDICA SAS.** Con Nit. No. 830,101,347 -5 certifica que dicha entidad ha cumplido con el pago de los aportes de sus empleados a los Sistemas de Salud, Riesgos profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, en los últimos 6 (seis) meses.

Expedida a los Doce (12) días del mes de octubre de 2023.

NOMBRE: **VIVIANA ASTRID SALAS MIELES**
Representante Legal

FIRMA :

C.C. No 1015401979

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830101347	5	ALARIS MEDICA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Autopista Norte 195-64 Local42	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7434300	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	217682311	945760472D	E	2023/10/11	2023/10/13	BANCOLOMBIA	2	$4,058,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				7	$2,539,800	$5,400	$0	$2,545,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$621,400	$1,300	$0	$622,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$40,000	$100	$0	$40,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$1,856,000	$3,900	$0	$1,859,900
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$22,400	$100	$0	$22,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$152,000	$400	$0	$152,400
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	7	$152,000	$400	$0	$152,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$743,200	$1,600	$0	$744,800
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	7	$743,200	$1,600	$0	$744,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				7	$615,000	$1,500	$0	$616,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$325,600	$700	$0	$326,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$100,000	$300	$0	$100,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$15,400	$100	$0	$15,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$34,000	$100	$0	$34,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$140,000	$300	$0	$140,300
TOTAL				7	$4,050,000	$8,900	$0	$4,058,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 8301013147	5	ALARIS MEDICA S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Autopista Norte 195-64 Local42	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7434300	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2823-09	2023-10	217682311	9457604720	E	2023/10/11	2023/10/13	BANCOLOMBIA	2	$4,058,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: PRINCIPAL (7 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (1 Afiliados)																														
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																														
1	CC	1015401979	SALAS VIVIANA																	23030 1	30	EPS008	30	CCF24	30	14-4	30	0.522%	30	SI
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (1 Afiliados)																														
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																														
2	CC	79956150	SALGADO EDWARD		X							X								23090 1	1	EPS008	1	CCF24	1	14-4	1	0.522%	1	SI
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (5 Afiliados)																														
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)																														
3	CC	53012520	GARZON BLANCA																	23100 1	30	EPS005	30	CCF24	30	14-4	30	0.522%	30	SI
4	CC	1071166123	MOSQUERA DUWAN																	23030 1	30	EPS010	30	CCF24	30	14-4	30	2.436%	30	SI
5	CC	1875687782	PAEZ EDWIN	X	X							X								25-14	3	EPS037	3	CCF24	2	14-4	3	2.436%	3	SI
6	PT	964343	REY CARLOS	X																23030 1	9	EPS037	9	CCF24	9	14-4	9	2.436%	9	SI
2	CC	1014252662	ROMERO INGRID	X																23100 1	5	EPS017	5	CCF24	5	14-4	5	2.436%	5	SI
Total			**Afiliados(7)**																											

ALARIS MEDICA


INFORME GENERAL HOSPITAL TUNJA

Observaciones vistas en piso número # 7 costado norte y sur.

En su mantenimiento Preventivo de Tomas Medicinales cambios de Kit 0-rings y ajustes de conexiones de acoples.

Realizando un total de (81 tomas)


1. Reparar cuerpos de tomas de oxígeno aire medicinal y vacío
2. Cambiar cheque de vacío

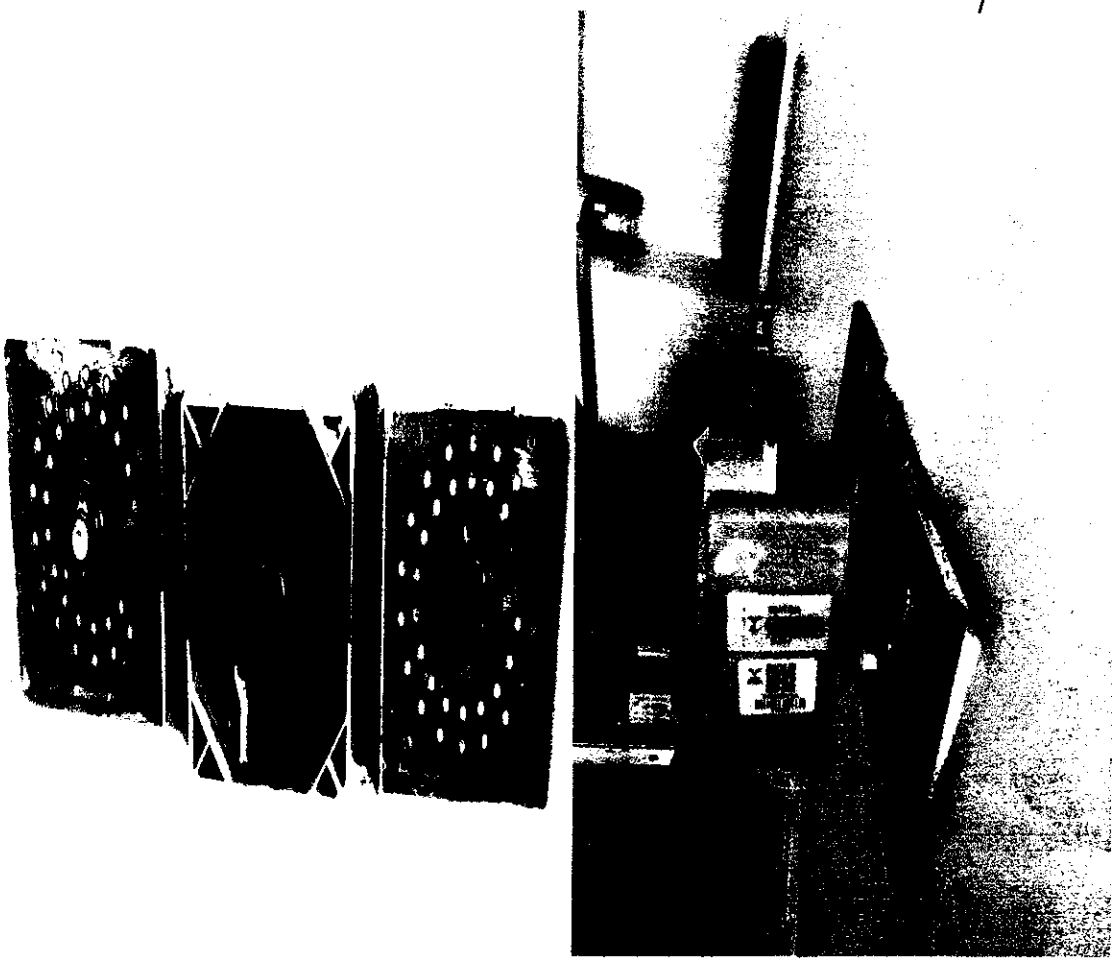

Toma de Aire Suspendida. Área Trabajo Sucio Cambiar Tornillería



Habitación 702 chueque interno de oxígeno malo No cuenta con válvula de servicio para su cambio

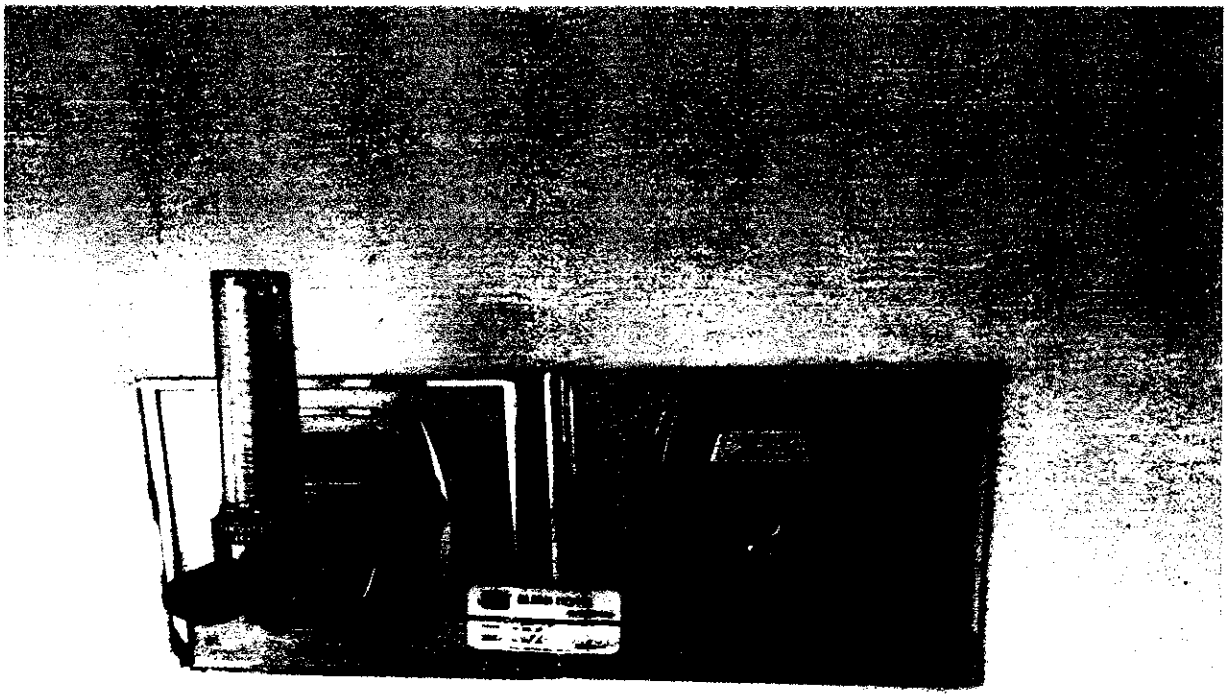

Habitación 713-714 cheque interno de oxígeno. No cuenta con válvula de servicio para su cambio.



Observaciones vistas en piso número # 6 costado norte y sur.


En su mantenimiento Preventivo de Tomas Medicinales cambios de Kit 0-rings y ajustes de conexiones de acoples.

Realizando un total de (93 tomas)




Habitación 633-634 flujómetro malo.

y cambio de tornillería

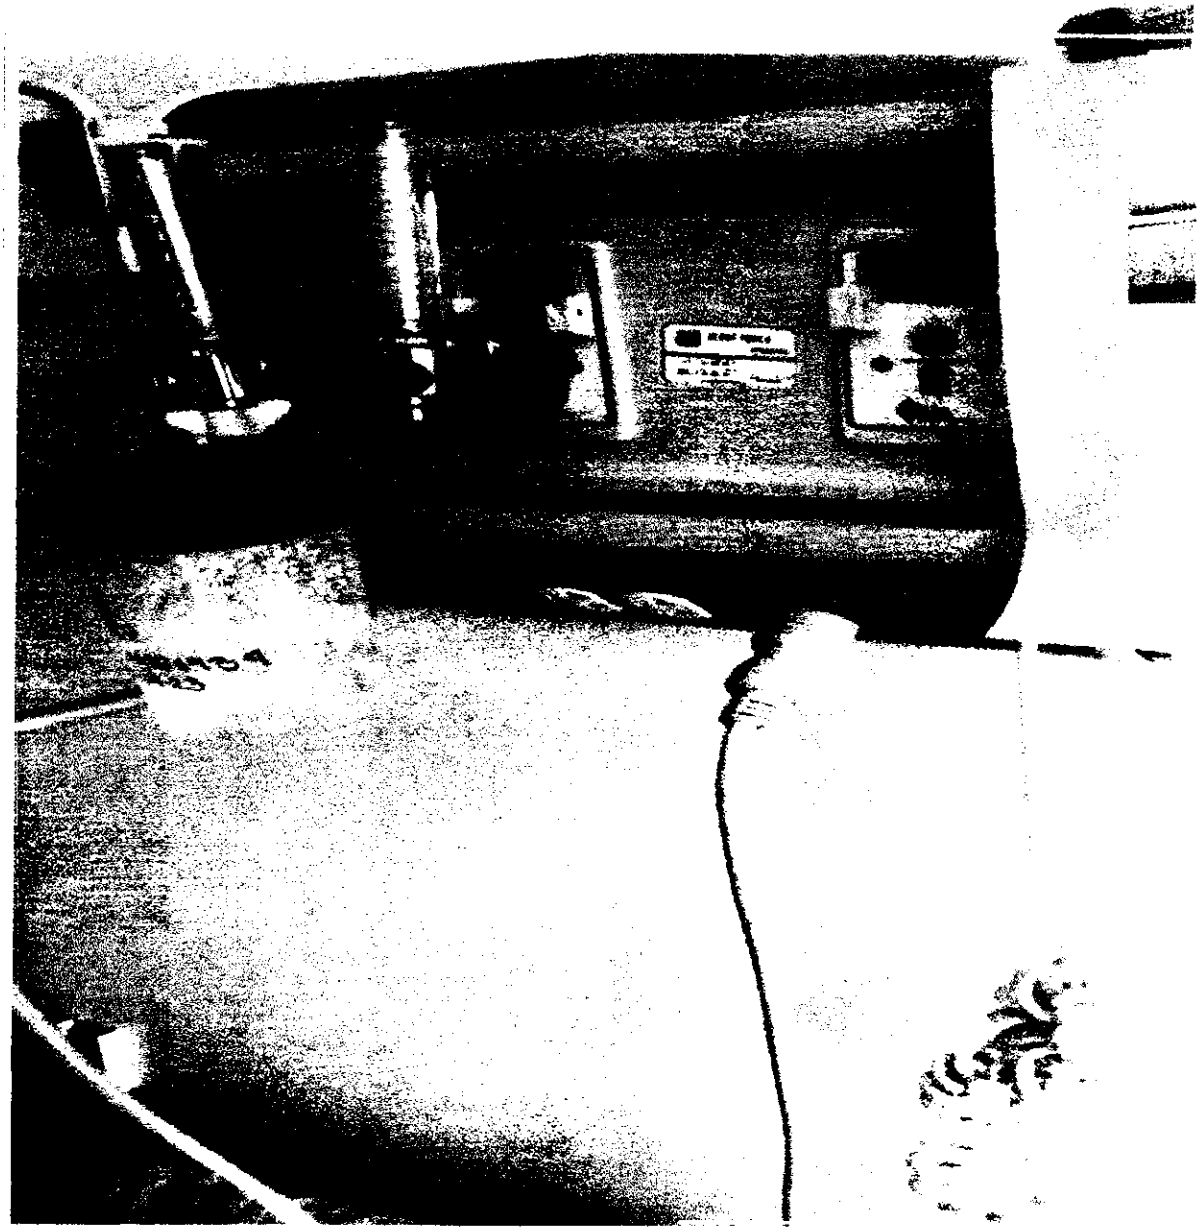

Habitaciones 631-632, 633-634, 635-636, y 637-638 cambios de tornillería a los Escudos

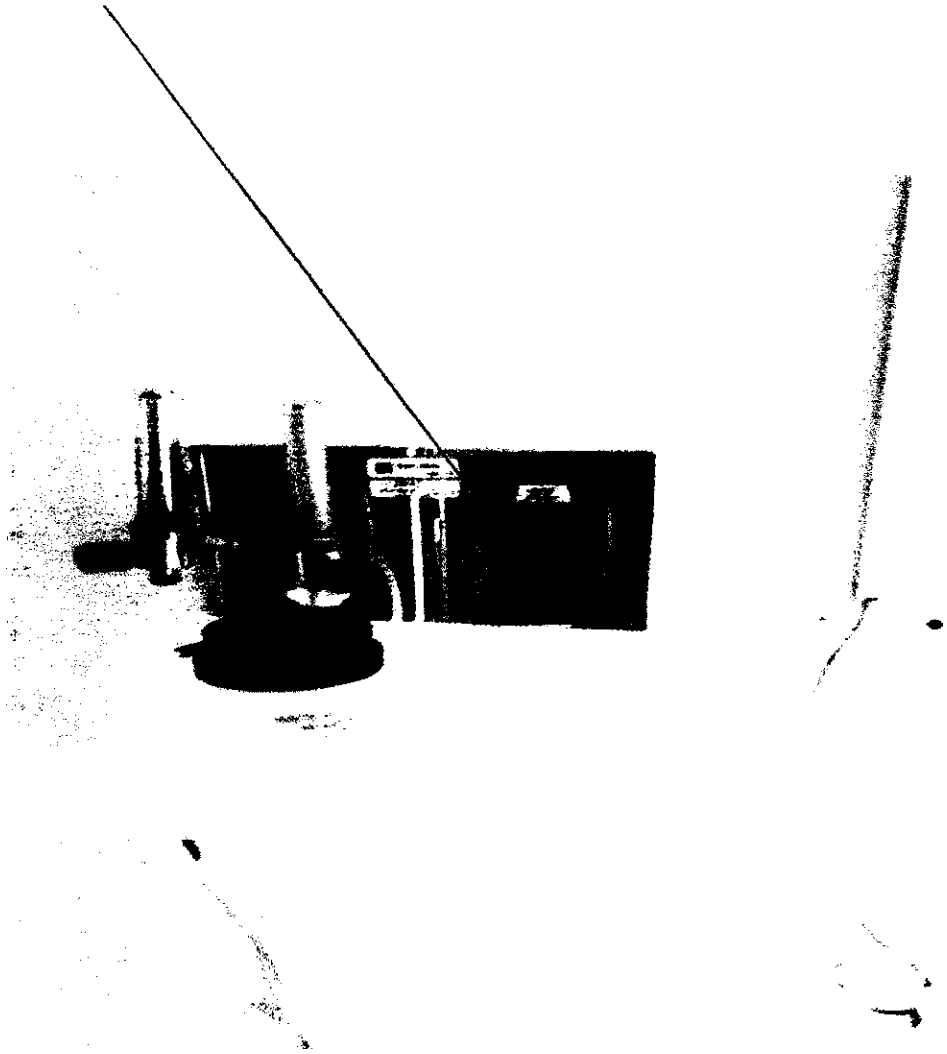

Observaciones vistas en piso número # 5 costado norte y sur.

En su mantenimiento Preventivo de Tomas Medicinales cambios de Kit 0-rings y ajustes de conexiones de acoples.


Realizando un total de (99 tomas)

Área de facturación sin escudos chemetro (Oxigeno y vacío)






Escudo de oxígeno Marca OHIO en mal estado en Habitación 501 y Habitación 502 Flujómetro no está calibrado.

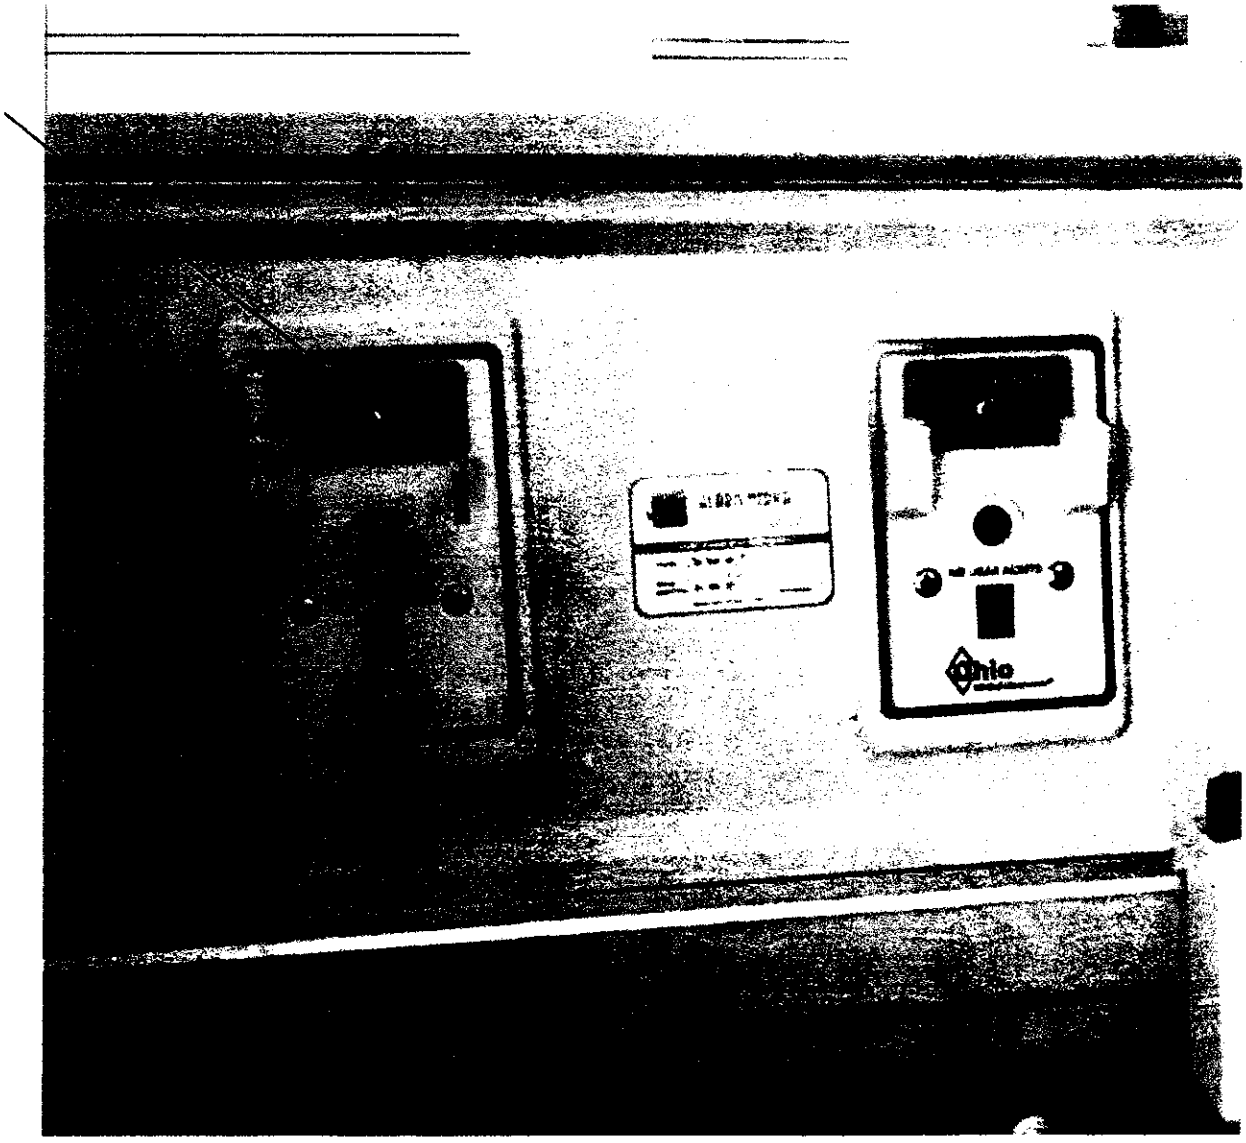

Terapia Respiratoria escudo de oxígeno marca OHIO en m a l estado de igual manera las UCI 5 1 2 ,513 y 515

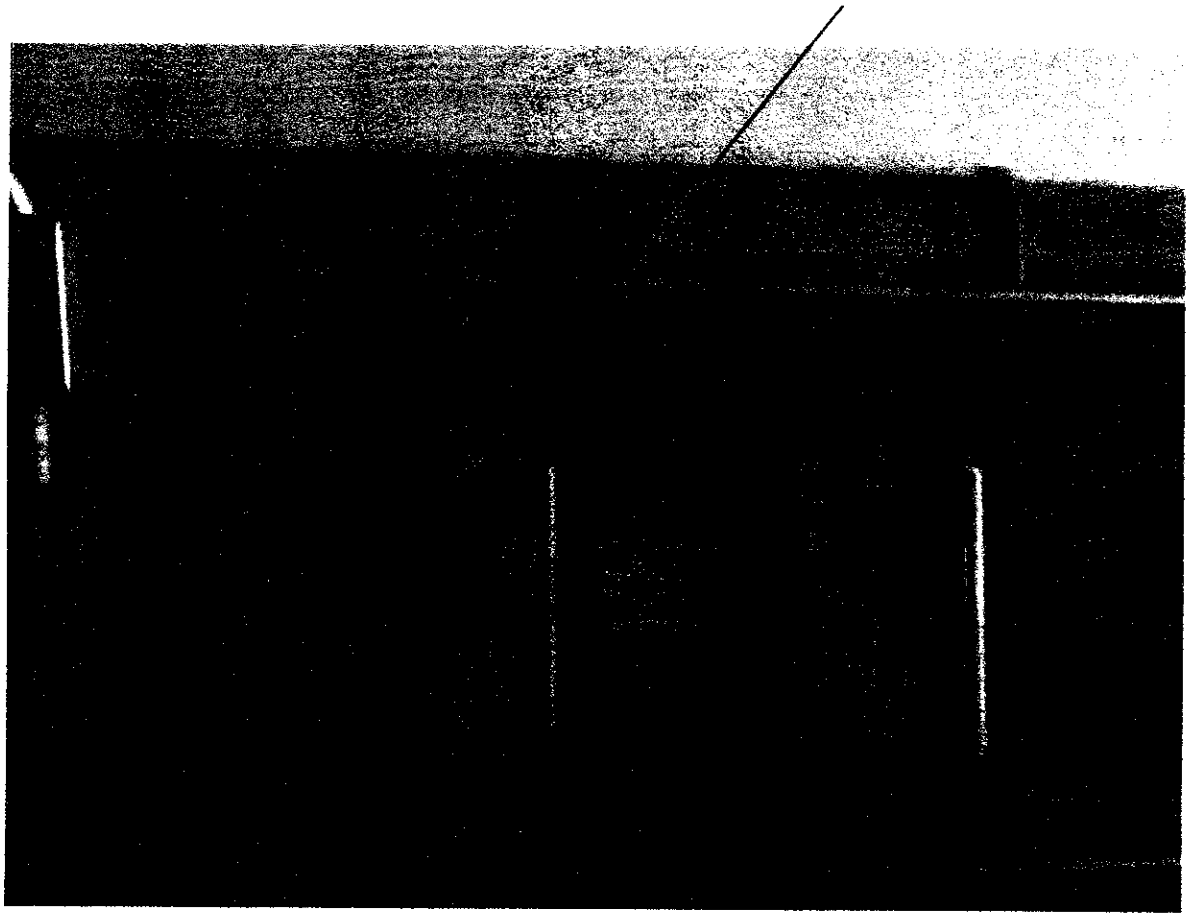

Ca libración de flujómetros en un 20 % y

Cambio de tornillería un 20%

Piso número #05 costado norte y sur.

Observaciones vistas en piso número # 4 costado norte y sur.

En su mantenimiento Preventivo de Tomas Medicinales cambios de Kit 0-rings y ajustes de conexiones de acoples.


Realizando un total de (150 tomas)

Cambio de repuestos de escudos internos de vacío ya que el óxido interviene en su funcionamiento.

El cambio de los escudos en un porcentaje del 50 % del


plso y camblo de tornillería en un porcentaje del 20%



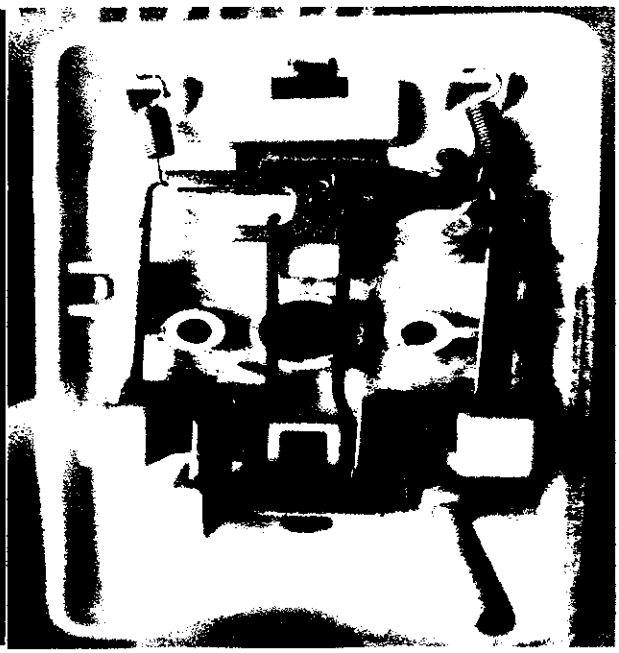



Observaciones de cajas de corte del Hospital Tunja: costado norte y sur

Caja de corte tres gases hemodinamia no cuenta con vacuómetro de vacío

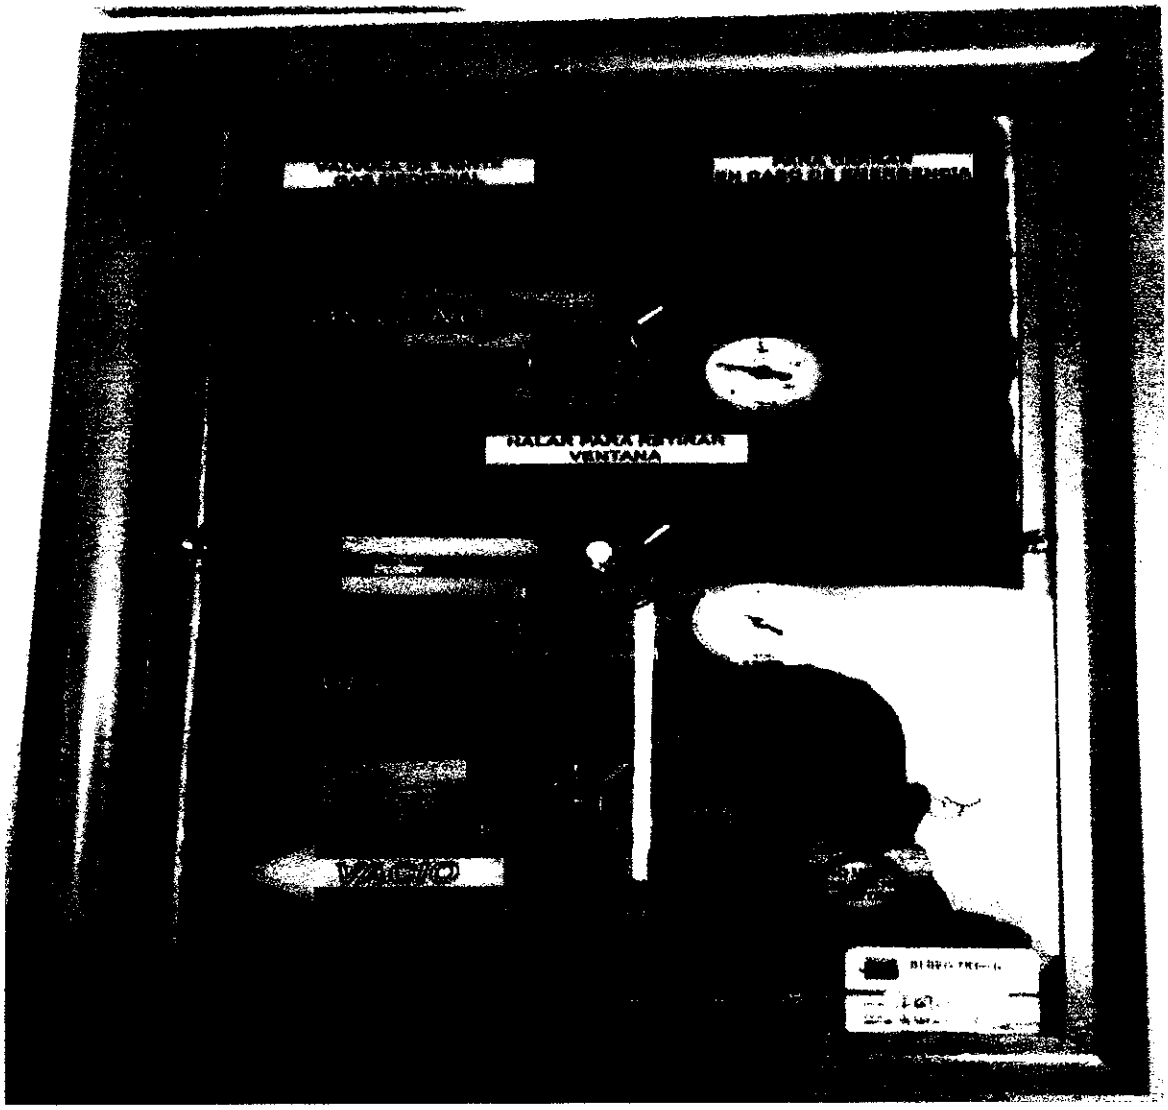

Caja de corte de tres gases con válvula de vacío cerrada

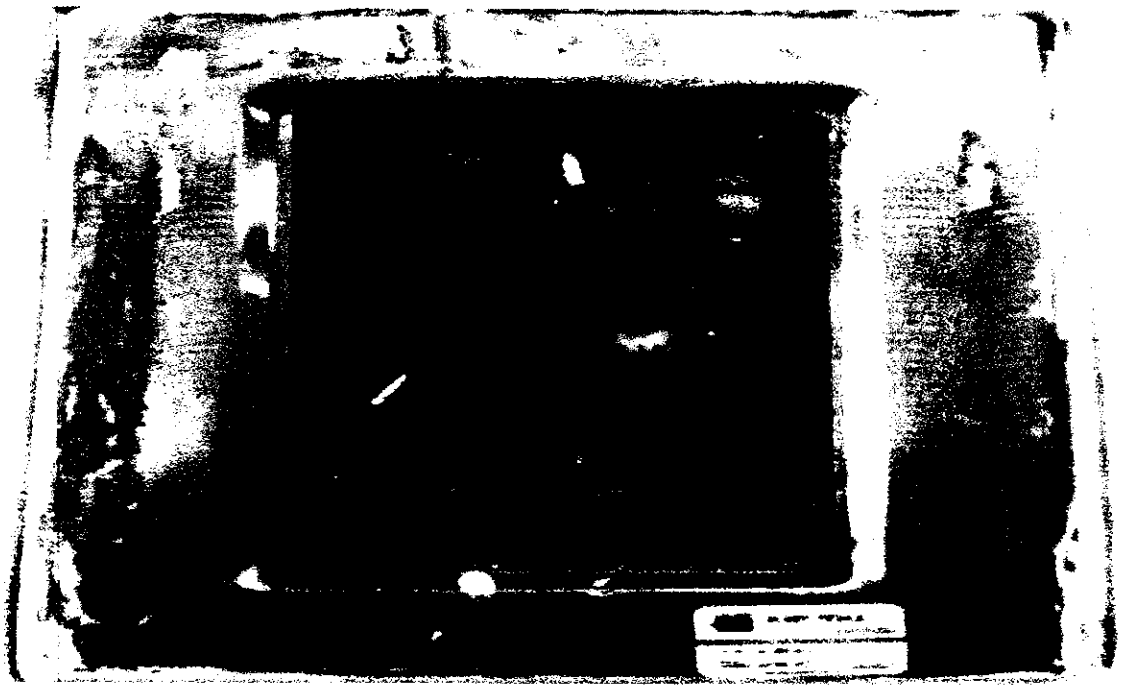


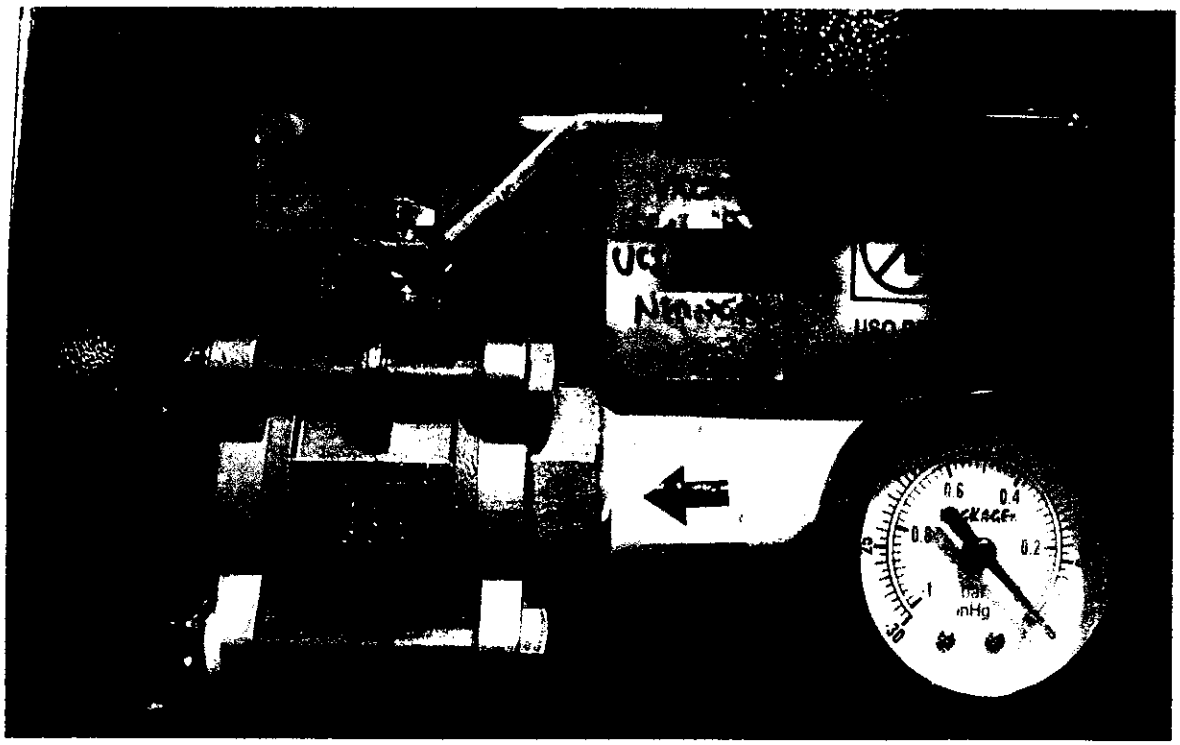


Caja de corte de oxígeno medicina Interna #6 piso Con fuga en sello de válvula



Cajas de corte en sala de parto sin manigueta en la red de vaco

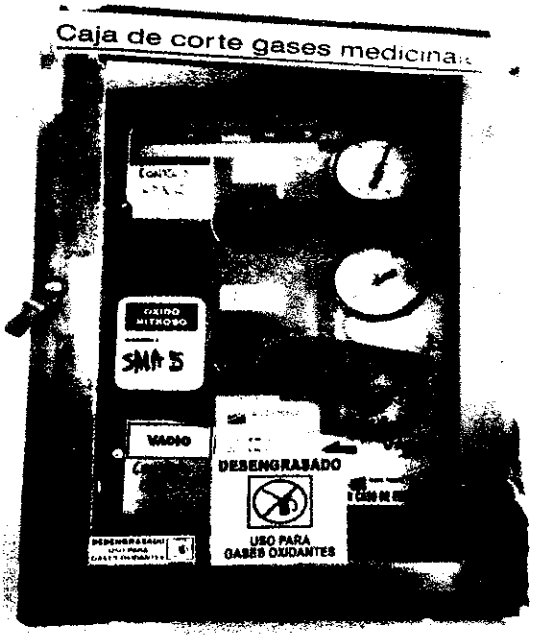





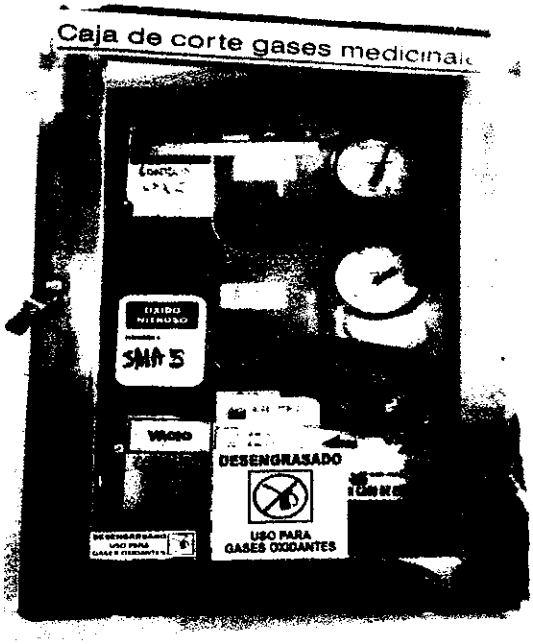

Observaci ones vistas en central de gases medicinales

Cambio de Tornillería a flanches

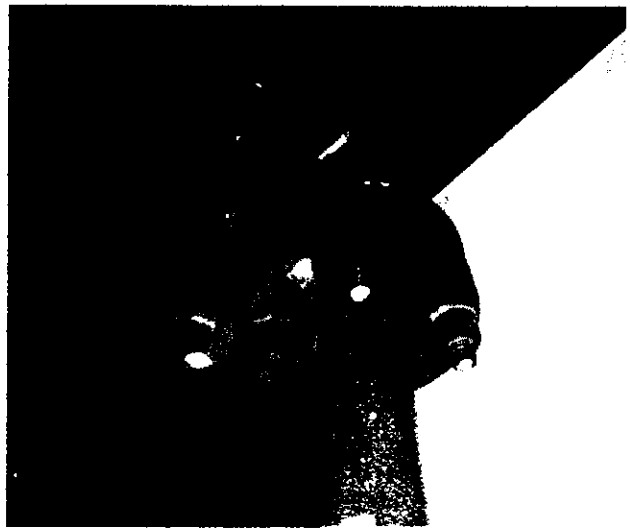


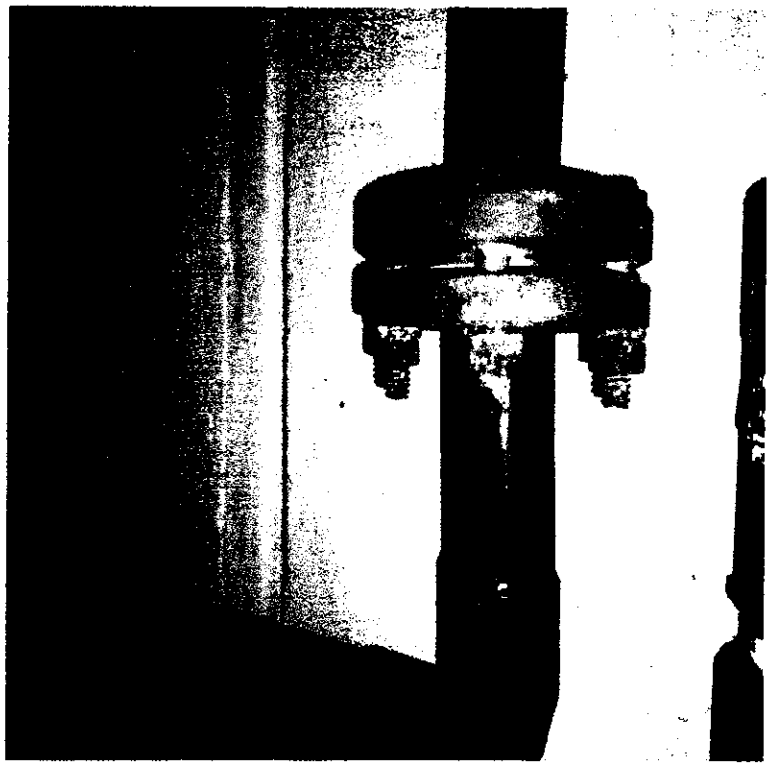

Corregir Fugas en Válvulas Cim del sistema del aire Medicinal en la Regulación doble



Colocar Mangueras de Alta Presión en Manifold de oxígeno Cantidad # 3

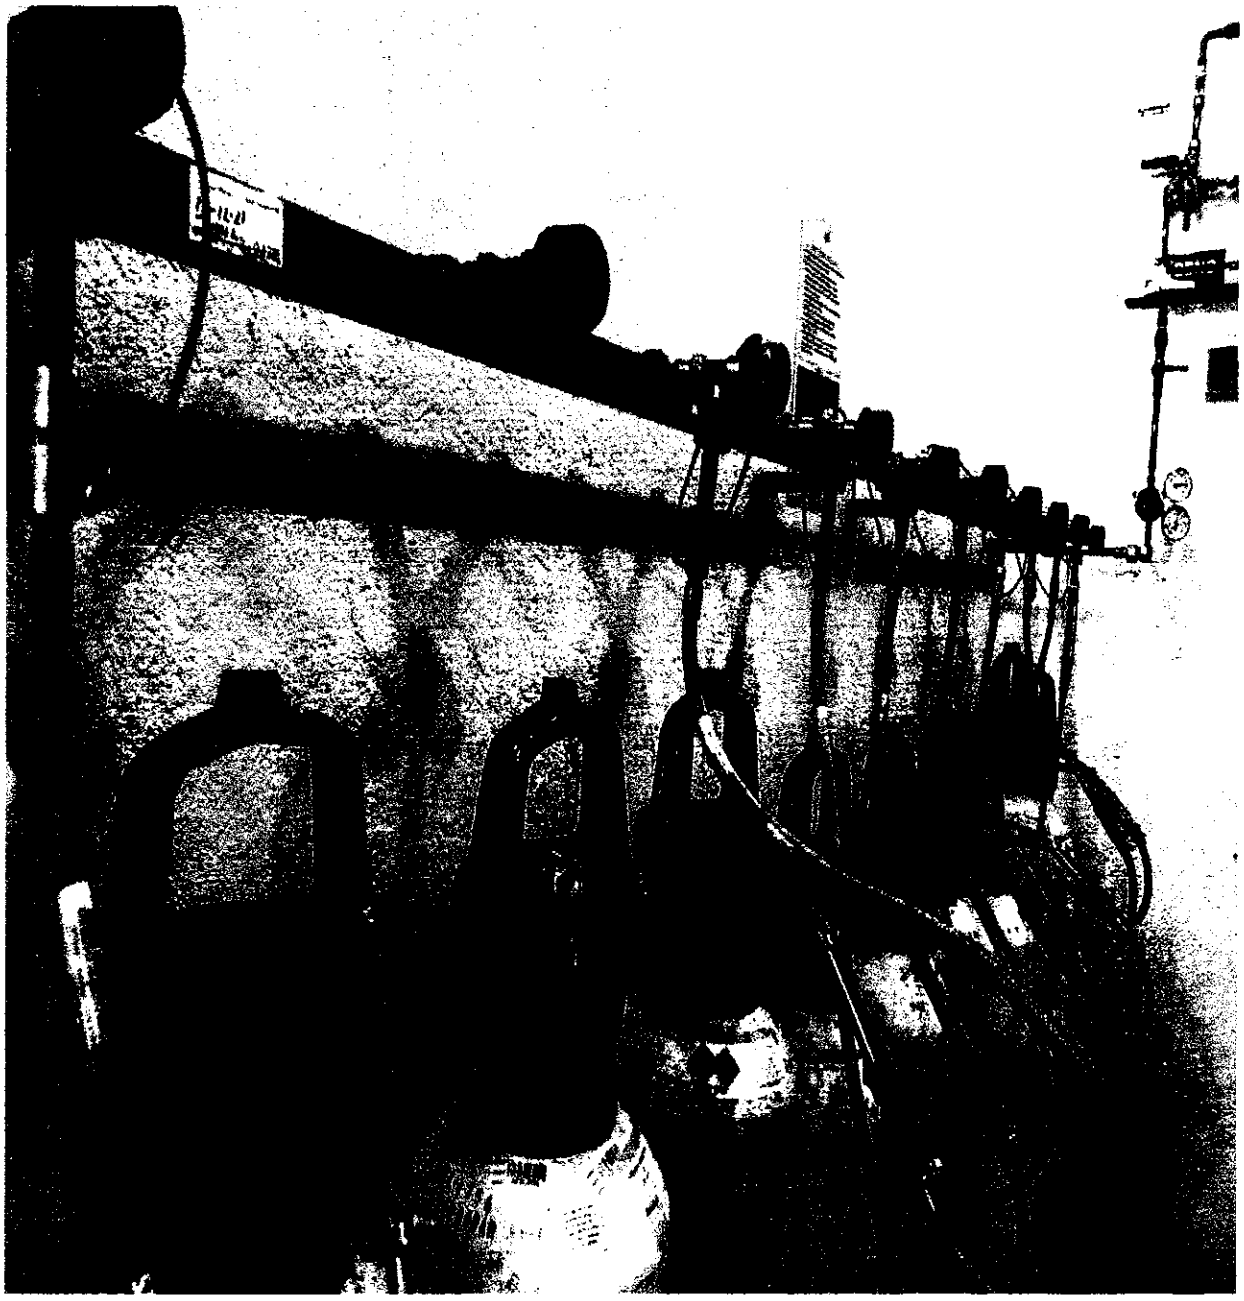

Cambiar sello de bronce a las mangueras de Alta presión del Manifold de Oxigeno cantidad #12 Preferiblemente los 20 ya que en Varias presenta fuga.








Fugas en mangueras de oxígeno de Alta Presión por motivo de sellos desgastados



Cambio de Cheque y tornillos

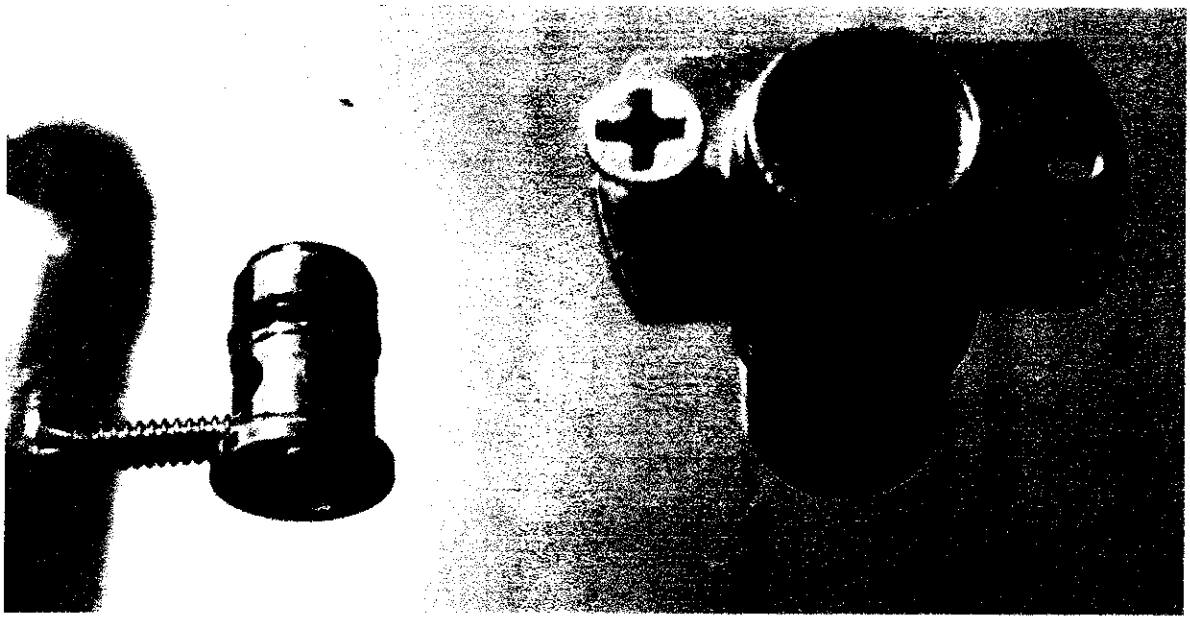


ALARIS MEDICA


Tunja Boyacá 12/10/2023.

Señores:
E.S.E. HOSPITAL SANRAFAEL DE TUNJA
ATENTAMENTE: ING JAVIER CERON
MANTENIMIENTO.
TUNJA BOYACA.

REF CONTRATO 549.

Se rea lizo el mantenimiento preventivo general de tomas medicinales:
Limpieza externa cambio de O-rings y verificación de ajuste y conexión de acoples Kit O-rings para mantenimiento preventivo de tomas chemetron, en pisos 7 costado norte y sur piso 6 costado norte y sur piso 5 costado norte y sur piso 4 costado norte y sur piso 3 costado norte y sur piso 2 costado norte y sur piso 1 costado norte y sur sótano 1 hospitalización mantenimiento preventivo a tomas medicinales oxígeno, aire medicinal y vacío total tomas contratadas 412. Quedando en funcionamiento y con marquilla de servicio.

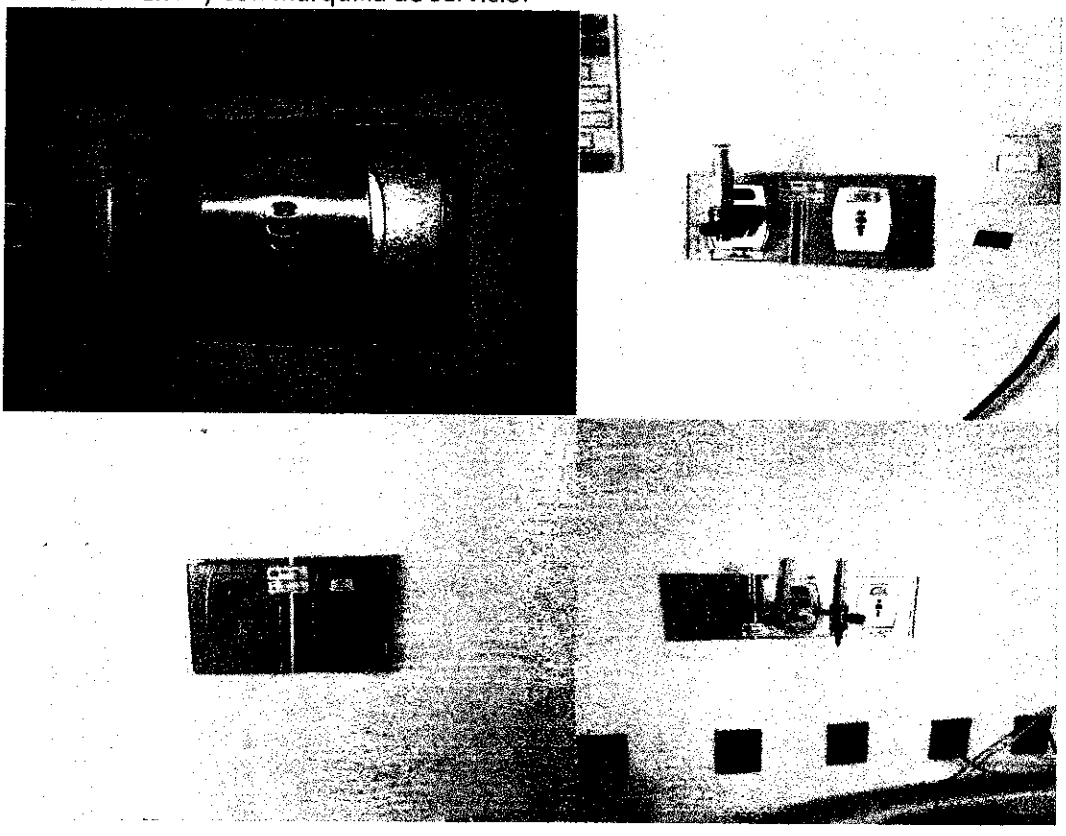

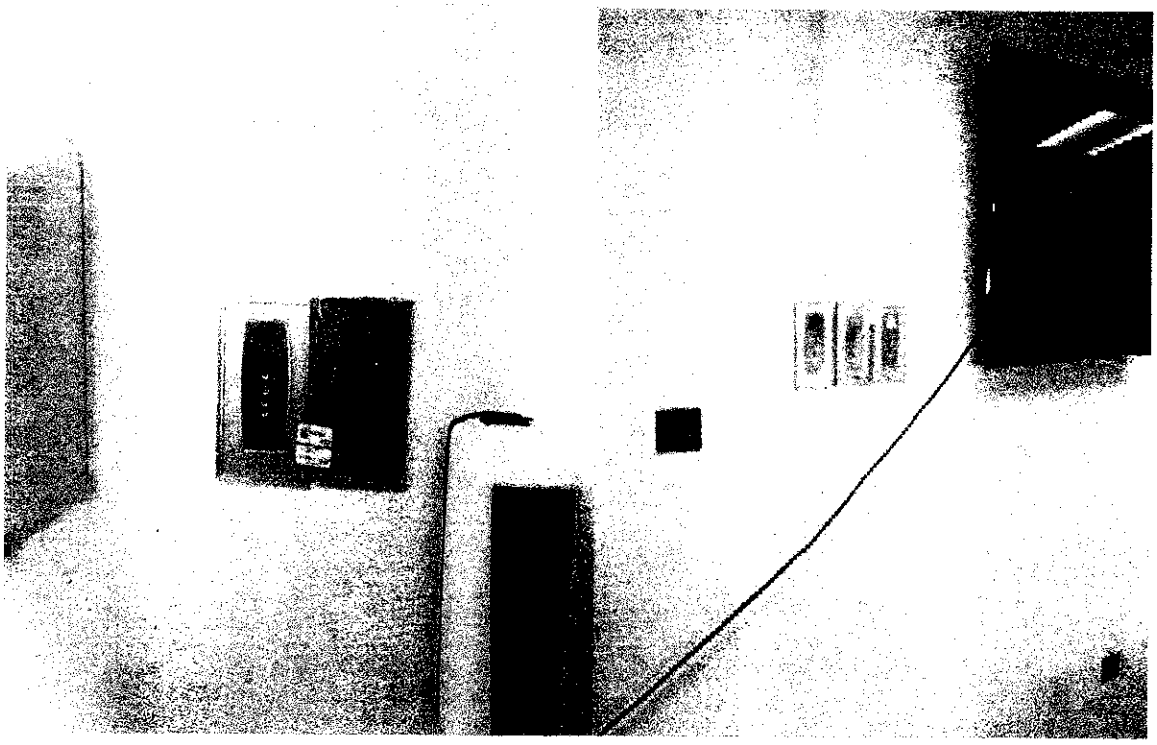


Se realizo mantenimiento caja de corte simple incluyendo prueba de fugas retoques de pintura etiquetas y limpieza general un total de 5 que quedando en funcionamiento y con etiqueta de servicio.



ALARIS MEDICA


Se realizo Mantenimiento Caja de Corte doble, incluye prueba de fugas, retoque pintura instalación de etiqueta y limpieza. Un total de 14 Quedando en funcionamiento y con etiqueta de servicio.



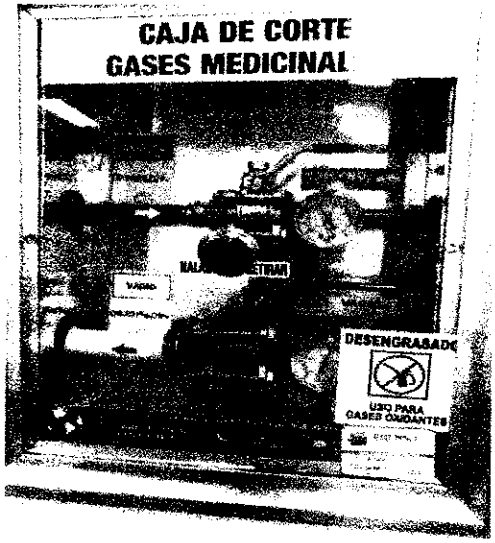


SE realizo Mantenimiento Caja de Corte Triple, incluye prueba de fugas, retoque pintura instalación de etiqueta y limpieza. Un total de 16. quedando en buen funcionamiento y con su etiqueta de servicio.



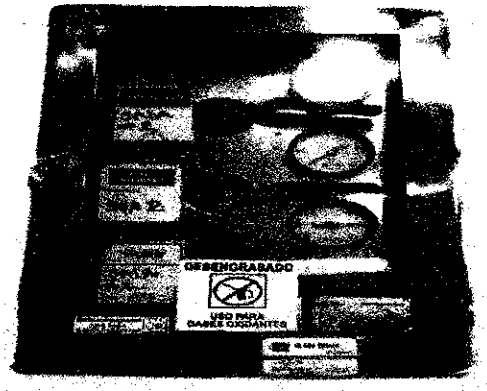


Se realizo Mantenimiento alarma de área de 1-10 señales, Incluye revisión y limpieza de los componentes, medición de voltaje y pruebas de caída de presión real. Un total 10 Quedando en buen funcionamiento. Y con etiqueta de servicio.

ALARIS MEDICA

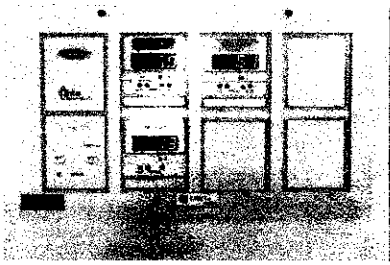



Se realizo Mantenimiento alarma maestra de 1-10 señales, Incluye revisión y limpieza de los componentes, medición de voltaje y pruebas de caída de presión. Un total 1 Quedando en buen funcionamiento y con etiqueta de servicio.



Se realizo Mantenimiento preventivo y correctivo a central de gases medicinales (Manifold de oxígeno, Manifold de aire, Válvulas central semiautomático aire medicinal, oxígeno y aire succión), incluye pruebas de fuga, retoque pintura instalación de etiqueta limpieza. Un total de 1. Quedando en buen funcionamiento y con etiqueta de servicio.



ALARIS MEDICA



Se entrega todo el mantenimiento contratado a satisfacción y sus reportes de piso los cuales reposan en el área de mantenimiento de la institución.

Cordialmente:

Ing. EDGAR MARTINEZ
Cel 318-2152615
