CONSORCIO VÍAS MÁRTIRES E&E 2024
NIT 901.901.814-3

VM-030-2025

Bogotá, 02 de Abril de 2025

Señores
CONSORCIO VIAL MÁRTIRES 2025
R/L: NAYDU LISBETH LOPEZ OROZCO
Direc: Calle 65 #5-01 Ocf 204
Teléfono 6017485476 – 3226724925
consvialmartires2025@gmail.com
Bogotá D.C.

Referencia: **CONTRATO COP-341-2024 "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES, PARA LA VIGENCIA FISCAL 2024, DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN".**

Asunto: **PRIMER GRUPO DE CIVs PARA ACCIONES DE MOVILIDAD**

Respetados señores:

En pro del cumplimiento de la meta física del contrato de referencia, nos permitimos presentar el primer paquete de CIVs propuesto para acciones de movilidad, los cuales han sido identificados posterior a recorridos realizados en compañía de la interventoría y la supervisión, a continuación, resumimos a manera de informe lo encontrado:

Tabla 1. CIVs contractuales

No	CIV	UPZ	PKID	EJE	DESDE	HASTA	BARRIO
2	14001489	37	512883	CLL 3	KRA 17	KRA 17 A	EDUARDO SANTOS
8	14000242	102	183814	CLL 23	KRA 18	KRA 18 BIS	SANTA FE
30	14000268	102	183813	CLL 23	KRA 17	KRA 18	SANTA FE
16	14001210	37	182521	KRA 18 B	CLL 5C	CLL 5	LA ESTANZUELA
17	14000745	102	183311	CLL 7	KRA 23A	KRA 24	LA PEPITA
18	14000827	102	183234	KRA 23A	CLL 7	AC 6	LA PEPITA
19	14000839	102	183225	KRA 23	AC 6	CLL 7	LA PEPITA
20	14000759	102	183226	KRA 23	CLL 7	CLL 8	LA PEPITA
21	14001655	102	183169	KRA 19A	CL 6B	CL 7BIS	LA ESTANZUELA
22	14000932	102	183168	KRA 19A	CL 6A	CL 6B	LA ESTANZUELA
24	14000083	102	91020551	KRA 29A	AC 22	CL 22A BIS	COLSEGUROS

25	14000051	102	91024784	KRA 29A	CLL 22A BIS	CL 22C	COLSEGUROS
28	14001461	37	512840	CLL 3	KR 18	KR 18A	EDUARDO SANTOS
29	14001446	37	182505	KRA 18A	CLL3	CL3 BIS	EDUARDO SANTOS

- **CIV 14001489 – CLL 3 ENTRE KRA 17 Y KRA 17A**

Se evidencia segmento vial con carpeta asfáltica con presencia de fisuras y baches, el contratista sugiere que se realice reparación mediante accione de movilidad. Es importante mencionar que dicho segmento vial hace parte de los CIVs priorizados dentro del contrato de referencia.







- **CIV 14000242 – CLL 23 ENTRE KRA 18 Y KRA 18 BIS.**

Se evidencia segmento vial con carpeta asfáltica con presencia de fisuras, el contratista sugiere que se realice reparación mediante accione de movilidad. Es importante mencionar que dicho segmento vial hace parte de los CIVs priorizados dentro del contrato de referencia.







- **CIV 14000268 – CLL 23 ENTRE KRA 17 Y KRA 18.**

Se evidencia segmento vial con carpeta asfáltica con presencia de fisuras y piel de cocodrilo, el contratista sugiere que este segmento vial sea incluir en el contrato y se realice reparación mediante accione de movilidad.





- **CIV 14001210 – KRA 18B ENTRE CLL 5 Y CLL 5C.**

Se evidencia segmento vial con carpeta asfáltica con presencia de baches, es importante mencionar que este segmento vial colinda con el CIV 14001141 el contratista sugiere que este segmento vial sea incluir en el contrato para dar continuidad entre CIVs y se realice reparación mediante accione de movilidad.



- **CIV 14000745 – CLL7 ENTRE KRA 23A Y KRA 24.**

Se evidencia segmento vial con carpeta asfáltica con presencia de baches y piel de cocodrilo, es importante mencionar que este segmento vial colinda con el CIV 14000760 el contratista sugiere que este segmento vial sea incluir en el contrato para dar continuidad entre CIVs y se realice reparación mediante accione de movilidad.







- **CIV 14000827 – KRA 23A ENTRE AC 6 Y CLL7.**

Se evidencia segmento vial con carpeta asfáltica con presencia de baches y fisuras, es importante mencionar que este segmento vial colinda con el CIV 14000760 el contratista sugiere que este segmento vial sea incluir en el contrato para dar continuidad entre CIVs y se realice reparación mediante accione de movilidad.

<table>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td></td>
</tr>
</table>

- **CIV 14000839 – KRA 23 ENTRE AC 6 Y CLL7.**

Se evidencia segmento vial con carpeta asfáltica con presencia de baches, fisuras y piel de cocodrilo es importante mencionar que este segmento vial colinda con el CIV 14000760 el contratista sugiere que este segmento vial sea incluir en el contrato para dar continuidad entre CIVs y se realice reparación mediante accione de movilidad.







- **CIV 14000759 – KRA 23 ENTRE CLL7 y CLL 8.**

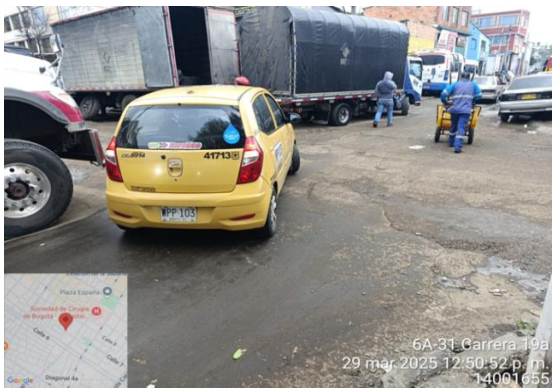
Se evidencia segmento vial con carpeta asfáltica con presencia de baches, es importante mencionar que este segmento vial colinda con el CIV 14000760 el contratista sugiere que este segmento vial sea incluir en el contrato para dar continuidad entre CIVs y se realice reparación mediante accione de movilidad.





- **CIV 140001655 – KRA 19A ENTRE CLL 6B Y CLL 7BIS.**

Se evidencia segmento vial con carpeta asfáltica con presencia de baches es importante mencionar que este segmento vial colinda con el CIV 14000950 el contratista sugiere que este segmento vial sea incluir en el contrato para dar continuidad entre CIVs y se realice reparación mediante accione de movilidad.

<table>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td></td>
</tr>
</table>

- **CIV 140000932 – KRA 19A ENTRE CLL 6A Y CLL 6B.**

Se evidencia segmento vial con carpeta asfáltica con presencia de baches es importante mencionar que este segmento vial colinda con el CIV 14000950 el contratista sugiere que este segmento vial sea incluir en el contrato para dar continuidad entre CIVs y se realice reparación mediante accione de movilidad.







- **CIV 14000083 – KRA 29A ENTRE AC 22 Y CLL 22ª BIS.**

Se evidencia segmento vial con carpeta asfáltica con presencia de baches, es importante mencionar que este segmento vial fue solicitado por parte del FDLM, el contratista conjuntamente con interventoría realiza inspección del segmento vial, se siguiere incluir al contrato para realizar reparación mediante acción de movilidad.







- **<u>CIV 14000051 – KRA 29A ENTRE CLL 22ª BIS Y CLL 22C.</u>**

Se evidencia segmento vial con carpeta asfáltica con presencia de fisuras, es importante mencionar que este segmento vial fue solicitado por parte del FDLM, el contratista conjuntamente con interventoría realiza inspección del segmento vial, se siguiere incluir al contrato para realizar reparación mediante acción de movilidad.





- **CIV 14001461 – CLL3 ENTRE AK 18 Y AK 18A.**

Se evidencia segmento vial con carpeta asfáltica con presencia de fisuras, es importante mencionar que este segmento vial se inspección conjuntamente con el contratista y la interventoría, se siguiere incluir al contrato para realizar reparación mediante acción de movilidad.

- **<u>CIV 14001446 – KRA 18A ENTRE CLL 3 Y CLL 3A BIS.</u>**

Se evidencia segmento vial con carpeta asfáltica con presencia de fisuras y baches, es importante mencionar que este segmento vial se inspección conjuntamente con el contratista y la interventoría, se siguiere incluir al contrato para realizar reparación mediante acción de movilidad.

Por lo anterior, el CONSORCIO VIAS MARTIRES E&E 2024, recomienda al Interventor informar al FDLM sobre el presente documento resumen con el propósito de que determine la inclusión de los CIVs mencionados anteriormente, al contrato de referencia.

Informamos que, para la comunicación del contrato se ha dispuesto el siguiente correo electrónico **contrato341.2024fdlm@gmail.com**

Cordialmente,

ADRIANA PRIETO SANCHEZ

Director de Obra
CONSORCIO VÍAS MÁRTIRES E&E 2024
CONTRATISTA

Elaboró: ZTFL
Aprobó: APS
Anexo: ANEXO 1 - PRESUPUESTO ESTIMADO POR M2 PARA EL PRIMER GRUPO DE ACCIONES DE MOVILIDAD.
