DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
PROCESO OBRAS PÚBLICAS
INFORME VISITA DE OBRA

FECHA	06/03/2025	DIRECCIÓN	LUDOTECA LA CONCEPCION

SOLICITUD
Visita de inspección visual

DESCRIPCIÓN
La Secretaria de familia y desarrollo social, solicita a esta dependencia el acompañamiento de un profesional, para verificar la problemática actual en la edificación así:


HALLAZGOS
1. Cubierta de Eternit deteriorada 2. Falta Baranda de seguridad 3. Luminarias dañadas

REGISTRO FOTOGRÁFICO





CUBIERTA ETERNIT

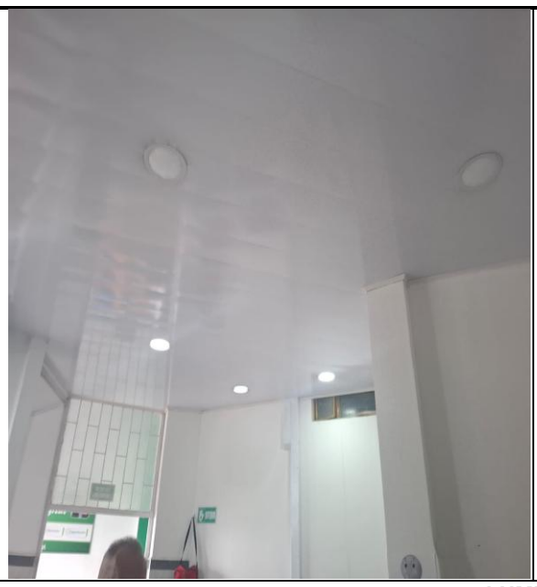



LUMINARIAS

CONCEPTO Y/O CONCLUCIONES
Durante la visita se evidencia un deterioro significativo de la cubierta de Eternit, material que, por su antigüedad y fragilidad, representa un riesgo potencial de filtraciones y desprendimientos. La falta de barandas en zonas elevadas incumple con los parámetros mínimos de seguridad, especialmente en espacios que reciben población infantil. Las luminarias dañadas disminuyen la funcionalidad del espacio

SOLUCIONES
1. Reemplazo de la cubierta de Eternit. 2. Instalación de barandas de seguridad 3. Retiro y remplazo de luminarias dañadas

Ing. Alexander Ospina
Contratista de la secretaria de Obras Publicas

Ing. Joaquín. Romero
Director Técnico Secretaría de Obras Públicas

Arq. Sandra Milena Atuesta A.
Secretaria de Obras Públicas
