
MORENO & CLAVIJO	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CÓDIGO: GPL-FO-024**
		VERSIÓN:01
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	**PÁGINA: 1 DE 1**

FECHA	DD		MM		AA	2024		CORTE N°			ELABORÓ	ING. OSCAR JAIR PORTILLA
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN DEL PUESTO DE SALUD PUERTO GAITÁN DEL MUNICIPIO DE TAME DE LA RED ASISTENCIAL DE LA ESE MORENO Y CLAVIJO DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA											
INTERVENTOR								NIT O C.C.			CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	
CONTRATISTA								NIT O C.C.			CONTRATO DE OBRA N°	

4.1	PINTURAS	ITEM	PINTURA EN VINILO DOS MANOS	UNID.	M2	UBICACIÓN	GENERAL

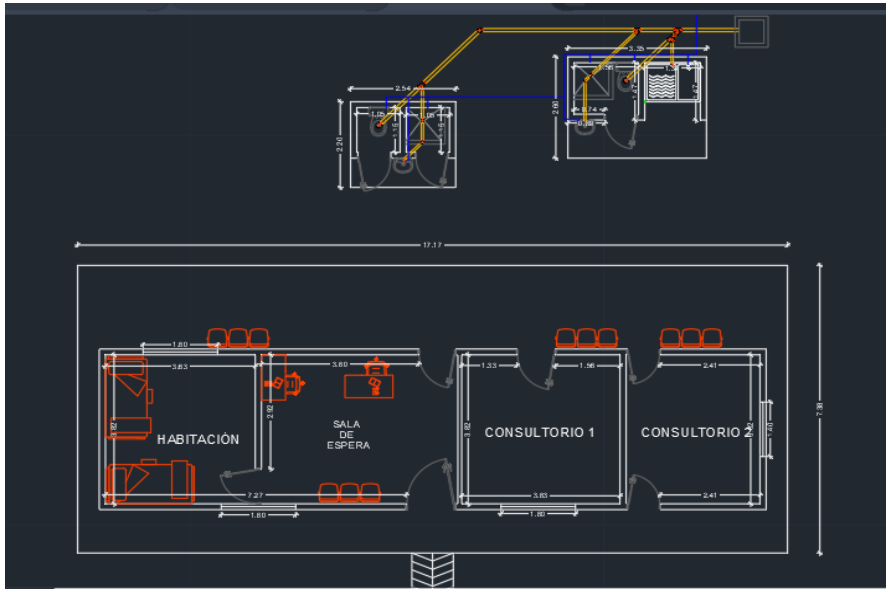

Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	SALA DE ESPERA	4,75	2,50		2,00	23,75
		3,82	2,50		2,00	19,10
	descuento ventana	1,80	1,00		1,00	(1,80)
	descuento puerta	1,00	2,00		2,00	(4,00)
Subtotal						37,05
TOTAL						37,05


ELABORO:

OSCAR JAIR PORTILLA GOMEZ
MP. 121037-0617671 NTS
INGENIERO CIVIL
ESE DEPARTAMENTAL MORENO Y CLAVIJO

MORENO & CLAVIJO Empresa Social del Estado Departamental	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CÓDIGO: GPL-FO-024**
		VERSIÓN:01
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	**PÁGINA: 1 DE 1**

FECHA	**DD**		**MM**		**AA**	2024		**CORTE N°**			**ELABORÓ**	**ING. OSCAR JAIR PORTILLA**	
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN DEL PUESTO DE SALUD PUERTO GAITÁN DEL MUNICIPIO DE TAME DE LA RED ASISTENCIAL DE LA ESE MORENO Y CLAVIJO DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA												
INTERVENTOR								**NIT O C.C.**			**CONTRATO DE INTERVENTORIA N°**		
CONTRATISTA								**NIT O C.C.**			**CONTRATO DE OBRA N°**		

4.2	**PINTURAS**	**ITEM**	PINTURA EPOXICA	**UNID.**	**M2**	**UBICACIÓN**	**GENERAL**

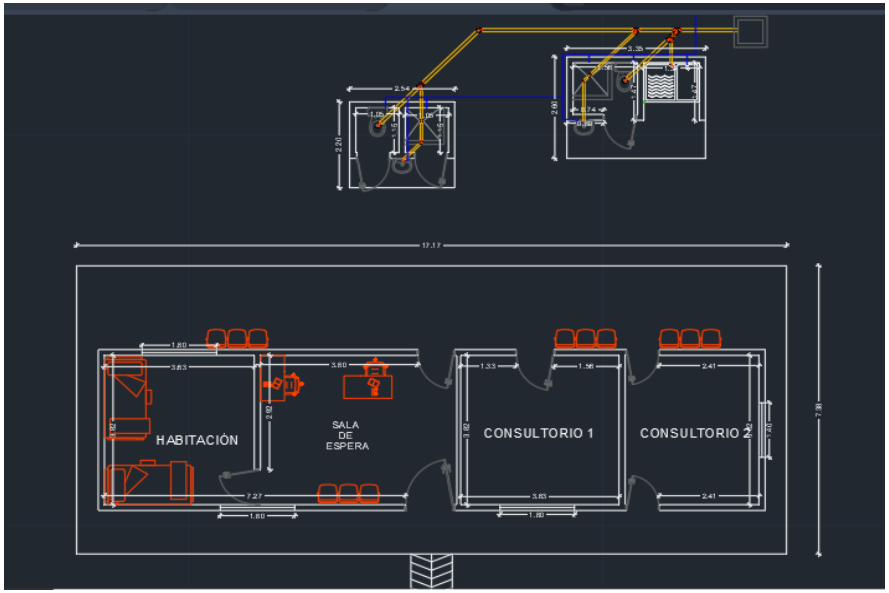

Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	HABITACION		2,50	14,90		37,25
	Descuento ventana	1,80		1,00		(1,80)
	Descuento puerta	1,00	2,00			(2,00)
	CONSULTORIO 1		2,50	15,30		38,25
	Descuento ventana	1,80	1,00			(1,80)
	Descuento puerta	1,00	2,00			(2,00)
	CONSULTORIO 2		2,50	14,10		35,25
	Descuento ventana	1,80	1,00			(1,80)
	Descuento puerta	1,00	2,00			(2,00)
Subtotal						99,35
TOTAL						**99,35**


ELABORO:

OSCAR JAIR PORTILLA GOMEZ
MP. 121037-0617671 NTS
INGENIERO CIVIL
ESE DEPARTAMENTAL MORENO Y CLAVIJO

MORENO & CLAVIJO Empresa Social del Estado Departamental	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CÓDIGO: GPL-FO-024**
		VERSIÓN:01
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	**PÁGINA: 1 DE 1**

FECHA	**DD**		**MM**		**AA**	**2024**		**CORTE N°**			**ELABORÓ**	**ING. OSCAR JAIR PORTILLA**	
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN DEL PUESTO DE SALUD PUERTO GAITÁN DEL MUNICIPIO DE TAME DE LA RED ASISTENCIAL DE LA ESE MORENO Y CLAVIJO DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA												
INTERVENTOR								**NIT O C.C.**				**CONTRATO DE INTERVENTORIA N°**	
CONTRATISTA								**NIT O C.C.**				**CONTRATO DE OBRA N°**	

4.3	**PINTURAS**	**ITEM**	PINTURA PARA EXTERIORES	**UNID.**	**M2**	**UBICACIÓN**	**GENERAL**

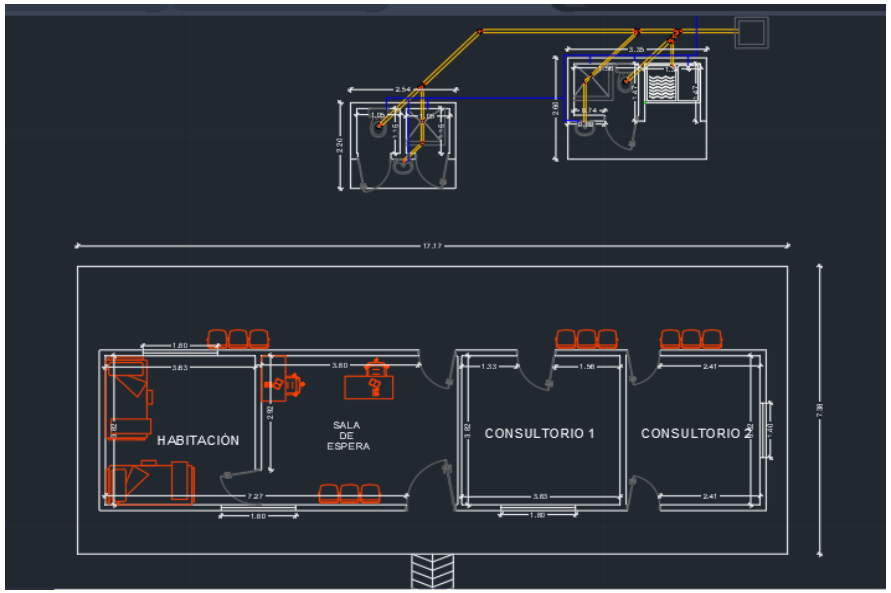

Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	BAÑOS	6,03	2,50		1,00	15,08
		7,93	2,50			19,83
	descontar puerta	0,80	2,00		3,00	(4,80)
	descontar ventana	0,70	0,50			(0,35)
	FACHADA LATERAL IZQUIERDA	4,12	3,20			13,18
	FACHADA LATERAL DERECHA	4,12	3,20			13,18
	descontar ventana	1,40	1,00			(1,40)
	FACHADA FRONTAL	16,13	3,20			51,62
	descontar puerta	1,00	2,00		2,00	(4,00)
	descontar ventana	1,80	1,00		2,00	(3,60)
	FACHADA POSTERIOR	16,13	3,20			51,62
	descontar puerta	1,00	2,00		3,00	(6,00)
	descontar ventana	1,80	1,00		1,00	(1,80)
Subtotal						142,55
TOTAL						**142,55**

ELABORO:

OSCAR JAIR PORTILLA GOMEZ
MP. 121037-0617671 NTS
INGENIERO CIVIL
ESE DEPARTAMENTAL MORENO Y CLAVIJO
