DATOS DE LA REUNIÓN	
Dependencia: Subdirección de Intermediación, Formalización y Regulación Empresarial. Subdirección de Abastecimiento Alimentario.	**Asunto:** Visita técnica de instalaciones fabrica carpas contrato 687 del 2025.
Fecha: 30 de mayo del 2025	**Lugar:** Presencial - Avenida Boyacá # 64C-02 Unicarpas
Asistentes/Participantes: SIFRE(Lineth Panche Molina, Jarrisón Rodriguez Rueda) SAA (Cesar González, Sara Jhoana Beltrán Mondragón) UT Gran Olan Capital (Edwin Ramírez) Unicarpas (Ramón Ayala, Edwin Ayala). Anexo: Listado de Asistencia	

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Realizar visita técnica a las instalaciones del aliado Unicarpas, perteneciente a la Unión Temporal Gran Olan Capital, con el propósito de verificar y revisar los materiales empleados en la fabricación de las carpas solicitadas en el marco del contrato 687 del 2025.

AGENDA DE LA REUNIÓN

1. Presentación del equipo visitante y aliados del contratista
2. Recorrido por las instalaciones de Unicarpas
3. Verificación de materiales y procesos de fabricación de carpas
4. Cierre, conclusiones y compromisos de la visita

DESARROLLO DE LA SESIÓN

La visita técnica inició a las 09:15 a.m. en las instalaciones del proveedor Unicarpas, ubicadas en la Avenida Boyacá #64C-02, en la localidad de Engativá, Bogotá. En el encuentro participaron los equipos técnicos de la Subdirección de Intermediación, Formalización y Regulación Empresarial, la Subdirección de Abastecimiento Alimentario, el contratista y su aliado estratégico.

Una vez realizadas las presentaciones iniciales, se procedió con el recorrido por las instalaciones de producción de Unicarpas, con el objetivo de verificar la capacidad técnica y operativa del aliado del contratista. La planta se distribuye en varios niveles, cada uno destinado a procesos específicos del ciclo de fabricación:

- Primer piso: zona de aplicación de pintura electrostática, equipada con horno de curado.
- Segundo piso: área de estampado, dotada con equipos especializados.
- Tercer piso: zona de soldadura de alta frecuencia para las estructuras.
- Cuarto piso: área destinada a corte, costura, remache y termosellado.

Durante el recorrido se evidenció que el aliado cuenta con la infraestructura, equipos y personal capacitado para llevar a cabo la fabricación integral de carpas y demás elementos requeridos por el contratista, en concordancia con los acuerdos y especificaciones definidas en el anexo técnico y las necesidades de la entidad.

Asimismo, se realizó una inspección puntual del material textil (lona) que será utilizado en la fabricación de las carpas. Se aplicaron pruebas básicas de estiramiento y rasgado, con el fin de verificar su resistencia mecánica. En este contexto, se reiteró al contratista la obligatoriedad de utilizar lona tipo superflex, así como asegurar que el calibre de la estructura metálica sea concordante con lo estipulado en el anexo de especificaciones técnicas.

En cuanto al sistema de anclaje, se informó que el mecanismo de unión tipo macho-hembra será tipo C, con el objetivo de mejorar la durabilidad y funcionalidad estructural de las carpas frente a condiciones de uso intensivo y diversas condiciones de manejo.

El aliado manifestó que trabaja con materias primas de alta calidad, lo cual ha sido un factor diferenciador en la producción de carpas de excelente rendimiento, según su historial comercial.

Finalmente, se aclaró que el estampado de las lonas será a full color, conforme a los artes gráficos entregados por la entidad. No obstante, la impresión y producción definitiva no se iniciará hasta que la entidad emita su aprobación formal sobre las muestras y dichos diseños.


El contratista recalca que la entrega de los elementos se realizará de forma anticipada respecto a la fecha definida en el cronograma establecido por la entidad. Inicialmente, el contratista entregará los elementos que no requieren procesos de producción complejos, como las sillas Rimax, mesas de fórmica, pisos, reflectores entre otros, hacia mediados del mes de junio. Posteriormente, hacia finales del mismo mes, se entregarán los elementos que requieren procesos de fabricación específicos, tales como las carpas, exhibidores, puff, stands, inflable, contrapesos entre otros.


La entidad, en conjunto con el contratista, verificará el diseño de las salas lounge y de los contrapesos metálicos de la estrategia Hecho en Bogotá, de acuerdo con las necesidades específicas y el uso previsto por la entidad, anticipando su proceso de fabricación.

A continuación, se detalla el registro fotográfico de la visita técnica a las instalaciones de Unicarpas:

Registro Fotográfico de la Visita	
	



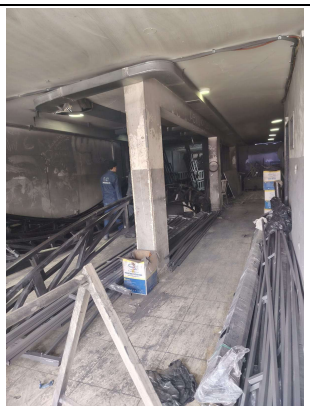

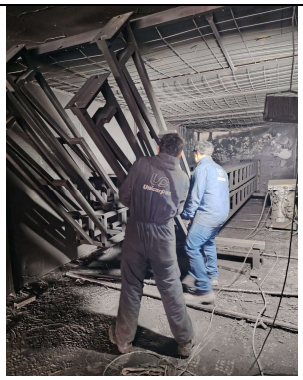Fuente: SDDE_SIFRE_SAA


COMPROMISOS DE LA REUNIÓN		
COMPROMISOS	**RESPONSABLE**	**FECHA CUMPLIMIENTO**
Entrega de muestras físicas: Se llevará al contratista una carpa tipo pagoda en medidas 3x3 m y 2x2 m, completa, con el fin de que este pueda verificar dimensiones reales y detalles estructurales.	SDDE	05/06/2025
Verificación de artes gráficos: La entidad enviará un enlace con los artes correspondientes a los elementos de las estrategias "Hecho en Bogotá" (HEB) y "Mercados Campesinos" (MEC). Estos serán	SDDE	30/05/2025

revisados por el equipo de diseño del contratista para su validación, verificación y aclaración de posibles dudas.		
Se realizará una nueva visita técnica a Unicarpas, con el fin de verificar la impresión de los artes gráficos y las muestras físicas de las lonas y estructuras metálicas de las carpas armadas, en el marco de los requerimientos establecidos por la entidad.	UT GRAN OLAN CAPITAL	04/06/2025

En constancia de lo anterior firman:

LINETH PANCHE M

Realizó
Nombre: Lineth Panche Molina
Cargo: Apoyó a la Supervisión contrato 687 Contratista SIFRE



Revisó
Nombre: Edwin Arley Ramírez Bohorquez
Cargo: Representante UT GRAN OLAN CAPITAL

Sara Beltrán

Revisó
Nombre: Sara Jhoana Beltran Mondragon
Cargo: Apoyó a la Supervisión contrato 687 Contratista SAA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Gestión Documental

Lista de Asistencia

Código:	GD-P1-F17
Versión:	5
Fecha:	13 de septiembre de 2023
Página:	Página 1 de 2
Elaborado por:	Santiago Anzola Contratista DGC
Revisado por:	Gloria Patiño Profesional U. SAF
Aprobado por:	Jenny Andrea Torres Subdirectora Administrativa y Financiera

MIPG

RESPONSABLE/ DEPENDENCIA:	FECHA		
ACTIVIDAD: Visita Proveedor Carpas "Contrato 687/2025	DD	MM	AA
TEMA: Visita técnica inspección bodega - taller	30	05	2025

HORA INICIO		HORA FIN	
9	00	11:30	AM

ITEMS	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO/ ENTIDAD	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
1	Cesar A Gontalet Caycedo	79.760319	SDDE - SDA	SDA	cagontalet@sdde.gov.co	3102887002	
2	Jarrison Rodriguez R	1030559099	SDDE - SIFRE	SIFRE	wolfire@live.com	3103476638	
3	Edwin Arley Ramirez	1072923793	UT Gran O.	Gran Oleam Ca.	utgranolamcapital@gmail.	3777	
4	Franyel Ramón Ayala Diez	88266294	Carpas y Hangares	Unicarpas	ecocarpas1@gmail.com	3229434277	
5	EDWIN AYALA DIEZ	1093739895	Carpas y Hangares	Unicarpas	VENTAS@carpasyhangares.com	3114934581	
6	Sara Jhoana Beltrán Mondragón	1024584961	SDDE - SAA	SAA	proyectos-deruta@sdde.gov.co	3106090847	Sara J B.
7	Lineth Panche Molina	1069176094	SDDE-SIFRE	Contratista	lpanche@sdde.gov.co	3138593679	LINETH PM
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							

La entidad en cumplimiento en lo dispuesto en la ley 1581 de 2012, "Por el cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales", informa al interesado que los datos solicitados para el diligenciamiento del formulario tiene como finalidad, permitir el desarrollo del objeto de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y fortalecer los mecanismos de transparencia.

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada

El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.

Powered by CamScanner
