La equidad es de todos · Prosperidad Social	**ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 5 (90%)**	**Código:**
		Versión: 2
	PROCESO: GESTIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL	**Fecha de Aprobación:**

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA **CONTRATO No.**

OBJETO: REMODELACION VIA DE ACCESO PRINCIPAL CON ANDENES DESDE EL PUENTE SOBRE EL RIO COELLO HASTA LA CARRERA 3 CON CALLE 2 COELLO-TOLIMA-FASE II

CONTRATANTE : ALCALDIA MUNICIPAL DE COELLO TOLIMA RL EVELIO CARO CANIZALES

CONTRATISTA : CONSORCIO VIA COELLO IC

INTERVENTOR: MEDINA Y RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SAS

PERÍODO A PAGAR: 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2022

A los Treinta (30) días del mes de Noviembre del año 2022 se reunieron FRANZ MOLLER REYES como Representante legal del Contratista de Obra - CONSORCIO VIA COELLO IC, CLAUDIA BIBIANA QUITIAN OCAMPO, Directora de Interventoría de "MEDINA Y RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SAS" y DUBAN DARIO RAMIREZ LOPEZ como Supervisor del Contrato por la Entidad Territorial, para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial No. 5 de las siguientes actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			ACTA PARCIAL # 5 - (90%)		CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
1.1	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO	m	560	$ 5.330,00	$ 2.984.800,00		$ -	368,00	-	368,00	$ 1.961.440	$ -	$ 1.961.440,00	192	$ 1.023.360
1.2	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RÍGIDOS	m2	2156,58	$ 12.138,00	$ 26.176.568,04	357,80	$ 4.342.966,20	2.439,00	357,80	2.796,80	$ 29.604.557	$ 4.342.966	$ 33.947.522,71	-640,22	-$ 7.770.955
1.3	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO	m2	672	$ 12.067,00	$ 8.109.024,00	92,40	$ 1.114.990,80	1.245,00	92,40	1.337,40	$ 15.023.403	$ 1.114.991	$ 16.138.393,73	-665,40	-$ 8.029.370
1.4	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN	m3	2835,48	$ 7.392,00	$ 20.959.868,16	50,46	$ 373.029,15	1.648,86	50,46	1.699,32	$ 12.188.341	$ 373.029	$ 12.561.369,86	1.136,16	$ 8.398.498
1.5	Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m).	m3/km	172.983,20	$ 759,00	$ 131.294.248,80	1.960,73	$ 1.488.193,73	170.383,34	1.960,73	172.344,07	$ 129.320.952	$ 1.488.194	$ 130.809.146,06	639,13	$ 485.103
2.1	Mejoramiento con material AFIRMADO	m3	431,32	$ 64.603,00	$ 27.864.307,55	59,02	$ 3.812.675,25	0,00	59,02	59,02	$ -	$ 3.812.675	$ 3.812.675,25	372	$ 24.051.632
2.2	SUB-BASE GRANULAR CLASE B	m3	431,32	$ 97.152,00	$ 41.903.212,03	31,05	$ 3.016.958,21	436,80	31,05	467,85	$ 42.435.994	$ 3.016.958	$ 45.452.951,81	-36,54	-$ 3.549.740
2.3	BASE GRANULAR CLASE B	m3	323,49	$ 103.724,00	$ 33.553.365,59	7,99	$ 828.806,62	324,00	7,99	331,99	$ 33.606.576	$ 828.807	$ 34.435.382,62	-8,50	-$ 882.017
2.4	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0	m2	2.156,58	$ 2.310,00	$ 4.981.699,80	651,27	$ 1.504.433,70	1.596,00	651,27	2.247,27	$ 3.686.760	$ 1.504.434	$ 5.191.193,70	-90,69	-$ 209.494
2.5	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 - COMPRA DE MEZCLA	m3	194,09	$ 650.876,00	$ 126.329.954,77	58,61	$ 38.150.641,13	143,64	58,61	202,25	$ 93.491.829	$ 38.150.641	$ 131.642.469,77	-8,16	-$ 5.312.515
3.1	Bordillo de Piezas Prefabricadas de Concreto; incluye la preparacion de la superficie de apoyo	m	1.340,00	$ 52.493,00	$ 70.340.620,00		$ -	680,00	-	680,00	$ 35.695.240	$ -	$ 35.695.240,00	660,00	$ 34.645.380
3.2	SUB-BASE GRANULAR CLASE B	m3	124,63	$ 97.152,00	$ 12.107.956,61	104,63	$ 10.164.528,00	40,50	104,63	145,13	$ 3.934.656	$ 10.164.528	$ 14.099.184,00	-20,50	-$ 1.991.227
3.3	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	79,17	$ 494.579,00	$ 39.155.819,43	59,40	$ 29.377.992,60	0,00	59,40	59,40	$ -	$ 29.377.993	$ 29.377.992,60	19,77	$ 9.777.827
3.4	Pavimento de adoquines de concreto.	m2	79,30	$ 133.031,00	$ 10.549.358,30	0,00	$ -	0,00	-	-	$ -	$ -	$ -	79,30	$ 10.549.358
4.1	SUMIDERO LATERAL SL - 150 EN MAMPOSTERIA	UND	5,00	$ 1.797.245,00	$ 8.986.225,00	5,00	$ 8.986.225,00	2,00	5,00	7,00	$ 3.594.490	$ 8.986.225	$ 12.580.715,00	-2,00	-$ 3.594.490
4.2	TUBERIA EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD ALCANTARILLADO 12" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	m	35,00	$ 85.357,00	$ 2.987.495,00	59,30	$ 5.061.670,10	35,00	59,30	94,30	$ 2.987.495	$ 5.061.670	$ 8.049.165,10	-59,30	-$ 5.061.670
5.1	Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (75 x 75)	UNIDAD	2,00	$ 428.505,00	$ 857.010,00		$ -	0,00	-	-	$ -	$ -	$ -	2,00	$ 857.010
5.2	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	m	1.078,29	$ 1.924,00	$ 2.074.629,96		$ -	0,00	-	-	$ -	$ -	$ -	1.078,29	$ 2.074.630
5.3	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	m2	68,40	$ 27.274,00	$ 1.865.541,60		$ -	0,00	-	-	$ -	$ -	$ -	68,40	$ 1.865.542
6.1	PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA (PGIO)	UND	1,00	$ 11.347.000,00	$ 11.347.000,00										
					$ -										
					$ -										$ -
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS OBRA					**$ 573.081.704,63**		**$ 108.223.110,49**				**$ 407.531.732**	**$ 108.223.110**	**$ 515.754.842,21**		**$ 57.326.862**
PGIO					**$ 11.347.000,00**		**$ 10.212.300,00**					**$ 10.212.300**	**$ 10.212.300**		**$ 1.134.700**
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS					**$ 171.695.279**		**$ 32.423.644**				**$ 122.096.507**	**$ 32.423.644**	**$ 154.520.150,7262**		**$ 17.175.128**
ADMINISTRACIÓN		**22,96%**			**$ 131.579.559**		**$ 24.848.026**				**$ 93.569.286**	**$ 24.848.026**	**$ 118.417.311,7715**		**$ 13.162.248**
IMPREVISTOS		**2,00%**			**$ 11.461.634**		**$ 2.164.462**				**$ 8.150.635**	**$ 2.164.462**	**$ 10.315.096,8442**		**$ 1.146.537**
UTILIDAD		**5,00%**			**$ 28.654.085**		**$ 5.411.156**				**$ 20.376.587**	**$ 5.411.156**	**$ 25.787.742,1105**		**$ 2.866.343**
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS					**$ 756.123.983,34**		**$ 150.859.054,39**				**$ 529.628.238,54**	**$ 150.859.054,39**	**$ 680.487.292,94**		**$ 75.636.690,40**

BALANCE PRESUPUESTAL

$ 756.123.983,34		**V/R ANTICIPO:**	$ -
$ -		**% ANTICIPO :**	$ -
$ 756.123.983,34		**% RETEGARANTIA :**	$ -

NO.	DESCRIPCIÓN*	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	% PAGADO	RETENCIÓN GARANTÍA			AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	ACTA PARCIAL # 1		$ 75.862.671	10,03%						$ 75.862.671	$ 680.261.312,57	10%
2	ACTA PARCIAL # 2		$ 151.300.871	20,01%						$ 151.300.871	$ 528.960.441,91	30%
3	ACTA PARCIAL # 3		$ 151.253.802	20,00%						$ 151.253.802	$ 377.706.639,56	50%
4	ACTA PARCIAL # 4		$ 151.210.895	20,00%						$ 151.210.895	$ 226.495.744,79	70%
5	ACTA PARCIAL # 5		$ 150.859.054	19,95%						$ 150.859.054	$ 75.636.690,40	90%
	TOTAL		**$ 680.487.293**	**90,00%**								

(*) Descripción de la etapa o el período facturado:

POR EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: FRANZ MOLLER REYES

Cargo: REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA DE OBRA

POR LA INTERVENTORÍA:

Firma:

Nombre: ORLANDO RIVERA MORA

Cargo: DIRECTOR GENERAL DE INTERVE

Firma:

Nombre: CLAUDIA BIBIANA QUITIAN OCAMPO

Cargo: DIRECTORA DE INTERVENTORIA

POR LA ENTIDAD TERRITORIAL:

Firma:

Nombre: DUBAN DARIO RAMIREZ LOPEZ

Cargo: SUPERVISOR CONTRATO - ENTE TERRITORIAL

MUNICIPIO DE COELLO	CONTRATO 179 DE 01 JULIO DE 2022		
	REMODELACION VIA DE ACCESO PRINCIPAL CON ANDENES DESDE EL PUENTE SOBRE EL RIO COELLO HASTA LA CARRERA 3 CON CALLE 2 COELLO - TOLIMA FASE II		
	CONTRATISTA:	INICIO:	25-jul.-22
	CONSORCIO VIA COELLO IC	TERMINACIÓN:	24-sep.-22
	INTERVENTORÍA:	PLAZO:	60 DIAS
	MEDINA Y RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SAS	VALOR:	$ 756.123.983,34

MEMORIAS DE CANTIDADES

ITEM:	1.1	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO			m
DESCRIPCIÓN / LOCALIZACIÓN	**CANTIDAD (UND)**	**LARGO (m)**	**ANCHO (m)**	**ALTO (m)**	**SUBTOTAL**
COSTADO DERECHO	0.00	180,00	0,00	0,00	180,00
COSTADO IZQUIERDO	0.00	116,00	0,00	0,00	116,00
COSTADO DERECHO	0,00	72,00	0,00	0,00	72,00
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**368,00**
				PAGADO ACTAS ANTERIORES	**368,00**
				A PAGAR PRESENTE ACTA	**0,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO







MUNICIPIO DE COELLO	CONTRATO 179 DE 01 JULIO DE 2022		
	REMODELACION VIA DE ACCESO PRINCIPAL CON ANDENES DESDE EL PUENTE SOBRE EL RIO COELLO HASTA LA CARRERA 3 CON CALLE 2 COELLO - TOLIMA FASE II		
	CONTRATISTA:	INICIO:	25-jul.-22
	CONSORCIO VIA COELLO IC	TERMINACIÓN:	24-sep.-22
	INTERVENTORÍA:	PLAZO:	60 DIAS
	MEDINA Y RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SAS	VALOR:	$ 756.123.983,34

ING. JUAN CARLOS SANCHEZ BETANCOURTH
RESIDENTE DE OBRA

ARQ. CLAUDIA BIBIANA QUITIAN OCAMPO
DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE COELLO	CONTRATO 179 DE 01 JULIO DE 2022		
	REMODELACION VIA DE ACCESO PRINCIPAL CON ANDENES DESDE EL PUENTE SOBRE EL RIO COELLO HASTA LA CARRERA 3 CON CALLE 2 COELLO - TOLIMA FASE II		
	CONTRATISTA:	INICIO:	25-jul.-22
	CONSORCIO VIA COELLO IC	TERMINACIÓN:	24-sep.-22
	INTERVENTORÍA:	PLAZO:	60 DIAS
	MEDINA Y RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SAS	VALOR:	$ 756.123.983,34

MEMORIAS DE CANTIDADES

ITEM:	1.2	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RÍGIDOS			m2
DESCRIPCIÓN / LOCALIZACIÓN	**CANTIDAD=UND**	**LARGO=M**	**ANCHO PROM=M**	**ALTO=M**	**SUBTOTAL**
K0+000 HASTA K0+95		95,00	5,70		541,50
K0+95 HASTA K0+199,32		104,32	7,23		754,25
K0+199,32 HASTA K0+326,32		127,00	7,23		918,21
K0+326,32 HASTA K0+360		33,68	7,30		245,86
KO +320 A K0+360		40	1		40
COSTADO DERECHO interseccion ko+93		10,10	1,70		17,17
COSTADO IZQUIERDO interseccion K0+93		7,00	1,70		11,90
COSTADO DERECHO K0+197 A K0+203,5		6,5	0,8		5,2
Faltante de k0+90 A k0+360		170	1,12		190,4
Sobreancho frente al hospital		40	0,8		32
k0+40(garaje alcaldia)		6,9	1,95		13,455
KO+120 (Losa de parqueadero)		4	3		12
K0+130 (Losa de parqueadero)		3,95	3		11,85
KO+00		6	0,5		3
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**2.796,80**
				PAGADO ACTAS ANTERIORES	**2.439,00**
				A PAGAR PRESENTE ACTA	**357,80**

REGISTRO FOTOGRÁFICO








ING. JUAN CARLOS SANCHEZ BETANCOURTH
RESIDENTE DE OBRA

ARQ. CLAUDIA BIBIANA QUITIAN OCAMPO
DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE COELLO	CONTRATO 179 DE 01 JULIO DE 2022		
	REMODELACION VIA DE ACCESO PRINCIPAL CON ANDENES DESDE EL PUENTE SOBRE EL RIO COELLO HASTA LA CARRERA 3 CON CALLE 2 COELLO - TOLIMA FASE II		
	CONTRATISTA:	INICIO:	25-jul.-22
	CONSORCIO VIA COELLO IC	TERMINACIÓN:	24-sep.-22
	INTERVENTORÍA:	PLAZO:	60 DIAS
	MEDINA Y RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SAS	VALOR:	$ 756.123.983,34

MEMORIAS DE CANTIDADES

ITEM:	1.3	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO			m2
DESCRIPCIÓN / LOCALIZACIÓN	**CANTIDAD**	**LARGO=M**	**ANCHO PROME=M**	**ALTO**	**SUBTOTAL**
COSTADO DERECHO K0+000 HASTA K0+090		90,00	2,10		189,000
COSTADO DERECHO K0+090 HASTA K0+200		110,00	2,10		231,000
COSTADO IZQUIERDO K0+000 HASTA K0+113,81		113,81	2,10		239,000
COSTADO DERECHO K0+200 HASTA K0+206		6,00	2,10		12,60
COSTADO DERECHO K0+250 A K0+280		30,00	2,10		63,00
COSTADO DERECHO K0+348 A K0+360		12,00	1,20		14,40
COSTADO IZQUIERDO K0+113,81 HASTA K0+350		236,19	2,10		496,00
COSTADO DERECHO K0+206 A K0+250		44,00	2,10		92,40
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**1.337,399**
				PAGADO ACTAS ANTERIORES	**1.245,00**
				A PAGAR PRESENTE ACTA	**92,40**

REGISTRO FOTOGRÁFICO









MUNICIPIO DE COELLO	CONTRATO 179 DE 01 JULIO DE 2022		
	REMODELACION VIA DE ACCESO PRINCIPAL CON ANDENES DESDE EL PUENTE SOBRE EL RIO COELLO HASTA LA CARRERA 3 CON CALLE 2 COELLO - TOLIMA FASE II		
	CONTRATISTA:	INICIO:	25-jul.-22
	CONSORCIO VIA COELLO IC	TERMINACIÓN:	24-sep.-22
	INTERVENTORÍA:	PLAZO:	60 DIAS
	MEDINA Y RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SAS	VALOR:	$ 756.123.983,34














MUNICIPIO DE COELLO	CONTRATO 179 DE 01 JULIO DE 2022		
	REMODELACION VIA DE ACCESO PRINCIPAL CON ANDENES DESDE EL PUENTE SOBRE EL RIO COELLO HASTA LA CARRERA 3 CON CALLE 2 COELLO - TOLIMA FASE II		
	CONTRATISTA:	INICIO:	25-jul.-22
	CONSORCIO VIA COELLO IC	TERMINACIÓN:	24-sep.-22
	INTERVENTORÍA:	PLAZO:	60 DIAS
	MEDINA Y RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SAS	VALOR:	$ 756.123.983,34



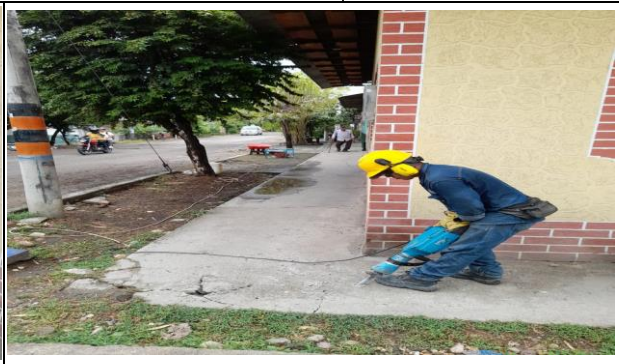





ING. JUAN CARLOS SANCHEZ BETANCOURTH
RESIDENTE DE OBRA

ARQ. CLAUDIA BIBIANA QUITIAN OCAMPO
DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE COELLO	CONTRATO 179 DE 01 JULIO DE 2022		
	REMODELACION VIA DE ACCESO PRINCIPAL CON ANDENES DESDE EL PUENTE SOBRE EL RIO COELLO HASTA LA CARRERA 3 CON CALLE 2 COELLO - TOLIMA FASE II		
	CONTRATISTA:	INICIO:	25-jul.-22
	CONSORCIO VIA COELLO IC	TERMINACIÓN:	24-sep.-22
	INTERVENTORÍA:	PLAZO:	60 DIAS
	MEDINA Y RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SAS	VALOR:	$ 756.123.983,34

MEMORIAS DE CANTIDADES

ITEM:	1.4	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN			m3
DESCRIPCIÓN / LOCALIZACIÓN	**CANTIDAD**	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTO**	**SUBTOTAL**
K0+000 HASTA K0+93		93,00	5,71	0,39	207,10
KO +093 HASTA KO + 138,50		45,50	7,95	0,47	170,01
K0+138,5 HASTA K0+200		61,50	7,95	0,47	229,79
K0+000 HASTA K0+93		93,00	0,69	0,39	25,03
KO +093 HASTA KO + 138,50		45,50	7,95	0,06	21,70
k0+200 A LA K0+336,65		136,65	6,80	0,53	492,48
k0+138,5 A LA K0+200		61,50	7,95	0,06	29,34
k0+320 A LA K0+360		40,00	1,10	0,53	23,32
COSTADO DERECHO K0+000 HASTA K0+090		90,00	2,10	0,15	189,00
COSTADO DERECHO K0+090 HASTA K0+200		110,00	2,10	0,15	231,00
K0+336,65 A K0+360		23,35	6,80	0,53	84,15
COSTADO IZQUIERDO K0+000 HASTA K0+113,81		113,81	2,10	0,15	35,85
COSTADO DERECHO K0+200 HASTA K0+280		80,00	2,10	0,15	25,20
COSTADO DERECHO K0+348 A K0+360		12,00	1,20	0,40	5,76
COSTADO IZQUIERDO K0+113,81 HASTA K0+350		236,19	2,10	0,15	74,40
COSTADO DERECHO K0+93 A K0+104		10,10	1,70	0,53	9,10
COSTADO IZQUIERDO K0+93 A K0+103		7,00	1,70	0,53	6,31
Tuberia sumideros k0 +88 Derecha		6,00	0,60	0,70	2,52
KO+88 IZQ		5,40	0,80	1,00	4,32
k0+120 derecho		6,00	0,80	1,00	4,80
K0+120 izquierdo		31,90	1,00	1,40	44,66
K0+230 derecho		6,00	0,60	1,00	3,60
K0+230 derecho izquierdo		30,00	0,80	1,30	31,20
ko +093		9,00	0,80	1,00	7,20
Sumideros	7,00	1,60	0,80	1,60	14,34
Fallo en abscisa K0+210		6,00	3,80	3,50	79,80
MENOS: Error en multiplicación F-19 Y F-20					-357,00
K0+200 A K0+207		6,50	0,80	0,53	2,76
K0+000		6,00	0,50	0,53	1,59
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**1.699,32**
				PAGADO ACTAS ANTERIORES	**1.648,86**
				A PAGAR PRESENTE ACTA	**50,46**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





MUNICIPIO DE COELLO	CONTRATO 179 DE 01 JULIO DE 2022		
	REMODELACION VIA DE ACCESO PRINCIPAL CON ANDENES DESDE EL PUENTE SOBRE EL RIO COELLO HASTA LA CARRERA 3 CON CALLE 2 COELLO - TOLIMA FASE ll		
	CONTRATISTA:	INICIO:	25-jul.-22
	CONSORCIO VIA COELLO IC	TERMINACIÓN:	24-sep.-22
	INTERVENTORÍA:	PLAZO:	60 DIAS
	MEDINA Y RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SAS	VALOR:	$ 756.123.983,34













ING. JUAN CARLOS SANCHEZ BETANCOURTH
RESIDENTE DE OBRA

ARQ. CLAUDIA BIBIANA QUITIAN OCAMPO
DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE COELLO	CONTRATO 179 DE 01 JULIO DE 2022		
	REMODELACION VIA DE ACCESO PRINCIPAL CON ANDENES DESDE EL PUENTE SOBRE EL RIO COELLO HASTA LA CARRERA 3 CON CALLE 2 COELLO - TOLIMA FASE II		
	CONTRATISTA:	INICIO:	25-jul.-22
	CONSORCIO VIA COELLO IC	TERMINACIÓN:	24-sep.-22
	INTERVENTORÍA:	PLAZO:	60 DIAS
	MEDINA Y RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SAS	VALOR:	$ 756.123.983,34

MEMORIAS DE CANTIDADES

ITEM:		1.5	Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil			m3/km
DESCRIPCIÓN / LOCALIZACIÓN	**% EXPANSION**	**DISTANCIA**	**LONGITUD**	**ANCHO**	**ALTO**	**SUBTOTAL**
EXCAVACION DESDE K0+000 HASTA K0+93	1,3	65,00	93,00	5,70	0,39	17.469,45
EXCAVACION DESDE KO +93 HASTA KO + 200	1,3	65,00	45,50	7,95	0,47	14.365,91
BORDILLO COSTADO DERECHO	1,3	65,00	180,00	0,20	0,45	1.368,90
BORDILLO COSTADO IZQUIERDO	1,3	65,00	116,00	0,20	0,45	882,18
PLACA EN CONCRETO E = 0,12	1,3	65,00	95,00	5,70	0,20	9.151,35
PLACA EN ASFALTO E = 0,05	1,30	65,00	104,32	6,95	0,05	3.063,29
ANDEN COSTADO DERECHO K0+000 HASTA K0+200	1,30	65,00	90,00	2,10	0,10	1.597,05
COSTADO DERECHO K0+000 HASTA K0+090	1,30	65,00	90,00	2,10	0,10	1.597,05
COSTADO DERECHO K0+090 HASTA K0+200	1,30	65,00	110,00	2,10	0,10	1.951,95
COSTADO IZQUIERDO K0+000 HASTA K0+113,81	1,30	65,00	113,81	2,10	0,10	2.019,55
K0+138,5 HASTA K0+200	1,30	65,00	61,50	2,10	0,47	5.129,19
K0+000 HASTA K0+93	1,30	65,00	93,00	4,30	0,39	13.178,70
KO +093 HASTA KO + 138,50	1,30	65,00	45,50	7,95	0,11	3.461,37
k0+200 A LA K0+336,65	1,30	65,00	136,65	6,80	0,53	41.614,18
BORDILLO COSTADO DERECHO	1,30	65,00	72,00	0,20	0,45	547,56
DEMOLICION PLACA E=0,05	1,30	65,00	160,00	6,95	0,05	4.698,20
DEMOLICION PLACA E=0,05	1,30	65,00	40,00	0,70	0,05	118,30
DEMOLICION ANDEN COSTADO DERECHO K0+200 HASTA K0+213	1,30	65,00	6,00	2,10	0,10	106,47
EXCAVACION ANDENES	1,3	65,00	560,00			47.320,00
PLACA KO +330 A K0+360	1,3	65,00	**30**	**0,5**	0,20	253,50
COSTADO DERECHO K0+93 A K0+104 PLACA	1,3	65,00	10,10	1,70	0,53	768,96
COSTADO IZQUIERDO K0+93 A K0+100 PLACA	1,3	65,00	7,00	1,70	0,53	532,94
COSTADO DERECHO K0+197 A K0+204 PLACA	1,3	65,00	6,5	0,8	0,53	232,88
COSTADO DERECHO K0+206 A K0+250	1,3	65,00	44,00	2,10	0,10	780,78
K0+000	1,30	65,00	6,00	0,50	0,53	134,36
					CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**172.344,07**
					PAGADO ACTAS ANTERIORES	**170.383,34**
					A PAGAR PRESENTE ACTA	**1.960,73**

REGISTRO FOTOGRÁFICO









MUNICIPIO DE COELLO	CONTRATO 179 DE 01 JULIO DE 2022		
	REMODELACION VIA DE ACCESO PRINCIPAL CON ANDENES DESDE EL PUENTE SOBRE EL RIO COELLO HASTA LA CARRERA 3 CON CALLE 2 COELLO - TOLIMA FASE II		
	CONTRATISTA:	INICIO:	25-jul.-22
	CONSORCIO VIA COELLO IC	TERMINACIÓN:	24-sep.-22
	INTERVENTORÍA:	PLAZO:	60 DIAS
	MEDINA Y RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SAS	VALOR:	$ 756.123.983,34

















MUNICIPIO DE COELLO

CONTRATO 179 DE 01 JULIO DE 2022

REMODELACION VIA DE ACCESO PRINCIPAL CON ANDENES DESDE EL PUENTE SOBRE EL RIO COELLO HASTA LA CARRERA 3 CON CALLE 2 COELLO - TOLIMA FASE II

CONTRATISTA:	INICIO:	25-jul.-22
CONSORCIO VIA COELLO IC	TERMINACIÓN:	24-sep.-22
INTERVENTORÍA:	PLAZO:	60 DIAS
MEDINA Y RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SAS	VALOR:	$ 756.123.983,34





ING. JUAN CARLOS SANCHEZ BETANCOURTH

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. CLAUDIA BIBIANA QUITIAN OCAMPO

DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE COELLO	CONTRATO 179 DE 01 JULIO DE 2022		
	REMODELACION VIA DE ACCESO PRINCIPAL CON ANDENES DESDE EL PUENTE SOBRE EL RIO COELLO HASTA LA CARRERA 3 CON CALLE 2 COELLO - TOLIMA FASE II		
	CONTRATISTA:	INICIO:	25-jul.-22
	CONSORCIO VIA COELLO IC	TERMINACIÓN:	24-sep.-22
	INTERVENTORÍA:	PLAZO:	60 DIAS
	MEDINA Y RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SAS	VALOR:	$ 756.123.983,34

MEMORIAS DE CANTIDADES

ITEM:	2.1	Mejoramiento con material AFIRMADO			M3
DESCRIPCIÓN / LOCALIZACIÓN	**CANTIDAD**	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTO**	**SUBTOTAL**
K0+90 Tapada tuberia 12"	2,00	6,00	0,65	0,40	3,12
K0+96 tapada tuberia 12"	1,00	9,00	0,65	0,50	2,93
K0+ 120 tapada tuberia 12"	1,00	31,90	0,80	1,10	28,07
K0+120 tapada tuberia sumidero 12"	1,00	6,00	0,65	0,50	1,95
K0+230 Tapada tubería 12"	1,00	30,00	0,70	1,00	21,00
K0+230 Tapada tubería 12" Sumidero	1,00	6,00	0,65	0,50	1,95
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**59,02**
				PAGADO ACTAS ANTERIORES	**0,00**
				A PAGAR PRESENTE ACTA	**59,02**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





ING. JUAN CARLOS SANCHEZ BETANCOURTH
RESIDENTE DE OBRA

ARQ. CLAUDIA BIBIANA QUITIAN OCAMPO
DIRECTORA DE INTERVENTORIA


MUNICIPIO DE COELLO	CONTRATO 179 DE 01 JULIO DE 2022		
	REMODELACION VIA DE ACCESO PRINCIPAL CON ANDENES DESDE EL PUENTE SOBRE EL RIO COELLO HASTA LA CARRERA 3 CON CALLE 2 COELLO - TOLIMA FASE II		
	CONTRATISTA:	INICIO:	25-jul.-22
	CONSORCIO VIA COELLO IC	TERMINACIÓN:	24-sep.-22
	INTERVENTORÍA:	PLAZO:	60 DIAS
	MEDINA Y RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SAS	VALOR:	$ 756.123.983,34

MUNICIPIO DE COELLO	CONTRATO 179 DE 01 JULIO DE 2022		
	REMODELACION VIA DE ACCESO PRINCIPAL CON ANDENES DESDE EL PUENTE SOBRE EL RIO COELLO HASTA LA CARRERA 3 CON CALLE 2 COELLO - TOLIMA FASE II		
	CONTRATISTA:	INICIO:	25-jul.-22
	CONSORCIO VIA COELLO IC	TERMINACIÓN:	24-sep.-22
	INTERVENTORÍA:	PLAZO:	60 DIAS
	MEDINA Y RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SAS	VALOR:	$ 756.123.983,34

MEMORIAS DE CANTIDADES

ITEM:	2.2	SUB-BASE GRANULAR CLASE B			M3
DESCRIPCIÓN / LOCALIZACIÓN	**Area**	**LONGITUD**	**ANCHO**	**ALTO**	**SUBTOTAL**
DESDE K0+000 HASTA K0+200		200,00	6,00	0,20	240,00
KO+200 HASTA K0 + 358		158,00	6,00	0,20	189,60
K0+358 A K0+360		2,00	6,00	0,20	2,40
K0+320 A K0+360		40,00	1,00	0,20	8,00
Area adicional de placas		37,27	1,00	0,20	7,45
Area de bordillos		680,00	0,30	0,10	20,40
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**467,85**
				PAGADO ACTAS ANTERIORES	**436,80**
				A PAGAR PRESENTE ACTA	**31,05**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

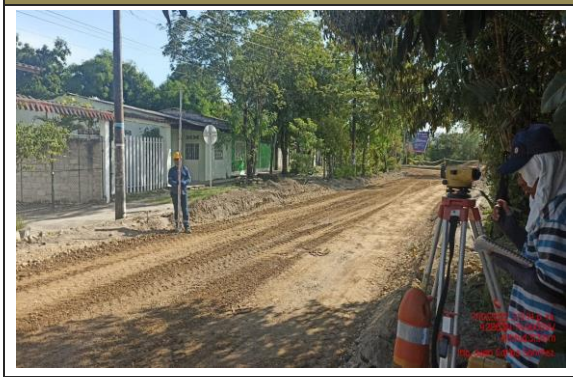







MUNICIPIO DE COELLO	CONTRATO 179 DE 01 JULIO DE 2022		
	REMODELACION VIA DE ACCESO PRINCIPAL CON ANDENES DESDE EL PUENTE SOBRE EL RIO COELLO HASTA LA CARRERA 3 CON CALLE 2 COELLO - TOLIMA FASE II		
	CONTRATISTA:	INICIO:	25-jul.-22
	CONSORCIO VIA COELLO IC	TERMINACIÓN:	24-sep.-22
	INTERVENTORÍA:	PLAZO:	60 DIAS
	MEDINA Y RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SAS	VALOR:	$ 756.123.983,34













ING. JUAN CARLOS SANCHEZ BETANCOURTH
RESIDENTE DE OBRA

ARQ. CLAUDIA BIBIANA QUITIAN OCAMPO
DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE COELLO	CONTRATO 179 DE 01 JULIO DE 2022		
	REMODELACION VIA DE ACCESO PRINCIPAL CON ANDENES DESDE EL PUENTE SOBRE EL RIO COELLO HASTA LA CARRERA 3 CON CALLE 2 COELLO - TOLIMA FASE II		
	CONTRATISTA:	INICIO:	25-jul.-22
	CONSORCIO VIA COELLO IC	TERMINACIÓN:	24-sep.-22
	INTERVENTORÍA:	PLAZO:	60 DIAS
	MEDINA Y RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SAS	VALOR:	$ 756.123.983,34

MEMORIAS DE CANTIDADES

ITEM:	2.3	BASE GRANULAR CLASE B			M3
DESCRIPCIÓN / LOCALIZACIÓN	**AREA**	**LONGITUD**	**ANCHO**	**ALTO**	**SUBTOTAL**
DESDE K0+000 HASTA K0+283		283,00	6,00	0,15	254,70
K0+283 A K0+360		73,00	6,00	0,15	65,70
K0+320 A K0+360		40,00	1,00	0,15	6,00
Area adicional de placas		37,27	1,00	0,15	5,59
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**331,99**
				PAGADO ACTAS ANTERIORES	**324,00**
				A PAGAR PRESENTE ACTA	**7,99**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





MUNICIPIO DE COELLO	CONTRATO 179 DE 01 JULIO DE 2022		
	REMODELACION VIA DE ACCESO PRINCIPAL CON ANDENES DESDE EL PUENTE SOBRE EL RIO COELLO HASTA LA CARRERA 3 CON CALLE 2 COELLO - TOLIMA FASE ll		
	CONTRATISTA:	INICIO:	25-jul.-22
	CONSORCIO VIA COELLO IC	TERMINACIÓN:	24-sep.-22
	INTERVENTORÍA:	PLAZO:	60 DIAS
	MEDINA Y RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SAS	VALOR:	$ 756.123.983,34





MUNICIPIO DE COELLO	CONTRATO 179 DE 01 JULIO DE 2022		
	REMODELACION VIA DE ACCESO PRINCIPAL CON ANDENES DESDE EL PUENTE SOBRE EL RIO COELLO HASTA LA CARRERA 3 CON CALLE 2 COELLO - TOLIMA FASE ll		
	CONTRATISTA:	INICIO:	25-jul.-22
	CONSORCIO VIA COELLO IC	TERMINACIÓN:	24-sep.-22
	INTERVENTORÍA:	PLAZO:	60 DIAS
	MEDINA Y RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SAS	VALOR:	$ 756.123.983,34





ING. JUAN CARLOS SANCHEZ BETANCOURTH
RESIDENTE DE OBRA

ARQ. CLAUDIA BIBIANA QUITIAN OCAMPO
DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE COELLO	CONTRATO 179 DE 01 JULIO DE 2022		
	REMODELACION VIA DE ACCESO PRINCIPAL CON ANDENES DESDE EL PUENTE SOBRE EL RIO COELLO HASTA LA CARRERA 3 CON CALLE 2 COELLO - TOLIMA FASE II		
	CONTRATISTA: CONSORCIO VIA COELLO IC	INICIO:	25-jul.-22
		TERMINACIÓN:	24-sep.-22
	INTERVENTORÍA: MEDINA Y RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SAS	PLAZO:	60 DIAS
		VALOR:	$ 756.123.983,34

MEMORIAS DE CANTIDADES

ITEM:	2.4	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSION ASFÁLTICA CRL-0			M2
DESCRIPCIÓN / LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	SUBTOTAL
K0+00 A K0+266	1,00	266,00	6,00		1.596,00
K0+266 A K0+360	1,00	94,00	6,00		564,00
K0+320 A K0+360	1,00	40,00	1,20		48,00
COSTADO DERECHO K0+93 A K0+104	1,00	10,10	1,70		17,17
COSTADO IZQUIERDO K0+93 A K0+100	1,00	7,00	1,70		11,90
COSTADO DERECHO K0+197 A K0+204	1,00	6,5	0,8		5,20
K0+00	1,00	6,00	0,50		3,00
Arreglo k0 +200	1,00	1,00	1,00		1,00
Arreglo k0 +0,0	1,00	1,00	1,00		1,00
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**2.247,27**
				PAGADO ACTAS ANTERIORES	**1.596,00**
				A PAGAR PRESENTE ACTA	**651,27**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





ING. JUAN CARLOS SANCHEZ BETANCOURTH
RESIDENTE DE OBRA


ARQ. CLAUDIA BIBIANA QUITIAN OCAMPO
DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE COELLO	CONTRATO 179 DE 01 JULIO DE 2022		
	REMODELACION VIA DE ACCESO PRINCIPAL CON ANDENES DESDE EL PUENTE SOBRE EL RIO COELLO HASTA LA CARRERA 3 CON CALLE 2 COELLO - TOLIMA FASE II		
	CONTRATISTA: CONSORCIO VIA COELLO IC	INICIO:	25-jul.-22
		TERMINACIÓN:	24-sep.-22
	INTERVENTORÍA: MEDINA Y RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SAS	PLAZO:	60 DIAS
		VALOR:	$ 756.123.983,34

MEMORIAS DE CANTIDADES

ITEM:	2.5	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 - COMPRA DE MEZCLA			M2
DESCRIPCIÓN / LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	SUBTOTAL
K0+00 A K0+266	1,00	266,00	6,00	0,09	143,64
K0+266 A K0+360	1,00	94,00	6,00	0,09	50,76
COSTADO DERECHO K0+93 A K0+104	1,00	10,10	1,70	0,09	1,55
COSTADO IZQUIERDO K0+93 A K0+100	1,00	7,00	1,70	0,09	1,07
COSTADO DERECHO K0+197 A K0+204	1,00	6,5	0,8	0,09	0,47
K0+320 A K0+360	1,00	40,00	1,20	0,09	4,32
K0+00	1,00	6,00	0,50	0,09	0,27
Arreglo k0 +200	1,00	1,00	1,00	0,09	0,09
Arreglo k0 +0,0	1,00	1,00	1,00	0,09	0,09
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	202,25
				PAGADO ACTAS ANTERIORES	143,64
				A PAGAR PRESENTE ACTA	58,61

REGISTRO FOTOGRÁFICO




ING. JUAN CARLOS SANCHEZ BETANCOURTH
RESIDENTE DE OBRA

ARQ. CLAUDIA BIBIANA QUITIAN OCAMPO
DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE COELLO	CONTRATO 179 DE 01 JULIO DE 2022		
	REMODELACION VIA DE ACCESO PRINCIPAL CON ANDENES DESDE EL PUENTE SOBRE EL RIO COELLO HASTA LA CARRERA 3 CON CALLE 2 COELLO - TOLIMA FASE II		
	CONTRATISTA:	INICIO:	25-jul.-22
	CONSORCIO VIA COELLO IC	TERMINACIÓN:	24-sep.-22
	INTERVENTORÍA:	PLAZO:	60 DIAS
	MEDINA Y RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SAS	VALOR:	$ 756.123.983,34

MEMORIAS DE CANTIDADES

ITEM:	**3.1**	**Bordillo de Piezas Prefabricadas de Concreto; incluye la preparacion de la superficie de apoyo**			**M.L**
DESCRIPCIÓN / LOCALIZACIÓN	**CANTIDAD**	**LONGITUD**	**ANCHO**	**ALTO**	**SUBTOTAL**
DESDE K0+00 HASTA K0+180	2,00	180,00			360,00
DESDE K0+180 HASTA K0+340	2,00	160,00			320,00
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**680,00**
				PAGADO ACTAS ANTERIORES	**680,00**
				A PAGAR PRESENTE ACTA	**0,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





MUNICIPIO DE COELLO	CONTRATO 179 DE 01 JULIO DE 2022		
	REMODELACION VIA DE ACCESO PRINCIPAL CON ANDENES DESDE EL PUENTE SOBRE EL RIO COELLO HASTA LA CARRERA 3 CON CALLE 2 COELLO - TOLIMA FASE II		
	CONTRATISTA:	INICIO:	25-jul.-22
	CONSORCIO VIA COELLO IC	TERMINACIÓN:	24-sep.-22
	INTERVENTORÍA:	PLAZO:	60 DIAS
	MEDINA Y RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SAS	VALOR:	$ 756.123.983,34













MUNICIPIO DE COELLO	CONTRATO 179 DE 01 JULIO DE 2022		
	REMODELACION VIA DE ACCESO PRINCIPAL CON ANDENES DESDE EL PUENTE SOBRE EL RIO COELLO HASTA LA CARRERA 3 CON CALLE 2 COELLO - TOLIMA FASE II		
	CONTRATISTA:	INICIO:	25-jul.-22
	CONSORCIO VIA COELLO IC	TERMINACIÓN:	24-sep.-22
	INTERVENTORÍA:	PLAZO:	60 DIAS
	MEDINA Y RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SAS	VALOR:	$ 756.123.983,34





ING. JUAN CARLOS SANCHEZ BETANCOURTH
RESIDENTE DE OBRA


ARQ. CLAUDIA BIBIANA QUITIAN OCAMPO
DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE COELLO	CONTRATO 179 DE 01 JULIO DE 2022		
	REMODELACIÓN VIA DE ACCESO PRINCIPAL CON ANDENES DESDE EL PUENTE SOBRE EL RIO COELLO HASTA LA CARRERA 3 CON CALLE 2 COELLO - TOLIMA FASE II		
	CONTRATISTA: CONSORCIO VIA COELLO IC	INICIO:	25-jul.-22
		TERMINACIÓN:	24-sep.-22
	INTERVENTORÍA: MEDINA Y RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SAS	PLAZO:	60 DIAS
		VALOR:	$ 756.123.983,34

MEMORIAS DE CANTIDADES

ITEM:	3.2	SUB-BASE GRANULAR CLASE B			M3
DESCRIPCIÓN / LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	SUBTOTAL
DESDE K0+000 HASTA K0+180 COSTADO DERECHO	1,00	180,00	1,55	0,15	41,85
KO + 00 A K0+350 COSTADO IZQUIERDO	1,00	350,00	1,55	0,15	81,38
K0+180 A K0+280 COSTADO DERECHO	1,00	100,00	1,55	0,15	23,25
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	146,48
				PAGADO ACTAS ANTERIORES	41,85
				A PAGAR PRESENTE ACTA	104,63

REGISTRO FOTOGRÁFICO





ING. JUAN CARLOS SANCHEZ BETANCOURTH
RESIDENTE DE OBRA

ARQ. CLAUDIA BIBIANA QUITIAN OCAMPO
DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE PURIFICACION	CONTRATO 157 DE 2022		
	REMODELACION VIA DE ACCESO PRINCIPAL CON ANDENES DESDE EL PUENTE SOBRE EL RIO COELLO HASTA LA CARRERA 3 CON CALLE 2 COELLO - TOLIMA FASE II		
	CONTRATISTA:	INICIO:	06-abr.-22
	CONSORCIO VIA COELLO IC	TERMINACIÓN:	05-jul.-22
	INTERVENTORÍA:	PLAZO:	3 meses
	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD	VALOR:	$ 756.123.983,34

MEMORIAS DE CANTIDADES

ITEM:	3.3	Concreto Resistencia 21MPa (D)			m3
DESCRIPCIÓN / LOCALIZACIÓN	**CANTIDAD**	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTO**	**SUBTOTAL**
KO +00 A K0+93 COSTADO DERECHO	1,00	270,00	1,10	0,10	29,70
KO +00 A K0+93 COSTADO IZQUIERDO	1,00	270,00	1,10	0,10	29,70
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**59,40**
				PAGADO ACTAS ANTERIORES	**0,00**
				A PAGAR PRESENTE ACTA	**59,40**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





ING. JUAN CARLOS SANCHEZ BETANCOURTH
RESIDENTE DE OBRA

ARQ. CLAUDIA BIBIANA QUITIAN OCAMPO
DIRECTORA DE INTERVENTORIA


MUNICIPIO DE COELLO	CONTRATO 179 DE 01 JULIO DE 2022		
	REMODELACION VIA DE ACCESO PRINCIPAL CON ANDENES DESDE EL PUENTE SOBRE EL RIO COELLO HASTA LA CARRERA 3 CON CALLE 2 COELLO - TOLIMA FASE II		
	CONTRATISTA:	INICIO:	25-jul.-22
	CONSORCIO VIA COELLO IC	TERMINACIÓN:	24-sep.-22
	INTERVENTORÍA:	PLAZO:	60 DIAS
	MEDINA Y RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SAS	VALOR:	$ 756.123.983,34

MEMORIAS DE CANTIDADES

ITEM:	4.1	SUMIDERO LATERAL SL - 150 EN MAMPOSTERIA			M3
DESCRIPCIÓN / LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	SUBTOTAL
K0 + 93	2,00				2,00
K0 + 120	2,00				2,00
K0 + 230	2,00				2,00
K0 + 96	1,00				1,00
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	7,00
				PAGADO ACTAS ANTERIORES	2,00
				A PAGAR PRESENTE ACTA	5,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO






ING. JUAN CARLOS SANCHEZ BETANCOURTH
RESIDENTE DE OBRA

ARQ. CLAUDIA BIBIANA QUITIAN OCAMPO
DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE COELLO	CONTRATO 179 DE 01 JULIO DE 2022		
	REMODELACION VIA DE ACCESO PRINCIPAL CON ANDENES DESDE EL PUENTE SOBRE EL RIO COELLO HASTA LA CARRERA 3 CON CALLE 2 COELLO - TOLIMA FASE II		
	CONTRATISTA: CONSORCIO VIA COELLO IC	INICIO:	25-jul.-22
		TERMINACIÓN:	24-sep.-22
	INTERVENTORÍA: MEDINA Y RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SAS	PLAZO:	60 DIAS
		VALOR:	$ 756.123.983,34

MEMORIAS DE CANTIDADES

ITEM:	4.2	TUBERIA EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD ALCANTARILLADO 12" SUMINISTRO E INSTALACIÓN			M3
DESCRIPCIÓN / LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	SUBTOTAL
k0 +88 Derecha		6,00			6,00
KO+88 IZQ		5,40			5,40
k0+120 derecho		6,00			6,00
K0+120 izquierdo		31,90			31,90
K0+230 derecho		6,00			6,00
K0+230 derecho izquierdo		30,00			30,00
ko +093		9,00			9,00
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**94,30**
				PAGADO ACTAS ANTERIORES	**35,00**
				A PAGAR PRESENTE ACTA	**59,30**

REGISTRO FOTOGRÁFICO






ING. JUAN CARLOS SANCHEZ BETANCOURTH
RESIDENTE DE OBRA

ARQ. CLAUDIA BIBIANA QUITIAN OCAMPO
DIRECTORA DE INTERVENTORIA
