CLAUDIA PATRICIA GARCES LOPEZ

De: CLAUDIA PATRICIA GARCES LOPEZ
Enviado el: jueves, 10 de julio de 2025 11:58 p. m.
Para: Sara Raquel Gonzalez Rodriguez; Jhon Alexander Quintero Gomez
CC: MARCELA PATRICIA ARAUJO COLINA
Asunto: RE: Informe Mensual FAER 651 2024 - mayo 2025 | Avanzame

Buenos días Sres. EMPRESA DE ENERGIA DE PUTUMAYO S.A. E.S.P.
Cordial saludo

De manera atenta se les informa que se aprobó en la plataforma AvanzaME, el informe del mes de mayo del contrato FAER 0651 2024.

Por favor tener en cuenta para los próximos reportes que debe haber concordancia entre todos los documentos cargados. De igual forma para el próximo reporte se deben cargar los soportes SEBRA pendientes.

Muchas gracias,

Claudia Patricia Garcés López
Grupo de Supervisión
Dirección de Energía Eléctrica
Energía


De: CLAUDIA PATRICIA GARCES LOPEZ
Enviado el: martes, 8 de julio de 2025 11:17 p. m.
Para: Sara Raquel Gonzalez Rodriguez <asistente.gerencia@energiaputumayo.com>
CC: Jhon Alexander Quintero Gomez <tecnica@energiaputumayo.com>
Asunto: RE: Informe Mensual FAER 651 2024 - mayo 2025 | Avanzame

Buenos días Sres. EMPRESA DE ENERGIA DE PUTUMAYO S.A. E.S.P.
Cordial saludo

El reporte fue rechazado debido a que el avance de la actividad “Avance de obra del 80%” es mayor al 100%. Por favor ajustar, en caso de requerirse contactar a la mesa de ayuda de plataforma

Avance De Obra Del 80%	2024-09-17	2025-01-08	global

De igual forma, en el módulo de Rendimientos se debe ajustar la fecha y valor del reintegro correspondiente al mes de mayo



Quedo atenta,

Claudia Patricia Garcés López
Grupo de Supervisión


Dirección de Energía Eléctrica

Energía

De: Sara Raquel Gonzalez Rodriguez <asistente.gerencia@energiaputumayo.com>
Enviado el: martes, 8 de julio de 2025 5:46 p. m.
Para: CLAUDIA PATRICIA GARCES LOPEZ <cpgarces@minenergia.gov.co>
CC: Jhon Alexander Quintero Gomez <tecnica@energiaputumayo.com>
Asunto: Re: Informe Mensual FAER 651 2024 - mayo 2025 | Avanzame

Cordial saludo,

El informe fue cargado en la plataforma según las correcciones solicitadas.

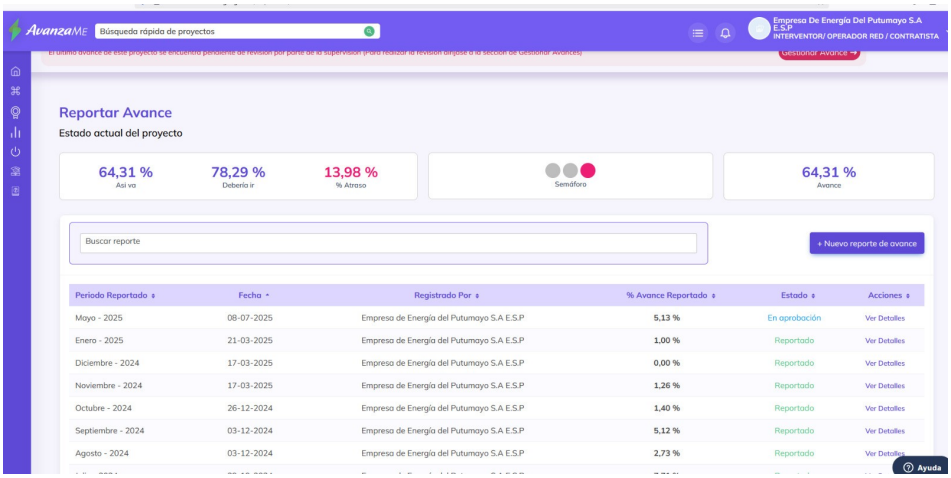

Sin otro particular.

El lun, 7 jul 2025 a la(s) 1:05 a.m., CLAUDIA PATRICIA GARCES LOPEZ (cpgarces@minenergia.gov.co) escribió:

> Buenos días Sres. Empresa de Energía del Putumayo S.A. E.S.P.
>
> Cordial saludo
>
> De manera atenta se les informa que se ha rechazado en la plataforma AvanzaME, el informe del mes de mayo del contrato FAER 0651 2024, por lo siguiente:
>
> - No se cargó el Soporte SEBRA del rendimiento generado en el mes de mayo. De igual forma en el módulo de Rendimientos el valor de reintegrado así como la fecha corresponde a los rendimientos generados en el mes de abril.
> - No se cargaron los soportes SEBRAS pendientes solicitados en el pasado reporte.
> - En el Informe del OR en el numeral 2.4.2 CRONOGRAMA DE CONTRATO DE OBRA se indica que hubo una modificación en las fechas fin de algunas actividades en el cronograma de obra; no obstante, se evidencia que todas las actividades tienen como fechas fin en el año 2024. No se adjuntó el Anexo 1 del informe.
> - En el Informe de Interventoría no se indican los retrasos ocasionados por las fuertes lluvias, indicadas en el Informe del contrato de obra. Todos los documentos deben estar en concordancia

- En los Avances cualitativos, así como en los informes presentados (OR, interventoría y contratista) se indica que se realizó la instalación del transformador de 2MVA; sin embargo, en el avance de obra, esta actividad se encuentra en 0% de ejecución. Por favor aclarar.

Muchas gracias,

Claudia Patricia Garcés López

Grupo de Supervisión

Dirección de Energía Eléctrica



Claudia Patricia Garcés López


Grupo de Supervisión

Dirección de Energía Eléctrica



--
Sara Raquel Gonzalez Rodriguez.
Asistente Profesional de Gerencia
Empresa de Energía del Putumayo S.A. E.S.P.
Carrera 9 N° 8-10, Barrio el Centro
*Tel: **311-2319812***
*E mail:**asistente.gerencia@energiaputumayo.com* *Pagina Web:**www.energiaputumayo.com***

Mocoa-Putumayo-Colombia



Nota de confidencialidad: *El contenido de este mensaje puede ser información privilegiada y confidencial de Empresa de Energía del Putumayo S.A. E.S.P. Si usted no es el destinatario real del mismo, por favor informe de ello a quien lo envía y destrúyalo en forma inmediata. Está prohibida su retención, grabación, utilización o divulgación con cualquier propósito.*

Toma 5 segundos imprimir este correo, el árbol que servirá para hacer el papel tardara 7 años en crecer. Antes de imprimir, asegúrese de que es necesario. Proteger el medio ambiente está en tus manos!!!
