
Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% Ejecutado	% Programado
1		**SUMINISTRAR E INSTALAR CONOS DE VIENTO PROVISTOS DE ENERGIA SOLAR PARA AEROPUERTO FABIO ALBERTO LEON BENTLEY DE MITÚ**	**114 días**	**vie 4/07/25**	**sáb 25/10/25**	**0%**	**0%**
2		**ETAPA DOCUMENTAL**	**9 días**	**vie 4/07/25**	**sáb 12/07/25**	**0%**	**0%**
3		EXPEDICIÓN DEL RP	2 días	vie 4/07/25	sáb 5/07/25	0%	0%
4		EXPEDICIÓN DE POLIZAS	2 días	dom 6/07/25	lun 7/07/25	0%	0%
5		APROBACIÓN DE POLIZAS	2 días	mar 8/07/25	mié 9/07/25	0%	0%
6		DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR	1 día	jue 10/07/25	jue 10/07/25	0%	0%
7		ACTA DE INICIO	2 días	vie 11/07/25	sáb 12/07/25	0%	0%
8		**ETAPA DE EJECUCIÓN**	**105 días**	**dom 13/07/2**	**sáb 25/10/25**	**0%**	**0%**
9		**COMPRAS**	**53 días**	**dom 13/07/2**	**mié 3/09/25**	**0%**	
10		Orden de compra equipos	4 días	dom 13/07/2	mié 16/07/25	0%	0%
11		Fabricación	45 días	jue 17/07/25	sáb 30/08/25	0%	0%
12		Transporte al sitio	4 días	dom 31/08/2	mié 3/09/25	0%	0%
13		**OBRAS CIVILES (CORONA Y BASES)**	25 días	jue 4/09/25	dom 28/09/25	0%	0%
14		**INSTALACIÓN**	**20 días**	**lun 29/09/25**	**sáb 18/10/25**	**0%**	**0%**
15		Suministro de indicador de viento iluminado y sistema fotovoltaico	5 días	lun 29/09/25	vie 3/10/25	0%	
16		Instalación de indicador de viento iluminado y sistema fotovoltaico	15 días	sáb 4/10/25	sáb 18/10/25	0%	
17		**PRUEBAS**	5 días	dom 19/10/2	jue 23/10/25	0%	0%
18		**ENTREGA FINAL**	2 días	vie 24/10/25	sáb 25/10/25	0%	0%

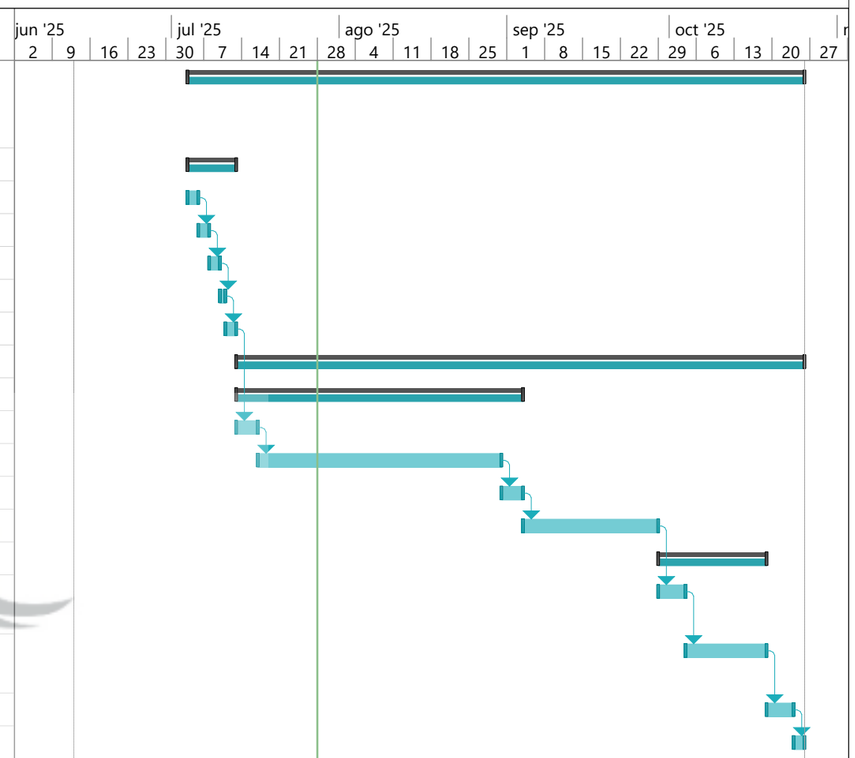

Airport skytech®
