
	MUNICIPIO DE GIRALDO					
	JUNTA DE ACCION COMUNAL MANGAR					
	CONVENIO SOLIDARIO No. 4 DE 2025					
ACTIVIDAD	Mantenimiento de obras de drenaje existentes. Incluye limpieza, desmonte vegetación, resane estructura, obras menores.					**MEMORIAS**
ITEM	1.0	**UNIDAD**	m	**FECHA :**	12/08/2025	

MEDIDA DE OBRA

DETALLE		CANTIDAD	LONGITUD (m)		TOTAL (m)
limpieza de transversales incluye posetas	K0+102	1	4.00		4.00
	K0+173	1	4.00		4.00
	K0+238	1	4.00		4.00
	K0+416	1	4.00		4.00
	K0+455	1	4.00		4.00
	K0+593	1	4.00		4.00
	K0+765	1	4.00		4.00
	K1+020	1	4.00		4.00
	K1+073	1	4.00		4.00
	K1+198	1	4.00		4.00
	K1+323	1	4.00		4.00
	K1+529	1	4.00		4.00
	K1+674	1	4.00		4.00
	K1+761	1	4.00		4.00
	K1+825	1	4.00		4.00
	K1+868	1	4.00		4.00
abscisado en direccion giraldo - manglar					
CANTIDAD TOTAL A COBRAR					**64.00**





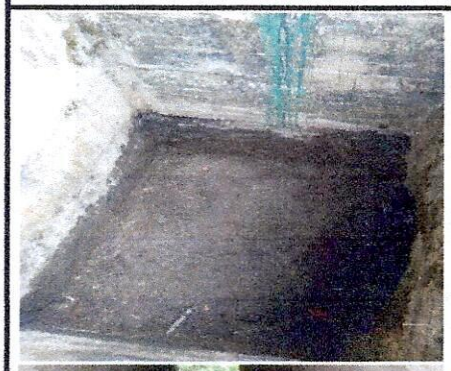



Luis Horacio Usuga C
LUIS HORACIO USUGA CAMPO


SAMUEL BARRERA CABALLERO


	MUNICIPIO DE GIRALDO					
	JUNTA DE ACCION COMUNAL MANGAR					
	CONVENIO SOLIDARIO No. 4 DE 2025					
ACTIVIDAD	Roceria y limpieza de zonas verdes existentes con una altura hasta 2 m. Incluye corte y desenraice de setos existentes, cargue, retiro y transporte de material vegetal resultante.					MEMORIAS
ITEM	2.0	UNIDAD	m	FECHA :	12/08/2025	

MEDIDA DE OBRA

DETALLE		CANTIDAD	LONGITUD (m)		TOTAL (m)
Roceria en via giraldo-Manglar en ambos costados a una altura o ancho de hasta 2m		2	2,500.00		5,000.00
CANTIDAD TOTAL A COBRAR					5,000.00

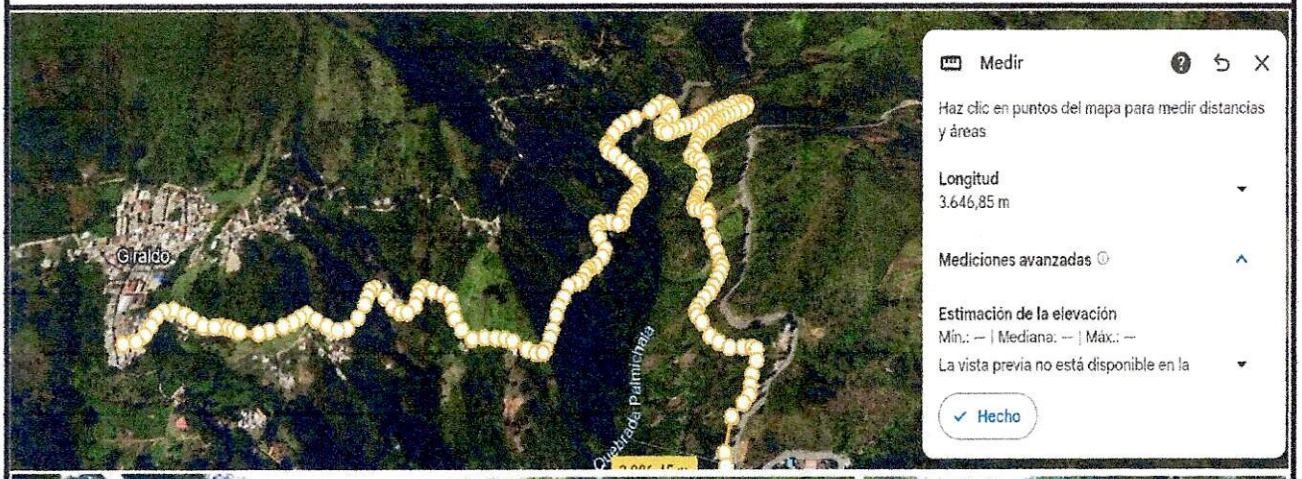

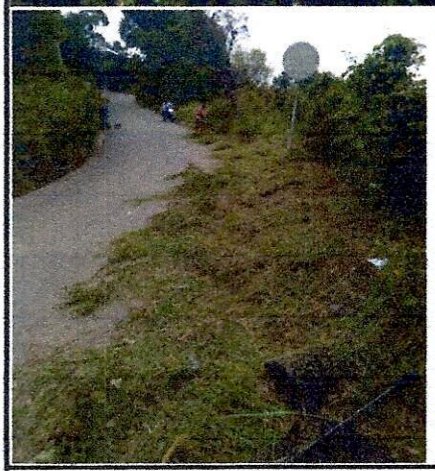

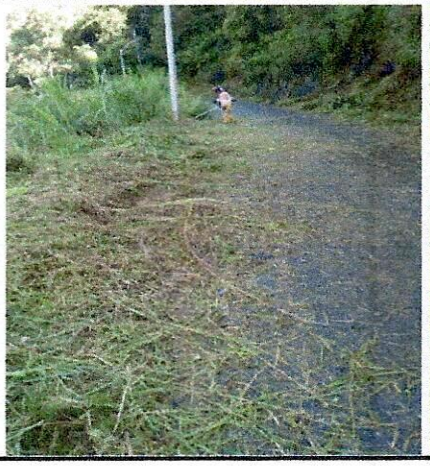




luis Horacio usuga c
CONTRATISTA
LUIS HORACIO USUGA CAMPO




DIRECTOR INTERVENTORIA
SAMUEL BARRERA CABALLERO

	MUNICIPIO DE GIRALDO					
	JUNTA DE ACCION COMUNAL MANGAR					
	CONVENIO SOLIDARIO No. 4 DE 2025					
ACTIVIDAD	Remocion de derrumbes					MEMORIAS
ITEM	3.0	UNIDAD	m3	FECHA :	12/08/2025	

MEDIDA DE OBRA

DETALLE		CANTIDAD m3	LONGITUD (m)		TOTAL m3
Derrumbes en via	k2+806	21			21.00
Derrumbes en via	k3+000	14			14.00
Derrumbes en via	k3+549	35			35.00
abscisado en dirección giraldo - manglar					
CANTIDAD TOTAL A COBRAR					70.00

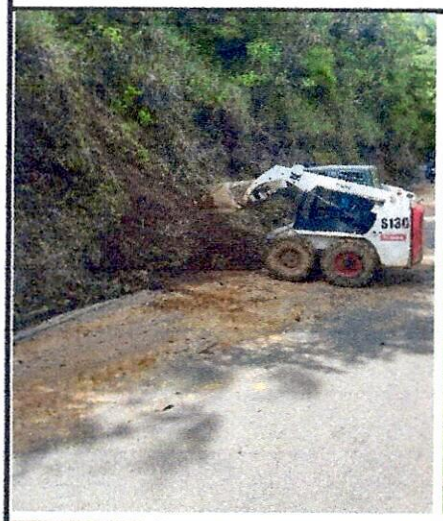

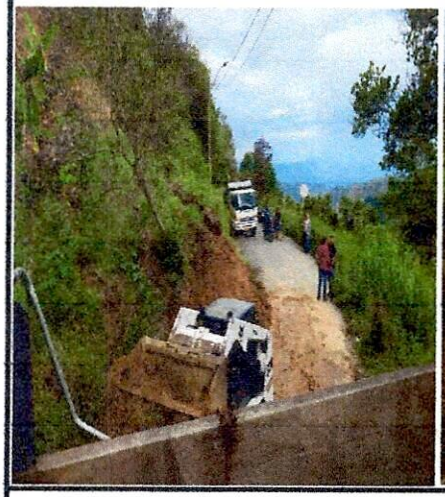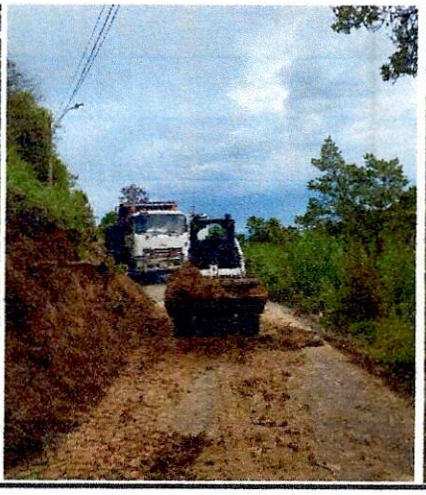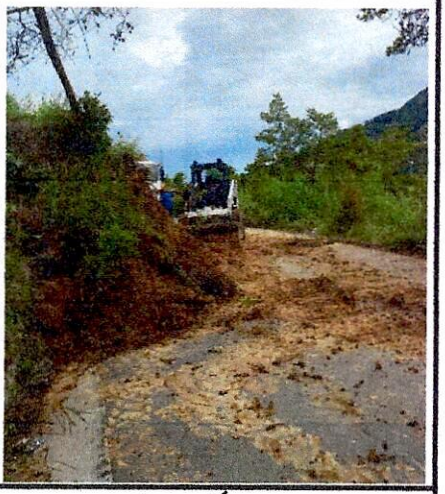
Luis Horacio Usuga C
CONTRATISTA
LUIS HORACIO USUGA CAMPO

DIRECTOR INTERVENTORIA
SAMUEL BARRERA CABALLERO


	MUNICIPIO DE GIRALDO					
	JUNTA DE ACCION COMUNAL MANGAR					
	CONVENIO SOLIDARIO No. 4 DE 2025					
ACTIVIDAD	Limpieza en cunetas de sedimentos					MEMORIAS
ITEM	4.0	UNIDAD	m	FECHA :	12/08/2025	


MEDIDA DE OBRA

DETALLE	INICIAL	FINAL	LONGITUD (m)		TOTAL (m)
abcisado en direción giraldo- manglar	K2+102	K3+646	1,544.00		1,544.00
CANTIDAD TOTAL A COBRAR					**1,544.00**

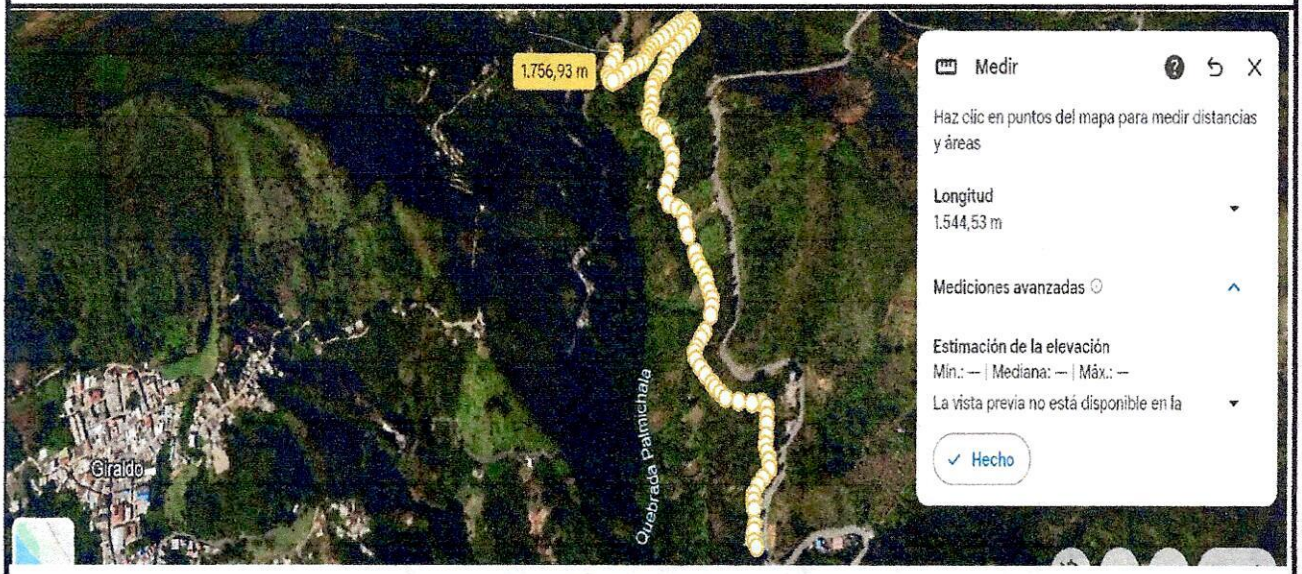



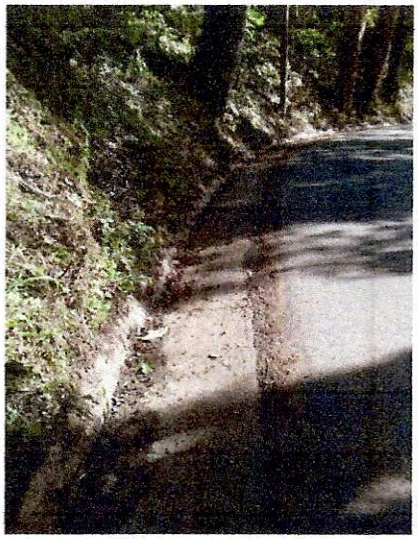

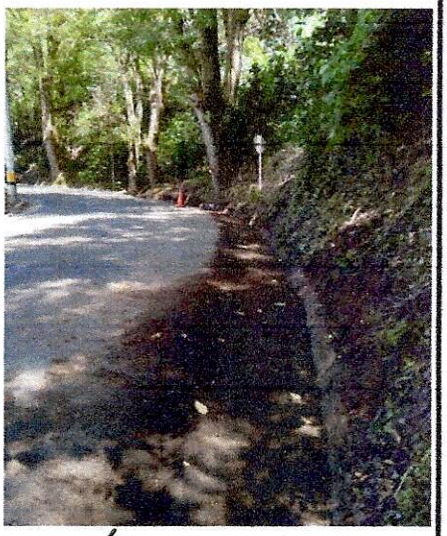

Luis Horacio Usuga C
CONTRATISTA
LUIS HORACIO USUGA CAMPO

DIRECTOR INTERVENTORIA
SAMUEL BARRERA CABALLERO
