ALCALDÍA DE MEDELLÍN

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

INFORME SEMANAL EJECUTIVO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025

Alcaldía de Medellín

OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE CONDUCTO ENTERRADO EN LA CALLE 14A CON CARRERA 138 SOBRE LA QUEBRADA LA BUGA, CORREGIMIENTO DE ALTAVISTA	INFORME No. 3

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1	29/04/2025 - Foto enviada por la comunidad derrumbe No. 2 el cual causo el cierre de la via



FOTO 2	29/04/2025- Foto enviada por la comunidad derrumbe No. 1 el cual causo el cierre de la via - este es de mayor volumen.



FOTO 3	30/04/2025 - Vista del canal con sedimento y material de arrastre



FOTO 4	30/04/2025- Foto enviada por la comunidad derrumbe No. 3 el cual causo el cierre de la via - reversadero de buses en buga



FOTO 5	01/05/2025 - Comunidad realizando limpieza de los tanques afectados en el derrumbe No. 1 - foto suministrada por la communidad



FOTO 6	29/04/2025- Foto enviada por la comunidad derrumbe No. 1 el cual causo el cierre de la via - este es de mayor volumen.



FOTO 7	29/04/2025 - recorte de titular del periodico digital



FOTO 8	29/04/2025 - recorte de titular del periodico digital

OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE CONDUCTO ENTERRADO EN LA CALLE 14A CON CARRERA 138 SOBRE LA QUEBRADA LA BUGA, CORREGIMIENTO DE ALTAVISTA	**INFORME No.** 3

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 9	06/05/2025 - Material sacado del canal, producto de la creciente



FOTO 10	08/05/2025- xona del derrumbe No. 2. la via continua cerrada.



FOTO 11	08/05/2025 - zona del derrumbe No 3. reversadero



FOTO 12	08/05/2025- Vista Material sacado del canal, producto de la creciente



FOTO 13	08/05/2025 - Vista del canal en limpieza



FOTO 14	08/05/2025- Canal afectado por las lluvias



FOTO 15	12/05/2025 - Cargue y retiro de material



FOTO 16	14/05/2025 - Amarre de Acero en muros

OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE CONDUCTO ENTERRADO EN LA CALLE 14A CON CARRERA 138 SOBRE LA QUEBRADA LA BUGA, CORREGIMIENTO DE ALTAVISTA	**INFORME No.** 3

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 17	14/05/2025 - Material sacado del canal, producto de la creciente



FOTO 18	13/05/2025- Fundida de losa inferior con concreto de 4500 psi



FOTO 19	15/05/2025 - Comité de convivencia Ciudadana



FOTO 20	15/05/2025- obreros empacando el material de excavacion en costales para mejor manejo



FOTO 21	13/05/2025 - Fundida de losa inferior con concreto de 4500



FOTO 22	13/05/2025- Bomba propulsora del concreto.



FOTO 23	12/05/2025 - Vista de canal limpio



FOTO 24	23/05/2025 - cargue de material para evacuacion

OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE CONDUCTO ENTERRADO EN LA CALLE 14A CON CARRERA 138 SOBRE LA QUEBRADA LA BUGA, CORREGIMIENTO DE ALTAVISTA	**INFORME No.** 3

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 25	22/05/2025 - Material sacado del canal, producto de la creciente



FOTO 26	22/05/2025- Retiro de material



FOTO 27	22/05/2025 - Limpieza y extraccion de material



FOTO 28	15/05/2025- obreros empacando el material de excavacion en costales para mejor manejo



FOTO 29	21/05/2025 - Formaleteado de muros parte superior del canal



FOTO 30	22/05/2025 Inicio de formaleteado



FOTO 31	24/05/2025 - Vista de canal en limpieza



FOTO 32	23/05/2025 - Limpieza de Acero en muros

OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE CONDUCTO ENTERRADO EN LA CALLE 14A CON CARRERA 138 SOBRE LA QUEBRADA LA BUGA, CORREGIMIENTO DE ALTAVISTA	**INFORME No.** 3

REGISTRO FOTOGRÁFICO

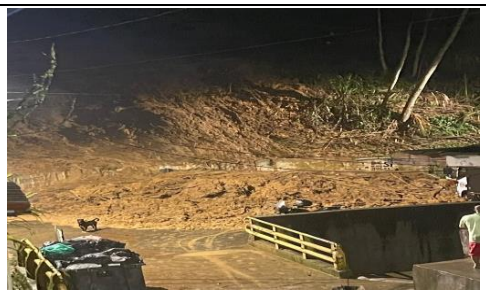


FOTO 33	19/05/2025 - foto suministrada por la comunidad - abalancha en zona del reversadero.



FOTO 34	19/05/2025 - Limpieza de sedimento - personal usando tapaboca



FOTO 35	20/05/2025 - subienda de quebrada por lluvias en la zona



FOTO 36	28/05/2025- fundida en concreto de 4000 psi en muros ambos costados



FOTO 37	28/05/2025- fundida en concreto de 4000 psi en muros ambos costados



FOTO 38	28/05/2025- fundida en concreto de 4000 psi en muros ambos costados



FOTO 39	29/05/2025 - desencofrado de muros



FOTO 40	20/05/2025 - subienda de quebrada por lluvias en la zona

OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE CONDUCTO ENTERRADO EN LA CALLE 14A CON CARRERA 138 SOBRE LA QUEBRADA LA BUGA, CORREGIMIENTO DE ALTAVISTA	**INFORME No.** 3

REGISTRO FOTOGRÁFICO

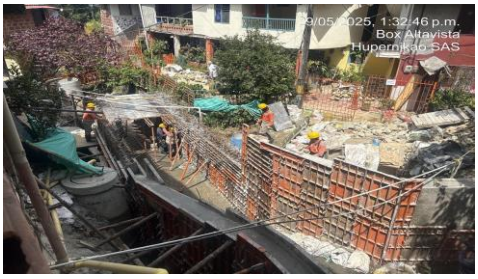


FOTO 41	29/05/2025 - desencofrado de muros



FOTO 42	30/05/2025- Cargue y retiro de material



FOTO 43	27/05/2025 - formaleteado de muros



FOTO 44	31/05/2025 - armado de acero y mesa para losa superior box



FOTO 45	31/05/2025 - armado de acero y mesa para losa superior box



FOTO 46	31/05/2025 - armado de acero y mesa para losa superior box



FOTO 47	26/05/2025 - Limpieza de acero en muros



FOTO 48	27/05/2025- Formaleteado de muros

ALCALDIA DE MEDELLIN
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

INFORME SEMANAL EJECUTIVO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025

Alcaldía de Medellín

OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE CONDUCTO ENTERRADO EN LA CALLE 14A CON CARRERA 138 SOBRE LA QUEBRADA LA BUGA, CORREGIMIENTO DE ALTAVISTA	**INFORME No.** 3

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 49	27/05/2025 - Formaleteado de muros



FOTO 50	26/05/2025 Retiro y limpieza de mateial RCD

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ALBERTO TEJERA HIGGINS
HUPERNIKAO S.A.S
