MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

SUBDIRECCIÓN DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS

TERRITORIAL NARIÑO

INFORME MENSUAL No. 08

PERÍODO: 01 al 30 de abril de 2025

CONTRATO No. 1982 DE 2024

CARRETERAS:

CÓDIGO 1003 VÍA PASTO-LA PISCICULTURA-EL PEPINO SECTOR PASTO-LA PISCICULTURA PR005+0000-PR033+0000

CÓDIGO 2501A VÍA PASTO-BUESACO-MOJARRAS SECTOR PASTO-BUESACO-HIGUERONES PR002+0000-PR102+0000

CÓDIGO 25NRB VÍA VARIANTE DAZA SECTOR VARIANTE DAZA PR000+0000-PR003+0599

ADMINISTRADOR VIAL:

CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024 - LOTE 5 GRUPO AMV No. 5

SUPERVISOR TÉCNICO:

DIEGO PAUL MARTÍNEZ ERASO

TABLA DE CONTENIDO

Pág.

1. Objetivos 4
1.1 General 4
1.2 Específicos 4
2 . Información general del contrato 5
3 . VÍAS A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 5 6
4 . actividades ejecutadas en el período: 7
4.1 INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO: CTA CALIBIO, LA GRAN VÍA, EL PRADO Y EL ENCANO. 7
4.2 RELACIÓN DE OTROS CONTRATOS 10
4.2.1 EJECUCIÓN DEL CONTRATO 4143 DEL 2024 EN EL PERIODO 11
4.3 ATENCIÓN A EMERGENCIAS 13
4.4 REPORTE DE INVASIONES EN EL PERÍODO 14
4.5 RECORRIDOS DEL PERSONAL DE LA AMVG5 POR LAS VÍAS A CARGO EN EL PERIODO. 15
4.6 RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LA AMVG5: ÁREA TÉCNICA Y SST. 16
4.6.1 RESIDENTE DE ADMINISTRACIÓN VIAL FRANCISCO ERAZO – ÁREA TÉCNICA. 16
4.6.2 AUXILIAR I DE ADMINISTRACIÓN VIAL MIGUEL LÓPEZ -ÁREA TÉCNICA 17

4.6.3 AUXILIAR II DE ADMINISTRACIÓN VIAL DANIEL COLLAZOS – ÁREA TÉCNICA 18

4.6.4 PROFESIONAL SST DE ADMINISTRACIÓN VIAL – ÁREA SST 18

5 correspondencia enviada y recibida 19

5.1 CORRESPONDENCIA ENVIADA: 19

5.2 CORRESPONDENCIA RECIBIDA: 24

6 ACTAS DE PAGO PARCIALES, ACUMULADOS Y SALDOS POR EJECUTAR. 29

7 . Conclusiones 30

ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO 32

1. OBJETIVOS

Se presenta un objetivo general y varios específicos.

1.1 General

Documentar de forma clara y concisa las actividades, procedimientos e incidencias relacionadas con la ejecución del contrato No. 1982 de 2024, cuyo objeto es la "Administración vial de las carreteras nacionales a cargo de la Dirección Territorial Nariño, Grupo AMV 5 Lote 5", durante el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de abril de 2025.

1.2 Específicos

- Presentar un registro fotográfico que evidencie las actividades realizadas por los profesionales de la administración vial, tanto en campo como en oficina, en cumplimiento de los objetivos contractuales establecidos por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS).

- Resumir de forma estructurada las actividades ejecutadas por el CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024, organizadas por capítulos y subcapítulos según la metodología establecida.

- Exponer las conclusiones y recomendaciones derivadas de la gestión realizada durante el periodo del 1 al 30 de abril de 2025.


2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Información general del contrato:

Número de contrato	1982 de 2024
Objeto	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, GRUPO AMV 5 LOTE 5.
Empresa ejecutora	CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024 NIT: 901838183
Consorciados y porcentaje de participación.	CAMINOS SAS NIT 822003009-1 - participación del 70% INPROTEKTO LIMITADA NIT 800032486-5 - participación del 30%
Representante Legal empresa ejecutora	Samuel Fernando Homez López cc 93356517 de Ibagué
Duración del contrato	29 meses
Plazo	Hasta el 31 de julio de 2026
Valor inicial incluido IVA	$ 4,050,198,082.00
Supervisor	Diego Paul Martínez Eraso.
Fecha de orden de inicio	12 de septiembre de 2024
Fecha de terminación	31 de julio de 2026

3. VÍAS A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 5



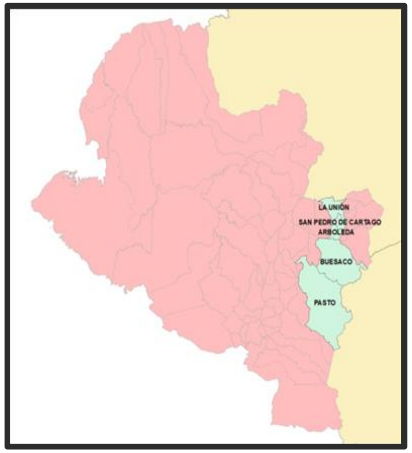

Localización de Nariño en Colombia (arriba)
Ubicación de municipios de influencia del proyecto (abajo)



Vías a cargo de la AMVG5 y algunos puntos de referencia y/o interés como centros poblados y/o municipios del área de influencia.

4. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO:

En el periodo del actual informe se realizaron actividades como interventoría a Contratos de Mantenimiento Rutinario, los cuales son ejecutados por cooperativas de trabajo asociado (CTA de ahora en adelante), ejecución de contrato de mezcla asfáltica con mano de obra de CTA, seguimiento a atención de emergencias atendidas por contrato 4121 de 2024 y atención de emergencias con CTA, reporte de invasiones, relación de fechas y rutas para recorridos diarios por parte del grupo de profesionales de la AMVNG5, y actividades específicas de cada profesional como se muestra a continuación:

4.1 INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO: CTA CALIBIO, LA GRAN VÍA, EL PRADO Y EL ENCANO.

Se relaciona un cuadro con los contratos de las cooperativas a las cuales se les hace interventoría:

CONTRATO No.	CONTRATISTA	OBJETO	FECHA DE ORDEN DE INICIO
3711 DE 2024	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA GRAN VÍA	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO Á LOS SECTORES 25NRB VARIANTE DE DAZA, PR 0+0000 - PR 3+0599/ 2501A PASTO - BUESACO - HIGUERONES, PR 2+0000 (PASTO) - PR38+0860 (BUESACO)"	7 DE OCTUBRE DE 2024

CONTRATO No.	CONTRATISTA	OBJETO	FECHA DE ORDEN DE INICIO
3665 DE 2024	COOPERATIVA COMUNITARIA DE SERVICIOS Y DE TRABAJO ASOCIADO DE CALIBIO	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO SECTORES 2501A PASTO - BUESACO - HIGUERONES, PR 38+0700 (BUESACO) - PR 70+0000 (MARTÍN)"	15 DE OCTUBRE DE 2024
3695 DE 2024	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL PRADO	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO EN LOS SECTORES 2501A PASTO - BUESACO - HIGUERONES, PR 70+0000 (MARTÍN) - PR 102+0000 (HIGUERONES)"	7 DE OCTUBRE DE 2024
3742 DE 2024.	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO INTEGRACIÓN EL ENCANO	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO SECTORES 1003 PASTO - LA PISCICULTURA, PR5+0000 - PR 33+0000"	8 DE OCTUBRE DE 2024

Entre las actividades desarrolladas en el corredor a cargo por parte de las CTA, para el periodo del actual informe en Las rutas 2501A, 1003 y 25NRB se enlistan las siguientes:

- Rocería.
- Poda de árboles y vegetación para despeje de señales verticales.
- Limpieza de cunetas.
- Limpieza de tubería de alcantarillas
- Limpieza de encoles y descoles de alcantarillas y box culvert.
- Limpieza de bordillos.
- Limpieza y enderezar señales verticales.
- Limpieza de defensas metálicas.
- Reporte de atropellamiento a fauna.
- Jornadas de tapahuecos con tierra.
- Despeje de derrumbes con herramienta menor.
- Limpieza de calzada: despeje de obstáculos, basuras y rocas para circulación vehicular en condiciones de comodidad y seguridad.
- Asistencia y participación en capacitación mensual orientada por AMVG5.
- Atención de emergencias.
- Reporte a grupo de WhatsApp de la AMVG5 “COOPERATIVAS NARIÑO G5”, de recorrido diario en la mañana y en la tarde, así como de las emergencias evidenciadas, de los respectivos tramos asignados de vía, todo ello dentro de la delimitación contractual de cada CTA.
- Corte de pavimento en sitios donde se aplicará la mezcla asfáltica e instalación de esta.
- Sello de fisuras en sitios críticos con emulsión asfáltica y arena.
- Ejecución de obras menores con recursos de insumos y mano de obra de CTA (trinchos)
- Mano de obra en la ejecución de instalación de estoperoles.

- Señalización y refuerzo de señalización de sitios críticos.
- Apoyo con control de tráfico en diferentes momentos dependiendo de la actividad que se desarrolle.
- Monitoreo de avance de falla con niveletas instaladas en talud en movimiento latente.
- Cierre de la vía atendiendo a resolución resolución 00221 del 04/feb/2025 “cierre preventivo desde las 18:00 hasta las 6:00 am del día siguiente”.
- Informar sobre protestas y manifestaciones sociales por vía de hecho en las vías a cargo.
- Acompañamiento a profesionales de AMVG5 a visitas para dar respuesta a derechos de petición.

Los tramos y los rendimientos se encuentran en el informe de indicadores para cada cooperativa, la programación semanal se revisa y aprueba todos los lunes por parte de la AMVG5.

4.2 RELACIÓN DE OTROS CONTRATOS

La administración vial tiene relación con otros 3 contratos: en ellos se realiza apoyo a la interventoría y en el contrato de suministro de mezcla se ejecuta con mano de obra de las CTA, como se muestra a continuación:

CONTRATO No.	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	OBJETO	COMENTARIO
No. 2019 DE 2024 (contrato Monto agotable)	CARLOS ALBERTO TORRES MONTERO	CARLOS ALBERTO TORRES MONTERO	HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO	El día 17 de septiembre de 2024 mediante comunicado 20254S-VNAR-066038 de la Dirección Territorial Nariño se asigna la Interventoría del Contrato de Monto Agotable No. 2019-2024 a la Administración Vial Grupo 5.
No. 3409 del 2024 (Contrato Señalización Paso Urbano Buesaco)	Roca ingeniería y maquinaria S.A.S NIT: 901007553	RICHARD CASTRO	OBRAS DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL (RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD Y SEÑALES VERTICALES) VÍA 2501A PASTO - BUESACO - MOJARRAS. DEPARTAMENTO DE NARIÑO	Asignación de interventoría a AMVG5 mediante memorando 2024S-VNAR-088406 firmado por directora territorial INVIAS NARIÑO.
No. 4143 del 2024	R&R proyectos de ingeniería SAS	RAFAEL EDUARDO RODRÍGUEZ ULLOA	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO VÍAS 2501A PASTO - BUESACO - HIGUERONES PR. 13+0200 – PR. 36+0000 y PR43+0000 - PR99+0600 Y VÍAS 1003 PASTO – EL PEPINO SECTOR PASTO - LA PISCICULTURA PR. 5+0000 – PR. 33+0000 A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE NARIÑO.,	Instalación de la mezcla con recursos de la AMVG5 y con mano de obra de las CTA según corresponda, en donde se realice la intervención.

4.2.1 EJECUCIÓN DEL CONTRATO 4143 DEL 2024 EN EL PERIODO

En el periodo del actual informe se instaló la mezcla asfáltica en el marco de la ejecución del contrato 4143 de 2024, cuyo contratista es R&R Proyectos de Ingeniería y quienes se encargan del suministro de la mezcla: la

administración vial organiza/coordina las labores, y la CTA hace la instalación de la mezcla (mano de obra). En el mes de abril se hizo bacheo en los siguientes lugares con su respectivo volumen aproximado:

- 08 de abril de 2025

No.	RUTA	PR	ÁREA (M2)	ESPESOR (M)	VOLUMEN (M3)
1	2501A	28+0340	7,50	0,10	0,750
2	2501A	28+0410	4,80	0,10	0,480
3	2501A	33+0230	46,77	0,15	7,015
4	2501A	33+0360	12,24	0,11	1,346
TOTAL					**9,591**
TOTAL (M3) - FC (1,25)					**11,989**

- 23 de abril de 2025

No.	RUTA	PR	ÁREA (M2)	ESPESOR (M)	VOLUMEN (M3)
1	2501A	16+0480	5,64	0,08	0,451
2	2501A	16+0550	3,91	0,08	0,313
3	2501A	16+0920	0,41	0,08	0,033
4	2501A	16+0970	0,56	0,08	0,045
5	2501A	18+0450	0,45	0,08	0,036
6	2501A	18+0460	0,45	0,08	0,036
7	2501A	18+0480	0,68	0,08	0,055
8	2501A	20+0360	6,78	0,09	0,610
9	2501A	20+0820	34,02	0,09	3,062
10	2501A	22+0060	0,89	0,08	0,071
11	2501A	22+0440	0,41	0,09	0,036
12	2501A	24+0040	49,49	0,09	4,454
13	2501A	26+0530	3,94	0,08	0,316
14	2501A	27+0845	1,98	0,08	0,158
15	2501A	34+0700	7,18	0.10	0.718
TOTAL					**10.394**
TOTAL (M3) - FC (1,25)					**12.992**

4.3 ATENCIÓN A EMERGENCIAS

En el periodo del 01 al 30 abril de 2025 se presentaron las emergencias que se resumen a continuación:

FECHA DEL EVENTO	COD VÍA	UBICACIÓN (PR)	TIPO DE EVENTO
1/04/2025	2501A	33+0400	Deslizamiento de suelo y material rocoso de mediana magnitud que generó el cierre del carril derecho sobre de la vía. Se realizaron labores de remoción con contrato 4121 de 2024.
2/04/2025	2501A	13+0250	Deslizamiento de material vegetal de gran magnitud que generó el cierre del carril derecho sobre de la vía.
3/04/2025	2501A	54+0460	Deslizamiento del talud superior de mediana magnitud que generó el cierre sobre el carril izquierdo de la vía.
3/04/2025	2501A	67+0040	Deslizamiento del talud superior de mediana magnitud que generó el cierre sobre el carril izquierdo de la vía.
1/03/2025	2501A	94+0850	Deslizamiento del talud superior de mediana magnitud que generó el cierre parcial del carril derecho de la vía. Se realizaron labores de remoción con contrato 4121 de 2024.
1/03/2025	2501A	98+0050	Deslizamiento del talud superior de mediana magnitud que generó el cierre parcial del carril derecho de la vía. Se realizaron labores de remoción con contrato 4121 de 2024.
9/04/2025	2501A	79+0700	Deslizamiento del talud superior de mediana magnitud que generó el cierre parcial del carril izquierdo de la vía. Se realizan labores de remoción con contrato 4121 de 2024.
11/04/2025	2501A	66+0860	Deslizamiento del talud superior de gran magnitud que generó el cierre parcial de la vía. Se realizan labores de remoción con contrato 4121 de 2024. A la fecha se mantiene cierre preventivo desde las 18:00 hasta las 6:00 am del día siguiente, según resolución 00221 del 04/feb/2025, por este evento.

4.4 REPORTE DE INVASIONES EN EL PERÍODO

En el periodo del actual informe se identificaron las siguientes contravenciones a la Ley, radicadas mediante comunicado y fecha como se muestra en el cuadro en la parte inferior:

FECHA	CONSECUTIVO	DESTINATARIO	DEPENDENCIA	ASUNTO
10/04/2025	240-AMVNG5-CTO1982-2024	ALCALDÍA BUESACO	OSWALDO PABÓN DIAZ alcalde Municipio de Buesaco	REITERACIÓN OFICIO 168-AMVNG5-CTO1982-2024 ‘’INVASIONES POR CONSTRUCCIÓN EN PR028+0870.
16/04/2025	248-AMVNG5-CTO1982-2024	ALCALDÍA BUESACO	OSWALDO PABÓN DIAZ alcalde Municipio de Buesaco	INVASIONES AL DERECHO DE VÍA, RUTA 2501A, PASTO-BUESACO-HIGUERONES JURISDICCIÓN DE MUNICIPIO DE BUESACO – DISPOSICIÓN DE MATERIAL TIPO ESCOMBROS SOBRE MARGEN IZQUIERDO DE LA VÍA EN PR32+0990 Y PR33+0430.
16/04/2025	249-AMVNG5-CTO1982-2024	ALCALDÍA SAN PEDRO DE CARTAGO	WALTER FERNANDO RODRÍGUEZ LOPEZ alcalde Municipio de San Pedro de Cartago	REITERACIÓN OFICIO 137-AMVNG5-CTO1982-2024 y REITERACIÓN OFICIO 212-AMVNG5-CTO-1982-2024 ‘’EXPLOTACIÓN ILEGAL DE MATERIALES EN EL PR073+0810’’

FECHA	CONSECUTIVO	DESTINATARIO	DEPENDENCIA	ASUNTO
21/04/2025	255-AMVNG5-CTO1982-2024	ALCALDÍA BUESACO	OSWALDO PABÓN DIAZ alcalde Municipio de Buesaco	INVASIONES AL DERECHO DE VÍA, RUTA 2501A, PASTO-BUESACO-HIGUERONES JURISDICCIÓN DE MUNICIPIO DE BUESACO – CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA SOBRE MARGEN IZQUIERDO DE LA VÍA EN PR42+0680

4.5 RECORRIDOS DEL PERSONAL DE LA AMVG5 POR LAS VÍAS A CARGO EN EL PERIODO.

Atendiendo a las obligaciones contractuales se realizan recorridos diarios por las vías a cargo, se muestra a continuación un calendario con los días del mes de abril de 2025 y abajo el número de ruta en la que se hizo recorrido por parte de la AMVG5.

abril 2025

lu.	ma.	mi.	ju.	vi.	sá.	do.
	1 2501A	2 2501A	3 2501A	4	5	6
7 2501A	8 2501A	9 1003 2501A 25NRB	10 1003 2501A 25NRB	11 2501A	12 2501A	13
14 2501A	15 25NRB 2501A	16 2501A	17 JUEVES SANTO	18 VIERNES SANTO	19	20
21 2501A	22 2501A	23 25NRB 2501A	24 2501A	25 1003 2501A 25NRB	26	27
28	29 1003 25NRB 2501A	30 1003 25NRB 2501A				

4.6 RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LA AMVG5: ÁREA TÉCNICA Y SST.

Se presenta a continuación un breve subcapítulo para cada uno de los profesionales de la administración vial, tanto del área técnica como del área de SST, en el que se detallan las actividades desarrolladas en el marco del contrato durante el periodo correspondiente a este informe.

4.6.1 RESIDENTE DE ADMINISTRACIÓN VIAL FRANCISCO ERAZO – ÁREA TÉCNICA.

- Gestión técnica para la solución de problemas de infraestructura vial con mano de obra de CTA y recursos de insumos.
- Respuesta a derechos de petición: visitas técnicas e informes.
- Recorridos con supervisor del contrato y apoyo en recorrido con contratistas en las vías de la territorial Nariño del INVIAS.
- Recorrido con la directora Territorial INVIAS Nariño.
- Supervisión de trabajos ejecutados con recursos de insumos y mano de obra de CTA.
- Supervisión e interventoría a contratos asignados. Elaboración de informes previo levantamiento de registros fotográficos, fílmicos y datos en campo.
- Reporte diario de las condiciones de la vía en el grupo de WhatsApp RESIDENTES AMV, mañana y tarde. Así como las emergencias en su respectivo formato anexando el registro fotográfico pertinente.
- Inspección técnica a los tramos para exigir a CTA cumplimiento con indicadores: toma de evidencias y llamados de atención en grupo.
- Toma de registros fílmicos y fotográficos con el Dron de la empresa.
- Elaboración, revisión y envío de informes a la dirección territorial en cumplimiento del contrato con cliente INVIAS.

- Apertura de procesos administrativos sancionatorios contra CTA. por posibles incumplimientos a los contratos.

4.6.2 AUXILIAR I DE ADMINISTRACIÓN VIAL MIGUEL LÓPEZ -ÁREA TÉCNICA

- Apoyo en la elaboración de informes: mensual, de obras menores, de inspección y de interventoría de contratos.
- Organización de registros fotográficos diario por cooperativa en archivo de la empresa.
- Apoyo en reporte diario en grupo de RESIDENTES AMV cuando se requiere.
- Apoyo en supervisión de instalación de estoperoles en municipios de la Unión y Buesaco.
- Apoyo a auxiliar II en recolección de información de accidentalidad en campo y elaboración de informe de accidentalidad.
- Inspección técnica a los tramos para exigir a CTA cumplimiento con indicadores: toma de evidencias y llamados de atención en grupo WhatsApp “COOPERATIVAS NARIÑO G5”.
- Toma de registros fílmicos y fotográficos con el Dron de la empresa.
- Apoyo a la información del estado de emergencias viales presentadas.
- Apoyo a visitas para dar respuesta a derechos de petición.
- Recorridos para verificación de estado de sitios críticos.
- Recolección de información de magnitud de daños en contrato de reductores de velocidad en casco urbano Buesaco.
- Reporte de invasiones nuevas en el grupo de WhatsApp de la AMVG5 “solo invasiones”

4.6.3 AUXILIAR II DE ADMINISTRACIÓN VIAL DANIEL COLLAZOS – ÁREA TÉCNICA

- Seguimiento y/o control a avance a programación de actividades de cooperativas asociadas de trabajo
- Organización y archivo de registro fotográfico técnico, SST y otros, asociado a las actividades de la administración vial.
- Elaboración de oficios asociados a reiteraciones e invasiones al derecho de vía, inspecciones o visitas técnicas sobre las rutas a cargo.
- Elaboración de reporte de emergencias mensual.
- Atención a emergencias presentadas sobre rutas a cargo.
- Refuerzo de señalización en puntos críticos.
- Obtención de información técnica para elaboración de solicitudes e informes.
- Ejecución y procesamiento de información asociada a actividad de tapa huecos con mezcla asfáltica en ruta 2501A.

4.6.4 PROFESIONAL SST DE ADMINISTRACIÓN VIAL – ÁREA SST

- Visitas a las Cooperativas y socialización de charlas de seguridad en el mes de abril los siguientes temas: Ergonomía, riesgo locativo, cuidado de manos, fiebre amarilla.
- Se desarrollo inspección del uso y estado de elementos de protección personal
- Se realizó inspección a vehículos (motos y carros) con el fin de evidenciar las condiciones de estos; y prevenir accidentes de tránsito.
- Se realizó inspección de elementos de primeros auxilios: (botiquín; camilla de emergencia; extintores)
- Realización de pausas activas.

- Inspección de herramienta manual y menor en las Cooperativas basada en la herramienta mínima solicitada.
- Se realizó apoyo en las señalizaciones de algunos lugares específicos, críticos en los corredores viales y en el desarrollo de actividades que se requiera.
- Se realiza seguimiento a la ejecución y capacitación al sistema de seguridad y salud diseñado en cada cooperativa

5 CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

Se presentan dos cuadros uno para la correspondencia enviada y otro para la recibida, así:

5.1 CORRESPONDENCIA ENVIADA:

FECHA	CONSECUTIVO	DESTINATARIO	DEPENDENCIA	ASUNTO
10/04/2025	228-AMVNG5-CTO1982-2024	Cooperativa de Trabajo Asociado la Gran Vía	Maira Leonela Burbano Representante legal.	Personal AUSENTE SIN JUSTIFICACIÓN
2/04/2025	229-AMVNG5-CTO1982-2024	policía nacional dirección de tránsito y transporte la unión	POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE LA UNIÓN	Solicitud reporte de accidentalidad mes de febrero de 2025.
2/04/2025	230-AMVNG5-CTO1982-2024	inspección de policía Buesaco	Yolanda Bolaños Inspectora de Policía	Solicitud reporte de accidentalidad mes de febrero de 2025.
2/04/2025	231-AMVNG5-CTO1982-2024	inspección de policía Arboleda	José Viveros Eraso Inspector de Policía	Solicitud reporte de accidentalidad mes de febrero de 2025.
2/04/2025	232-AMVNG5-CTO1982-2024	Inspección de policía san pedro de Cartago	Gladys López Inspectora de Policía	Solicitud reporte de accidentalidad mes de febrero de 2025.

FECHA	CONSECUTIVO	DESTINATARIO	DEPENDENCIA	ASUNTO
2/04/2025	233-AMVNG5-CTO1982-2024	Policía nacional dirección de tránsito y transporte la unión	POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE LA UNIÓN	Solicitud reporte de accidentalidad mes de febrero de 2025.
2/04/2025	234-AMVNG5-CTO1982-2024	inspector de policía Florencia Cauca	Deivy Antony Solarte Araujo Inspector de Policía	Solicitud reporte de accidentalidad mes de febrero de 2025.
2/04/2025	235-AMVNG5-CTO1982-2024	Cooperativa De Trabajo Asociado Calibio	José Tito Chaguendo Quilindo Representante legal.	Alcance a correspondencia “personal ausente sin justificación”.
2/04/2025	236-AMVNG5-CTO1982-2024	INVIAS	Dirección territorial Nariño directora María del Pilar Cerón	Solicitud autorización compra de barricadas naranjas para señalización
2/04/2025	237-AMVNG5-CTO1982-2024	Cooperativa De Trabajo Asociado La Gran Vía	Maira Leonela Burbano Representante legal.	Solicitud de elementos de protección personal.
2/04/2025	238-AMVNG5-CTO1982-2024	Cooperativa De Trabajo Asociado Calibio	José Tito Chaguendo Quilindo Representante legal.	Contrato número 3665 de 2024; solicitud de vehículo adecuado para cargue de herramienta y elementos para trabajo seguro
7/04/2025	239-AMVNG5-CTO1982-2024	INVIAS	Dirección territorial Nariño directora María del Pilar Cerón	Respuesta correspondencia “solicitud de intervención urgente”. Pr44+0500.
10/04/2025	240-AMVNG5-CTO1982-2024	Alcaldía Municipal Buesaco Acuabuesaco	Oswaldo Pabón Diaz alcalde Municipal Buesaco	Reiteración oficio 168-AMVNG5-CTO1982-2024 ‘’invasiones por construcción en pr028+0870’’.

FECHA	CONSECUTIVO	DESTINATARIO	DEPENDENCIA	ASUNTO
10/04/2025	241-AMVNG5-CTO1982-2024	Cooperativa De Trabajo Asociado La Gran Vía	Maira Leonela Burbano Representante legal.	Personal ausente sin justificación
11/04/2025	242-AMVNG5-CTO1982-2024	Cooperativa De Trabajo Asociado El Prado	Milton Fabian Gómez Tulande Representante legal.	Solicitud de elementos de protección personal
11/04/2025	243-AMVNG5-CTO1982-2024	Cooperativa De Trabajo Asociado Calibio	José Tito Chaguendo Quilindo Representante legal.	Contrato número 3665 de 2024; solicitud reparación y mantenimiento de guadañas
12/04/2025	244-AMVNG5-CTO1982-2024	INVIAS	Dirección territorial Nariño directora María del Pilar Cerón	Respuesta solicitud urgente policía nacional del municipio la unión, acciones realizadas por la administración vial grupo 5 para disposición de señalización por cierre total preventivo, según comunicado de prensa y resolución 00221 de 04 de febrero de 2025
14/04/2025	246-AMVNG5-CTO1982-2024	Cooperativa De Trabajo Asociado Calibio	José Tito Chaguendo Quilindo Representante legal.	Respuesta “personal ausente sin justificación” contrato número 3665 de 2024
14/04/2025	247-AMVNG5-CTO1982-2024	Personería Municipal San Pedro De Cartago	Personería Municipal San Pedro de Cartago Sandra Narváez	Respuesta personería municipal, municipio de San Pedro De Cartago

FECHA	CONSECUTIVO	DESTINATARIO	DEPENDENCIA	ASUNTO
16/04/2025	248-AMVNG5-CTO1982-2024	Alcaldía Municipal Buesaco	Oswaldo Pabón Diaz alcalde Municipal Buesaco	Invasiones al derecho de vía, ruta 2501a, pasto-Buesaco-higuerones jurisdicción de municipio de Buesaco – disposición de material tipo escombros sobre margen izquierdo de la vía en pr32+0990 y pr33+0430
16/04/2025	249-AMVNG5-CTO1982-2024	Alcaldía Municipal San Pedro De Cartago	WALTER FERNANDO RODRÍGUEZ LOPEZ alcalde Municipal San Pedro de Cartago	Reiteración oficio 212-amvng5-cto1982-2024 ‘’reiteración explotación ilegal de materiales en el pr073+0810’’
16/04/2025	250-AMVNG5-CTO1982-2024	Corporación Autónoma Regional De Nariño	Pablo Roberto Pérez Andrade subdirector de conocimiento y evaluación ambiental	Caída de árboles de eucalipto ruta nacional 2501a pasto – Buesaco – higuerones pr34+0120
16/04/2025	251-AMVNG5-CTO1982-2024	INVIAS	Dirección territorial Nariño directora María del Pilar Cerón	Informe deslizamiento pr66+0850, ruta 2501a pasto – Buesaco - Higuerones.
16/04/2025	252-AMVNG5-CTO1982-2024	INVIAS	Dirección territorial Nariño directora María del Pilar Cerón	Entrega de informe trimestral periodo enero a marzo de 2025
21/04/2025	253-AMVNG5-CTO1982-2024	alcaldía municipal arboleda	Mari luz Cristina Delgado Gaviria alcaldesa Municipal Arboleda	Respuesta alcaldía municipal, municipio de arboleda
21/04/2025	254-AMVNG5-CTO1982-2024	INVIAS	Dirección territorial Nariño directora María del Pilar Cerón	Entrega de informe punto crítico ruta 1003, pasto la

FECHA	CONSECUTIVO	DESTINATARIO	DEPENDENCIA	ASUNTO
				piscicultura, pr29+0620
21/04/2025	255-AMVNG5-CTO1982-2024	alcaldía municipal Buesaco	Oswaldo Pabón Diaz alcalde Municipal Buesaco	Invasiones al derecho de vía, ruta 2501a, pasto-Buesaco-higuerones jurisdicción de municipio de Buesaco – construcción de tanque de almacenamiento de agua sobre margen izquierdo de la vía en pr42+0680
21/04/2025	256-AMVNG5-CTO1982-2024	alcaldía municipal Buesaco	Jhonny Alexander Mesa Timaran secretario de infraestructura Municipal Buesaco	Respuesta deslizamientos sobre la vía nacional. Cañón de Juanambú (coordenadas: 1°26'41"n, 77°08'41"w), higuerones (coordenadas: 1°43'32"n, 77°14'76"w).
21/04/2025	257-AMVNG5-CTO1982-2024	alcaldía municipal Buesaco	Jhonny Alexander Mesa Timaran secretario de infraestructura Municipal Buesaco	Respuesta libre circulación en la vía “Buesaco – pasto
22/04/2025	259-AMVNG5-CTO1982-2024	INVIAS	Oficina jurídica	Informe de invasiones zona uso de vía nacional de los meses de febrero y marzo de 2025

FECHA	CONSECUTIVO	DESTINATARIO	DEPENDENCIA	ASUNTO
25/04/2025	260-AMVNG5-CTO1982-2024	INVIAS	Dirección territorial Nariño directora María del Pilar Cerón	Entrega de informe daños en resaltos ruta 2501a, pasto – Buesaco – higuerones. Contrato 3409 - 2024
25/04/2025	261-AMVNG5-CTO1982-2024	cooperativa de trabajo asociado Calibio	José Tito Chaguendo Quilindo Representante legal.	Alcance a correspondencia “personal ausente sin justificación”.
28/04/2025	262-AMVNG5-CTO1982-2024	EMLAUNION	Sindy Dueñas jefe de Talento Humano.	Respuesta expediente no. 2025-001.
30/04/2025	263-AMVNG5-CTO1982-2024	invias	Dirección territorial Nariño directora María del Pilar Cerón	Entrega de informe construcción de obra menor pr34+0120

5.2 CORRESPONDENCIA RECIBIDA:

Número	Fecha de Recibido en correo	ENVIADO POR	Asunto tratado	RESPONSABLE Y DEPENDENCIA
	1/04/2025	INVIAS	Aprobación costo por viáticos al ingeniero residente AMVG5	DIEGO PAUL MARTÍNEZ ERASO SUPERVISOR INVIAS
2025I-VBOG-019114	1/04/2025	INVIAS	Cierre de toma de información para SIGPAV	SIRLEY DABEIBA MERCHÁN CARREÑO SUBDIRECTORA DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Número	Fecha de Recibido en correo	ENVIADO POR	Asunto tratado	RESPONSABLE Y DEPENDENCIA
	2/04/2025	SEGUNDO ALFONSO SANTACRUZ SANTACRUZ	Derecho de petición sobre adecuación de alcantarilla en el PR33+940	HABITANTE DE LA COMUNIDAD
2025I-VBOG-019114	3/04/2025	INVIAS	Aprobación solicitud de compra de barricadas para señalización	DIEGO PAUL MARTÍNEZ ERASO SUPERVISOR INVIAS
140.19-42	8/04/2025	ALCALDÍA MUNICIPAL DE BUESACO	Visita derecho de petición	BAYRON ASDRUBAL ARGOTTY MONCAYO SECRETARIO DE PLANEACIÓN
140.09.01_456	8/04/2025	ALCALDÍA MUNICIPAL DE BUESACO	Punto crítico del 35+0300.	BAYRON ASDRUBAL ARGOTTY MONCAYO SECRETARIO DE PLANEACIÓN
140.09.01_457	8/04/2025	ALCALDÍA MUNICIPAL DE BUESACO	Respuesta a requerimiento INVASIONES PR028+0870.	BAYRON ASDRUBAL ARGOTTY MONCAYO SECRETARIO DE PLANEACIÓN
SUTRA-SETRA - 3.1	8/04/2025	POLICÍA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE NARIÑO	Reporte de accidentalidad	VÍCTOR ALFONSO CIFUENTES INTENDENTE SECCIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DENAR

Número	Fecha de Recibido en correo	ENVIADO POR	Asunto tratado	RESPONSABLE Y DEPENDENCIA
1042.3 00 02 2025	8/04/2025	ALCALDÍA MUNICIPAL DE PASTO	solicitud visita técnica alcantarilla PR11	ADRIANA MILENA RUALES ORDOÑEZ jefe de CORREGIDURÍA DE LA LAGUNA
140.09.01_462	9/04/2025	ALCALDÍA MUNICIPAL DE BUESACO	Respuesta a requerimiento de AMVNG5.	BAYRON ASDRUBAL ARGOTTY MONCAYO SECRETARIO DE PLANEACIÓN
140.09.01_463	9/04/2025	ALCALDÍA MUNICIPAL DE BUESACO	Respuesta a requerimiento de AMVNG5.	BAYRON ASDRUBAL ARGOTTY MONCAYO SECRETARIO DE PLANEACIÓN
140.09.01_464	9/04/2025	ALCALDÍA MUNICIPAL DE BUESACO	Respuesta a requerimiento de AMVNG5.	BAYRON ASDRUBAL ARGOTTY MONCAYO SECRETARIO DE PLANEACIÓN
140.09.01_461	9/04/2025	ALCALDÍA MUNICIPAL DE BUESACO	Respuesta a requerimiento de AMVNG5.	BAYRON ASDRUBAL ARGOTTY MONCAYO SECRETARIO DE PLANEACIÓN
140.09.01_465	10/04/2025	ALCALDÍA MUNICIPAL DE BUESACO	Respuesta a requerimiento de AMVNG5.	BAYRON ASDRUBAL ARGOTTY MONCAYO SECRETARIO DE PLANEACIÓN
160.09.01_No. 476	11/04/2025	ALCALDÍA MUNICIPAL DE BUESACO	Solicitud urgente de intervención en vía nacional – pérdida de banca y fallas de canalización	JHONNY ALEXANDER MESA TIMARAN Secretario de Infraestructura

Número	Fecha de Recibido en correo	ENVIADO POR	Asunto tratado	RESPONSABLE Y DEPENDENCIA
2025I-VBOG-022382	14/04/2025	INVIAS	Observaciones informe Criterio Técnico	SIRLEY DABEIBA MERCHÁN CARREÑO SUBDIRECTORA DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PD - 083- 2025	15/04/2025	PERSONERA MUNICIPAL DE CARTAGO NARIÑO	solicitud informe de estado de la Vía	SANDRA MARCELA NARVÁEZ SANTACRUZ Personera Municipal
140.09.01_457	15/04/2025	ALCALDÍA MUNICIPAL DE BUESACO	Respuesta a requerimiento de AMVNG5.	BAYRON ASDRUBAL ARGOTTY MONCAYO SECRETARIO DE PLANEACIÓN
Radicado: 2025E-VUVR-038736	21/04/2025	ALCALDÍA MUNICIPAL DE BUESACO	OFICIO 476 Solicitud urgente de intervención en vía nacional perdida de banca y fallas	JHONNY ALEXANDER MESA TIMARAN Secretario de Infraestructura
Radicado: 2025E-VUVR-038993	21/04/2025	sandrita59831@gmail.com	PQR de habitante de la comunidad de Buesaco.	HABITANTE DE LA COMUNIDAD
Radicado: 2025E-VUVRAZ-041002	21/04/2025	ALCALDÍA MUNICIPAL SAN PEDRO DE CARTAGO	Reiteración de solicitud de información sobre estado de la vía.	Maribel Carolina Gutiérrez secretaria de Despacho
	21/04/2025	INVIAS	INVITACIÓN a mesa de trabajo INVICOSTOS-UPTC, zona sur.	BLANCA ANDREA PEÑALOSA PABÓN Subdirección de Planificación de infraestructura Grupo APU
160.09.01_No. 536	21/04/2025	ALCALDÍA DE BUESACO	Solicitud urgente de intervención en vía nacional – pérdida de banca y fallas de canalización paso ancho.	JHONNY ALEXANDER MESA TIMARAN Secretario de Infraestructura

Número	Fecha de Recibido en correo	ENVIADO POR	Asunto tratado	RESPONSABLE Y DEPENDENCIA
			Seguimiento con soporte técnico de ACUABUESACO.	
	22/04/2025	ÁLVARO ARCOS	PQR de habitante de la comunidad de Buesaco.	PROPIETARIO DE VIVIENDA SECTOR PR 34 RUTA 2501
2025E-VUVR-040378	22/04/2025	GRACIELA JOJOA VELÁSQUEZ	PQR habitante de Pasto.	HABITANTE DE LA COMUNIDAD
	23/04/2025	ALCALDÍA MUNICIPAL SAN PEDRO DE CARTAGO	PRQ estado de la vía.	Santiago Alberto Muñoz Bravo Coordinador de Gestión del Riesgo
2-0259080392921	23/04/2025	AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	RESPUESTA REITERACIÓN OFICIO 212-AMVNG5-CTO1982-2024	PHILLI STEVENS MESA MORALES Gestor T1 Grado 10 - Punto de Atención Regional Pasto
140.09.01_556	24/04/2025	ALCALDÍA MUNICIPAL DE BUESACO	Respuesta a requerimiento por INVASIONES.	BAYRON ASDRUBAL ARGOTTY MONCAYO SECRETARIO DE PLANEACIÓN
	25/04/2025	INVIAS	Solicitud de información estado de la vía ruta 1003 PR29	KAROLID ESCOBAR ABOGADA CONTRATISTA
E-2025-139756/D-2025 3985969	28/04/2025	PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	Auto Actuación preventiva.	ANA ROCÍO SUAREZ GUZMÁN PROCURADORA PROVINCIAL DE INSTRUCCIÓN DE PASTO
	28/04/2025	PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	Auto preventiva, situación presentada en el PR 060+0620	ANA ROCÍO SUAREZ GUZMÁN PROCURADORA PROVINCIAL DE INSTRUCCIÓN DE PASTO
	28/04/2025	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE	Traslado por competencia. Solicitud de	ALEXANDER FIGUEROA MALDONADO

Número	Fecha de Recibido en correo	ENVIADO POR	Asunto tratado	RESPONSABLE Y DEPENDENCIA
			acompañamiento técnico para valoración de árboles en riesgo de caída	Coordinador – U.C.G.A y Servicio a la Ciudadanía
	30/04/2025	ALCALDÍA MUNICIPAL DE BUESACO	CONVOCAR A REUNIÓN – CUMPLIMIENTO DE ACCIÓN POPULAR:	ASDRUBAL ARGOTTY Secretario de Tránsito y Transporte

6 ACTAS DE PAGO PARCIALES, ACUMULADOS Y SALDOS POR EJECUTAR.

Se relacionan las actas de obra hasta la fecha y el saldo del contrato

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	SALDO
Valor Inicial	12/09/2024	$ 4,050,198,082.00		$ 4,050,198,082.00
Adiciones				$ -
Acta No,1	12 al 30 de septiembre de 2024		$ 55,830,078.00	$ 3,994,368,004.00
Acta No,2	01 al 31 de octubre de 2024		$ 77,889,022.00	$ 3,916,478,982.00
Acta No,3	01 al 30 de noviembre de 2024		$ 86,900,464.00	$ 3,829,578,518.00
Acta No,4	01 al 31 de diciembre de 2024		$ 89,423,264.00	$ 3,740,155,254.00
Acta No,5	01 al 31 de enero de 2025		$ 89,734,092.00	$ 3,650,421,162.00
Acta No,6	01 al 28 de febrero de 2025		$ 89,734,092.00	$ 3,560,687,070.00
Acta No,7	01 al 31 de marzo de 2025		$ 138,537,658.00	$ 3,422,149,412.00
Acta No,8	01 al 30 de abril de 2025		$ 97,837,754.00	$ 3.324.311.658,00
TOTALES		**$ 4,050,198,082.00**	**$ 725,886,424.00**	**$ 3,324,311,658.00**

7. CONCLUSIONES

- Se ejecutó el contrato 4143 de 2025 los días 08 y 23 de abril de 2025. En ambas jornadas un volumen aproximado con factor de compactación de 12 y 13 metros cúbicos respectivamente.

- Se hizo seguimiento a las actividades de las CTA y llamados de atención respectivos para el cumplimiento de indicadores.

- Se recorrieron las vías a cargo en 22 de los 30 días del mes de abril de 2025: los domingos y festivos las CTA se encargan de verificar el estado de la vía e informar novedades.

- Equipo de profesionales de la AMVNG5 ejecutaron sus funciones a cabalidad atendiendo las obligaciones contractuales y se cumple con entrega de informes y gestiones a tiempo.

- En el mes de abril de 2025 por disposición de la dirección territorial del INVIAS con resolución N00221 del 04/feb/2025 por peligro en colapso talud PR66+0850 ruta 2501A, se hace cierre preventivo en horas de la noche en la glorieta Daza PR00+0000 de la Ruta 25NRB y en PR84+0100 para salvaguardar la seguridad de los usuarios de estas rutas.

- Por condiciones climáticas adversas se presentaron múltiples deslizamientos menores y algunos cerraron parcialmente la calzada, algunos de mayor magnitud en diferentes sectores en especial en la ruta 2501A Pasto Buesaco Higuerones. Estos últimos fueron atendidos por el contratista CONSORCIO VÍAS DEL SUR bajo el contrato 4121 de 2024, con apoyo en la señalización y control de tráfico por las CTA y/o administración vial en algunos casos.

- Se realizó la instalación de estoperoles en los municipios de La Unión y Buesaco con mano de obra de las cooperativas de trabajo y suministro con ítem de Insumos del contrato de administración vial.

- Se hizo el sello de fisuras de puntos críticos con arena y emulsión en dos puntos del PR36+0170 y 36+0760 de la ruta 2501A en ambas margenes.

- Entre los días 03 a 15 de abril de 2025 se realizó la reparación de la cuneta, bordillo y construcción de trinchos para dar confinamiento a la banca en costado izquierdo en PR34+0120 de la ruta 2501A: se trabajó con recursos de insumos, y mano de obra de la CTA La Gran Vía. Se comprobó que se pueden hacer obras de atención con bajos recursos y mano de obra de las CTA. dentro del contrato de administración vial, no obstante, no se debe considerar esta como una obra definitiva sino una atención inmediata para evitar daños más severos y se exhorta a inversión en el sector con muros cuya tipología y tamaño deben ser evaluados por especialistas en contratos de estudios y diseños.

- En la parte de gestión administrativa la AMVGN5, envió comunicados a diferentes entidades para la atención oportuna a requerimientos de tipo técnico, ambiental, gestión predial, entre otros.

- AMVNG5 informa e invita a la dirección general del INVIAS Nariño para la solución de problemas técnicos en inestabilidad de la banca en las rutas 2501A y 1003.


- Se atendieron reuniones con la comunidad, supervisión, dirección territorial Nariño INVIAS para socialización de gestiones respecto a problemas de inestabilidad en la banca PR35+0300 ruta 2501A.

ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
Seguimiento a actividades cooperativas: reunion área SST y técnica en PR69+0570. CTA Calibio.	Capacitación COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO con cuerpo de bomberos de Buesaco. Manejo de extintores y primeros auxilios.
	
Inspección obras de drenaje. PR20+0060.Ruta 2501A	Seguimiento a actividades de CTA La Gran Vía: Limpieza de canal en PR34+0340.
	
Medición de magnitud de fisuras en ruta 2501A, fallla el Romeral. PR36+0140.	Medición de magnitud de fisuras en ruta 2501A, fallla el Romeral. PR36+0140.

	
Seguimiento a emergencia ocurrida el 07 de marzo de 2025 en ruta 1003. PR18+0150.	Policía de carreteras en cierre PR0+0000 RUTA 25NRB haciendo el respectivo cierre según la resolución 00221 del 04/feb/2025 por peligro en colapso talud PR66+0850 ruta 2501A
	
Obra de mitigacion por contrato 4121 de 2024: recalce de losas en PR82+0960 ruta 2501A.	Atención de emergencia por caída de árbol sobre ruta 25NRB PR03+0620 carril derecho.
	
Cierre ilegal por protesta social por avance en obra vía a Berruecos (contrato Gobernación) ruta 2501A PR51+0500.	Medición de magnitud de fisuras en ruta 2501A, fallla el Romeral. PR36+0700.

	
Recorrido con dirección territorial INVIAS Nariño verificación estado sitio critico PR35+0300 restaurante “El Corral”	Seguimiento a emergencia ocurrida el 07 de marzo de 2025 en ruta 1003. PR17+0050.
	
Visita a peticionario para dar respuesta a derecho de petición, municipio de la Unión. PR89+0270. Ruta 2501A.	Inspección de obra de drenaje y comunidad para acomodación de tubos de acueducto veredal en alcantarilla. PR10+0490. Ruta 1003.
	
Visita a petición de la comunidad respecto a condición de caja de alcantarilla. PR34+0460. Ruta 2501A	Visita a peticionario para dar respuesta a derecho de petición. Ruta 1003. PR10+0490.

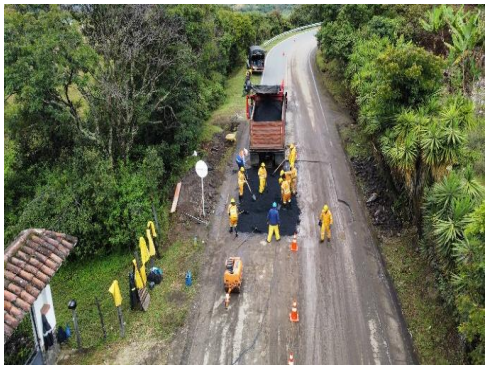	
Visita a peticionarios para dar respuesta a derecho de petición: ruta 2501A PR44+0660.	Medición de baches para cuantificar mezcla asfáltica en jornada de bacheo, contrato 4143 de 2024.
	
Instalación de mezcla asfáltica, ejecución del contrato 4143 del 2024. PR28+0340. Ruta 2501A	Instalación de mezcla asfáltica, ejecución del contrato 4143 del 2024. PR28+0340. Ruta 2501A. Panorámica con Dron.
	
Recorrido técnico con contratista e interventoría en ejecución del contrato 4121 de 2024. Parada en PR35+0300. Ruta 2501A.	Reunión alcaldía de Buesaco, comunidad, dirección territorial Nariño y administración vial para hablar sobre sitio crítico PR35+0300 ruta 2501A

	
Perforación para instalación de estoperoles en el municipio de Buesaco PR36+0300. Ruta 2501A	Limpieza de perforaciones con aire comprimido para pegar estoperoles. PR90+0770. Ruta 2501A. municipio de La Unión.
	
Instalación de estoperoles en el municipio de Buesaco PR36+0310. Ruta 2501A	Panorámica de estoperoles instalados municipio de Buesaco sector Barrio Bolívar. PR36+300. Ruta 2501A
	
Visita técnica a sitio critico PR29+620 ruta 1003.	Panorámica con Dron sitio critico PR29+0620 ruta 2501A.

	
Sello de fisuras con arena y emulsión, en punto critico ruta 2501A, PR36+0170.	Sello de fisuras con arena y emulsión, en punto crítico ruta 2501A, PR36+0700.
	
Recorrido para recibir contrato 3409 de 2024. A la izquierda Ing. Francisco Erazo (interventoría). Centro Ing. Richard Castro (contratista). Derecha ing. Diego Martínez (supervisor)	Levantamiento de información magnitud de daños en reductores en interventoría a contrato 3409 de 2024. Reductor N1 PR36+0380.
	
Visita especialista en geotecnia en sitio crítico ruta 2501A. PR66+0850.	Seguimiento a estado de sitio crítico y avance de remoción de material. PR66+0850. Ruta 2501A.

	
Panorámica sitio critico ruta 2501A PR66+0850.	Panorámica con dron sitio critico ruta 2501A PR66+0850.
	
Construcción de trinchos luego de caída de 2 árboles de eucalipto, para confinamiento de banca en margen izquierdo. Instalación de elementos verticales. PR34+0120. Ruta 2501A	Construcción de trinchos luego de caída de 2 árboles de eucalipto, para confinamiento de banca en margen izquierdo. Compactación de material. PR34+0120. Ruta 2501A
	
Trincho finalizado. Detalle de sacosuelos en parte superior. PR34+0120. Ruta 2501A	Charla SST en instalaciones AMVNG5. Alimentación saludable y hábitos de vida saludable.

	
Seguimiento a actividades cooperativas: reunion área SST y técnica en PR13+1040. Ruta 1003. CTA Encano.	Instalación de Rejilla en la caja de alcantarilla. PR34+0450. Margen izquierdo. Ruta 2501A.
	
Instalación de Rejilla en la caja de alcantarilla. PR34+0450. Margen izquierdo. Ruta 2501A.	Instalación de Rejilla en la caja de alcantarilla. PR34+0450. Margen izquierdo. Ruta 2501A.
