MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

SUBDIRECCIÓN DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS

TERRITORIAL NARIÑO

INFORME MENSUAL No. 12

PERÍODO: 01 al 31 de agosto de 2025

CONTRATO No. 1982 DE 2024

CARRETERAS:

CÓDIGO 1003 VÍA PASTO-LA PISCICULTURA-EL PEPINO SECTOR PASTO-LA PISCICULTURA PR005+0000-PR033+0000

CÓDIGO 2501A VÍA PASTO-BUESACO-MOJARRAS SECTOR PASTO-BUESACO-HIGUERONES PR002+0000-PR102+0000

CÓDIGO 25NRB VÍA VARIANTE DAZA SECTOR VARIANTE DAZA PR000+0000-PR003+0599

ADMINISTRADOR VIAL:

CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024 - LOTE 5 GRUPO AMV No. 5

SUPERVISOR TÉCNICO:

JONNY ANDRÉS FAJARDO ROSERO

TABLA DE CONTENIDO

Pág.

1. OBJETIVOS 8

1.1 GENERAL 8

1.2 ESPECÍFICOS 8

2 . INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 9

3 . VÍAS A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 5 10

4 . ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO. 11

4.1 INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO: CTA CALIBIO, LA GRAN VÍA, EL PRADO Y EL ENCANO. 11

4.2 SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES CONTRATISTA 4121 DE 2024 EN LA RUTA 2501A PASTO – BUESACO – MOJARRAS. 13

4.3 ATENCIÓN A EMERGENCIAS 16

4.4 OBRAS MENORES PARA MITIGACIÓN DE DAÑOS EN LA CALZADA REALIZADAS CON MANO DE OBRA DE CTA Y RECURSOS DE INSUMOS . 16

4.5 REPORTE DE INVASIONES EN EL PERÍODO 17

4.6 RECORRIDOS DEL PERSONAL DE LA AMVG5 POR LAS VÍAS A CARGO EN EL PERIODO. 19

4.7 RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN VIAL (AMVNG5) REFERENTES AL ÁREA TÉCNICA Y SST. 20

Pág

4.7.1 INGENIERO RESIDENTE DE ADMINISTRACIÓN VIAL FRANCISCO ERAZO – ÁREA TÉCNICA. 20

4.7.2 INGENIERO AUXILIAR I DE ADMINISTRACIÓN VIAL MIGUEL LÓPEZ - ÁREA TÉCNICA 22

4.7.3 AUXILIAR II DE ADMINISTRACIÓN VIAL DANIEL COLLAZOS – ÁREA TÉCNICA 23

4.7.4 PROFESIONAL SST DE ADMINISTRACIÓN VIAL CLAUDIA OVIEDO – ÁREA SST 24

5 . CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA 25

5.1 CORRESPONDENCIA ENVIADA: 25

5.2 CORRESPONDENCIA RECIBIDA: 30

6 . ACTAS DE PAGO PARCIALES, ACUMULADOS Y SALDOS POR EJECUTAR. 32

7 . CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 33

ANEXO NO.1 - REGISTRO FOTOGRÁFICO 36

LISTA DE FOTOS

Pág

Foto No. 1. 01/08025. Levantamiento topográfico para cubicación de derrumbe. PR09+0900 RUTA 2501A. 14
Foto No. 2, 3 y 4. 12 y 13 de agosto de 2025. Trabajos de conformación de base para instalación de pavimento articulado. PR32+0840. Ruta 2501A 14
Foto No. 5 y 6. 13/08/2025 Nivelación de fresado instalado en meses anteriores. PR34+0320. Ruta 2501A. 14
Foto No. 7 y 8. 05/08/2025 Muro en Gavión PR34+0560. Ruta 2501A. 15
Foto No. 9 y 10. 22/08/2025 Trabajos en descole alcantarilla PR35+0950. Ruta 2501A 15
Foto No. 11,12 y 13. 20/08/2025. Trabajos de pavimentación en el municipio de La Unión. PR87+0200. Ruta 2501A 15
Foto No. 14. 04/08/2025. Levantamiento informacion de señales para informe accidentalidad PR38+0785. Ruta 2501A. 36
Foto No. 15. 04/08/2025. Levantamiento informacion de señales para informe accidentalidad PR76+0200. Ruta 2501A. 36
Foto No. 16. 05/08/2025. Estado de obra de mitigacion finalizada. PR30+0840 ruta 2501A. 36
Foto No. 17. 05/08/2025. Estado de cuneta reconstruida en obra de mitigación. PR30+0840 ruta2501A 36
Foto No. 18.04/08/2025. Recorrido técnico puente La Rinconada PR84+0570 ruta 2501A. 37
Foto No. 19. 05/08/2025. Medición de derrumbe PR15+0800 ruta 1003. 37
Foto No. 20. 05/08/2025. Instrucciones a cooperativa El Encano por parte de AMV.PR14+0685 ruta 1003. 37

Pág.

Foto No. 21. 05/08/2025. Verificacion de estado de obra de mitigacion de erosion de talud. PR27+0100 ruta 1003. 37
Foto No. 22. 05/08/2025. Atencion emergencia por parte de cooperativa el Encano y recomendaciones por parte de AMV. PR32+0180. Ruta 1003 37
Foto No. 23. 05/08/2025Atencion emergencia por parte de cooperativa el Encano. PR32+0180. Ruta 1003. 37
Foto No. 24. 05/082025. Estado de sitio critico – avance en severidad de daños en carril derecho. PR29+0620. Ruta 1003. 38
Foto No. 25. Panorámica Estado de sitio critico – avance en severidad de daños en carril derecho. PR29+0620. Ruta 1003. 38
Foto No. 26. Instrucciones e implementación PMT para actividad de sello de junta de construcción reductores de velocidad Buesaco. Reductor N1. PR36+0368. Ruta 2501A 38
Foto No. 27. 08/08/2025. Inspección a tubería alcantarilla PR32+0180. Ruta 1003. 38
Foto No. 28. 11/08/2025. Sello de fisuras en juntas de construcción reductores de velocidad. Reductor N5. PR38+0320. Ruta 2501A. 38
Foto No. 29. 11/08/2025. Sello de fisuras en juntas de construcción reductores de velocidad. Reductor N7. PR38+0660. Ruta 2501A 38
Foto No. 30. 12/08/2025. Medición de magnitud de baches para solicitud asfalto. PR27+0900. Ruta 2501A. 39
Foto No. 31. 12/08/2025. Charla con integrantes de cooperativa La Gran Vía. PR20+0800. Ruta2501A. 39
Foto No. 32. 12/08/2025. Capacitación para AMV con ARL SURA. Datos observatorio nacional de seguridad vial. 39
Foto No. 33. Capacitación para AMV con ARL SURA. Tips para preoperacional de vehículos y manejo defensivo. 39

Pág.

Foto No. 34. 12/08/2025. Inspección diaria a cooperativa Calibio por parte de AMV. PR40+0710. Ruta 2501A. 39
Foto No. 35. 12/08/2025.Inspección a daño en carril izquierdo. PR40+0740. Ruta 2501A. 39
Foto No. 36. 13/08/2025. Charla técnica a cooperativa Calibio por parte de AMV. PR45+0000. Ruta 2501A. 40
Foto No. 37. Charla técnica a cooperativa El prado por parte de AMV. PR76+0640. Ruta 2501A 40
Foto No. 38. 13/08/2025. Inspección a obra de mitigación de daños en falla geológica. PR14+0980. Ruta 1003. 40
Foto No. 39. 13/08/2025. Charla a cooperativa La Gran Vía por parte de AMV. PR30+0840. Ruta 2501A. 40
Foto No. 40. 14/08/2025. Visita técnica por parte de subdirector nacional del INVIAS Javier Cañón, contratista e interventoría de obra y AMV. PR86+0250. Ruta 2501A. 40
Foto No. 41. 14/08/2025. Visita técnica por parte de subdirector nacional del INVIAS Javier Cañón, contratista e interventoría de obra y AMV. PR86+0300. Ruta 2501A 40
Foto No. 42. 13/08/2025. Emergencia por incendio aparentemente provocado. Talud superior margen derecho. PR34+0910. 41
Foto No. 43. 15/08/2025. Charla técnica con personal de cooperativa El Encano. PR11+0430. Ruta 1003. 41
Foto No. 44. 15/08/2025. Tapa de alcantarilla arreglada por Acuabuesaco. PR35+0810. Ruta 2501A. 41
Foto No. 45. 20/08/2025. Charla de seguridad por parte de AMV a cooperativa Calibio. PR43+0830. 41

Pág.

Foto No. 46. 20/08/2025. Entrega de cinta de peligro AMV a cooperativa El Encano. PR23+0600. Ruta 1003. 41
Foto No. 47. 20/08/2025. Charla de seguridad a cooperativa el Prado. PR74+0300. Ruta 2501A.. 41
Foto No. 48. 20/08/2025. Prueba de alcoholimetría a conductor 1 AMV. 42
Foto No. 49. 20/08/2025. Prueba de alcoholimetría a conductor 1 AMV. 42
Foto No. 50. 21/08/2025. Charla de seguridad con SST de AMV. 42
Foto No. 51. 21/08/2025. Pausa activa personal AMV. 42
Foto No. 52. 08/07/2025. Contratista 4121 realiza labores de conformación y/o adecuación de subrasante de la vía sobre el carril izquierdo, en PR29+0100 hacia mayores en Ruta 2501A. 42
Foto No. 53. 08/07/2025. Contratista 4121 realiza labores de conformación y/o adecuación de subrasante de la vía sobre el carril izquierdo, en PR29+0100 hacia mayores en Ruta 2501A. 42

1. OBJETIVOS

Se presenta un objetivo general y varios específicos.

1.1 General

Documentar de forma clara y concisa las actividades, procedimientos e incidencias relacionadas con la ejecución del contrato No. 1982 de 2024, cuyo objeto es la "Administración vial de las carreteras nacionales a cargo de la Dirección Territorial Nariño, Grupo AMV 5 Lote 5", durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de agosto de 2025.

1.2 Específicos

- Presentar un registro fotográfico que evidencie las actividades realizadas por los profesionales de la administración vial, microempresas de mantenimiento rutinario y del contrato 4121 de 2024 (contratista que realiza trabajos en la ruta 2501A) en el periodo del informe.

- Resumir de forma estructurada las actividades ejecutadas por el CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024, organizadas por capítulos y subcapítulos según la metodología establecida.

- Exponer las conclusiones y recomendaciones derivadas de la gestión realizada durante el periodo del 1 al 31 de agosto de 2025.

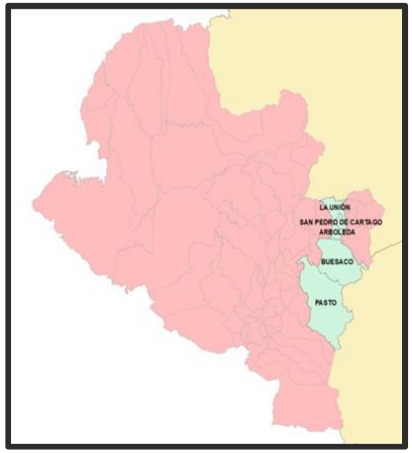
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Información general del contrato:

Número de contrato	1982 de 2024
Objeto	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, GRUPO AMV 5 LOTE 5.
Empresa ejecutora	CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024 NIT: 901838183
Consorciados y porcentaje de participación.	CAMINOS SAS NIT 822003009-1 - participación del 70% INPROTEKTO LIMITADA NIT 800032486-5 - participación del 30%
Representante Legal empresa ejecutora	Samuel Fernando Homez López C.C. 93356517 de Ibagué
Duración del contrato	29 meses
Plazo	Hasta el 31 de julio de 2026
Valor inicial incluido IVA	$ 4,050,198,082.00
Supervisor	Jonny Andrés Fajardo Rosero
Fecha de orden de inicio	12 de septiembre de 2024
Fecha de terminación	31 de julio de 2026

3. VÍAS A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 5

<table>
<tr>
<td>


</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Localización de Nariño en Colombia (arriba)
Ubicación de municipios de influencia del proyecto (abajo)</td>
<td>Vías a cargo de la AMVG5 y algunos puntos de referencia y/o interés como centros poblados y/o municipios del área de influencia.</td>
</tr>
</table>

4. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO.

Las actividades por exponer en el actual capítulo son: 1) cuadro relacionando los contratos de Mantenimiento Rutinario, los cuales son ejecutados por cooperativas de trabajo asociado (CTA de ahora en adelante) y enlistar actividades en el periodo. 2) Seguimiento a actividades realizadas contrato 4121 de 2024 (con el objetivo de mantener informado al INVIAS), 3) Atención de emergencias con CTA. 4) Reporte de invasiones, 5) Relación de fechas y rutas para recorridos diarios por parte del grupo de profesionales de la AMVNG5 y 6) Resumen de actividades por cada profesional del grupo de trabajo CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024.

4.1 INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO: CTA CALIBIO, LA GRAN VÍA, EL PRADO Y EL ENCANO.

Se relaciona un cuadro con los contratos de las cooperativas a las cuales se les hace interventoría:

CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO	FECHA DE ORDEN DE INICIO
3711 DE 2024	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA GRAN VÍA	“SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO Á LOS SECTORES 25NRB VARIANTE DE DAZA, PR 0+0000 - PR 3+0599/ 2501A PASTO - BUESACO - HIGUERONES, PR 2+0000 (PASTO) - PR38+0860 (BUESACO)”	7 DE OCTUBRE DE 2024
3665 DE 2024	COOPERATIVA COMUNITARIA DE SERVICIOS Y DE TRABAJO ASOCIADO DE CALIBIO	“SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO SECTORES 2501A PASTO - BUESACO - HIGUERONES, PR 38+0700 (BUESACO) - PR 70+0000 (MARTÍN)”	15 DE OCTUBRE DE 2024

CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO	FECHA DE ORDEN DE INICIO
3695 DE 2024	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL PRADO	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO EN LOS SECTORES 2501A PASTO - BUESACO - HIGUERONES, PR 70+0000 (MARTÍN) - PR 102+0000 (HIGUERONES)"	7 DE OCTUBRE DE 2024
3742 DE 2024.	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO INTEGRACIÓN EL ENCANO	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO SECTORES 1003 PASTO - LA PISCICULTURA, PR5+0000 - PR 33+0000"	8 DE OCTUBRE DE 2024

Entre las actividades desarrolladas por cada CTA en el periodo del informe se enlistan las siguientes:

- Rocería.
- Poda de árboles y vegetación para despeje de señales verticales.
- Poda de árboles y vegetación para despeje de calzada (paisajismo y seguridad vial)
- Desmonte manual de talud.
- Limpieza de cunetas.
- Limpieza de tubería de alcantarillas.
- Limpieza de encoles y descoles de alcantarillas y box culvert.
- Limpieza de bordillos.
- Limpieza y/o enderezamiento de señales verticales.
- Retiro y/o reemplazo de señales verticales dañadas o en mal estado.
- Limpieza de defensas metálicas.
- Reporte de atropellamiento a fauna.
- Jornadas de tapahuecos con material común.
- Jornadas de recolección de basura.

- Despeje de derrumbes menores con herramienta menor.
- Limpieza de calzada: despeje de obstáculos, basuras y rocas para circulación vehicular de usuarios viales en condiciones de seguridad y comodidad.
- Asistencia y participación a capacitación mensual orientada por AMVNG5.
- Atención de emergencias presentadas en las rutas a cargo.
- Reporte e informe a grupo de WhatsApp de la AMVNG5 “COOPERATIVAS NARIÑO G5”, de recorrido diario en horas de la mañana y de la tarde, así como también el reporte de las emergencias evidenciadas en los respectivos tramos asignados de vía.
- Señalización y refuerzo de señalización en sitios críticos, con colombinas reflectivas y cinta de peligro no pase.
- Apoyo al control de tráfico en implementación del PMT en actividades desarrolladas.

Los tramos y rendimientos de las actividades mencionadas se relacionan en el informe de indicadores para cada CTA. Adicionalmente, la programación semanal de las actividades ejecutadas es revisada y aprobada por la administración vial los lunes de cada semana.

4.2 SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES CONTRATISTA 4121 DE 2024 EN LA RUTA 2501A PASTO – BUESACO – MOJARRAS.

Con el objetivo de brindar información en tiempo real de los avances del contratista de obra “CONSORCIO VÍAS DEL SUR” bajo el contrato No 4121 de 2024, la administración vial en sus recorridos diarios registró las actividades observadas. Para el periodo del 01 al 31 se ejecutó en el tramo 2501A PASTO – BUESACO - MOJARRAS:



Foto No. 1. 01/08025. Levantamiento topográfico para cubicación de derrumbe. PR09+0900 RUTA 2501A.







Foto No. 2, 3 y 4. 12 y 13 de agosto de 2025. Trabajos de conformación de base para instalación de pavimento articulado. PR32+0840. Ruta 2501A





Foto No. 5 y 6. 13/08/2025 Nivelación de fresado instalado en meses anteriores. PR34+0320. Ruta 2501A.





Foto No. 7 y 8. 05/08/2025 Muro en Gavión PR34+0560. Ruta 2501A.





Foto No. 9 y 10. 22/08/2025 Trabajos en descole alcantarilla PR35+0950. Ruta 2501A







Foto No. 11,12 y 13. 20/08/2025. Trabajos de pavimentación en el municipio de La Unión. PR87+0200. Ruta 2501A

4.3 ATENCIÓN A EMERGENCIAS

En el periodo del 01 al 31 de agosto de 2025 se presentaron las emergencias que se relacionan a continuación:

FECHA DEL EVENTO	CÓDIGO VÍA	UBICACIÓN (PR)	TIPO DE EVENTO
4/08/2025	1003	32+0240	Flujo de detritos del talud superior sobre el margen izquierdo de mediana magnitud que generó el cierre parcial sobre el carril izquierdo de la vía.
13/08/2025	2501A	34+0910	Se presenta incendio en talud superior aparentemente generado por los dueños del predio. Cayeron rocas a la vía las cuales fueron despejadas por la cooperativa Gran Vía.

La emergencia de la ruta 1003 fue atendida por la cooperativa asociada de trabajo Integración El Encano los días 04 y 05 de agosto de 2025. La emergencia de la ruta 2501A fue atendida por bomberos Buesaco y despeje de rocas por parte de cooperativa La Gran Vía el mismo día de la emergencia.

4.4 OBRAS MENORES PARA MITIGACIÓN DE DAÑOS EN LA CALZADA REALIZADAS CON MANO DE OBRA DE CTA Y RECURSOS DE INSUMOS

En el periodo del 01 al 31 de agosto de 2024, se realizó el sello de juntas de construcción con arena y emulsión en los reductores de velocidad en el casco urbano de Buesaco (reductores que fueron construidos bajo el contrato de obra 3409 de 2024 del cual la AMV fue apoyo de interventoría) con el fin de evitar la erosión y daño en pavimento. Esto se realizó en los 7 reductores de velocidad a continuación enlistados:

Reductor N	PR	Sector
1	36+0368	Coliseo barrio Bolívar
2	37+0830	Semáforo Mercafácil

Reductor N	PR	Sector
3	38+0004	ESE Virgen de Lourdes.
4	38+0232	Banco mundo Mujer
5	38+0322	
6	38+0567	Bomba Terpel
7	38+0660	Café de Buesaco.

En la ruta 1003 se realizó nivelación con mortero de fisura por falla geológica en PR14+0980 por parte de la cooperativa El Encano.

Construcción de colombinas en concreto para la señalización de los diferentes sectores en las rutas 1003 Pasto – La Piscicultura y la 2501A Pasto – Buesaco – Higuerones.

Señalización horizontal de pasos escolares y resaltos en las rutas 2501A Pasto Buesaco – Higuerones. Pendiente por realizar la señalización en la ruta 1003 Pasto – La Piscicultura.

4.5 REPORTE DE INVASIONES EN EL PERÍODO

En el periodo del actual informe se identificaron las siguientes contravenciones a la Ley, radicadas mediante comunicado y fecha como se muestra en el cuadro en la parte inferior:

FECHA	CONSECUTIVO	DESTINATARIO	DEPENDENCIA	ASUNTO
01/08/2025	389-AMVNG5-CTO1982-2024	ALCALDÍA MUNICIPIO DE ARBOLEDA	MARILUZ CRISTINA DELGADO GAVIRIA ALCALDESA	EXPLANACIÓN DE TALUD SUPERIOR SOBRE MARGEN IZQUIERDO EN PR055+0420.
05/08/2025	398-AMVNG5-CTO1982-2024	ALCALDÍA MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE CARTAGO	WALTER FERNANDO RODRÍGUEZ LOPEZ ALCALDE	CULTIVOS OBSTRUYENDO SEÑALIZACIÓN VERTICAL SOBRE MARGEN DERECHO EN PR069+0260.
05/08/2025	399-AMVNG5-CTO1982-2024	ALCALDÍA MUNICIPIO DE BUESACO	OSWALDO PABÓN DIAZ ALCALDE	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE CONCRETO REFORZADO SOBRE MARGEN DERECHO DE LA VÍA EN PR22+0430, 27+0440 y PR49+0000
14/08/2025	404-AMVNG5-CTO1982-2024	ALCALDÍA SAN JUAN DE PASTO	NICOLAS MARTIN TORO ALCALDE	CONSTRUCCIÓN DE VÍA DE ACCESO A VIVIENDA SOBRE MARGEN DERECHO DE LA VÍA EN PR19+0930.
14/08/2025	405-AMVNG5-CTO1982-2024	ALCALDÍA MUNICIPIO DE LA UNIÓN	JAVIER MONTENEGRO ALCALDE	ACOPIO DE ESCOMBROS, OBSTRUCCIÓN DE CUNETA Y CALZADA SOBRE MARGEN DERECHO DE LA VÍA EN PR91+0830

FECHA	CONSECUTIVO	DESTINATARIO	DEPENDENCIA	ASUNTO
14/08/2025	405-AMVNG5-CTO1982-2024	ALCALDÍA MUNICIPIO DE LA UNIÓN	JAVIER MONTENEGRO ALCALDE	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, OBSTRUCCIÓN DE CUNETA Y CALZADA SOBRE MARGEN DERECHO DE LA VÍA EN PR92+0250

4.6 RECORRIDOS DEL PERSONAL DE LA AMVG5 POR LAS VÍAS A CARGO EN EL PERIODO.

Se presenta un calendario del mes de agosto de 2025 con los recorridos diarios en las vías a cargo de la administración vial grupo 5 en este periodo.

lu.	ma.	mi.	ju.	vi.	sá.	do.
				1 2501A 25NRB	2	3
4 2501A	5 2501A 25NRB	6 2501A	7	8 1003	9	10
11 2501A	12 2501A	13 2501A 25NRB 1003	14 2501A Recorrido con contratista 4121 de 2024 y subdirector general del INVIAS	15 2501A 25NRB 1003	16	17
18	19 2501A	20 2501A 1003	21 2501A 25NRB	22 2501A 25NRB	23	24
25 2501A 1003	26 2501A 25NRB	27 2501A	28 1003	29 2501A 25NRB	30	31

4.7 RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN VIAL (AMVNG5) REFERENTES AL ÁREA TÉCNICA Y SST.

Se presenta un breve subcapítulo para cada uno de los profesionales de la administración vial, tanto del área técnica como del área de SST, en el que se detallan las actividades desarrolladas en el marco del contrato durante el periodo correspondiente a este informe.

4.7.1 INGENIERO RESIDENTE DE ADMINISTRACIÓN VIAL FRANCISCO ERAZO – ÁREA TÉCNICA.

Gestión técnica para la resolución de problemas de infraestructura vial por medio de mano de obra de CTA y recursos e insumos suministrados por la Administración Vial (AMVNG5).

Respuesta a derechos de petición: visitas técnicas e informes.

Recorridos con subdirector territorial de INVIAS y contratistas de obra en las rutas a cargo.

Supervisión de trabajos ejecutados con recursos e insumos y mano de obra de CTA.

Reporte diario del estado o condiciones de la vía en el grupo de WhatsApp “RESIDENTES AMV”, durante las horas de la mañana y tarde. Así como también el debido reporte de emergencias en su respectivo formato anexando el registro fotográfico pertinente.

Inspección técnica a los tramos de vía o rutas a cargo para exigir a CTA cumplimiento de acuerdo con los indicadores contractuales del mantenimiento rutinario, en el cual se toma de evidencias y se hacen llamados de atención grupales, al igual que de manera escrita por medio de comunicados.

Toma de registros fílmicos y fotográficos con el Dron adscrito a la Administración Vial (AMVNG5).

Elaboración, revisión y envío de informes técnicos a la Dirección Territorial Invias Nariño en cumplimiento del contrato 1982 de 2024.

4.7.2 INGENIERO AUXILIAR I DE ADMINISTRACIÓN VIAL MIGUEL LÓPEZ - ÁREA TÉCNICA

- Apoyo en la elaboración de informes: Recolección de información en campo, elaboración y envío de informe de accidentalidad, mes inmediatamente anterior.

- Organización de registros fotográficos diario por cooperativa en archivo de la empresa.

- Complemento de la bitácora de actividades de cooperativa y administración tanto física como en archivo Excel: meses de abril, mayo y junio de 2025 (trabajo para ponerla al día)

- Apoyo en supervisión en mitigación de daños en calzada por hundimiento por falla geológica PR14+0982 con mano de obra de las CTA en ruta 1003 (sello con mortero).

- Toma de registros fotográficos de las actividades del contratista 4121 de 2024 para reporte a dirección territorial Nariño.

- Toma de registros fílmicos y fotográficos con el Dron de la empresa.

- Inspección técnica a los tramos para exigir a CTA cumplimiento con indicadores: toma de evidencias y llamados de atención en grupo WhatsApp “COOPERATIVAS NARIÑO G5”.

- Toma de registros fílmicos y fotográficos con el Dron de la empresa.

- Recorridos para verificación de estado de sitios críticos.

- Reporte de invasiones nuevas en el grupo de WhatsApp de la AMVG5 “solo invasiones”.

- Reporte del estado diario de las vías a cargo en las horas de la mañana en grupo interno de la empresa “AMV GRUPO 5”.

4.7.3 AUXILIAR II DE ADMINISTRACIÓN VIAL DANIEL COLLAZOS – ÁREA TÉCNICA

- Seguimiento y/o control a avance y programación de actividades de cooperativas asociadas de trabajo

- Organización y archivo de registro fotográfico técnico, SST y otros, asociado a las actividades de la administración vial.

- Elaboración de oficios asociados a invasiones y reiteraciones al derecho de vía, solicitudes de insumos y respuestas a requerimientos de entidades municipales.

- Elaboración de Presupuesto asociado a señalización horizontal para demarcación de zonas escolares.

- Elaboración de informe asociado al manejo de residuos orgánicos en el PR59+0720, sector de Arboleda, Nariño.

- Diligenciamiento y procesamiento de información diaria de administración vial y contratos de mantenimiento rutinario en bitácora.
- Elaboración de reporte de emergencias mensual.

- Diligenciamiento y elaboración de formatos asociados a encuestas de fauna SUKUBUN.

4.7.4 PROFESIONAL SST DE ADMINISTRACIÓN VIAL CLAUDIA OVIEDO – ÁREA SST

- En los recorridos viales realizados sobre las rutas a cargo durante el mes de agosto, se socializaron en las visitas y charlas de seguridad los siguientes temas, tanto al personal de la administración vial como a las CTA: Protocolo de seguridad en obras, trabajo seguro en alturas, como inspeccionar elementos para trabajo en alturas, riesgo locativo, tropezones, caídas y resbalones, Importancia de los preoperacionales.

- Se realizó la inspección del uso y estado de elementos de protección personal del personal de las cooperativas de trabajo.

- Se realizó inspección a vehículos (motos y carros) de las CTA, con el propósito de evidenciar las condiciones de estos; y prevenir accidentes de tránsito.

- Se realizó inspección de elementos de primeros auxilios: (botiquín; camilla de emergencia; extintores) a las respectivas CTA.

- Se realizaron pausas activas con el personal de la administración vial (AMVNG5) y las CTA.

- Se realizó inspección de herramienta manual y menor de las CTA, todo ello con base a la herramienta mínima solicitada contractualmente para las labores de mantenimiento rutinario.

- Se realiza seguimiento al diseño y ejecución al sistema de seguridad y salud en el trabajo a las cooperativas a cargo, con el fin de que ejecuten actividades encaminadas a velar por la seguridad y bienestar de los trabajadores y así cumplir con la normatividad vigente.

- Se actualiza y ejecuta el sistema de seguridad y salud en el trabajo del CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024, con el fin de velar por la salud y seguridad del personal, al igual que por cumplir con la normatividad vigente.

-Gestión y coordinación de capacitación mensual para trabajadores de CTA en la cual se abordaron temas de “conservación de recursos naturales, fuentes hídricas, fauna, entre otros, de gran importancia en la ejecución de las actividades laborales que se realizan” dirigida por la corporación autónoma regional de Nariño CORPONARIÑO.

5. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

Se presentan dos cuadros uno para la correspondencia enviada y otro para la recibida para el periodo del actual informe, así:

5.1 CORRESPONDENCIA ENVIADA:

FECHA	CONSECUTIVO	DESTINATARIO	DEPENDENCIA	ASUNTO
01/08/2025	389-AMVNG5-CTO1982-2024	ALCALDÍA MUNICIPIO DE ARBOLEDA	MARILUZ CRISTINA DELGADO GAVIRIA ALCALDESA	EXPLANACIÓN DE TALUD SUPERIOR SOBRE MARGEN IZQUIERDO EN PR055+0420.

FECHA	CONSECUTIVO	DESTINATARIO	DEPENDENCIA	ASUNTO
04/08/2025	391-AMVNG5-CTO1982-2024	INSPECTOR DE POLICÍA MUNICIPIO DE FLORENCIA, CAUCA	DEIBY ANTONY SOLARTE ARAUJO INSPECTOR	SOLICITUD REPORTE ACCIDENTALIDAD JULIO DE 2025
04/08/2025	392-AMVNG5-CTO1982-2024	POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA SECCIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE NARIÑO	VÍCTOR ALFONSO CIFUENTES CAYCEDO Intendente	SOLICITUD REPORTE ACCIDENTALIDAD JULIO DE 2025
04/08/2025	393-AMVNG5-CTO1982-2024	SECRETARÍA DE TRÁNSITO DE BUESACO	BAYRON ASDRUBAL ARGOTTY MONCAYO SECRETARIO DE TRÁNSITO	SOLICITUD REPORTE ACCIDENTALIDAD JULIO DE 2025
04/08/2025	394-AMVNG5-CTO1982-2024	INSPECTOR DE POLICÍA MUNICIPIO DE ARBOLEDA	JOSE HERMENEGILDO VIVEROS ERAZO	SOLICITUD REPORTE ACCIDENTALIDAD JULIO DE 2025
04/08/2025	395-AMVNG5-CTO1982-2024	INSPECTOR DE POLICÍA MUNICIPIO DE LA UNIÓN	JAIME ANDRÉS ARMERO SOLARTE INSPECTOR	SOLICITUD REPORTE ACCIDENTALIDAD JULIO DE 2025

FECHA	CONSECUTIVO	DESTINATARIO	DEPENDENCIA	ASUNTO
04/08/2025	396-AMVNG5-CTO1982-2024	INSPECTORA DE POLICÍA MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE CARTAGO	GLADYS OLIVA LÓPEZ INSPECTORA	SOLICITUD REPORTE ACCIDENTALIDAD JULIO DE 2025
05/08/2025	390-AMVNG5-CTO1982-2024	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ARBOLEDA	MARILUZ CRISTINA DELGADO GAVIRIA ALCALDESA	SOLICITUD DE INSPECCIÓN SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS ORGÁNICOS, RUTA 2501A, MARGEN DERECHO EN PR 59+0720
05/08/2025	398-AMVNG5-CTO1982-2024	ALCALDÍA MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE CARTAGO	WALTER FERNANDO RODRÍGUEZ LOPEZ ALCALDE	CULTIVOS OBSTRUYENDO SEÑALIZACIÓN VERTICAL SOBRE MARGEN DERECHO EN PR069+0260.
05/08/2025	399-AMVNG5-CTO1982-2024	ALCALDÍA MUNICIPIO DE BUESACO	OSWALDO PABÓN DIAZ ALCALDE	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE CONCRETO REFORZADO SOBRE MARGEN DERECHO DE LA VÍA EN PR22+0430, 27+0440 y PR49+0000
05/08/2025	400-AMVNG5-CTO1982-2024	DIRECCIÓN TERRITORIAL INVIAS NARIÑO	MARIA DEL PILAR CERÓN BENAVIDES DIRECTORA	RESPUESTA A SOLICITUD AUTORIZACIÓN DE CIERRE TEMPORAL DE VÍA 2501A

FECHA	CONSECUTIVO	DESTINATARIO	DEPENDENCIA	ASUNTO
11/08/2025	402-AMVNG5-CTO1982-2024	EMPRESA DE ACUEDUCTO DE BUESACO NARIÑO	ACUABUESACO	REITERACIÓN ALCANTARILLA SIN TAPA Y DEFICIENTEMENTE SEÑALIZACIÓN VÍA 2501A PR035+0820 CARRIL DERECHO, BUESACO.
14/08/2025	403-AMVNG5-CTO1982-2024	DIRECCIÓN TERRITORIAL INVIAS NARIÑO	MARIA DEL PILAR CERÓN BENAVIDES DIRECTORA	SOLICITUD MEZCLA ASFÁLTICA PARA REPARACIONES DE PAVIMENTO EN RUTA 2501A, PR15-PR29, MEDIANTE CONTRATO 4121 DE 2024.
14/08/2025	404-AMVNG5-CTO1982-2024	ALCALDÍA SAN JUAN DE PASTO	NICOLAS MARTIN TORO ALCALDE	CONSTRUCCIÓN DE VÍA DE ACCESO A VIVIENDA SOBRE MARGEN DERECHO DE LA VÍA EN PR19+0930.
14/08/2025	405-AMVNG5-CTO1982-2024	ALCALDÍA MUNICIPIO DE LA UNIÓN	JAVIER MONTENEGRO ALCALDE	ACOPIO DE ESCOMBROS, OBSTRUCCIÓN DE CUNETA Y CALZADA SOBRE MARGEN DERECHO DE LA VÍA EN PR91+0830
15/08/2025	406-AMVNG5-CTO1982-2024	ALCALDÍA MUNICIPIO DE LA UNIÓN	JAVIER MONTENEGRO ALCALDE	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, OBSTRUCCIÓN DE CUNETA Y CALZADA SOBRE MARGEN DERECHO DE LA VÍA EN PR92+0250

FECHA	CONSECUTIVO	DESTINATARIO	DEPENDENCIA	ASUNTO
15/08/2025	407-AMVNG5-CTO1982-2024	ALCALDÍA MUNICIPIO DE BUESACO	OSWALDO PABÓN DIAZ ALCALDE	SOLICITUD DE ATENCIÓN AL CONDUCTO REGULAR PARA OBTENER PERMISOS DE CIERRE TOTAL DE VÍA - RUTA 25 TRAMO 01A EN EL MARCO DEL FESTIVAL DE VERANO AGROEXPO BUESACO 2025.
19/08/2025	408-AMVNG5-CTO1982-2024	JOSE TITO CHAGUENDO QUILINDO	REPRESENTANTE LEGAL COOPERATIVA CALIBIO	INVITACIÓN A CAPACITACIÓN MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.
19/08/2025	409-AMVNG5-CTO1982-2024	MARÍA LEONELA BURBANO	R/L COOPERATIVA LA GRAN VÍA	INVITACIÓN A CAPACITACIÓN MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.
19/08/2025	410-AMVNG5-CTO1982-2024	JOSE SILVIO YAMAC	REPRESENTANTE LEGAL COOPERATIVA INTEGRACIÓN EL ENCANO	INVITACIÓN A CAPACITACIÓN MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.
19/08/2025	411-AMVNG5-CTO1982-2024	MILTON FABIAN GÓMEZ	REPRESENTANTE LEGAL COOPERATIVA INTEGRACIÓN EL ENCANO	INVITACIÓN A CAPACITACIÓN MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.

5.2CORRESPONDENCIA RECIBIDA:

NÚMERO	FECHA RECIBIDO EN CORREO	ENVIADO POR	RESPONSABLE Y DEPENDENCIA	ASUNTO
2025I-VBOG-055972	01/08/2025	INVIAS	JAIRO WILLIAM TORRES BECERRA SUBDIRECTOR DE GESTIÓN DEL RIESGO	REITERACIÓN SOLICITUD ACTUALIZACIÓN DE ESTADO DE PUNTOS CRÍTICOS.
2025I-VBOG-043404 y 2025I-VBOG-056579	04/08/2025	INVIAS	JAIRO WILLIAM TORRES BECERRA SUBDIRECTOR DE GESTIÓN DEL RIESGO	Reiteración memorando 2025I-VBOG-043404 directorio de contactos de emergencia e inventario de maquinaria y equipos
2025I-VBOG-056748	04/08/2025	INVIAS	BLANCA LILIANA HERNÁNDEZ CARBALLO SUBDIRECTORA DE REGLAMENTACIÓN TÉCNICA E INNOVACIÓN (E)	Solicitud Viabilidad Cierre de Vías por Evento 9 Vuelta a Nariño
-	05/08/2025	ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA UNIÓN	JAIME JAVIER MONTENEGRO TORRES ALCALDE	Solicitud de autorización para cierre temporal de la Vía Intermunicipal: “Buesaco - La Unión – Higuerones, Ruta 2501A.”
GS-2025-136853-DENAR	05/08/2025	POLICÍA NACIONAL	DAYANNA LOPEZ CORDOBA PATRULLERA SECCIONAL TRANSITO Y TRANSPORTE DEPARTAMENTO DE POLICIA DE NARIÑO	Respuesta a solicitud reporte de accidentalidad mes de julio.
2025I-VBOG-058639	11/08/2025	INVIAS	SIRLEY DABEIBA MERCHÁN CARREÑO Subdirectora de Planificación de Infraestructura	Invitación a mesas de trabajo para socialización y presentación de resultados de entregables desarrollados en el marco del Contrato 4040-24:
2025E-VUVR-081991	15/08/2025	Carlos Torres Montero	Carlos Torres Montero CONTRATISTA	derecho de petición contrato 2019 de 2024

NÚMERO	FECHA RECIBIDO EN CORREO	ENVIADO POR	RESPONSABLE Y DEPENDENCIA	ASUNTO
-	19/08/2025	ACUABUESACO	WITHMAN PASCUAZA GERENTE	respuesta reiteración alcantarilla sin tapa y deficientemente señalización vía 2501a pr035+0820 carril derecho, Buesaco.
-	20/08/2025	INVIAS	JONNY ANDRÉS FAJARDO ROSERO SUPERVISOR CONTRATO 1982-2024	Remisión de documento designación de supervisor.

6. ACTAS DE PAGO PARCIALES, ACUMULADOS Y SALDOS POR EJECUTAR.

A continuación, se relacionan las actas de obra hasta la fecha y el saldo actual del contrato:

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	SALDO
Valor Inicial	12/09/2024	$ 4.050.198.082,00		$ 4.050.198.082,00
Adiciones	-	-	-	-
Acta No.1	12 al 30 de septiembre de 2024	**$ 4.050.198.082,00**	$ 55.830.078,00	$ 3.994.368.004,00
Acta No.2	01 al 31 de octubre de 2024	**$ 4.050.198.082,00**	$ 77.889.022,00	$ 3.916.478.982,00
Acta No.3	01 al 30 de noviembre de 2024	**$ 4.050.198.082,00**	$ 86.900.464,00	$ 3.829.578.518,00
Acta No.4	01 al 31 de diciembre de 2024	**$ 4.050.198.082,00**	$ 89.423.264,00	$ 3.740.155.254,00
Acta No.5	01 al 31 de enero de 2025	**$ 4.050.198.082,00**	$ 89.734.092,00	$ 3.650.421.162,00
Acta No.6	01 al 28 de febrero de 2025	**$ 4.050.198.082,00**	$ 89.734.092,00	$ 3.560.687.070,00
Acta No.7	01 al 31 de marzo de 2025	**$ 4.050.198.082,00**	$ 138.537.658,00	$ 3.422.149.412,00
Acta No.8	01 al 30 de abril de 2025	**$ 4.050.198.082,00**	$ 97.837.754,00	$ 3.324.311.658,00
Acta No.9	01 al 31 de mayo de 2025	**$ 4.050.198.082,00**	$ 117.812.856,00	$ 3.206.498.802,00
Acta No.10	01 al 30 de junio de 2025	**$ 4.050.198.082,00**	$ 96.628.000,00	$ 3.109.870.802,00
Acta No.11	01 al 31 de julio de 2025	**$ 4.050.198.082,00**	$ 91.739.718,00	$ 3.018.131.084,00
Acta No.12	01 al 31 de agosto de 2025	**$ 4.050.198.082,00**	$ 137.869.116,00	$ 2.880.261.968,00
TOTALES		**$ 4.050.198.082,00**	**$ 1.169.936.114,00**	**$ 2.880.261.968,00**

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se ejecutaron obras menores de mitigación de daños en calzada en las rutas 2501A PR 36+0368, 37+0830, 38+0004, 38+0232, 38+0322, 38+0567 y 38+0660. En la ruta 1003 en PR14+0980.

- Se hizo seguimiento a las actividades de las CTA y llamados de atención respectivos para el cumplimiento de indicadores.

- Se recorrió las vías a cargo en 19 de los 31 días del mes de agosto de 2025: los domingos y festivos las CTA se encargan de verificar el estado de la vía e informar novedades. Los días 7 y 18 de agosto fueron días festivos.

- Equipo de profesionales de la AMVNG5 ejecutaron sus funciones a cabalidad atendiendo las obligaciones contractuales y se cumple con entrega de informes y gestiones a tiempo.

- En cumplimiento de funciones administrativas la AMVGN5, envió comunicados a diferentes entidades para la atención oportuna a requerimientos de tipo técnico, ambiental, gestión predial, entre otros.

- Se pidió autorización para ejecución de recursos de insumos a la supervisión del contrato para la elaboración de colombinas.

- Se pidió autorización para ejecución de recursos de insumos a la supervisión del contrato para la compra de pintura y realizar la señalización horizontal de escuelas.

- Se realizó capacitación mensual por parte de la administración vial a las microempresas encargadas del mantenimiento rutinario: para el mes de agosto los invitados fueron personal de CORPONARIÑO.

- AMVNG5 informa e invita a la dirección general del INVIAS Nariño para la solución de problemas técnicos en inestabilidad de la banca en las rutas 2501A y 1003.

- Se recomienda por parte de la administración vial a INVIAS, realizar los debidos estudios técnicos especializados (topografía, geotecnia, hidrología e hidráulica), los cuales son requeridos para identificar planos de falla, evaluar riesgos y diseñar o determinar soluciones para los sitios críticos de las rutas 1003 y 2501A.

- Se recomienda al INVIAS actuar de manera inmediata en la atención del sitio critico PR29+0620 de la ruta 1003, con el fin de evitar el colapso total de la banca y en inversiones de mayor magnitud en un futuro. con el fin de realizar una intervención pronta, se recomienda además, realizarla con recursos del contrato 1111 de 2021 cuyo objeto CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MODULO 1.
Donde en su clausula séptima en el parágrafo segundo menciona:

> *PARÁGRAFO SEGUNDO: Toda vez que el plazo del presente contrato excede la actual vigencia fiscal, existe autorización para comprometer vigencias futuras según Oficio No. 5.2.0.1, Referencia 2-2021-020941 de fecha 26 de abril de 2021, suscrito por la Secretaria Ejecutiva del Consejo Superior de Política Fiscal – CONFIS - del Ministerio de Hacienda y 2401, Subprograma 0600, Proyecto 0123 denominado CONSTRUCCIÓN,*

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA TUMACO – PASTO - MOCOA DE LA TRANSVERSAL TUMACO - MOCOA EN LOS DEPARTAMENTOS DE NARIÑO, PUTUMAYO, recursos nación, con número de autorización SIIF Nación 11521 del 27 de abril de 2021, así: vigencia 2022: $20.379.255.249, vigencia 2023: $30.528.000.000, vigencia 2024: $61.056.000.000, vigencia 2025: $71.232.000.000, vigencia 2026: $81.408.000.000, vigencia 2027: $76.320.000.000, vigencia 2028: $71.232.000.000, vigencia 2029: $61.056.000.000 y vigencia 2030: $106.848.000.000. Lo anterior de conformidad con la distribución de recursos contenida en el Memorando No. DT 37430 del 28 de mayo de 2021.

- la gestión SST de la administración vial realizó charlas de seguridad, pausas activas y control de alcoholemia a los conductores, entre otras labores. Se gestionó capacitación por parte de la ARL SURA el día12 de agosto de 2025 para el personal del CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024.

ANEXO NO.1 - REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto No. 14. 04/08/2025. Levantamiento informacion de señales para informe accidentalidad PR38+0785. Ruta 2501A.



Foto No. 15. 04/08/2025. Levantamiento informacion de señales para informe accidentalidad PR76+0200. Ruta 2501A



Foto No. 16. 05/08/2025. Estado de obra de mitigacion finalizada. PR30+0840 ruta 2501A.



Foto No. 17. 05/08/2025. Estado de cuneta reconstruida en obra de mitigación. PR30+0840 ruta2501A



Foto No. 18.04/08/2025. Recorrido técnico puente La Rinconada PR84+0570 ruta 2501A.



Foto No. 19. 05/08/2025. Medición de derrumbe PR15+0800 ruta 1003.



Foto No. 20. 05/08/2025. Instrucciones a cooperativa El Encano por parte de AMV.PR14+0685 ruta 1003.



Foto No. 21. 05/08/2025. Verificacion de estado de obra de mitigacion de erosion de talud. PR27+0100 ruta 1003.



Foto No. 22. 05/08/2025. Atencion emergencia por parte de cooperativa el Encano y recomendaciones por parte de AMV. PR32+0180. Ruta 1003



Foto No. 23. 05/08/2025Atencion emergencia por parte de cooperativa el Encano. PR32+0180. Ruta 1003.



Foto No. 24. 05/082025. Estado de sitio critico – avance en severidad de daños en carril derecho. PR29+0620. Ruta 1003.



Foto No. 25. Panorámica Estado de sitio critico – avance en severidad de daños en carril derecho. PR29+0620. Ruta 1003.



Foto No. 26. Instrucciones e implementación PMT para actividad de sello de junta de construcción reductores de velocidad Buesaco. Reductor N1. PR36+0368. Ruta 2501A



Foto No. 27. 08/08/2025. Inspección a tubería alcantarilla PR32+0180. Ruta 1003.



Foto No. 28. 11/08/2025. Sello de fisuras en juntas de construcción reductores de velocidad. Reductor N5. PR38+0320. Ruta 2501A.



Foto No. 29. 11/08/2025. Sello de fisuras en juntas de construcción reductores de velocidad. Reductor N7. PR38+0660. Ruta 2501A



Foto No. 30. 12/08/2025. Medición de magnitud de baches para solicitud asfalto. PR27+0900. Ruta 2501A.



Foto No. 31. 12/08/2025. Charla con integrantes de cooperativa La Gran Vía. PR20+0800. Ruta2501A.



Foto No. 32. 12/08/2025. Capacitación para AMV con ARL SURA. Datos observatorio nacional de seguridad vial.



Foto No. 33. Capacitación para AMV con ARL SURA. Tips para preoperacional de vehículos y manejo defensivo.



Foto No. 34. 12/08/2025. Inspección diaria a cooperativa Calibio por parte de AMV. PR40+0710. Ruta 2501A.



Foto No. 35. 12/08/2025.Inspección a daño en carril izquierdo. PR40+0740. Ruta 2501A.



Foto No. 36. 13/08/2025. Charla técnica a cooperativa Calibio por parte de AMV. PR45+0000. Ruta 2501A.



Foto No. 37. Charla técnica a cooperativa El prado por parte de AMV. PR76+0640. Ruta 2501A



Foto No. 38. 13/08/2025. Inspección a obra de mitigación de daños en falla geológica. PR14+0980. Ruta 1003.



Foto No. 39. 13/08/2025. Charla a cooperativa La Gran Vía por parte de AMV. PR30+0840. Ruta 2501A.



Foto No. 40. 14/08/2025. Visita técnica por parte de subdirector nacional del INVIAS Javier Cañón, contratista e interventoría de obra y AMV. PR86+0250. Ruta 2501A.



Foto No. 41. 14/08/2025. Visita técnica por parte de subdirector nacional del INVIAS Javier Cañón, contratista e interventoría de obra y AMV. PR86+0300. Ruta 2501A



Foto No. 42. 13/08/2025. Emergencia por incendio aparentemente provocado. Talud superior margen derecho. PR34+0910.



Foto No. 43. 15/08/2025. Charla técnica con personal de cooperativa El Encano. PR11+0430. Ruta 1003.



Foto No. 44. 15/08/2025. Tapa de alcantarilla arreglada por Acuabuesaco. PR35+0810. Ruta 2501A.



Foto No. 45. 20/08/2025. Charla de seguridad por parte de AMV a cooperativa Calibio. PR43+0830.



Foto No. 46. 20/08/2025. Entrega de cinta de peligro AMV a cooperativa El Encano. PR23+0600. Ruta 1003.



Foto No. 47. 20/08/2025. Charla de seguridad a cooperativa el Prado. PR74+0300. Ruta 2501A.





Foto No. 48. 20/08/2025. Prueba de alcoholimetría a conductor 1 AMV.





Foto No. 49. 20/08/2025. Prueba de alcoholimetría a conductor 1 AMV.



Foto No. 50. 21/08/2025. Charla de seguridad con SST de AMV.



Foto No. 51. 21/08/2025. Pausa activa personal AMV.



Foto No. 52. 22/08/2025. Capacitación mensual cooperativas de trabajo.



Foto No. 53. 22/08/2025. Capacitación mensual cooperativas de trabajo.



Foto No. 54. 25/08/2025. Pintura de escuelas con ítem de insumos y mano de obra de las cooperativas. Ruta 2501A.



Foto No. 55. 25/08/2025. Pintura de escuelas con ítem de insumos y mano de obra de las cooperativas. Ruta 2501A.



Foto No. 56. 25/08/2025. Pintura de escuelas con ítem de insumos y mano de obra de las cooperativas. Ruta 2501A.



Foto No. 57. 25/08/2025. Pintura de escuelas con ítem de insumos y mano de obra de las cooperativas. Ruta 2501A.



Foto No. 58. 25/08/2025. Pintura de escuelas con ítem de insumos y mano de obra de las cooperativas. Ruta 2501A.



Foto No. 59. 25/08/2025. Pintura de escuelas con ítem de insumos y mano de obra de las cooperativas. Ruta 2501A.



Foto No. 60. 26/08/2025. Pintura de resaltos con ítem de insumos y mano de obra de las cooperativas. Ruta 2501A.



Foto No. 61. 26/08/2025. Pintura de resaltos con ítem de insumos y mano de obra de las cooperativas. Ruta 2501A.



Foto No. 62. 26/08/2025. Pausa activa, personal de AMV.



Foto No. 63. 26/08/2025. Pausa activa, personal de AMV.
