
Emsercota S.A.

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO AQUA

ACTA PARCIAL N°	3		FECHA DE CORTE	DD	6	MM	6	AA	2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA								
CONTRATISTA	CONSORCIO AQUA		NIT O C.C.	901.707.176-1		CONTRATO No.		No. 112-2023	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA		NIT O C.C.	900.124.654-4		CONTRATO No.		No. 117-2023	

COMPONENTE	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD		HOJA		
ALCANTARILLADO SANITARIO. PARCELAS GLOBO 1	ICCU - 2.10 Construcción	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3		1	DE	4

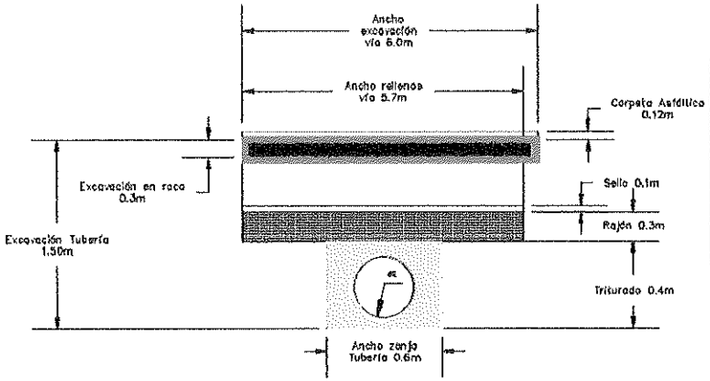



	ABSCISADO		DIMENSIONES			
UBICACIÓN	INICIO	FIN	LONG.	ANCHO	ALTO	TOTAL
MH30A-MH30	K0+000,00	K0+002,90	2,90	6,00	0,30	5,22
MH30-MH38B	K0+002,90	K0+014,90	12,00	6,00	0,30	21,60
MH38B-MH38	K0+014,90	K0+059,70	44,80	6,00	0,30	80,64
MH38-MH37	K0+059,70	K0+116,74	57,04	6,00	0,30	102,67
MH37-MH36	K0+116,74	K0+176,72	59,98	6,00	0,30	107,96
MH36-MH35	K0+176,72	K0+236,54	59,82	6,00	0,30	107,68
MH35-MH34	K0+236,54	K0+296,42	59,88	6,00	0,30	107,78
MH34-MH33	K0+296,42	K0+356,22	59,80	6,00	0,30	107,64
MH33-MH32	K0+356,22	K0+416,24	60,02	6,00	0,30	108,04
MH32-MH31	K0+416,24	K0+465,00	48,76	6,00	0,30	87,77
		TOTAL				837,00

TOTAL	837,00

OBSERVACIONES

BALANCE DE CANTIDADES	
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0,0
A PAGAR PRESENTE ACTA	837,00
ACUMULADO	837,00

EPIFANIO VELASQUEZ LEAL
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO AQUA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
REPRESENTANTE LEGAL

639


Emsercota S.A.

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO AQUA

ACTA PARCIAL N°	1		FECHA DE CORTE	DD	6	MM	6	AA	2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA								
CONTRATISTA	CONSORCIO AQUA		NIT O C.C.	901.707.176-1		CONTRATO No.		No. 112-2023	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA		NIT O C.C.	900.124.654-4		CONTRATO No.		No. 117-2023	

COMPONENTE	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD		HOJA		
ALCANTARILLADO SANITARIO. PARCELAS GLOBO 1	ICCU - 2.10 Construcción	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3		2	DE	4

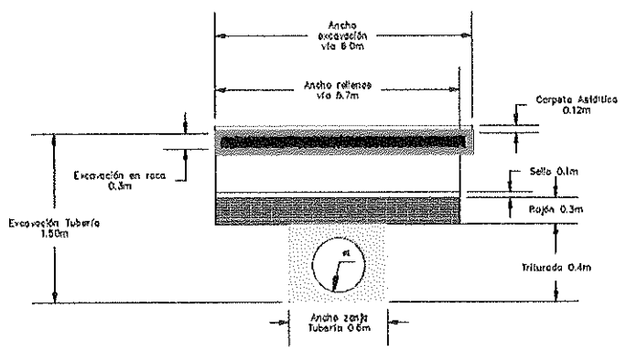



		COTAS		DIMENSIONES			
UBICACIÓN	ABSCISADO	SUPERIOR	INFERIOR	ALTO	LONG.	ANCHO	TOTAL
MH30A-MH30	K0+000,00	2576,237	2575,937	0,300			
MH30	K0+002,90	2576,263	2575,963	0,300	2,90	6,00	5,22
MH38B	K0+014,90	2576,372	2576,072	0,300	12,00	6,00	21,60
MH38	K0+059,70	2576,779	2576,479	0,300	44,80	6,00	80,64
MH37	K0+116,74	2577,398	2577,098	0,300	57,04	6,00	102,67
MH36	K0+176,72	2577,976	2577,676	0,300	59,98	6,00	107,96
MH35	K0+236,54	2578,489	2578,189	0,300	59,82	6,00	107,68
MH34	K0+296,42	2578,964	2578,664	0,300	59,88	6,00	107,78
MH33	K0+356,22	2579,395	2579,095	0,300	59,80	6,00	107,64
MH32	K0+416,24	2579,758	2579,458	0,300	60,02	6,00	108,04
MH32-MH31	K0+465,00	2579,983	2579,683	0,300	48,76	6,00	87,77
			TOTAL				837,00

OBSERVACIONES

TOTAL	837,00
BALANCE DE CANTIDADES	
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0,0
A PAGAR PRESENTE ACTA	837,00
ACUMULADO	837,00

EPIFANIO VELASQUEZ LEAL
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO AQUA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
REPRESENTANTE LEGAL

032

Emsercota S.A.


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO AQUA

ACTA PARCIAL N°	3		FECHA DE CORTE	DD	6	MM	6	AA	2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA								
CONTRATISTA	CONSORCIO AQUA		NIT O C.C.	901.707.176-1		CONTRATO No.		No. 112-2023	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA		NIT O C.C.	900.124.654-4		CONTRATO No.		No. 117-2023	

COMPONENTE	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD		HOJA		
ALCANTARILLADO SANITARIO. PARCELAS GLOBO 1	ICCU - 2.10 Construcción	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3		3	DE	4

ESQUEMAS

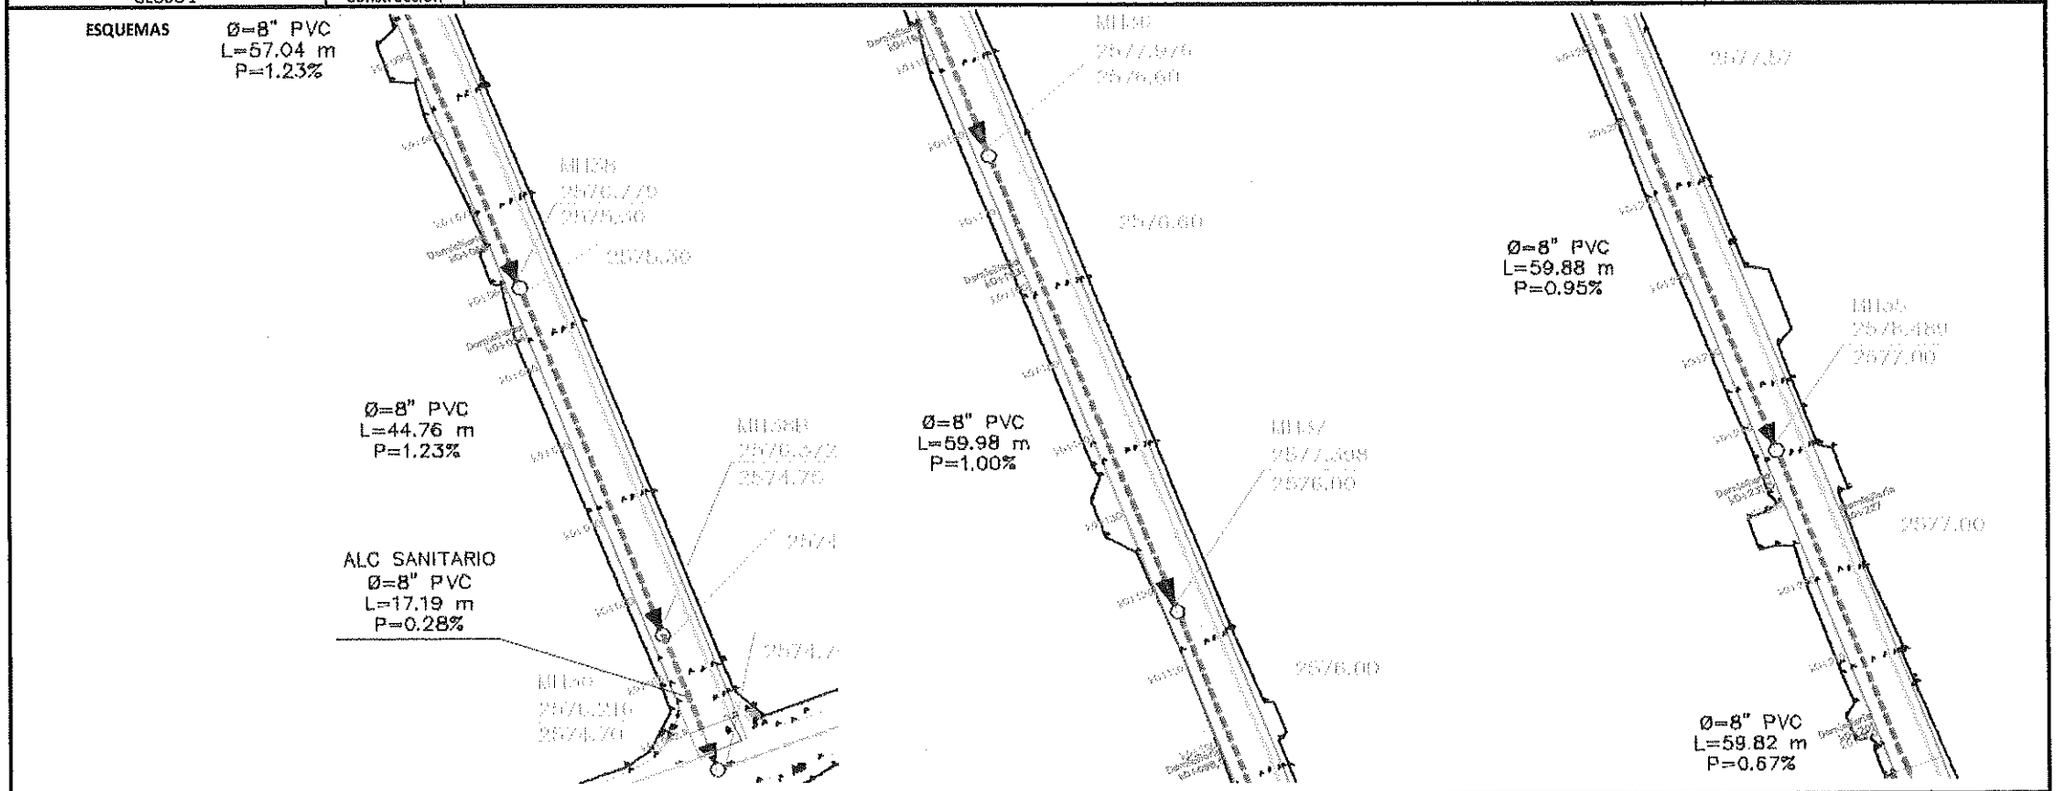

OBSERVACIONES

TOTAL	837,00
BALANCE DE CANTIDADES	
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0,0
A PAGAR PRESENTE ACTA	837,00
ACUMULADO	837,00

EPIFANIO VELASQUEZ LEAL
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO AQUA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
REPRESENTANTE LEGAL

640

Emsercota S.A.


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO AQUA

ACTA PARCIAL N°	3		FECHA DE CORTE	DD	6	MM	6	AA	2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA								
CONTRATISTA	CONSORCIO AQUA		NIT O C.C.	901.707.176-1		CONTRATO No.		No. 112-2023	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA		NIT O C.C.	900.124.654-4		CONTRATO No.		No. 117-2023	

COMPONENTE	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD		HOJA		
ALCANTARILLADO SANITARIO. PARCELAS GLOBO 1	ICCU - 2.10 Construcción	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3		4	DE	4

ESQUEMAS

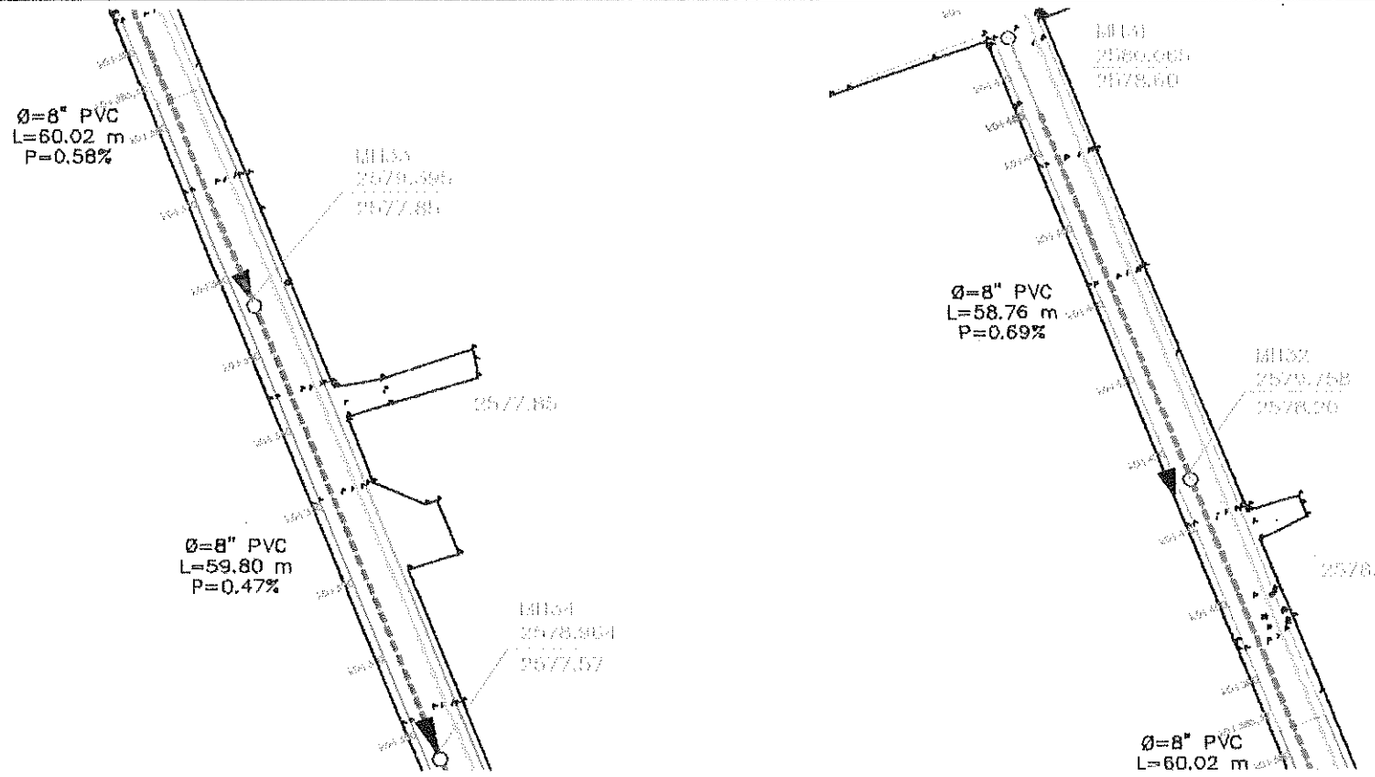

OBSERVACIONES

TOTAL	837,00
BALANCE DE CANTIDADES	
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0,0
A PAGAR PRESENTE ACTA	837,00
ACUMULADO	837,00

EPIFANIO VELASQUEZ LEAL
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO AQUA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
REPRESENTANTE LEGAL


Emsercota S.A.


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO AQUA

ACTA PARCIAL N°	3		FECHA DE CORTE	DD	6	MM	6	AA	2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA								
CONTRATISTA	CONSORCIO AQUA		NIT O C.C.	901.707.176-1		CONTRATO No.		No. 112-2023	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA		NIT O C.C.	900.124.654-4		CONTRATO No.		No. 117-2023	

COMPONENTE	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD		HOJA		
ALCANTARILLADO SANITARIO. PARCELAS GLOBO 1	EPC - 4.5.4	ENTIBADO TIPO 3 METALICO	M2		1	DE	3

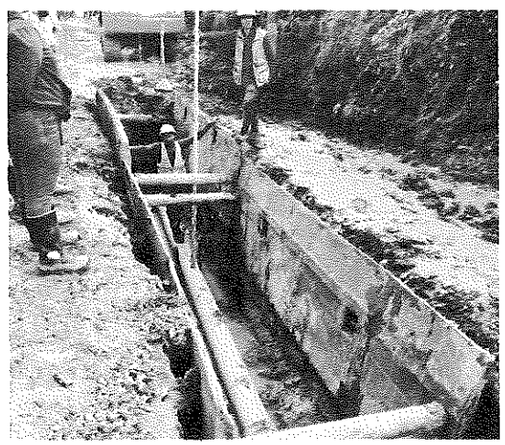

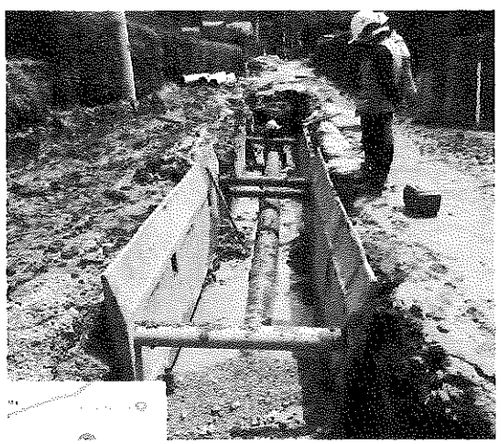

	ABSCISADO		DIMENSIONES			
UBICACIÓN	INICIO	FIN	LONG.	ALTO	CARAS	TOTAL
MH47-MH74	K0+007,77	K0+067,77	60,00	2,22	2,00	266,84
MH74-MH75	K0+067,77	K0+137,83	70,06	1,78	2,00	249,34
		TOTAL				516,19

OBSERVACIONES

TOTAL	516,19
BALANCE DE CANTIDADES	
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0,0
A PAGAR PRESENTE ACTA	516,19
ACUMULADO	516,19

EPIFANIO VELASQUEZ LEAL
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO AQUA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
REPRESENTANTE LEGAL

642


Emsercota S.A.


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO AQUA

ACTA PARCIAL N°	1		FECHA DE CORTE	DD	6	MM	6	AA	2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA							
CONTRATISTA	CONSORCIO AQUA		NIT O C.C.	901.707.176-1		CONTRATO No.		No. 112-2023	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA		NIT O C.C.	900.124.654-4		CONTRATO No.		No. 117-2023	

COMPONENTE	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD		HOJA		
ALCANTARILLADO SANITARIO. PARCELAS GLOBO 1	EPC - 4.5.4	ENTIBADO TIPO 3 METALICO	M2		2	DE	3

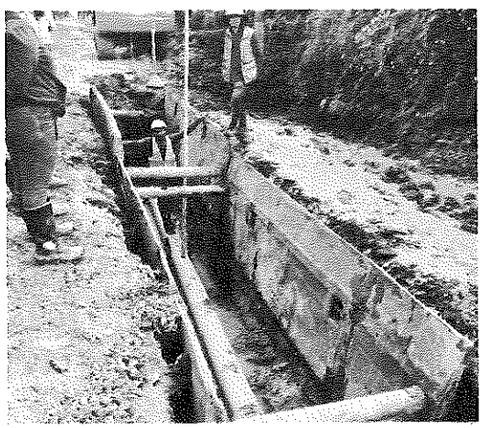

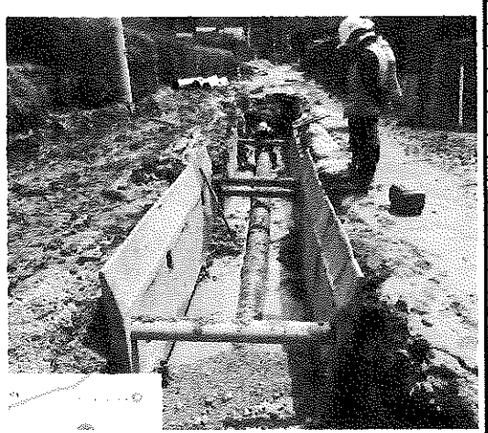

		COTAS		DIMENSIONES			
UBICACIÓN	ABSCISADO	SUPERIOR	INFERIOR	ALTO	LONG.	CARAS	TOTAL
MH47-MH74	K0+007,77	2574,428	2571,753	2,674			
MH74	K0+067,77	2573,433	2571,660	1,773	60,00	2,00	266,84
MH75	K0+137,83	2572,276	2570,490	1,786	70,06	2,00	249,34
			TOTAL				516,19

OBSERVACIONES

TOTAL	516,19
BALANCE DE CANTIDADES	
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0,0
A PAGAR PRESENTE ACTA	516,19
ACUMULADO	516,19

EPIFANIO VELASQUEZ LEAL
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO AQUA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
REPRESENTANTE LEGAL

95

Emsercota S.A.


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


CONSORCIO AQUA

ACTA PARCIAL N°	3		FECHA DE CORTE	DD	6	MM	6	AA	2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA								
CONTRATISTA	CONSORCIO AQUA		NIT O C.C.	901.707.176-1		CONTRATO No.		No. 112-2023	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA		NIT O C.C.	900.124.654-4		CONTRATO No.		No. 117-2023	

COMPONENTE	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD		HOJA		
ALCANTARILLADO SANITARIO. PARCELAS GLOBO 1	EPC - 4.5.4	ENTIBADO TIPO 3 METALICO	M2		3	DE	3

ESQUEMAS

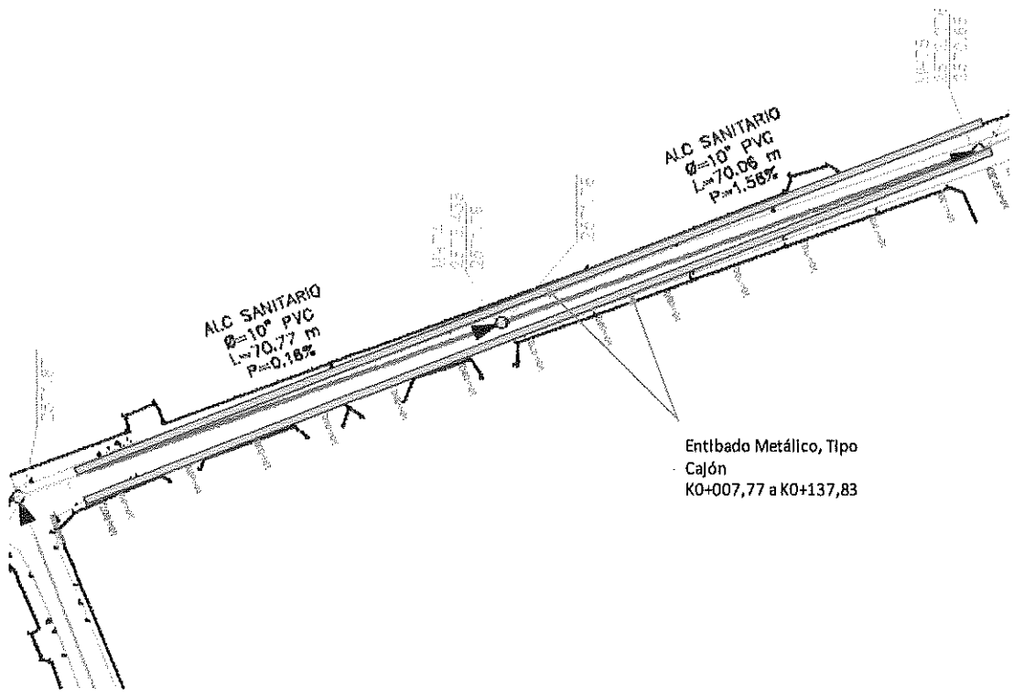

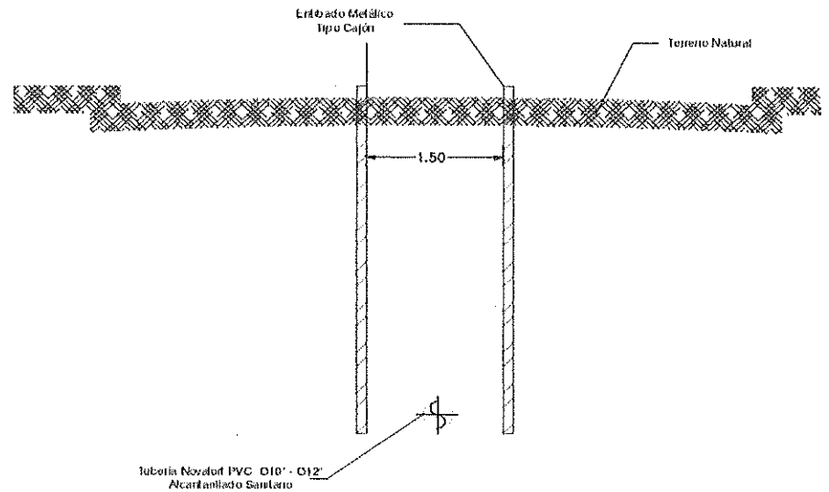

OBSERVACIONES

TOTAL	516,19
BALANCE DE CANTIDADES	
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0,0
A PAGAR PRESENTE ACTA	516,19
ACUMULADO	516,19

EPIFANIO VELASQUEZ LEAL
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO AQUA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
REPRESENTANTE LEGAL


Emsercota S.A.

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


CONSORCIO AQUA

ACTA PARCIAL N°	3		FECHA DE CORTE	DD	6	MM	6	AA	2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA								
CONTRATISTA	CONSORCIO AQUA		NIT O C.C.	901.707.176-1		CONTRATO No.		No. 112-2023	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA		NIT O C.C.	900.124.654-4		CONTRATO No.		No. 117-2023	

COMPONENTE	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD		HOJA		
ALCANTARILLADO SANITARIO, PARCELAS GLOBO 1	ICCU - 16.9 Construcción	RELLENO GRAVILLA DE RÍO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3		1	DE	4





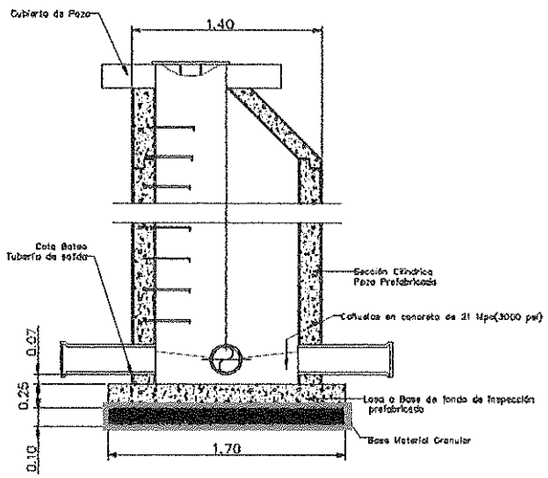

UBICACIÓN	ABSCISADO INICIO	ABSCISADO FIN	DIMENSIONES LONG.	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES ALTO	SUBTOTAL	Descuento VOL. TUBO	TOTAL
Relleno Gravilla Tubería Alcantarillado PVC 8"								
MH30-MH38B	K0+002,90	K0+014,90	12,00	0,6	0,4	2,88	-0,38	2,50
MH38B-MH38	K0+014,90	K0+059,70	44,80	0,6	0,4	10,75	-1,41	9,34
MH38-MH37	K0+059,70	K0+116,74	57,04	0,6	0,4	13,69	-1,79	11,90
MH37-MH36	K0+116,74	K0+176,72	59,98	0,6	0,4	14,40	-1,88	12,51
MH36-MH35	K0+176,72	K0+236,54	59,82	0,6	0,4	14,36	-1,88	12,48
MH35-MH34	K0+236,54	K0+296,42	59,88	0,6	0,4	14,37	-1,88	12,49
MH34-MH33	K0+296,42	K0+356,22	59,80	0,6	0,4	14,35	-1,88	12,47
MH33-MH32	K0+356,22	K0+416,24	60,02	0,6	0,4	14,40	-1,89	12,52
MH32-MH31	K0+416,24	K0+465,00	48,76	0,6	0,4	11,70	-1,53	10,17
Relleno Gravilla Tubería Alcantarillado PVC 10"								
MH47-MH74	K0+007,77	K0+067,77	60,00	1,5	0,45	40,50	-2,95	37,55
MH74-MH75	K0+067,77	K0+137,83	70,06	1,5	0,45	47,29	-3,44	43,85
Relleno Gravilla Conexión Domiciliaria 8" x 6"								
MH38B-MH38 (C.Izq)	K0+054,00		4,30	0,60	0,36	0,93	-0,09	0,84
MH38-MH37 (C.Izq)	K0+066,00		4,50	0,60	0,36	0,97	-0,09	0,88
MH38-MH37 (C.Izq)	K0+098,50		3,90	0,60	0,36	0,84	-0,08	0,76
MH37-MH36 (C.Izq)	K0+163,00		3,90	0,60	0,36	0,84	-0,08	0,76
MH36-MH35 (C.Izq)	K0+194,00		3,90	0,60	0,36	0,84	-0,08	0,76
MH36-MH35 (C.Izq)	K0+201,00		3,80	0,60	0,36	0,82	-0,08	0,74
MH36-MH35 (C.Izq)	K0+231,50		3,80	0,60	0,36	0,82	-0,08	0,74
MH36-MH35 (C. Der)	K0+227,00		6,50	0,60	0,36	1,40	-0,13	1,27
MH35-MH34 (C. Der)	K0+255,00		6,50	0,60	0,36	1,40	-0,13	1,27
MH34-MH33 (C. Der)	K0+337,00		6,80	0,60	0,36	1,47	-0,14	1,33
MH34-MH33 (C. Der)	K0+340,00		6,50	0,60	0,36	1,40	-0,13	1,27
MH30-MH38B (C.Izq)	K0+020,00		6,40	0,60	0,36	1,38	-0,13	1,25
MH33-MH32 (C.Der)	K0+374,00		6,00	0,60	0,36	1,30	-0,12	1,18
MH33-MH32 (C.Der)	K0+406,00		6,40	0,60	0,36	1,38	-0,13	1,25
MH33-MH32 (C.Izq)	K0+408,00		5,00	0,60	0,36	1,08	-0,10	0,98
Relleno Gravilla Pozos (Manholes)								
MH38B	K0+014,90		1,70	1,70	0,100	0,29		0,29
MH38	K0+059,70		1,70	1,70	0,100	0,29		0,29
MH37	K0+116,74		1,70	1,70	0,100	0,29		0,29
MH36	K0+176,72		1,70	1,70	0,100	0,29		0,29
MH35	K0+236,54		1,70	1,70	0,100	0,29		0,29
MH34	K0+296,42		1,70	1,70	0,100	0,29		0,29
MH33	K0+356,22		1,70	1,70	0,100	0,29		0,29
MH32	K0+416,24		1,70	1,70	0,100	0,29		0,29
MH30	K0+002,90		1,70	1,70	0,100	0,29		0,29
MH74	K0+137,83		1,70	1,70	0,100	0,29		0,29
				TOTAL				196,00

OBSERVACIONES

Descuento Tubería: Volumen Tubería PVC 8" (200mm) = 3,14 x (0,20^2) / 4 x Long. Tubería
Volumen Tubería PVC 6" (160mm) = 3,14 x (0,16^2) / 4 x Long. Tubería
Volumen Tuberí PVC 10" (250mm) = 3,14 x (0,25^2)/4 x Long. Tubería

TOTAL	196,00
BALANCE DE CANTIDADES	
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0,0
A PAGAR PRESENTE ACTA	196,00
ACUMULADO	196,00

EPIFANIO VELASQUEZ LEAL
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO AQUA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
REPRESENTANTE LEGAL


Emsercota S.A.


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO AQUA

ACTA PARCIAL N°	1	FECHA DE CORTE	DD	6	MM	6	AA	2025	
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA								
CONTRATISTA	CONSORCIO AQUA	NIT O C.C.	901.707.176-1		CONTRATO No.		No. 112-2023		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA	NIT O C.C.	900.124.654-4		CONTRATO No.		No. 117-2023		

COMPONENTE	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD		HOJA		
ALCANTARILLADO SANITARIO, PARCELAS GLOBO 1	ICCU - 16.9 Construcción	RELLENO GRAVILLA DE RÍO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3		2	DE	4

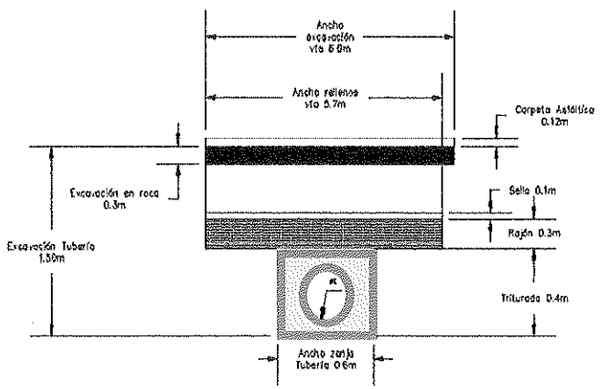

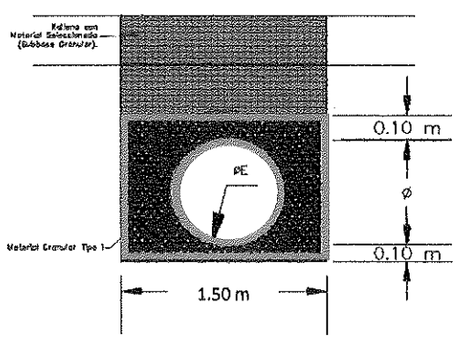

UBICACIÓN	ABSCISADO	COTAS SUPERIOR	COTAS INFERIOR	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES LONG.	DIMENSIONES ANCHO	SUBTOTAL	Descuento VOL. TUBO	TOTAL
Relleno Gravilla Tubería Alcantarillado PVC 8"									
MH30-MH38B	K0+002,90	2575,015	2574,615	0,400					
MH38B	K0+014,90	2575,050	2574,650	0,400	12,00	0,60	2,88	-0,38	2,50
MH38	K0+059,70	2575,600	2575,200	0,400	44,80	0,60	10,75	-1,41	9,34
MH37	K0+116,74	2576,300	2575,900	0,400	57,04	0,60	13,69	-1,79	11,90
MH36	K0+176,72	2576,900	2576,500	0,400	59,98	0,60	14,40	-1,88	12,51
MH35	K0+236,54	2577,300	2576,900	0,400	59,82	0,60	14,36	-1,88	12,48
MH34	K0+296,42	2577,870	2577,470	0,400	59,88	0,60	14,37	-1,88	12,49
MH33	K0+356,22	2578,150	2577,750	0,400	59,80	0,60	14,35	-1,88	12,47
MH32	K0+416,24	2578,500	2578,100	0,400	60,02	0,60	14,40	-1,89	12,52
MH32-MH31	K0+465,00	2578,832	2578,432	0,400	48,76	0,60	11,70	-1,53	10,17
Relleno Gravilla Tubería Alcantarillado PVC 10"									
MH47-MH74	K0+007,77	2572,203	2571,753	0,450					
MH74	K0+067,77	2572,110	2571,660	0,450	60,00	1,50	40,50	-2,95	37,55
MH75	K0+137,83	2570,940	2570,490	0,450	70,06	1,50	47,29	-3,44	43,85
Relleno Gravilla Conexión Domiciliaria 8" x 6"									
MH38B-MH38 (C.Izq)	K0+054,00			0,36	4,30	0,60	0,93	-0,09	0,84
MH38-MH37 (C.Izq)	K0+066,00			0,36	4,50	0,60	0,97	-0,09	0,88
MH38-MH37 (C.Izq)	K0+098,50			0,36	3,90	0,60	0,84	-0,08	0,76
MH37-MH36 (C.Izq)	K0+163,00			0,36	3,90	0,60	0,84	-0,08	0,76
MH36-MH35 (C.Izq)	K0+194,00			0,36	3,90	0,60	0,84	-0,08	0,76
MH36-MH35 (C.Izq)	K0+201,00			0,36	3,80	0,60	0,82	-0,08	0,74
MH36-MH35 (C.Izq)	K0+231,50			0,36	3,80	0,60	0,82	-0,08	0,74
MH36-MH35 (C. Der)	K0+227,00			0,36	6,50	0,60	1,40	-0,13	1,27
MH35-MH34 (C. Der)	K0+255,00			0,36	6,50	0,60	1,40	-0,13	1,27
MH34-MH33 (C. Der)	K0+337,00			0,36	6,80	0,60	1,47	-0,14	1,33
MH34-MH33 (C. Der)	K0+340,00			0,36	6,50	0,60	1,40	-0,13	1,27
MH30-MH38B (C.Izq)	K0+020,00			0,36	6,40	0,60	1,38	-0,13	1,25
MH33-MH32 (C.Der)	K0+374,00			0,36	6,00	0,60	1,30	-0,12	1,18
MH33-MH32 (C.Der)	K0+406,00			0,36	6,40	0,60	1,38	-0,13	1,25
MH33-MH32 (C.Izq)	K0+408,00			0,36	5,00	0,60	1,08	-0,10	0,98
Relleno Gravilla Pozos (Manhole)									
MH38B	K0+014,90	2574,330	2574,230	0,10	1,70	1,70	0,29		0,29
MH38	K0+059,70	2574,880	2574,780	0,10	1,70	1,70	0,29		0,29
MH37	K0+116,74	2575,580	2575,480	0,10	1,70	1,70	0,29		0,29
MH36	K0+176,72	2576,180	2576,080	0,10	1,70	1,70	0,29		0,29
MH35	K0+236,54	2576,580	2576,480	0,10	1,70	1,70	0,29		0,29
MH34	K0+296,42	2577,150	2577,050	0,10	1,70	1,70	0,29		0,29
MH33	K0+356,22	2577,430	2577,330	0,10	1,70	1,70	0,29		0,29
MH32	K0+416,24	2577,780	2577,680	0,10	1,70	1,70	0,29		0,29
MH30	K0+002,90	2574,308	2574,208	0,10	1,70	1,70	0,29		0,29
MH74	K0+137,83	2571,340	2571,240	0,10	1,70	1,70	0,29		0,29
					TOTAL				196,00

OBSERVACIONES

Descuento Tubería: Volumen Tubería PVC 8" (200mm) = 3,14 x (0,20^2) / 4 x Long. Tubería
Volumen Tubería PVC 6" (160mm) = 3,14 x (0,16^2) / 4 x Long. Tubería
Volumen Tuberí PVC 10" (250mm) = 3,14 x (0,25^2) / 4 x Long. Tubería

TOTAL	196,00
BALANCE DE CANTIDADES	
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0,0
A PAGAR PRESENTE ACTA	196,00
ACUMULADO	196,00

EPIFANIO VELASQUEZ LEAL
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO AQUA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORÍA
CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
REPRESENTANTE LEGAL

646

Emsercota S.A.

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


CONSORCIO AQUA

ACTA PARCIAL N°	3	FECHA DE CORTE	DD	6	MM	6	AA	2025	
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA								
CONTRATISTA	CONSORCIO AQUA	NIT O C.C.	901.707.176-1	CONTRATO No.	No. 112-2023				
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA	NIT O C.C.	900.124.654-4	CONTRATO No.	No. 117-2023				

COMPONENTE	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD		HOJA		
ALCANTARILLADO SANITARIO. PARCELAS GLOBO 1	ICCU - 16.9 Construcción	RELLENO GRAVILLA DE RÍO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3		3	DE	4

ESQUEMAS

Red Alcantarillado - Sector Summer Hill (Del MH30 a MH31)

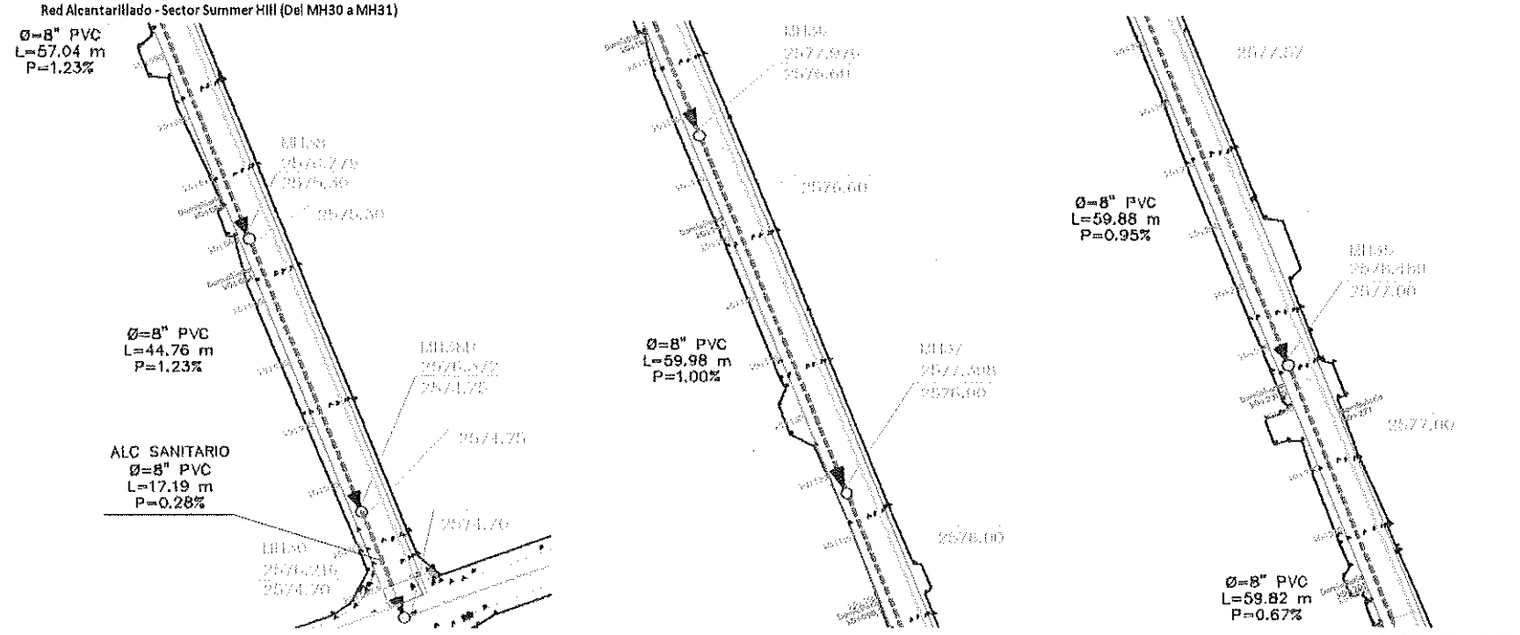

OBSERVACIONES

TOTAL	196,00
BALANCE DE CANTIDADES	
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0,0
A PAGAR PRESENTE ACTA	196,00
ACUMULADO	196,00

EPIFANIO VELASQUEZ LEAL
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO AQUA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
REPRESENTANTE LEGAL

642

Emsercota S.A.

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


CONSORCIO AQUA


ACTA PARCIAL N°	3	FECHA DE CORTE	DD	6	MM	6	AA	2025	
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA							
CONTRATISTA	CONSORCIO AQUA	NIT O C.C.	901.707.176-1	CONTRATO No.	No. 112-2023			
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA	NIT O C.C.	900.124.654-4	CONTRATO No.	No. 117-2023			

COMPONENTE	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD		HOJA		
ALCANTARILLADO SANITARIO. PARCELAS GLOBO 1	ICCU - 16.9 Construcción	RELLENO GRAVILLA DE RÍO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3		4	DE	4


ESQUEMAS

Red Alcantarillado - Sector Summer Hill (Del MH30 a MH31)

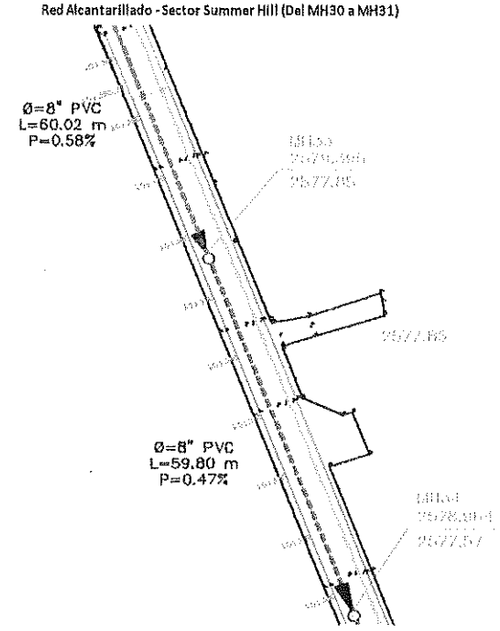

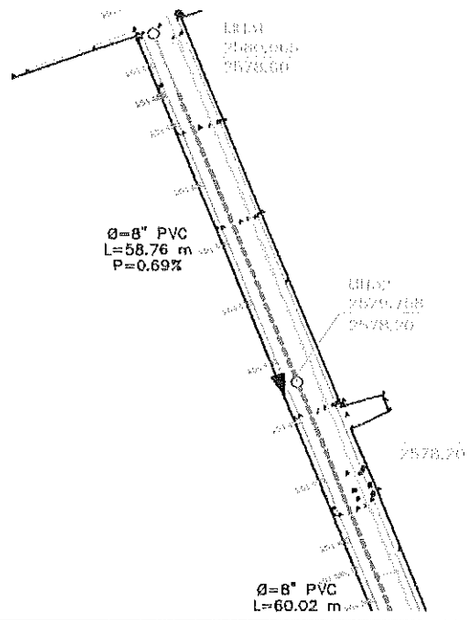

Red Alcantarillado - Sector Culebrera (Del MH47 a MH75)

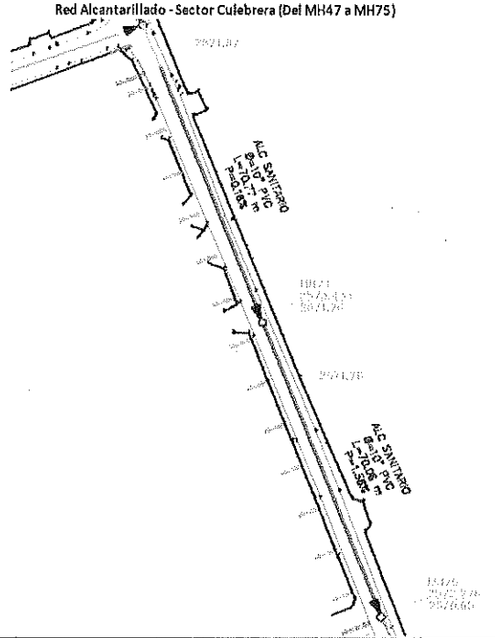

OBSERVACIONES

TOTAL	196,00
BALANCE DE CANTIDADES	
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0,0
A PAGAR PRESENTE ACTA	196,00
ACUMULADO	196,00

EPIFANIO VELASQUEZ LEAL
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO AQUA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
REPRESENTANTE LEGAL

Emsercota S.A.


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO AQUA

ACTA PARCIAL N°	3	FECHA DE CORTE	DD	6	MM	6	AA	2025	
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA								
CONTRATISTA	CONSORCIO AQUA	NIT O C.C.	901.707.176-1	CONTRATO No.	No. 112-2023				
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA	NIT O C.C.	900.124.654-4	CONTRATO No.	No. 117-2023				

COMPONENTE	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD		HOJA		
ALCANTARILLADO SANITARIO. PARCELAS GLOBO 1	ICCU - 2.9 Urbanismo	RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA"	M3		1	DE	3



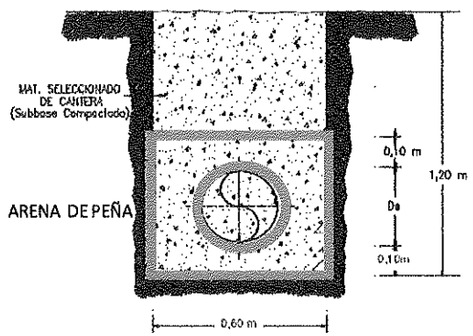

DETALLE EXCAVACION TUBERIA PEAD IMPULSION CULEBRERA

	ABSCISADO		DIMENSIONES				Descuento	
UBICACIÓN	INICIO	FIN	LONG.	ANCHO	ALTO	SUBTOTAL	VOL. TUBO	TOTAL
Línea 1 - CHICU (V.Principal)	K0+000,00	K0+092,70	92,70	0,60	0,36	20,02	-1,86	18,16
Línea 1 - CHICU (V.Principal)	K0+092,70	K0+564,80	472,10	0,60	0,36	101,97	-9,49	92,48
Línea 1 - CHICU (V.Culebrera)	K0+564,80	K0+715,00	150,20	0,60	0,36	32,44	-3,02	29,42
Línea 1 - CHICU (V.Culebrera)	K0+715,00	K0+960,00	245,00	0,60	0,36	52,92	-4,93	47,99
					TOTAL			188,06

OBSERVACIONES

Esta cantidad corresponde a material instalado en la Impulsión Culebrera, desde el K0+000,00 al K0+960,00

Descuento de Tubería = Volumen Tubería PEAD 160 = 3,14 x (0,160^2) / 4 x Long. Tubería

TOTAL	188,06

BALANCE DE CANTIDADES

PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0,0
A PAGAR PRESENTE ACTA	188,06
ACUMULADO	188,06

EPIFANIO VELASQUEZ LEAL
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO AQUA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
REPRESENTANTE LEGAL

0,9

Emsercota S.A.


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO AQUA


ACTA PARCIAL N°	3	FECHA DE CORTE	DD	6	MM	6	AA	2025	
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA							
CONTRATISTA	CONSORCIO AQUA	NIT O C.C.	901.707.176-1	CONTRATO No.	No. 112-2023			
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA	NIT O C.C.	900.124.654-4	CONTRATO No.	No. 117-2023			

COMPONENTE	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD		HOJA		
ALCANTARILLADO SANITARIO. PARCELAS GLOBO 1	ICCU - 2.9 Urbanismo	RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA"	M3		2	DE	3


ESQUEMAS

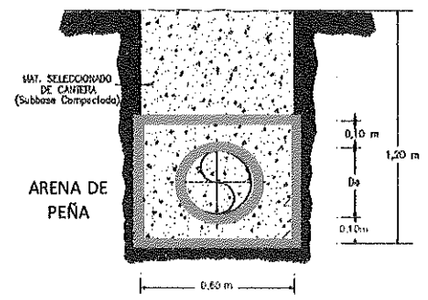

DETALLE EXCAVACION TUBERIA PEAD IMPULSION CULEBRERA

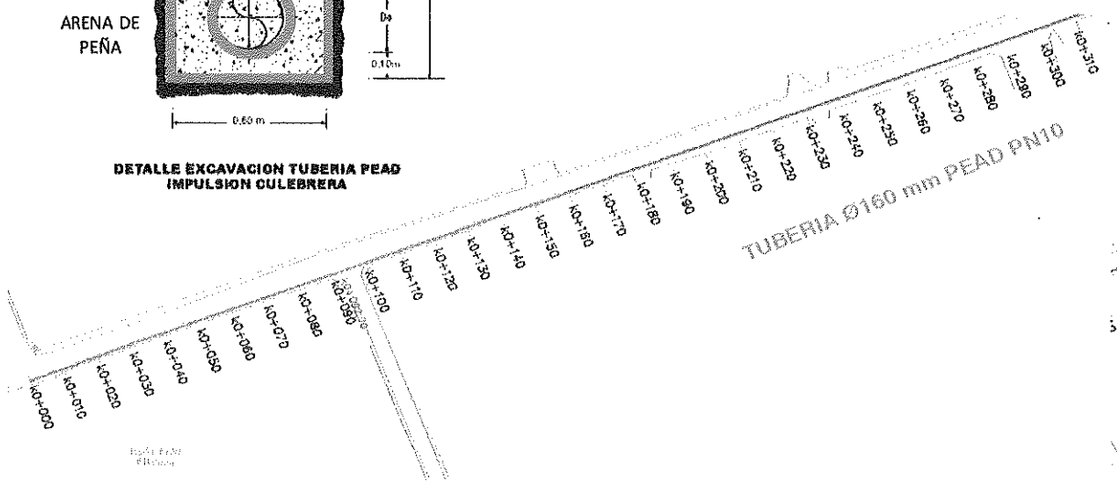

Tubería PEAD 160mm - Impulsión
Línea Chicu
k0+000,00 - k0+960,00

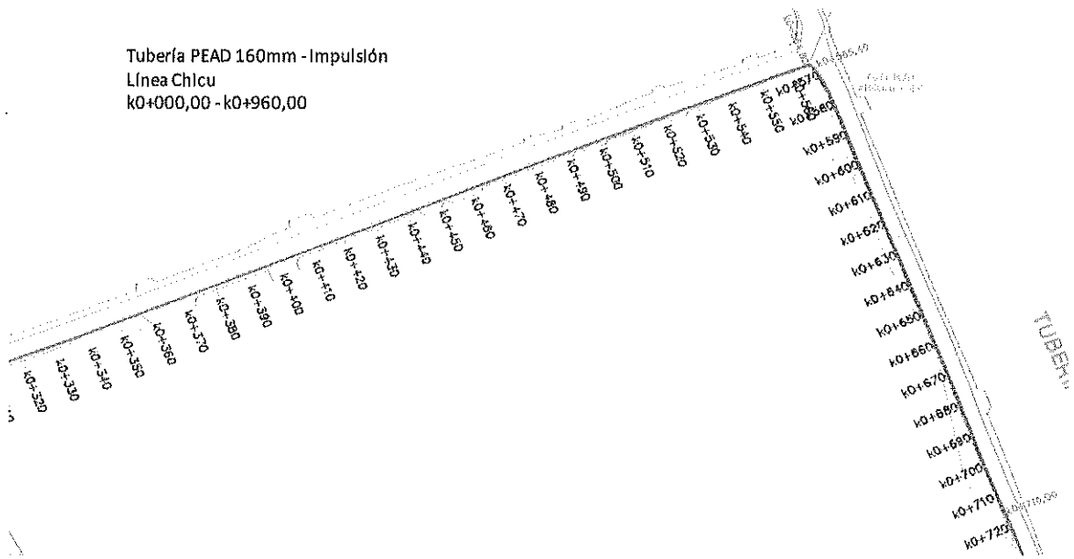

OBSERVACIONES

Esta cantidad corresponde a material instalado en la Impulsión Culebrera, desde el K0+000,00 al K0+960,00

Descuento de Tubería = Volumen Tubería PEAD 160 = 3,14 x (0,160^2) / 4 x Long. Tubería

TOTAL	**188,06**
BALANCE DE CANTIDADES	
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0,0
A PAGAR PRESENTE ACTA	188,06
SALDO POR EJECUTAR	188,06

EPIFANIO VELASQUEZ LEAL
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO AQUA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
REPRESENTANTE LEGAL

6/10

Emsercota S.A.


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO AQUA

ACTA PARCIAL N°	3	FECHA DE CORTE	DD	6	MM	6	AA	2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA							
CONTRATISTA	CONSORCIO AQUA	NIT O C.C.	901.707.176-1	CONTRATO No.	No. 112-2023			
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA	NIT O C.C.	900.124.654-4	CONTRATO No.	No. 117-2023			

COMPONENTE	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD		HOJA		
IMPULSION CULEBRERA	ICCU - 16.10 Construcción	RELLENO AGREGADO EN MATERIAL DE BASE COMPACTADO MECANICAMENTE	M3		3	DE	3

ESQUEMAS

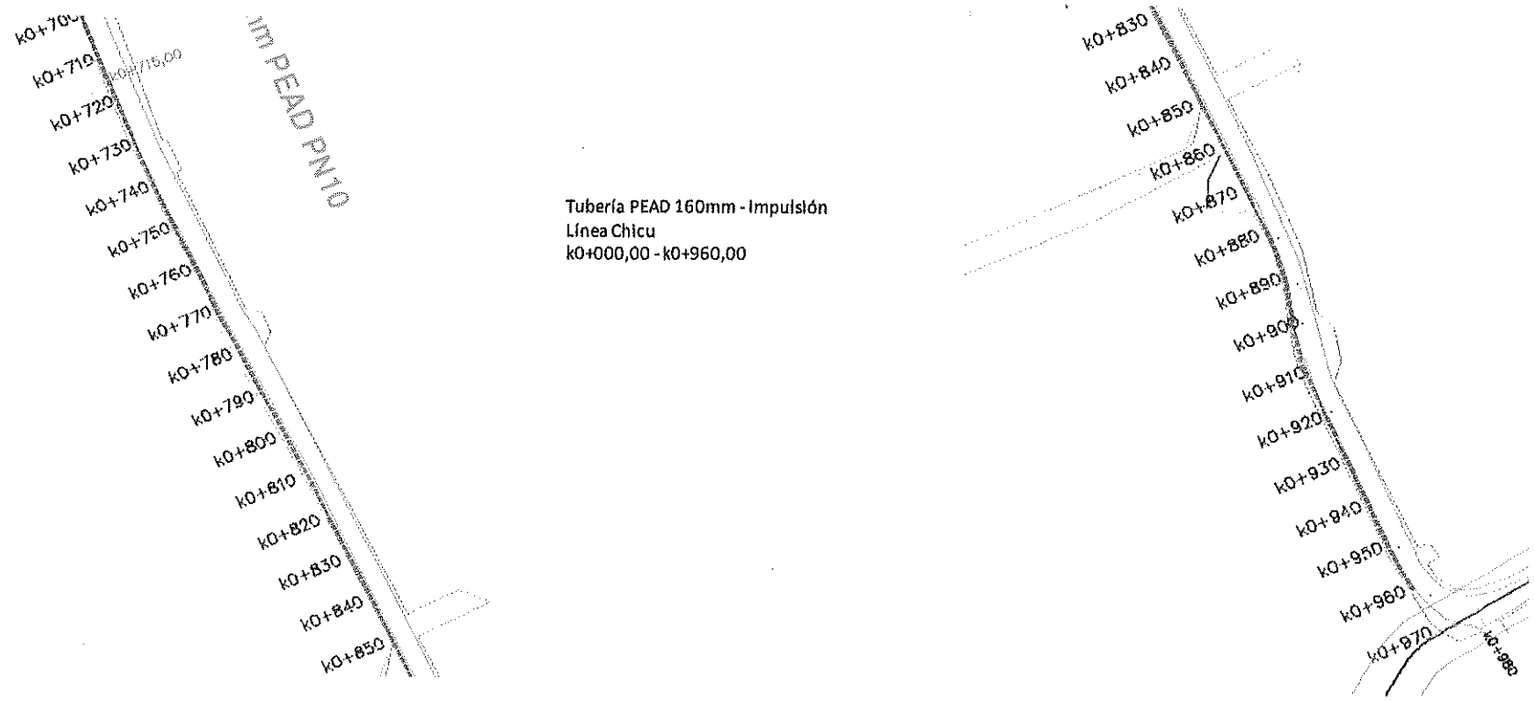

Tubería PEAD 160mm - Impulsión
Línea Chicu
k0+000,00 - k0+960,00

OBSERVACIONES

Esta cantidad corresponde a material instalado en la Impulsión Culebrera, desde el K0+000,00 al K0+960,00

Descuento de Tubería = Volumen Tubería PEAD 160 = 3,14 x (0,160^2) / 4 x Long. Tubería

TOTAL	188,06
BALANCE DE CANTIDADES	
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0,0
A PAGAR PRESENTE ACTA	188,06
ACUMULADO	188,06

EPIFANIO VELASQUEZ LEAL
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO AQUA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
REPRESENTANTE LEGAL


Emsercota S.A.


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


CONSORCIO AQUA

ACTA PARCIAL N°	3	FECHA DE CORTE	DD	6	MM	6	AA	2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA							
CONTRATISTA	CONSORCIO AQUA	NIT O C.C.	901.707.176-1	CONTRATO No.		No. 112-2023		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA	NIT O C.C.	900.124.654-4	CONTRATO No.		No. 117-2023		

COMPONENTE	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD		HOJA		
ALCANTARILLADO SANITARIO. PARCELAS GLOBO 1	ICCU - 1.6 Vías	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3/KM		1	DE	1

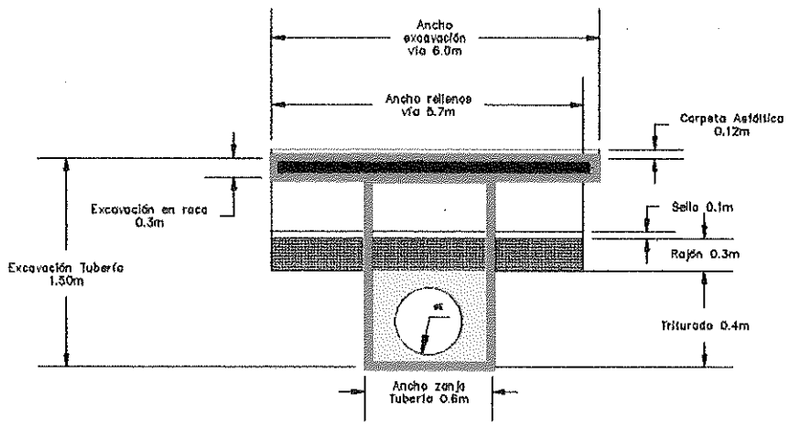

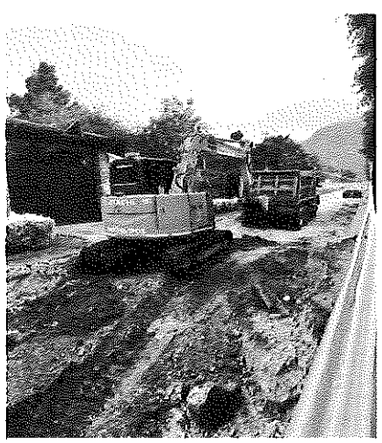

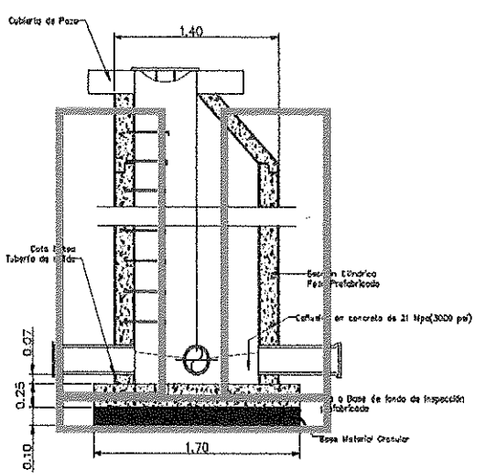

	ABSCISADO		DIMENSIONES			ACARREO		
UBICACIÓN	INICIO	FIN	LONG.	ANCHO	ALTO	EXPANSION	KM	TOTAL
Transporte Excavación Instalación Tubería Alcantarillado PVC 8" (Zanja de Instalación)								
MH30-MH38B	K0+002,90	K0+014,90	12,00	0,60	1,26	1,3	24	283,05
MH38B-MH38	K0+014,90	K0+059,70	44,80	0,60	1,23	1,3	24	1032,02
MH38-MH37	K0+059,70	K0+116,74	57,04	0,60	1,12	1,3	24	1194,37
MH37-MH36	K0+116,74	K0+176,72	59,98	0,60	1,07	1,3	24	1198,07
MH36-MH35	K0+176,72	K0+236,54	59,82	0,60	1,11	1,3	24	1245,93
MH35-MH34	K0+236,54	K0+296,42	59,88	0,60	1,12	1,3	24	1257,17
MH34-MH33	K0+296,42	K0+356,22	59,80	0,60	1,15	1,3	24	1286,67
MH33-MH32	K0+356,22	K0+416,24	60,02	0,60	1,23	1,3	24	1383,76
MH32-MH31	K0+416,24	K0+465,00	48,76	0,60	1,16	1,3	24	1058,83
Transporte Excavación Instalación Tubería Alcantarillado PVC 10" (Zanja de Instalación)								
MH47-MH74	K0+007,77	K0+067,77	60,00	1,50	2,22	1,3	24	6239,76
MH74-MH75	K0+067,77	K0+137,83	70,06	1,50	1,78	1,3	24	5836,28
Transporte Excavación Instalación Conexión Dmiciliaria 8" x 6"								
MH38B-MH38 (C.Izq)	K0+054,00		4,30	0,60	0,50	1,3	24	40,25
MH38-MH37 (C.Izq)	K0+066,00		4,50	0,60	0,60	1,3	24	50,54
MH38-MH37 (C.Izq)	K0+098,50		3,90	0,60	0,70	1,3	24	51,11
MH37-MH36 (C.Izq)	K0+163,00		3,90	0,60	0,60	1,3	24	43,80
MH36-MH35 (C.Izq)	K0+194,00		3,90	0,60	0,70	1,3	24	51,11
MH36-MH35 (C.Izq)	K0+201,00		3,80	0,60	0,70	1,3	24	49,80
MH36-MH35 (C.Izq)	K0+231,50		3,80	0,60	0,60	1,3	24	42,68
MH36-MH35 (C. Der)	K0+227,00		6,50	0,60	0,60	1,3	24	73,01
MH35-MH34 (C. Der)	K0+255,00		6,50	0,60	0,90	1,3	24	109,51
MH34-MH33 (C. Der)	K0+337,00		6,80	0,60	0,80	1,3	24	101,84
MH34-MH33 (C. Der)	K0+340,00		6,50	0,60	0,80	1,3	24	97,34
MH30-MH38B (C.Izq)	K0+020,00		6,40	0,60	0,90	1,3	24	107,83
MH33-MH32 (C.Der)	K0+374,00		6,00	0,60	0,90	1,3	24	101,09
MH33-MH32 (C.Der)	K0+406,00		6,40	0,60	0,90	1,3	24	107,83
MH33-MH32 (C.Izq)	K0+408,00		5,00	0,60	0,90	1,3	24	84,24
Transporte Excavación Material de Excavación en Roca (ICCU - 2.10)								
MH30A-MH30	K0+000,00	K0+002,90	2,90	6,00	0,30	1,3	19	128,93
MH30-MH38B	K0+002,90	K0+014,90	12,00	6,00	0,30	1,3	19	533,52
MH38B-MH38	K0+014,90	K0+059,70	44,80	6,00	0,30	1,3	19	1991,81
MH38-MH37	K0+059,70	K0+116,74	57,04	6,00	0,30	1,3	19	2536,00
MH37-MH36	K0+116,74	K0+176,71	59,98	6,00	0,30	1,3	19	2666,71
MH36-MH35	K0+176,72	K0+236,54	59,82	6,00	0,30	1,3	19	2659,60
MH35-MH34	K0+236,54	K0+296,42	59,88	6,00	0,30	1,3	19	2662,26
MH34-MH33	K0+296,42	K0+356,22	59,80	6,00	0,30	1,3	19	2658,71
MH33-MH32	K0+356,22	K0+416,24	60,02	6,00	0,30	1,3	19	2668,49
MH32-MH31	K0+416,24	K0+465,00	48,76	6,00	0,30	1,3	19	2167,87
Transporte Demolición Pavimento (EPC - 2.1.2)								
MH30A-MH30	K0+000,00	K0+002,90	2,90	6,00	0,12		24	50,11
MH30-MH38B	K0+002,90	K0+014,90	12,00	6,00	0,12		24	207,36
MH38B-MH38	K0+014,90	K0+059,70	44,80	6,00	0,12		24	774,14
MH38-MH37	K0+059,70	K0+116,74	57,04	6,00	0,12		24	985,65
MH37-MH36	K0+116,74	K0+176,72	59,98	6,00	0,12		24	1036,45
MH36-MH35	K0+176,72	K0+236,54	59,82	6,00	0,12		24	1033,69
MH35-MH34	K0+236,54	K0+296,42	59,88	6,00	0,12		24	1034,73
MH34-MH33	K0+296,42	K0+356,22	59,80	6,00	0,12		24	1033,34
MH33-MH32	K0+356,22	K0+416,24	60,02	6,00	0,12		24	1037,15


Emsercota S.A.

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO AQUA

ACTA PARCIAL N°	3	FECHA DE CORTE	DD	6	MM	6	AA	2025	
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA							
CONTRATISTA	CONSORCIO AQUA	NIT O C.C.	901.707.176-1	CONTRATO No.	No. 112-2023			
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA	NIT O C.C.	900.124.654-4	CONTRATO No.	No. 117-2023			

COMPONENTE	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD		HOJA		
ALCANTARILLADO SANITARIO. PARCELAS GLOBO 1	ICCU - 1.6 Vias	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3/KM		1	DE	1

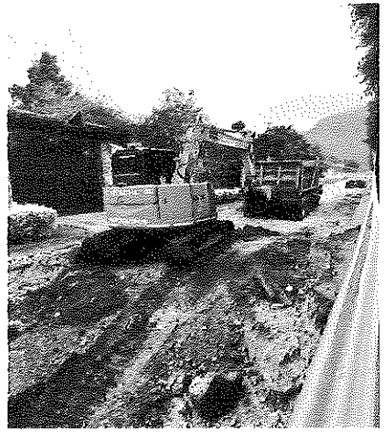

	ABSCISADO		DIMENSIONES			ACARREO		
UBICACIÓN	INICIO	FIN	LONG.	ANCHO	ALTO	EXPANSION	KM	TOTAL
MH32-MH31	K0+416,24	K0+465,00	48,76	6,00	0,12		24	842,57
Transporte Excavación Cajas Domiciliarias								
MH38B-MH38 (C.Izq)	K0+054,00		1,40	1,40	1,23	1,3	24	75,25
MH38-MH37 (C.Izq)	K0+066,00		1,40	1,40	1,12	1,3	24	68,40
MH38-MH37 (C.Izq)	K0+098,50		1,40	1,40	1,12	1,3	24	68,40
MH37-MH36 (C.Izq)	K0+163,00		1,40	1,40	1,07	1,3	24	65,25
MH36-MH35 (C.Izq)	K0+194,00		1,40	1,40	1,11	1,3	24	68,04
MH36-MH35 (C. Der)	K0+227,00		1,40	1,40	1,11	1,3	24	68,04
Transporte Excavación Pozos (Manholes)								
UBICACIÓN	INICIO	LONG.	ANCHO	ALTO	DESCUEN. POZO	EXPANSION	KM	TOTAL
MH38B	K0+014,90	2,30	2,30	1,062	-0,58	1,3	24	157,24
MH38	K0+059,70	2,30	2,30	0,919	-0,58	1,3	24	133,58
MH37	K0+116,74	2,30	2,30	0,838	-0,58	1,3	24	120,26
MH36	K0+176,72	2,30	2,30	0,816	-0,58	1,3	24	116,56
MH35	K0+236,54	2,30	2,30	0,929	-0,58	1,3	24	135,31
MH34	K0+296,42	2,30	2,30	0,834	-0,58	1,3	24	119,51
MH33	K0+356,22	2,30	2,30	0,985	-0,58	1,3	24	144,50
MH32	K0+416,24	2,30	2,30	0,938	-0,58	1,3	24	136,74
MH30	K0+002,90	2,30	2,30	0,975	-0,58	1,3	24	
MH74	K0+067,77	2,30	2,30	2,193	-7,22	1,3	24	
				TOTAL				53308,07

OBSERVACIONES

TOTAL	53308,07
BALANCE DE CANTIDADES	
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0,0
A PAGAR PRESENTE ACTA	53308,07
ACUMULADO	53308,07

EPIFANIO VELASQUEZ LEAL
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO AQUA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
REPRESENTANTE LEGAL

93


Emsercota S.A.


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO AQUA

ACTA PARCIAL N°	3		FECHA DE CORTE	DD	6	MM	6	AA	2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA								
CONTRATISTA	CONSORCIO AQUA		NIT O C.C.	901.707.176-1		CONTRATO No.		No. 112-2023	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA		NIT O C.C.	900.124.654-4		CONTRATO No.		No. 117-2023	

COMPONENTE	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD		HOJA		
ALCANTARILLADO SANITARIO, PARCELAS GLOBO 1	EPC - 8.1.3	INSTALACIÓN TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 8"	ML		1	DE	3

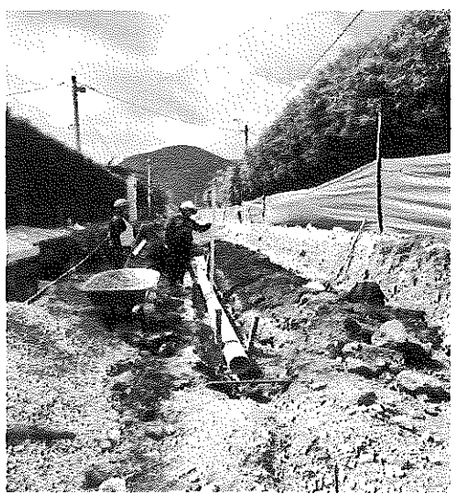

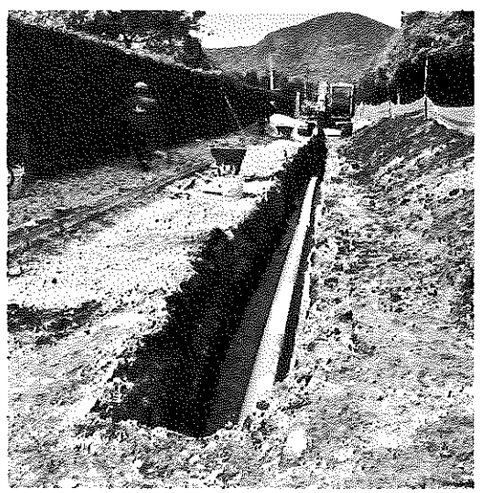

	ABSCISADO		DIMENSIONES			
UBICACIÓN	INICIO	FIN	LONG.	ANCHO	ALTO	TOTAL
Instalación Tubería Alcantarillado PVC 8"						
MH30-MH38B	K0+002,90	K0+014,90	12,00			12,00
MH38B-MH38	K0+014,90	K0+059,70	44,80			44,80
MH38-MH37	K0+059,70	K0+116,74	57,04			57,04
MH37-MH36	K0+116,74	K0+176,72	59,98			59,98
MH36-MH35	K0+176,72	K0+236,54	59,82			59,82
MH35-MH34	K0+236,54	K0+296,42	59,88			59,88
MH34-MH33	K0+296,42	K0+356,22	59,80			59,80
MH33-MH32	K0+356,22	K0+416,24	60,02			60,02
MH32-MH31	K0+416,24	K0+465,00	48,76			48,76
		TOTAL				462,10

OBSERVACIONES

TOTAL	462,10
BALANCE DE CANTIDADES	
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0,0
A PAGAR PRESENTE ACTA	462,10
ACUMULADO	462,10

EPIFANIO VELASQUEZ LEAL
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO AQUA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA QUIEDO
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
REPRESENTANTE LEGAL

Emsercota S.A.


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO AQUA

ACTA PARCIAL N°	3		FECHA DE CORTE	DD	6	MM	6	AA	2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA								
CONTRATISTA	CONSORCIO AQUA		NIT O C.C.	901.707.176-1		CONTRATO No.		No. 112-2023	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA		NIT O C.C.	900.124.654-4		CONTRATO No.		No. 117-2023	

COMPONENTE	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD		HOJA		
ALCANTARILLADO SANITARIO. PARCELAS GLOBO 1	EPC-8.1.3	INSTALACIÓN TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 8"	ML		2	DE	3

ESQUEMAS

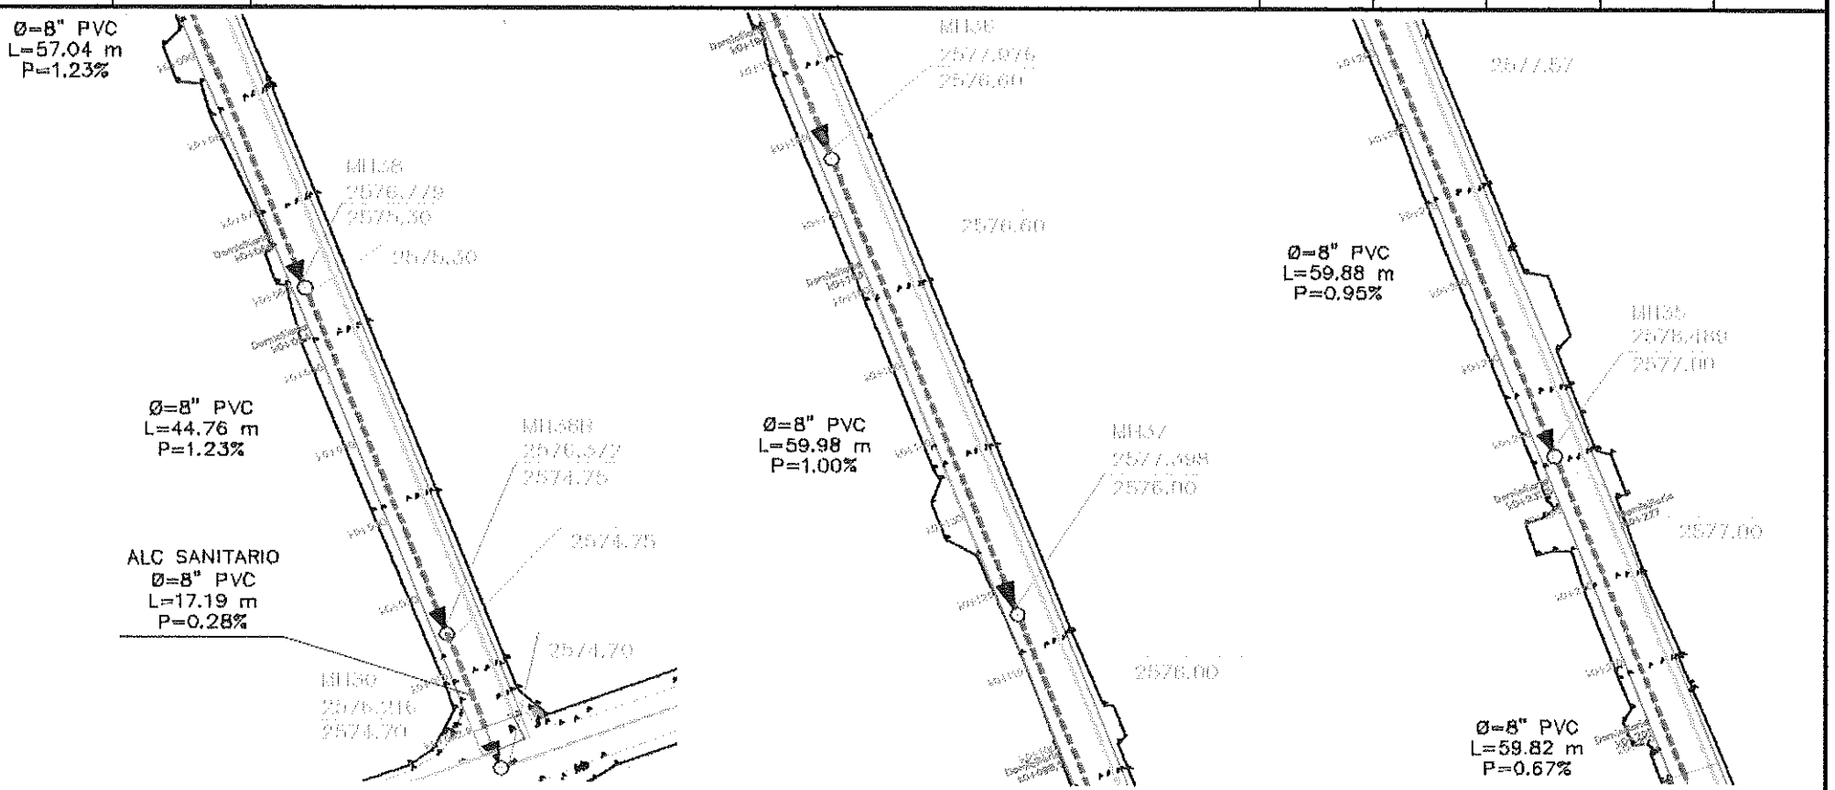

OBSERVACIONES

TOTAL	462,10
BALANCE DE CANTIDADES	
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0,0
A PAGAR PRESENTE ACTA	462,10
ACUMULADO	462,10

EPIFANIO VELASQUEZ LEAL
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO AQUA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
REPRESENTANTE LEGAL

Emsercota S.A.


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO AQUA

ACTA PARCIAL N°	3		FECHA DE CORTE	DD	6	MM	6	AA	2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA								
CONTRATISTA	CONSORCIO AQUA		NIT O C.C.	901.707.176-1		CONTRATO No.	No. 112-2023		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA		NIT O C.C.	900.124.654-4		CONTRATO No.	No. 117-2023		

COMPONENTE	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD		HOJA		
ALCANTARILLADO SANITARIO. PARCELAS GLOBO 1	EPC - 8.1.3	INSTALACIÓN TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 8"	ML		3	DE	3

ESQUEMAS

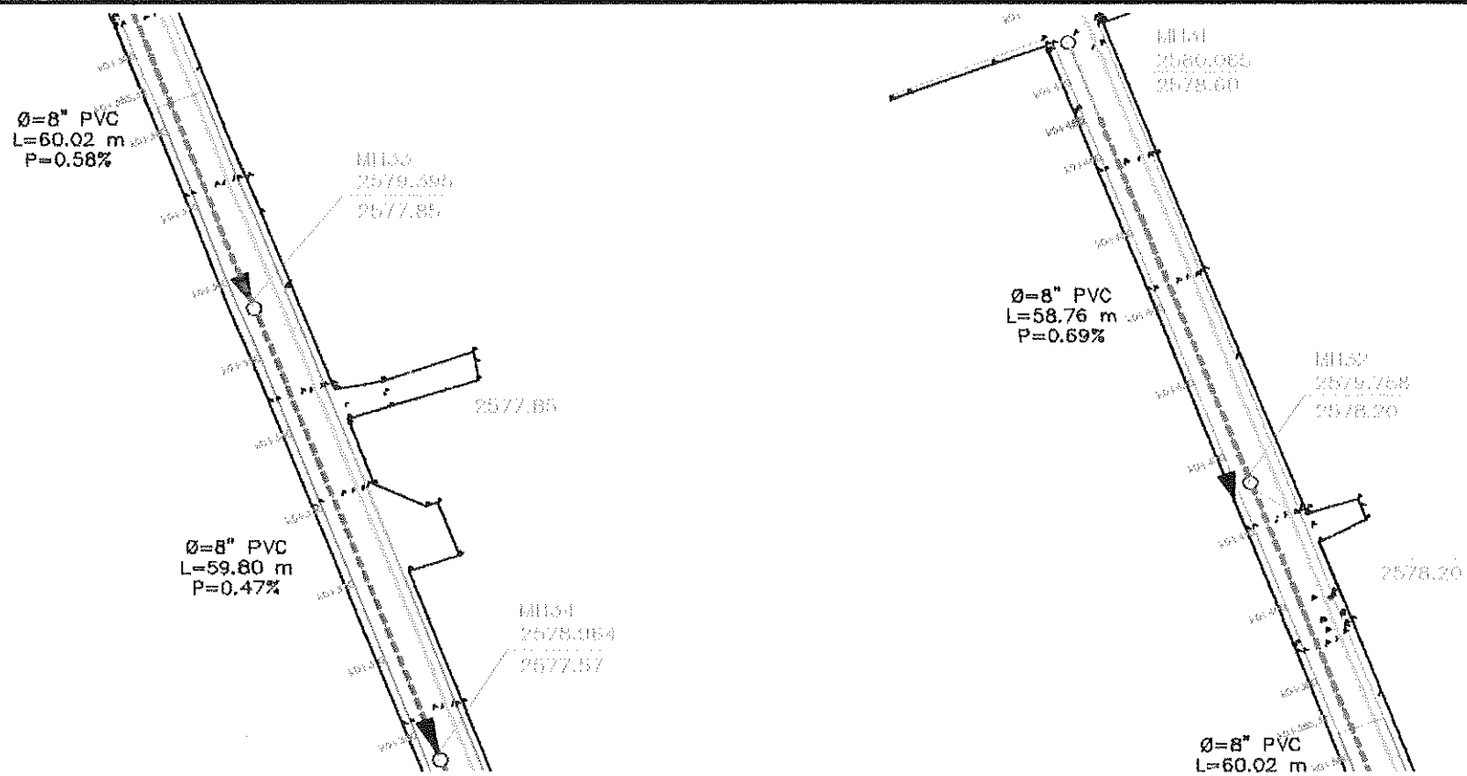

OBSERVACIONES

TOTAL	462,10
BALANCE DE CANTIDADES	
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0,0
A PAGAR PRESENTE ACTA	462,10
ACUMULADO	462,10

EPIFANIO VELASQUEZ LEAL
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO AQUA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
REPRESENTANTE LEGAL


Emsercota S.A.


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO AQUA

ACTA PARCIAL N°	3		FECHA DE CORTE	DD	6	MM	6	AA	2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA								
CONTRATISTA	CONSORCIO AQUA		NIT O C.C.	901.707.176-1		CONTRATO No.		No. 112-2023	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA		NIT O C.C.	900.124.654-4		CONTRATO No.		No. 117-2023	

COMPONENTE	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD		HOJA		
ALCANTARILLADO SANITARIO. PARCELAS GLOBO 1	EPC-8.1.4	INSTALACIÓN TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 10"	ML		1	DE	2

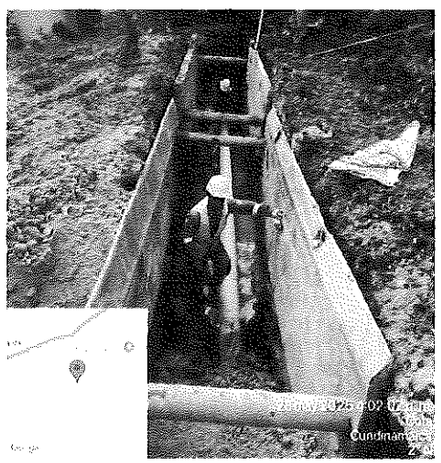

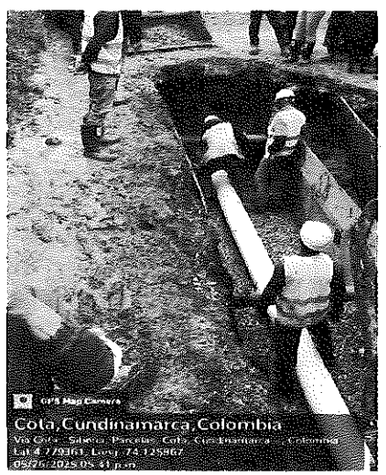

	ABSCISADO		DIMENSIONES			
UBICACIÓN	INICIO	FIN	LONG.	ANCHO	ALTO	TOTAL
Instalación Tubería Alcantarillado PVC 8"						
MH47-MH74	K0+007,77	K0+067,77	60,00			60,00
MH74-MH75	K0+067,77	K0+137,83	70,06			70,06
		TOTAL				130,06

OBSERVACIONES

TOTAL	130,06
BALANCE DE CANTIDADES	
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0,0
A PAGAR PRESENTE ACTA	130,06
ACUMULADO	130,06

EPIFANIO VELASQUEZ LEAL
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO AQUA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA QUIEDO
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
REPRESENTANTE LEGAL

9/6

Emsercota S.A.


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO AQUA

ACTA PARCIAL N°	3		FECHA DE CORTE	DD	6	MM	6	AA	2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA								
CONTRATISTA	CONSORCIO AQUA		NIT O C.C.	901.707.176-1		CONTRATO No.		No. 112-2023	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA		NIT O C.C.	900.124.654-4		CONTRATO No.		No. 117-2023	

COMPONENTE	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD		HOJA		
ALCANTARILLADO SANITARIO. PARCELAS GLOBO 1	EPC - 8.1.4	INSTALACIÓN TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 10"	ML		2	DE	2

ESQUEMAS

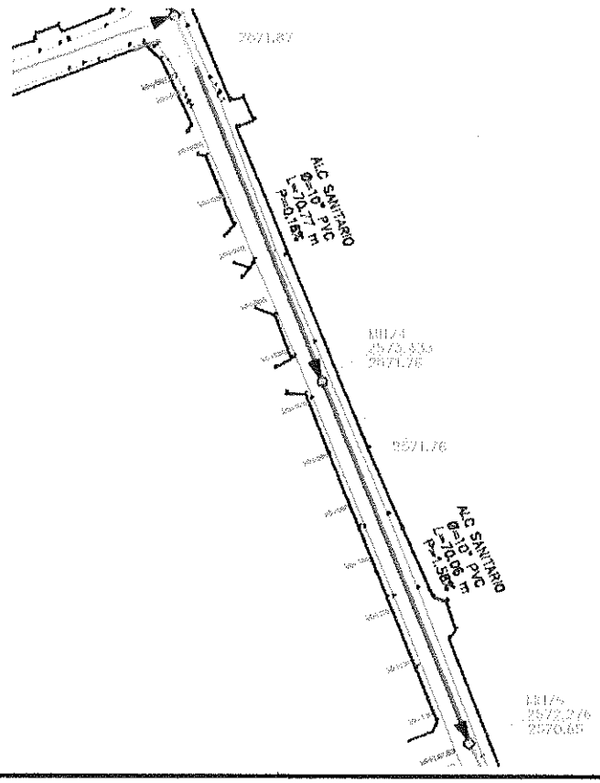

OBSERVACIONES

TOTAL	130,06
BALANCE DE CANTIDADES	
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0,0
A PAGAR PRESENTE ACTA	130,06
ACUMULADO	130,06

EPIFANIO VELASQUEZ LEAL
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO AQUA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
REPRESENTANTE LEGAL

Emsercota S.A.

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO AQUA

ACTA PARCIAL N°	3		FECHA DE CORTE	DD	6	MM	6	AA	2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA								
CONTRATISTA	CONSORCIO AQUA		NIT O C.C.	901.707.176-1		CONTRATO No.		No. 112-2023	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA		NIT O C.C.	900.124.654-4		CONTRATO No.		No. 117-2023	

COMPONENTE	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD		HOJA		
ALCANTARILLADO SANITARIO. PARCELAS GLOBO 1	EPC - 8.1.2	INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 160MM (6")	UND		1	DE	3





	ABSCISADO		DIMENSIONES			
UBICACIÓN	INICIO	FIN	LONG.	DESCUENTO	ALTO	TOTAL
Instalación Tubería Alcantarillado PVC 6" Conexión Domiciliaria)						
MH38B-MH38 (C.Izq)	K0+054,00		4,30	-4		0,30
MH38-MH37 (C.Izq)	K0+066,00		4,50	-4		0,50
MH38-MH37 (C.Izq)	K0+098,50		3,90	0		0,00
MH37-MH36 (C.Izq)	K0+163,00		3,90	0		0,00
MH36-MH35 (C.Izq)	K0+194,00		3,90	0		0,00
MH36-MH35 (C.Izq)	K0+201,00		3,80	0		0,00
MH36-MH35 (C.Izq)	K0+231,50		3,80	0		0,00
MH36-MH35 (C. Der)	K0+227,00		6,50	-4		2,50
MH35-MH34 (C. Der)	K0+255,00		6,50	-4		2,50
MH34-MH33 (C. Der)	K0+337,00		6,80	-4		2,80
MH34-MH33 (C. Der)	K0+340,00		6,50	-4		2,50
MH30-MH38B (C.Izq)	K0+020,00		6,40	-4		2,40
MH33-MH32 (C.Der)	K0+374,00		6,00	-4		2,00
MH33-MH32 (C.Der)	K0+406,00		6,40	-4		2,40
MH33-MH32 (C.Izq)	K0+408,00		5,00	-4		1,00
	TOTAL					18,90

OBSERVACIONES

Se descuenta la longitud de 4m a cada conexión domiciliaria, la cual esta incluida en el item EPC-8.6.1 CONEXIÓN DOMICILIARIA ALCANTARILLADO 8" X 6".
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLAS CON LOS ADITAMENTOS DE INSTALACION LONGITUD PROMEDIO 4M

TOTAL	18,90
BALANCE DE CANTIDADES	
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0,0
A PAGAR PRESENTE ACTA	18,90
ACUMULADO	18,90

EPIFANIO VELASQUEZ LEAL
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO AQUA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
REPRESENTANTE LEGAL

Emsercota S.A.


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO AQUA

ACTA PARCIAL N°	3		FECHA DE CORTE	DD	6	MM	6	AA	2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA								
CONTRATISTA	CONSORCIO AQUA		NIT O C.C.	901.707.176-1		CONTRATO No.	No. 112-2023		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA		NIT O C.C.	900.124.654-4		CONTRATO No.	No. 117-2023		

COMPONENTE	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD		HOJA		
ALCANTARILLADO SANITARIO. PARCELAS GLOBO 1	EPC - 8.1.2	INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 160MM (6")	UND		2	DE	3

ESQUEMAS

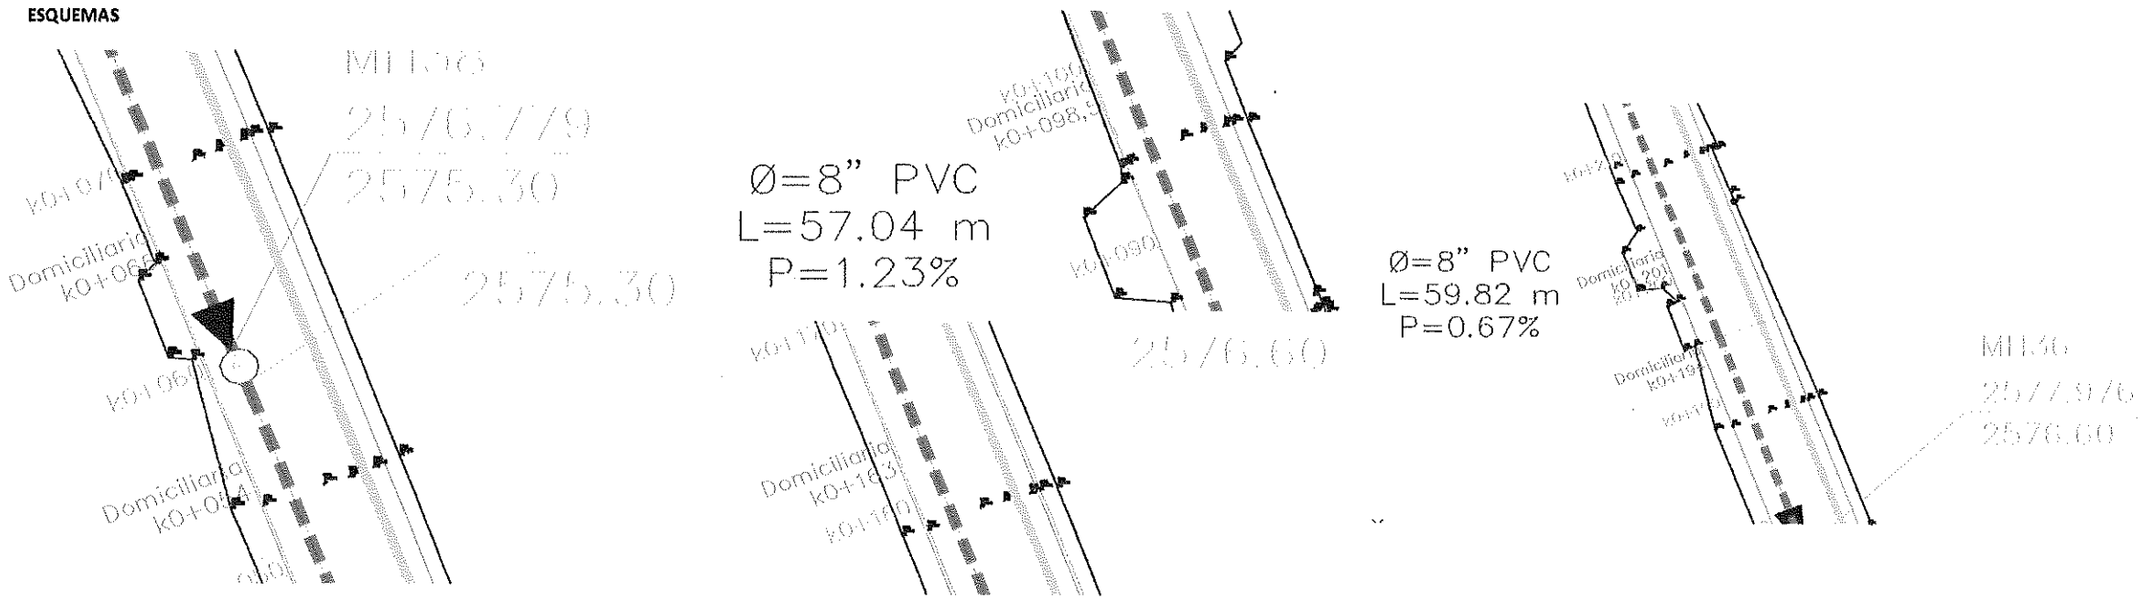

OBSERVACIONES

Se descuenta la longitud de 4m a cada conexión domiciliaria, la cual esta incluida en el item EPC-8.6.1 CONEXIÓN DOMICILIARIA ALCANTARILLADO 8" X 6".
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLAS CON LOS ADITAMENTOS DE INSTALACION LONGITUD PROMEDIO 4M

TOTAL	18,90
BALANCE DE CANTIDADES	
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0,0
A PAGAR PRESENTE ACTA	18,90
ACUMULADO	18,90

EPIFANIO VELASQUEZ LEAL
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO AQUA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
REPRESENTANTE LEGAL

Emsercota S.A.

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


CONSORCIO AQUA


ACTA PARCIAL N°	3		FECHA DE CORTE	DD	6	MM	6	AA	2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA								
CONTRATISTA	CONSORCIO AQUA		NIT O C.C.	901.707.176-1		CONTRATO No.	No. 112-2023		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA		NIT O C.C.	900.124.654-4		CONTRATO No.	No. 117-2023		

COMPONENTE	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD		HOJA		
ALCANTARILLADO SANITARIO. PARCELAS GLOBO 1	EPC - 8.1.2	INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 160MM (6")	UND		3	DE	3

ESQUEMAS

Ø=8" PVC
L=59.88 m
P=0.95%

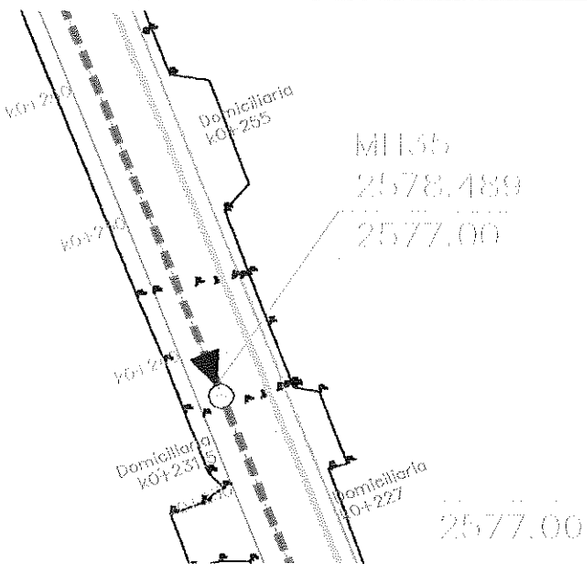

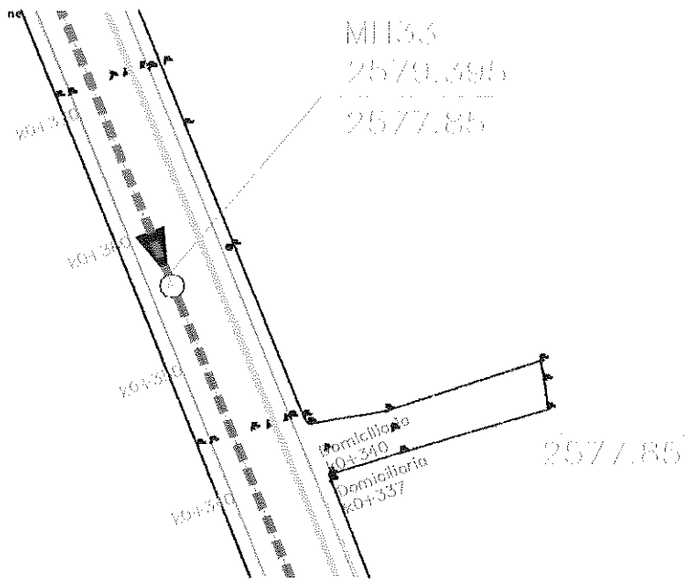

OBSERVACIONES

Se descuenta la longitud de 4m a cada conexión domiciliaria, la cual esta incluida en el Item EPC-8.6.1 CONEXIÓN DOMICILIARIA ALCANTARILLADO 8" X 6".
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLAS CON LOS ADITAMENTOS DE INSTALACION LONGITUD PROMEDIO 4M

TOTAL	18,90
BALANCE DE CANTIDADES	
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0,0
A PAGAR PRESENTE ACTA	18,90
ACUMULADO	18,90

EPIFANIO VELASQUEZ LEAL
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO AQUA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
REPRESENTANTE LEGAL

660

Emsercota S.A.

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO AQUA

ACTA PARCIAL N°	3		FECHA DE CORTE	DD	6	MM	6	AA	2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA								
CONTRATISTA	CONSORCIO AQUA		NIT O C.C.	901.707.176-1		CONTRATO No.		No. 112-2023	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA		NIT O C.C.	900.124.654-4		CONTRATO No.		No. 117-2023	

COMPONENTE	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD		HOJA		
ALCANTARILLADO SANITARIO. PARCELAS GLOBO 1	EPC - 8.3.11	SECCION CILINDRICA DE POZO H=0,5M D=1,2M (PREFABRICADO)	UND		1	DE	3





	ABSCISADO		DIMENSIONES			
UBICACIÓN	INICIO	FIN	ALTO		UND	TOTAL
MH38B	K0+014,90	K0+014,90	1,62		3,50	3,50
MH38	K0+059,70	K0+059,70	1,48		3,00	3,00
MH37	K0+116,74	K0+116,74	1,40		3,00	3,00
MH36	K0+176,72	K0+176,72	1,38		3,00	3,00
MH35	K0+236,54	K0+236,54	1,49		3,00	3,00
MH34	K0+296,42	K0+296,42	1,39		3,00	3,00
MH33	K0+356,22	K0+356,22	1,55		3,00	3,00
MH32	K0+416,24	K0+416,24	1,56		3,00	3,00
MH30	K0+002,90	K0+002,90	1,54		3,00	3,00
MH74	K0+067,77	K0+067,77	1,67		3,50	3,50
	TOTAL					31,00

OBSERVACIONES

TOTAL	31,00
BALANCE DE CANTIDADES	
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0,0
A PAGAR PRESENTE ACTA	31,00
ACUMULADO	31,00

EPIFANIO VELASQUEZ LEAL
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO AQUA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
REPRESENTANTE LEGAL

661

Emsercota S.A.


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO AQUA

ACTA PARCIAL N°	3		FECHA DE CORTE	DD	6	MM	6	AA	2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA								
CONTRATISTA	CONSORCIO AQUA		NIT O C.C.	901.707.176-1		CONTRATO No.		No. 112-2023	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA		NIT O C.C.	900.124.654-4		CONTRATO No.		No. 117-2023	

COMPONENTE	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD		HOJA		
ALCANTARILLADO SANITARIO, PARCELAS GLOBO 1	EPC-8.3.11	SECCION CILINDRICA DE POZO H=0,5M D=1,2M (PREFABRICADO)	UND		2	DE	3

ESQUEMAS

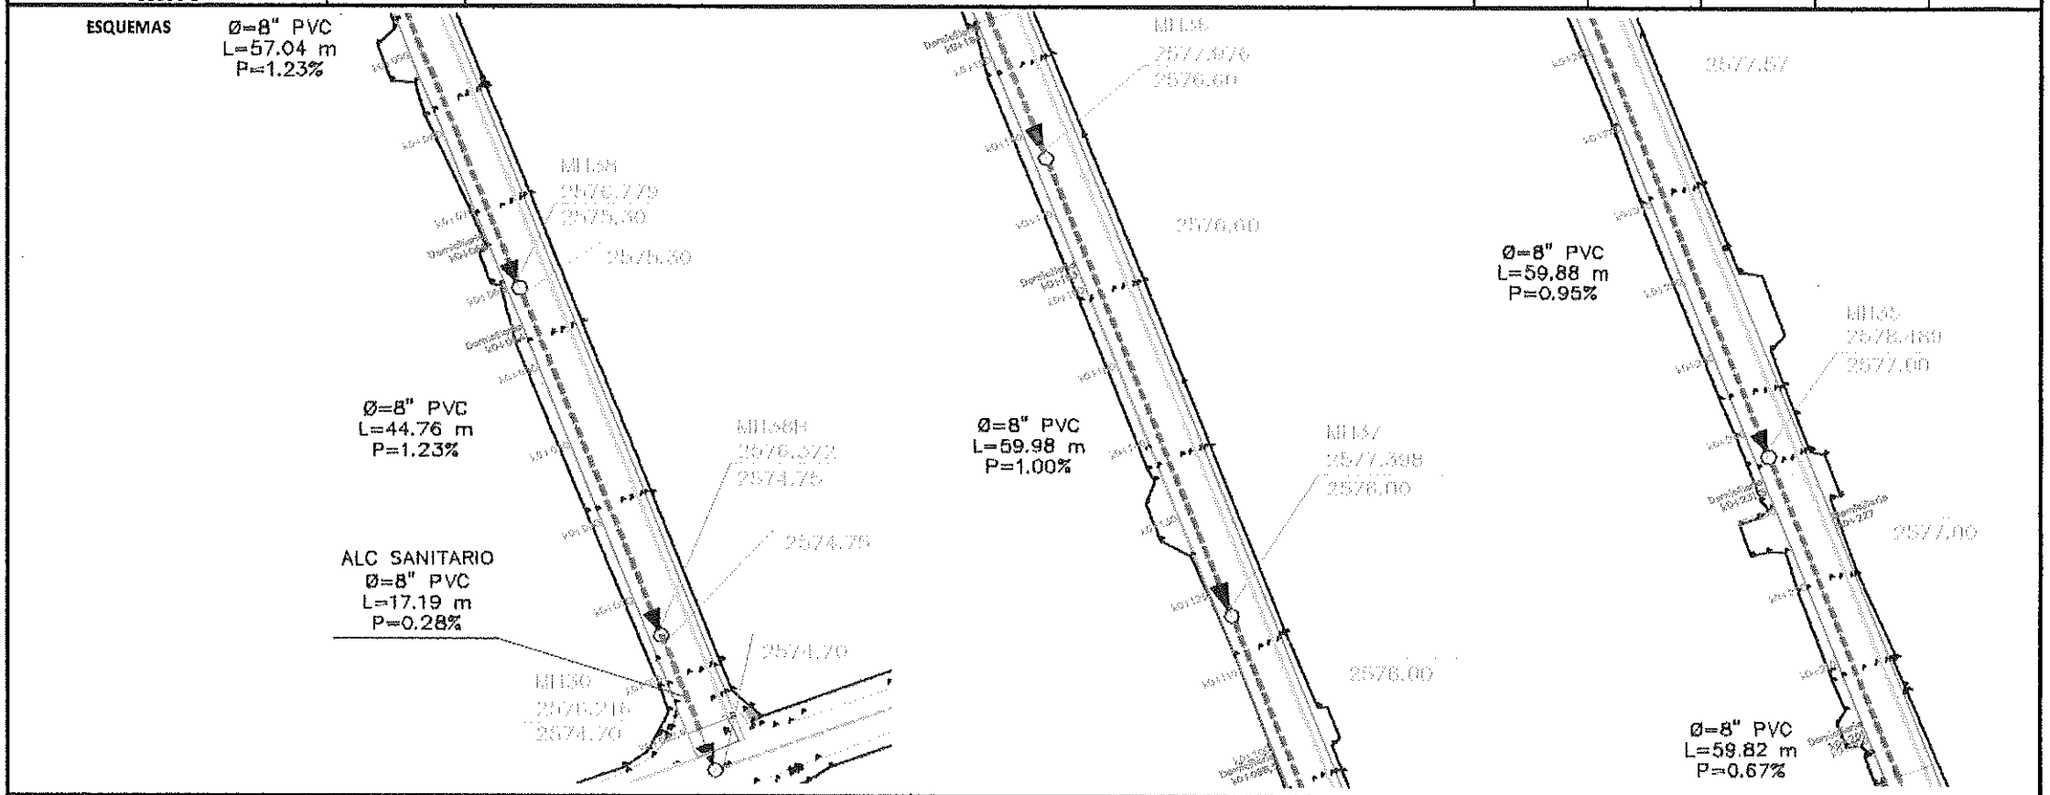

OBSERVACIONES

TOTAL	31,00
BALANCE DE CANTIDADES	
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0,0
A PAGAR PRESENTE ACTA	31,00
ACUMULADO	31,00

EPIFANIO VELASQUEZ LEAL
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO AQUA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
REPRESENTANTE LEGAL

662

Emsercota S.A.

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


CONSORCIO AQUA


ACTA PARCIAL N°	3		FECHA DE CORTE	DD	6	MM	6	AA	2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA								
CONTRATISTA	CONSORCIO AQUA		NIT O C.C.	901.707.176-1		CONTRATO No.		No. 112-2023	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA		NIT O C.C.	900.124.654-4		CONTRATO No.		No. 117-2023	

COMPONENTE	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD		HOJA		
ALCANTARILLADO SANITARIO. PARCELAS GLOBO 1	EPC - 8.3.11	SECCION CILINDRICA DE POZO H=0,5M D=1,2M (PREFABRICADO)	UND		3	DE	3


ESQUEMAS

Red Alcantarillado - Sector Summer Hill (Del MH30 a MH31)

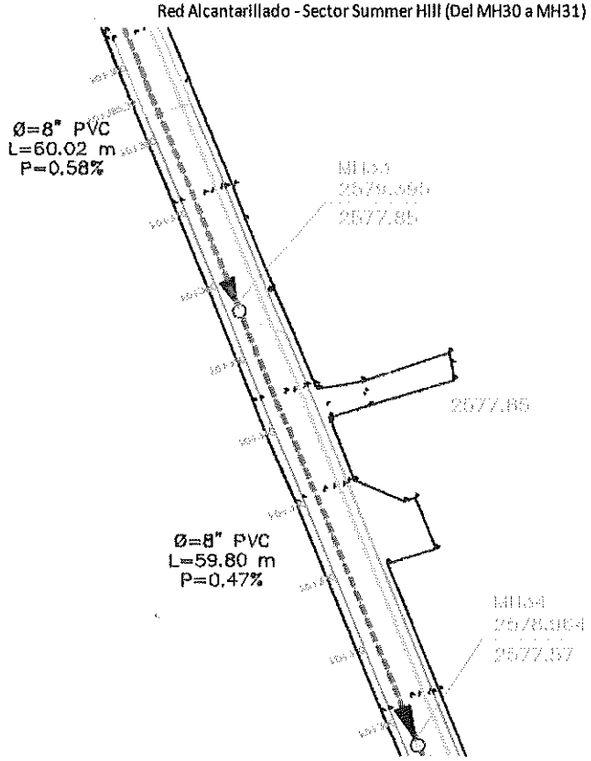

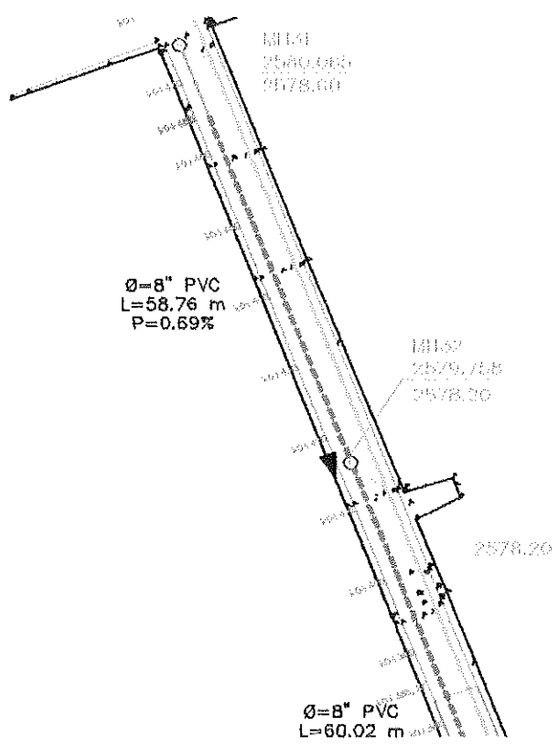

Red Alcantarillado - Sector Culebrera (Del MH47 a MH75)

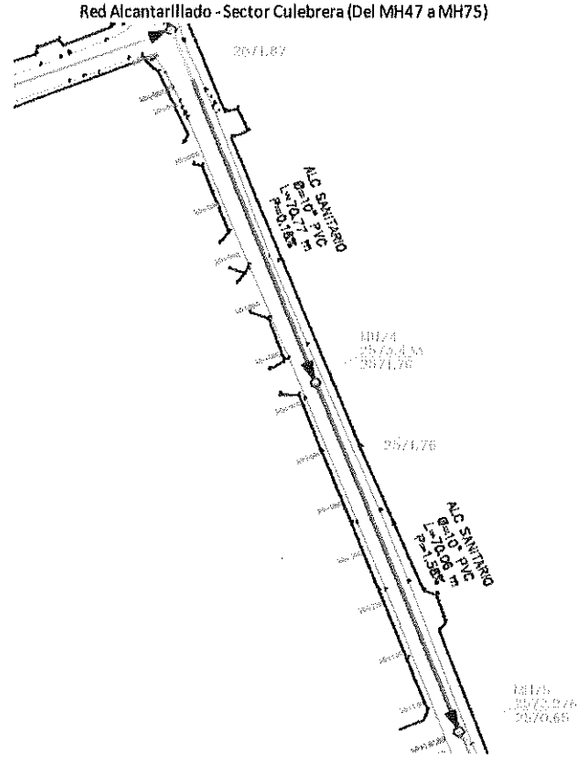

OBSERVACIONES		
	TOTAL	31,00
	BALANCE DE CANTIDADES	
	PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0,0
	A PAGAR PRESENTE ACTA	31,00
	ACUMULADO	31,00

EPIFANIO VELASQUEZ LEAL
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO AQUA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
REPRESENTANTE LEGAL

663

Emsercota S.A.


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO AQUA

ACTA PARCIAL N°	3		FECHA DE CORTE	DD	6	MM	6	AA	2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA								
CONTRATISTA	CONSORCIO AQUA		NIT O C.C.	901.707.176-1		CONTRATO No.		No. 112-2023	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA		NIT O C.C.	900.124.654-4		CONTRATO No.		No. 117-2023	

COMPONENTE	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD		HOJA		
ALCANTARILLADO SANITARIO. PARCELAS GLOBO 1	ICCU - 4.1 Urbanismo	PLACA DE FONDO POZO D=1.7M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO)	UND		1	DE	3



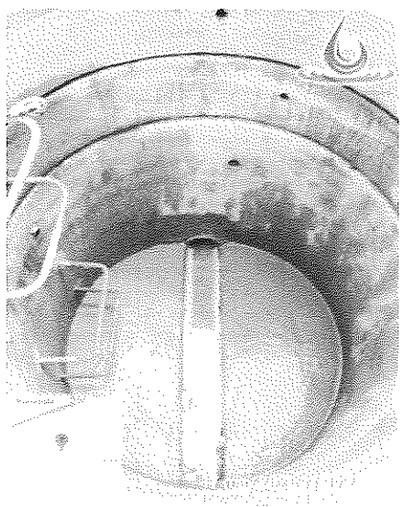

	ABSCISADO		DIMENSIONES			
UBICACIÓN	INICIO	FIN	UND			TOTAL
MH38B	K0+014,90	K0+014,90	1,00			1,00
MH38	K0+059,70	K0+059,70	1,00			1,00
MH37	K0+116,74	K0+116,74	1,00			1,00
MH36	K0+176,72	K0+176,72	1,00			1,00
MH35	K0+236,54	K0+236,54	1,00			1,00
MH34	K0+296,42	K0+296,42	1,00			1,00
MH33	K0+356,22	K0+356,22	1,00			1,00
MH32	K0+416,24	K0+416,24	1,00			1,00
MH30	K0+002,90	K0+002,90	1,00			1,00
MH74	K0+067,77	K0+067,77	1,00			1,00
	TOTAL					10,00

OBSERVACIONES

TOTAL	10,00
BALANCE DE CANTIDADES	
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0,0
A PAGAR PRESENTE ACTA	10,00
ACUMULADO	10,00

EPIFANIO VELASQUEZ LEAL
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO AQUA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
REPRESENTANTE LEGAL

Emsercota S.A.

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


CONSORCIO AQUA

ACTA PARCIAL N°	3		FECHA DE CORTE	DD	6	MM	6	AA	2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA								
CONTRATISTA	CONSORCIO AQUA		NIT O C.C.	901.707.176-1		CONTRATO No.		No. 112-2023	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA		NIT O C.C.	900.124.654-4		CONTRATO No.		No. 117-2023	

COMPONENTE	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD		HOJA		
ALCANTARILLADO SANITARIO. PARCELAS GLOBO 1	ICCU - 4,1 Urbanismo	PLACA DE FONDO POZO D=1.7M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO)	ML		2	DE	3

ESQUEMAS

Red Alcantarillado - Sector Summer Hill (Del MH30 a MH31)

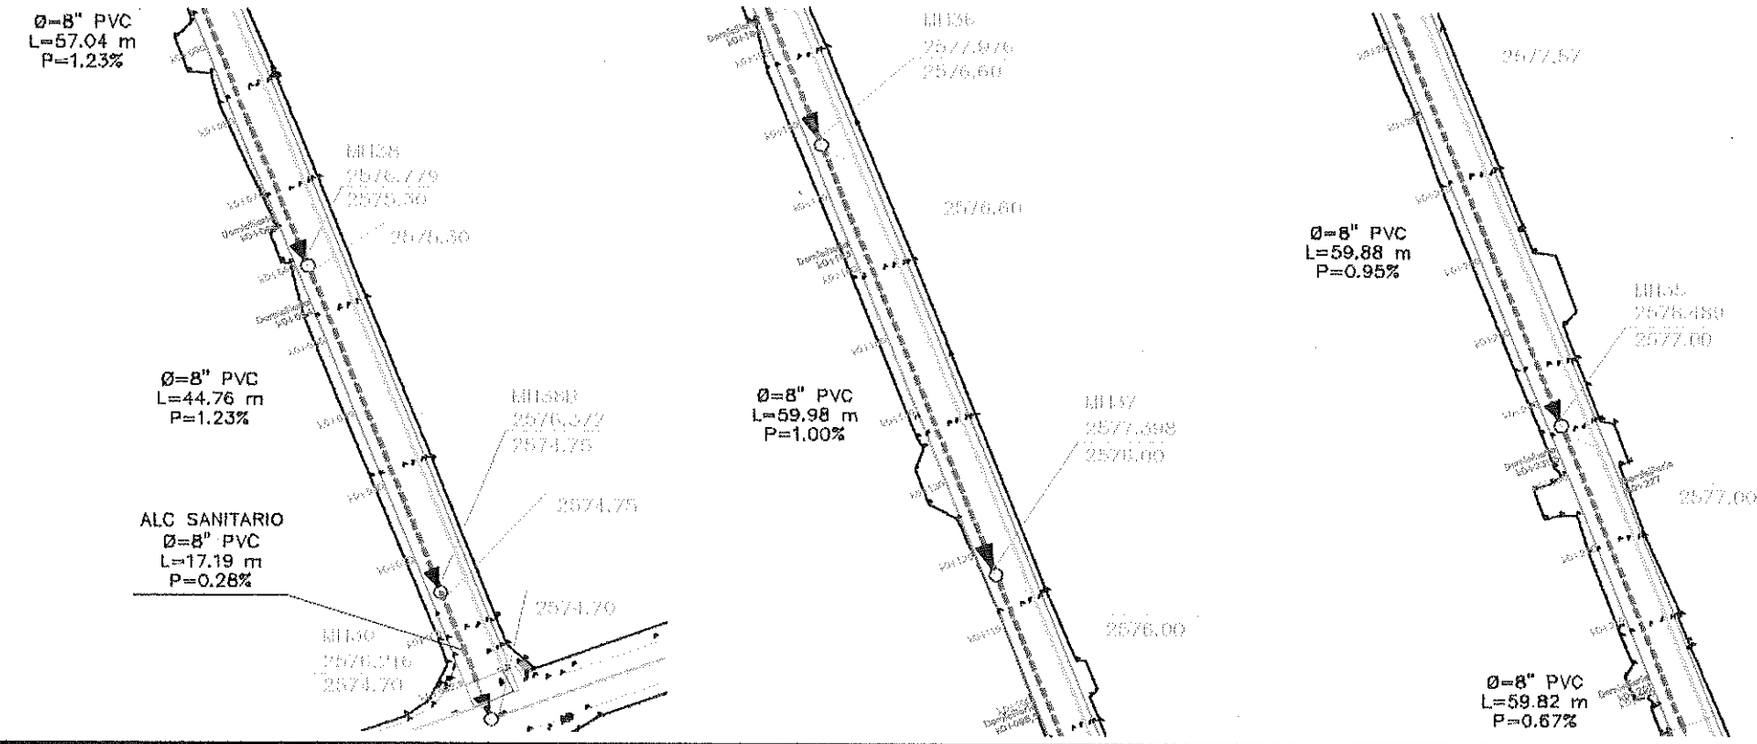

OBSERVACIONES

TOTAL	10,00
BALANCE DE CANTIDADES	
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0,0
A PAGAR PRESENTE ACTA	10,00
ACUMULADO	10,00

EPIFANIO VELASQUEZ LEAL
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO AQUA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
REPRESENTANTE LEGAL

Emsercota S.A.

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


CONSORCIO AQUA


ACTA PARCIAL N°	3		FECHA DE CORTE	DD	6	MM	6	AA	2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA								
CONTRATISTA	CONSORCIO AQUA		NIT O C.C.	901.707.176-1		CONTRATO No.		No. 112-2023	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA		NIT O C.C.	900.124.654-4		CONTRATO No.		No. 117-2023	

COMPONENTE	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD		HOJA		
ALCANTARILLADO SANITARIO. PARCELAS GLOBO 1	ICCU - 4.1 Urbanismo	PLACA DE FONDO POZO D=1.7M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO)	ML		3	DE	3


ESQUEMAS

Red Alcantarillado - Sector Summer Hill (Del MH30 a MH31)

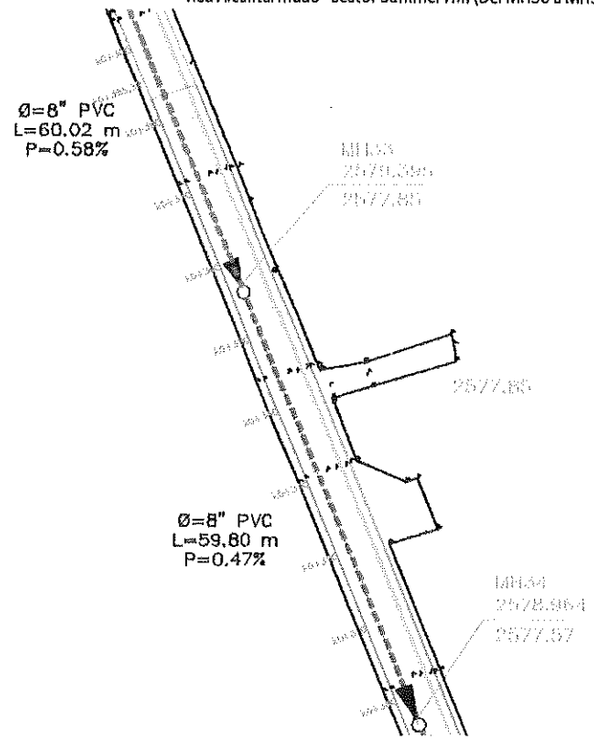

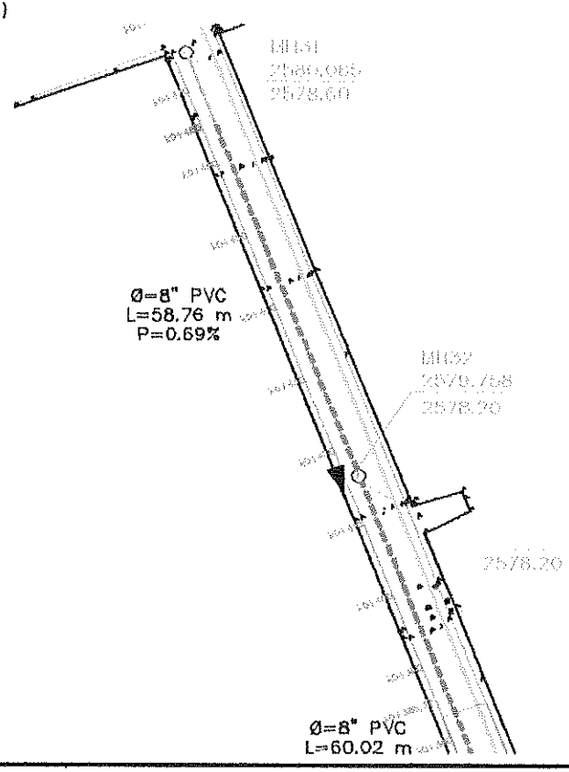

Red Alcantarillado - Sector Culebrera (Del MH47 a MH75)

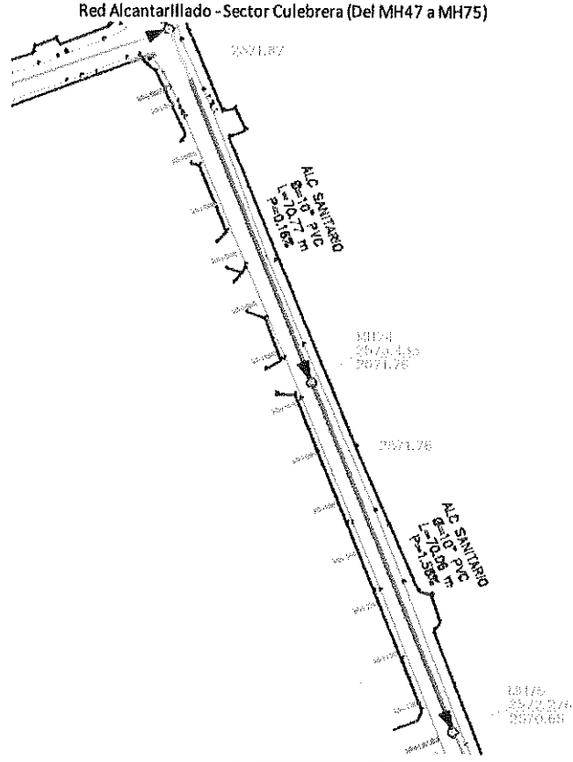

OBSERVACIONES

TOTAL	10,00
BALANCE DE CANTIDADES	
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0,0
A PAGAR PRESENTE ACTA	10,00
ACUMULADO	10,00

EPIFANIO VELASQUEZ LEAL
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO AQUA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
REPRESENTANTE LEGAL


Emsercota S.A.

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO AQUA

ACTA PARCIAL N°	3		FECHA DE CORTE	DD	6	MM	6	AA	2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA								
CONTRATISTA	CONSORCIO AQUA		NIT O C.C.	901.707.176-1		CONTRATO No.		No. 112-2023	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA		NIT O C.C.	900.124.654-4		CONTRATO No.		No. 117-2023	

COMPONENTE	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD		HOJA		
ALCANTARILLADO SANITARIO, PARCELAS GLOBO 1	E-5	ABATIMIENTO DE NIVEL FREATICO POR SISTEMA WELL-POINT O SIMILAR	DIA		1	DE	2

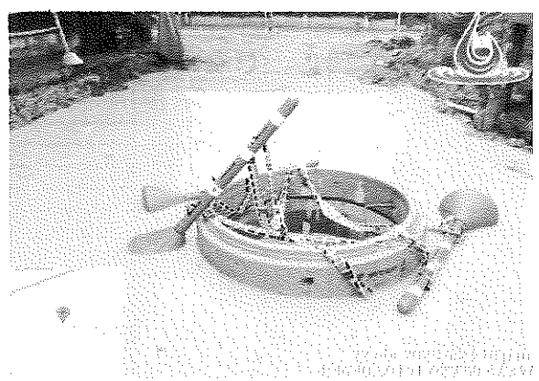



	ABSCISADO		DIMENSIONES			
UBICACIÓN	INICIO	FIN	F. INICIO	F. FIN	DIA	TOTAL
MH30-MH38B	K0+002,90	K0+014,90	14/04/25	16/04/25	3,00	3,00
MH38B-MH38	K0+014,90	K0+059,70	22/04/25	26/04/25	5,00	5,00
MH38B-MH38	K0+014,90	K0+059,70	28/04/25	29/04/25	2,00	2,00
MH47-MH74	K0+007,77	K0+067,77	26/05/25	30/05/25	5,00	5,00
MH74-MH75	K0+067,77	K0+137,83	31/05/25	31/05/25	1,00	1,00
MH74-MH75	K0+067,77	K0+137,83	3/06/25	7/06/25	5,00	5,00
		TOTAL				21,00

OBSERVACIONES

TOTAL	21,00

BALANCE DE CANTIDADES	
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0,0
A PAGAR PRESENTE ACTA	21,00
ACUMULADO	21,00

EPIFANIO VELASQUEZ LEAL
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO AQUA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
REPRESENTANTE LEGAL

68

Emsercota S.A.


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO AQUA

ACTA PARCIAL N°	3		FECHA DE CORTE	DD	6	MM	6	AA	2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA								
CONTRATISTA	CONSORCIO AQUA		NIT O C.C.	901.707.176-1		CONTRATO No.	No. 112-2023		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA		NIT O C.C.	900.124.654-4		CONTRATO No.	No. 117-2023		

COMPONENTE	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD		HOJA		
ALCANTARILLADO SANITARIO. PARCELAS GLOBO 1	E-5	ABATIMIENTO DE NIVEL FREATICO POR SISTEMA WELL-POINT O SIMILAR	DIA		2	DE	2

ESQUEMAS

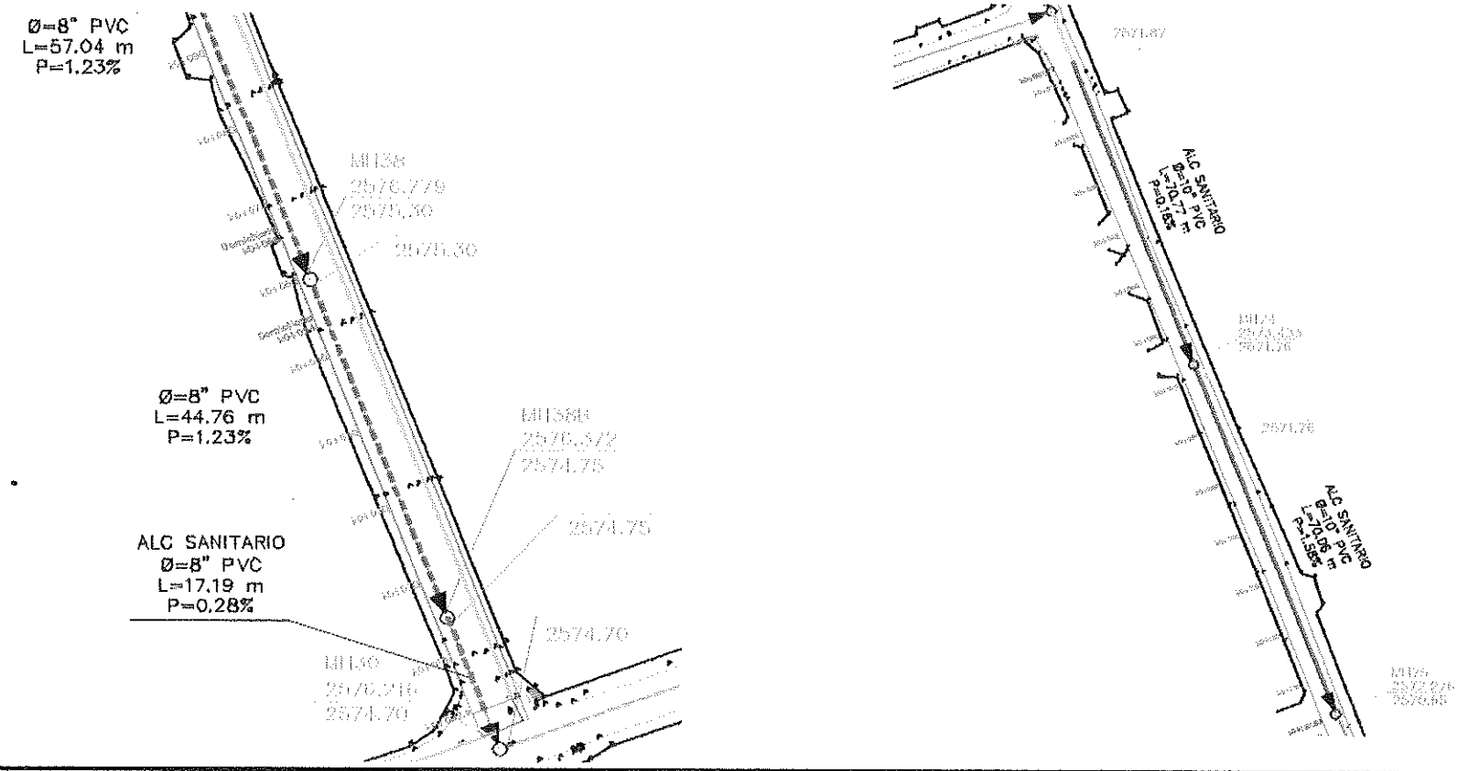

OBSERVACIONES

TOTAL	21,00
BALANCE DE CANTIDADES	
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0,0
A PAGAR PRESENTE ACTA	21,00
ACUMULADO	21,00

EPIFANIO VELASQUEZ LEAL
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO AQUA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
REPRESENTANTE LEGAL


Emsercota S.A.

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO AQUA

ACTA PARCIAL N°	3		FECHA DE CORTE	DD	6	MM	6	AA	2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA								
CONTRATISTA	CONSORCIO AQUA		NIT O C.C.	901.707.176-1		CONTRATO No.		No. 112-2023	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA		NIT O C.C.	900.124.654-4		CONTRATO No.		No. 117-2023	

COMPONENTE	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD		HOJA		
ALCANTARILLADO SANITARIO. PARCELAS GLOBO 1	EPC - 8.6.1	CONEXIÓN DOMICILIARIA ALCANTARILLADO 8" X 6". INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLAS CON LOS ADITAMENTOS DE INSTALACION LONGITUD PROMEDIO 4M	UND		1	DE	3

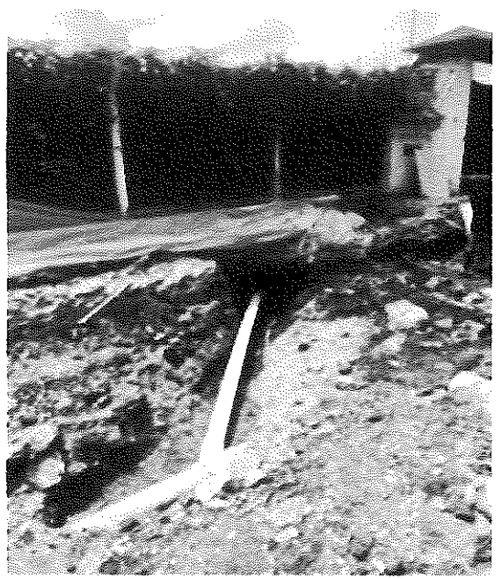



	ABSCISADO		DIMENSIONES			
UBICACIÓN	INICIO	FIN	LONG.	ANCHO	ALTO	TOTAL
MH38B-MH38 (C.Izq)	K0+054,00		1,00			1,00
MH38-MH37 (C.Izq)	K0+066,00		1,00			1,00
MH38-MH37 (C.Izq)	K0+098,50		1,00			1,00
MH37-MH36 (C.Izq)	K0+163,00		1,00			1,00
MH36-MH35 (C.Izq)	K0+194,00		1,00			1,00
MH36-MH35 (C.Izq)	K0+201,00		1,00			1,00
MH36-MH35 (C.Izq)	K0+231,50		1,00			1,00
MH36-MH35 (C. Der)	K0+227,00		1,00			1,00
MH35-MH34 (C. Der)	K0+255,00		1,00			1,00
MH34-MH33 (C. Der)	K0+337,00		1,00			1,00
MH34-MH33 (C. Der)	K0+340,00		1,00			1,00
MH30-MH38B (C.Izq)	K0+020,00		1,00			1,00
MH33-MH32 (C.Der)	K0+374,00		1,00			1,00
MH33-MH32 (C.Der)	K0+406,00		1,00			1,00
MH33-MH32 (C.Izq)	K0+408,00		1,00			1,00
	TOTAL					15,00

OBSERVACIONES

TOTAL	15,00

BALANCE DE CANTIDADES	
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0,0
A PAGAR PRESENTE ACTA	15,00
ACUMULADO	15,00

EPIFANIO VELASQUEZ LEAL
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO AQUA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
REPRESENTANTE LEGAL

69

Emsercota S.A.


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO AQUA

ACTA PARCIAL N°	3		FECHA DE CORTE	DD	6	MM	6	AA	2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA								
CONTRATISTA	CONSORCIO AQUA		NIT O C.C.	901.707.176-1		CONTRATO No.		No. 112-2023	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA		NIT O C.C.	900.124.654-4		CONTRATO No.		No. 117-2023	

COMPONENTE	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD		HOJA		
ALCANTARILLADO SANITARIO, PARCELAS GLOBO 1	EPC - 8.6.1	CONEXIÓN DOMICILIARIA ALCANTARILLADO 8" X 6". INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLAS CON LOS ADITAMENTOS DE INSTALACION LONGITUD PROMEDIO 4M	UND		2	DE	3

ESQUEMAS

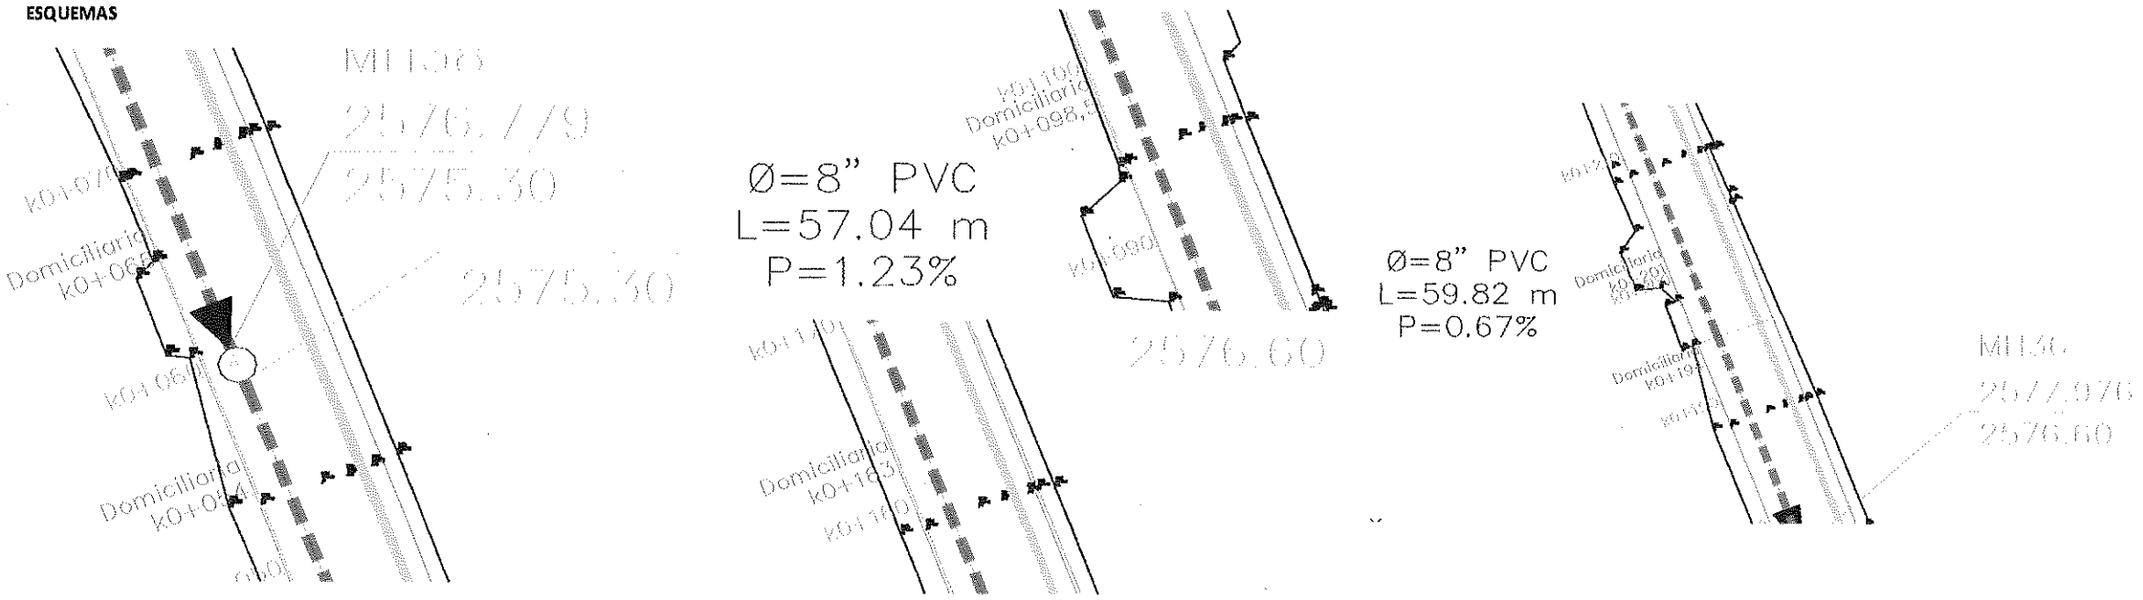

OBSERVACIONES

TOTAL	15,00
BALANCE DE CANTIDADES	
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0,0
A PAGAR PRESENTE ACTA	15,00
ACUMULADO	15,00

EPIFANIO VELASQUEZ LEAL
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO AQUA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
REPRESENTANTE LEGAL

630

Emsercota S.A.


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO AQUA

ACTA PARCIAL N°	3		FECHA DE CORTE	DD	6	MM	6	AA	2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA								
CONTRATISTA	CONSORCIO AQUA		NIT O C.C.	901.707.176-1		CONTRATO No.	No. 112-2023		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA		NIT O C.C.	900.124.654-4		CONTRATO No.	No. 117-2023		

COMPONENTE	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD		HOJA		
ALCANTARILLADO SANITARIO. PARCELAS GLOBO 1	EPC - 8.6.1	CONEXIÓN DOMICILIARIA ALCANTARILLADO 8" X 6". INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLAS CON LOS ADITAMENTOS DE INSTALACION LONGITUD PROMEDIO 4M	UND		3	DE	3

ESQUEMAS

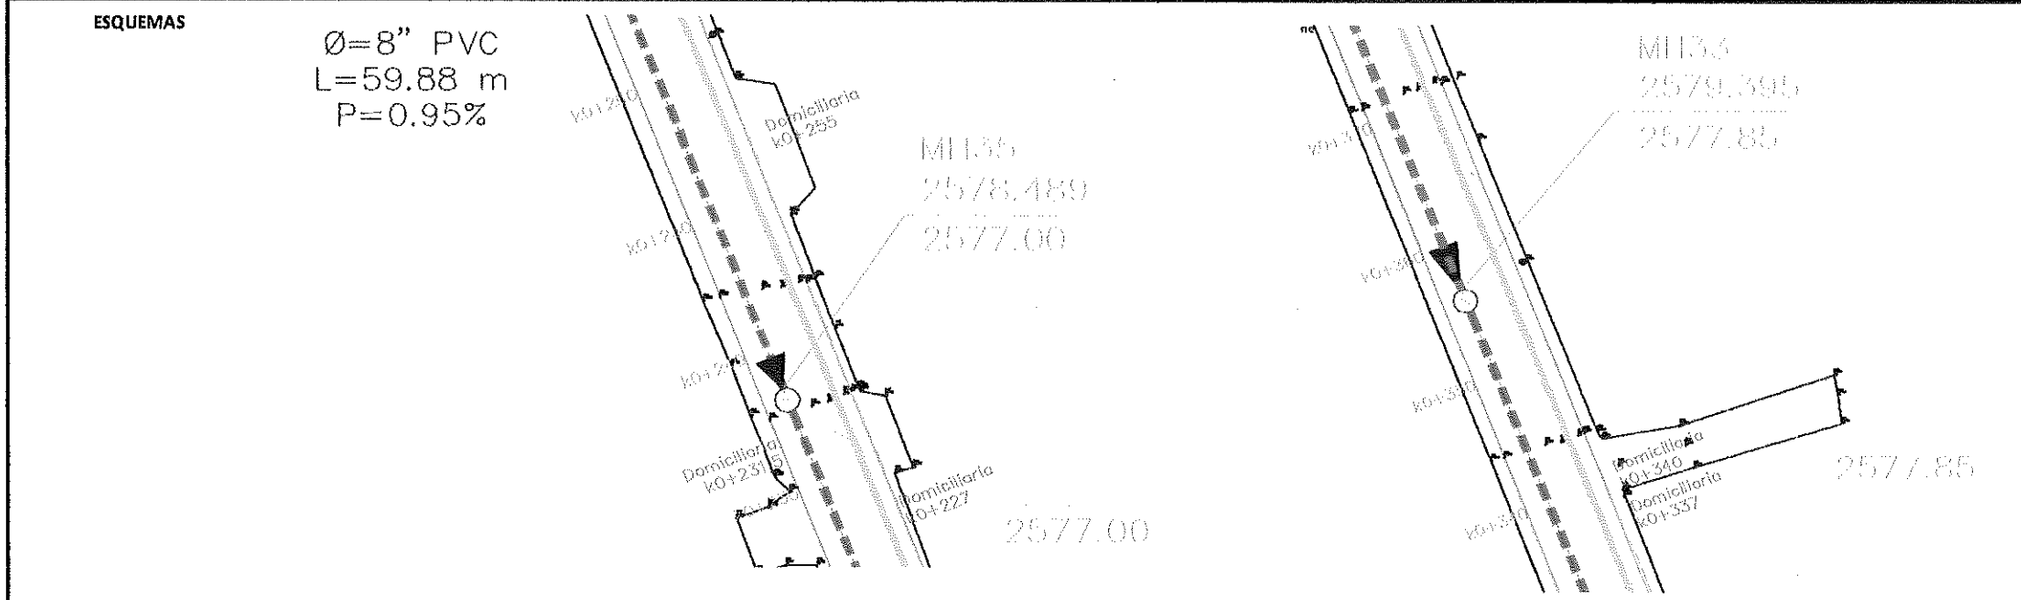

OBSERVACIONES

TOTAL	15,00
BALANCE DE CANTIDADES	
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0,0
A PAGAR PRESENTE ACTA	15,00
ACUMULADO	15,00

EPIFANIO VELASQUEZ LEAL
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO AQUA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
REPRESENTANTE LEGAL

Emsercota S.A.

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO AQUA

ACTA PARCIAL N°	3		FECHA DE CORTE	DD	6	MM	6	AA	2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA								
CONTRATISTA	CONSORCIO AQUA		NIT O C.C.	901.707.176-1		CONTRATO No.		No. 112-2023	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA		NIT O C.C.	900.124.654-4		CONTRATO No.		No. 117-2023	

COMPONENTE	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD		HOJA		
ALCANTARILLADO SANITARIO. PARCELAS GLOBO 1	Sum.Tub.PVC 8	SUMINISTRO TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 8"- 57 PSI	ML		1	DE	1





	ABSCISADO		DIMENSIONES			
UBICACIÓN	INICIO	FIN	LONG.	ANCHO	ALTO	TOTAL
MH30-MH38B	K0+002,90	K0+014,90	12,00			12,00
MH38B-MH38	K0+014,90	K0+059,70	44,80			44,80
MH38-MH37	K0+059,70	K0+116,74	57,04			57,04
MH37-MH36	K0+116,74	K0+176,72	59,98			59,98
MH36-MH35	K0+176,72	K0+236,54	59,82			59,82
MH35-MH34	K0+236,54	K0+296,42	59,88			59,88
MH34-MH33	K0+296,42	K0+356,22	59,80			59,80
MH33-MH32	K0+356,22	K0+416,24	60,02			60,02
MH32-MH31	K0+416,24	K0+465,00	48,76			48,76
		TOTAL				462,10

OBSERVACIONES

Se presenta certificados de calidad de la tubería PVC Novafort 8"

TOTAL	462,10

BALANCE DE CANTIDADES	
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0,0
A PAGAR PRESENTE ACTA	462,10
ACUMULADO	462,10

EPIFANIO VELASQUEZ LEAL
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO AQUA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
REPRESENTANTE LEGAL

92


Emsercota S.A.

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO AQUA

ACTA PARCIAL N°	3		FECHA DE CORTE	DD	6	MM	6	AA	2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA								
CONTRATISTA	CONSORCIO AQUA		NIT O C.C.	901.707.176-1		CONTRATO No.		No. 112-2023	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA		NIT O C.C.	900.124.654-4		CONTRATO No.		No. 117-2023	

COMPONENTE	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD		HOJA		
ALCANTARILLADO SANITARIO. PARCELAS GLOBO 1	Sum.Tub.PVC 10	SUMINISTRO TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 10"- 57 PSI	ML		1	DE	1

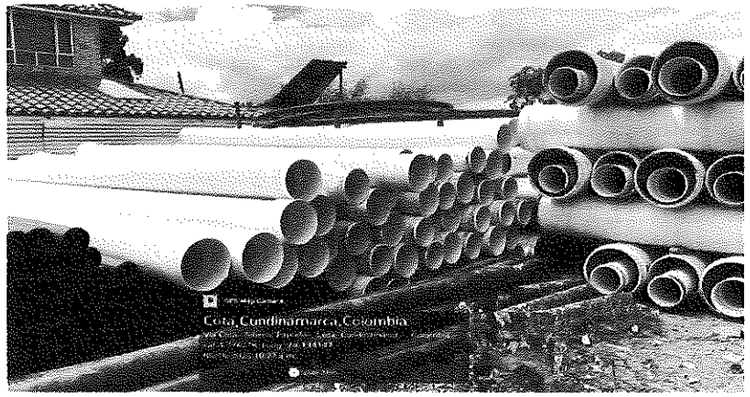

	ABSCISADO		DIMENSIONES			
UBICACIÓN	INICIO	FIN	LONG.	ANCHO	ALTO	TOTAL
Instalación Tubería Alcantarillado PVC 8"						
MH47-MH74	K0+007,77	K0+067,77	60,00			60,00
MH74-MH75	K0+067,77	K0+137,83	70,06			70,06
		TOTAL				130,06

OBSERVACIONES

TOTAL	130,06

BALANCE DE CANTIDADES	
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0,0
A PAGAR PRESENTE ACTA	130,06
ACUMULADO	130,06

EPIFANIO VELASQUEZ LEAL
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO AQUA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
REPRESENTANTE LEGAL

623

Emsercota S.A.

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO AQUA

ACTA PARCIAL N°	3		FECHA DE CORTE	DD	6	MM	6	AA	2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA								
CONTRATISTA	CONSORCIO AQUA		NIT O C.C.	901.707.176-1		CONTRATO No.	No. 112-2023		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA		NIT O C.C.	900.124.654-4		CONTRATO No.	No. 117-2023		

COMPONENTE	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD		HOJA		
ALCANTARILLADO SANITARIO. PARCELAS GLOBO 1	Sum.Tub.PVC 6	SUMINISTRO TUBERÍA PVC NOVAFORT ALCANTARILLADO 6"	UND		1	DE	1





	ABSCISADO		DIMENSIONES			
UBICACIÓN	INICIO	FIN	LONG.	DESCUENTO	ALTO	TOTAL
Instalación Tubería Alcantarillado PVC 6" Conexión Domiciliaria)						
MH38B-MH38 (C.Izq)	K0+054,00		4,30	-4		0,30
MH38-MH37 (C.Izq)	K0+066,00		4,50	-4		0,50
MH38-MH37 (C.Izq)	K0+098,50		3,90	0		0,00
MH37-MH36 (C.Izq)	K0+163,00		3,90	0		0,00
MH36-MH35 (C.Izq)	K0+194,00		3,90	0		0,00
MH36-MH35 (C.Izq)	K0+201,00		3,80	0		0,00
MH36-MH35 (C.Izq)	K0+231,50		3,80	0		0,00
MH36-MH35 (C. Der)	K0+227,00		6,50	-4		2,50
MH35-MH34 (C. Der)	K0+255,00		6,50	-4		2,50
MH34-MH33 (C. Der)	K0+337,00		6,80	-4		2,80
MH34-MH33 (C. Der)	K0+340,00		6,50	-4		2,50
MH30-MH38B (C.Izq)	K0+020,00		6,40	-4		2,40
MH33-MH32 (C.Der)	K0+374,00		6,00	-4		2,00
MH33-MH32 (C.Der)	K0+406,00		6,40	-4		2,40
MH33-MH32 (C.Izq)	K0+408,00		5,00	-4		1,00
	TOTAL					18,90

OBSERVACIONES

Se descuenta la longitud de 4m a cada conexión domiciliaria, la cual esta incluida en el Item EPC-8.6.1 CONEXIÓN DOMICILIARIA ALCANTARILLADO 8" X 6".
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLAS CON LOS ADITAMENTOS DE INSTALACION LONGITUD PROMEDIO 4M

TOTAL	18,90

BALANCE DE CANTIDADES	
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0,0
A PAGAR PRESENTE ACTA	18,90
ACUMULADO	18,90

EPIFANIO VELASQUEZ LEAL
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO AQUA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
REPRESENTANTE LEGAL

Emsercota S.A.
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO AQUA

ACTA PARCIAL N°	3		FECHA DE CORTE	DD	6	MM	6	AA	2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA								
CONTRATISTA	CONSORCIO AQUA		NIT O C.C.	901.707.176-1		CONTRATO No.	No. 112-2023		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA		NIT O C.C.	900.124.654-4		CONTRATO No.	No. 117-2023		

COMPONENTE	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD		HOJA		
IMPULSION CULEBRERA	EPC - 1.1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES	ML		1	DE	3



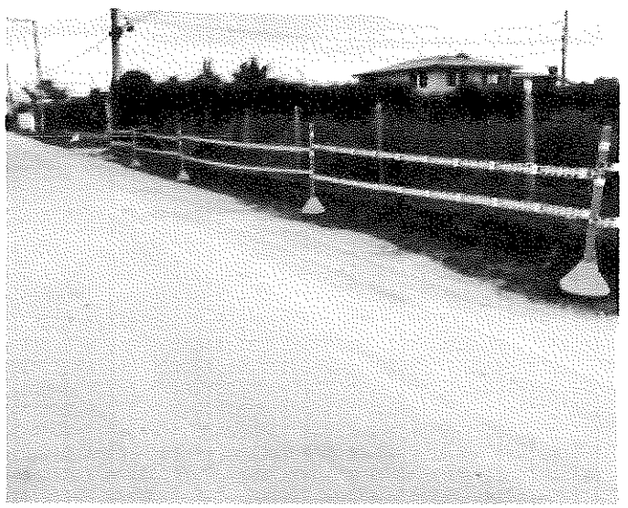

	ABSCISADO		DIMENSIONES			
UBICACIÓN	INICIO	FIN	LONG			TOTAL
Línea 1 - CHICU (V.Principal)	K0+000,00	K0+092,70	92,70			92,70
Línea 1 - CHICU (V.Principal)	K0+092,70	K0+564,80	472,10			472,10
Línea 1 - CHICU (V.Culebrera)	K0+564,80	K0+715,00	150,20			150,20
Línea 1 - CHICU (V.Culebrera)	K0+715,00	K0+960,00	245,00			245,00
		TOTAL				960,00

OBSERVACIONES

TOTAL	960,00

BALANCE DE CANTIDADES	
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0,0
A PAGAR PRESENTE ACTA	960,00
ACUMULADO	960,00

EPIFANIO VELASQUEZ LEAL
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO AQUA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
REPRESENTANTE LEGAL

Emsercota S.A.


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO AQUA

ACTA PARCIAL N°	3		FECHA DE CORTE	DD	6	MM	6	AA	2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA								
CONTRATISTA	CONSORCIO AQUA		NIT O C.C.	901.707.176-1		CONTRATO No.		No. 112-2023	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA		NIT O C.C.	900.124.654-4		CONTRATO No.		No. 117-2023	

COMPONENTE	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD		HOJA		
IMPULSION CULEBRERA	EPC - 1.1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES	ML		2	DE	3

ESQUEMAS

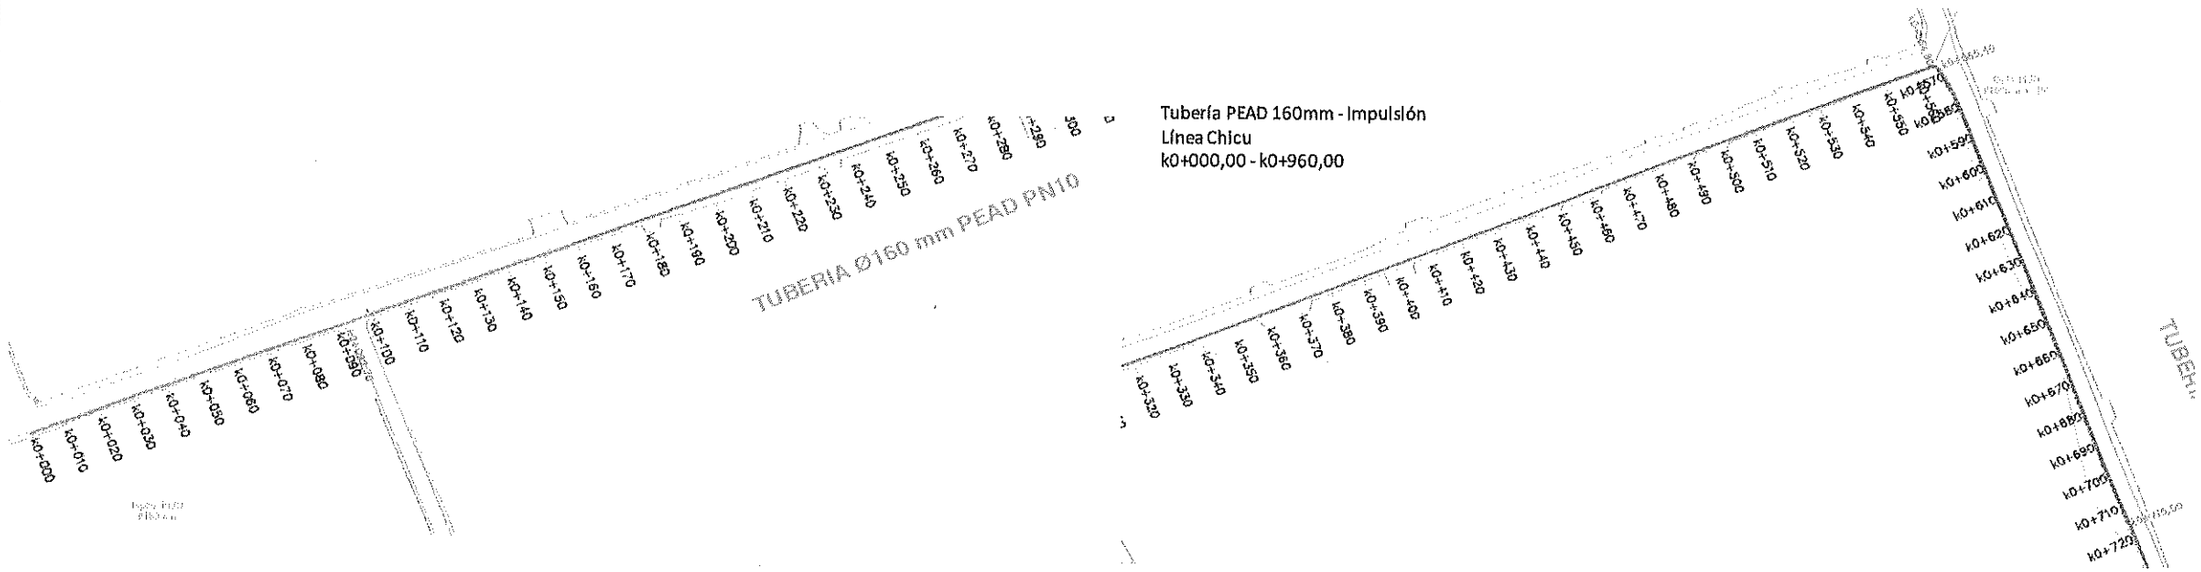

Tubería PEAD 160mm - Impulsión
Línea Chicu
k0+000,00 - k0+960,00

OBSERVACIONES

TOTAL	**960,00**
BALANCE DE CANTIDADES	
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0,0
A PAGAR PRESENTE ACTA	960,00
ACUMULADO	960,00

EPIFANIO VELASQUEZ LEAL
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO AQUA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
REPRESENTANTE LEGAL

626

Emsercota S.A.


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO AQUA

ACTA PARCIAL N°	3		FECHA DE CORTE	DD	6	MM	6	AA	2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA								
CONTRATISTA	CONSORCIO AQUA		NIT O C.C.	901.707.176-1		CONTRATO No.		No. 112-2023	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA		NIT O C.C.	900.124.654-4		CONTRATO No.		No. 117-2023	

COMPONENTE	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD		HOJA		
IMPULSION CULEBRERA	EPC - 1.1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES	ML		3	DE	3

ESQUEMAS

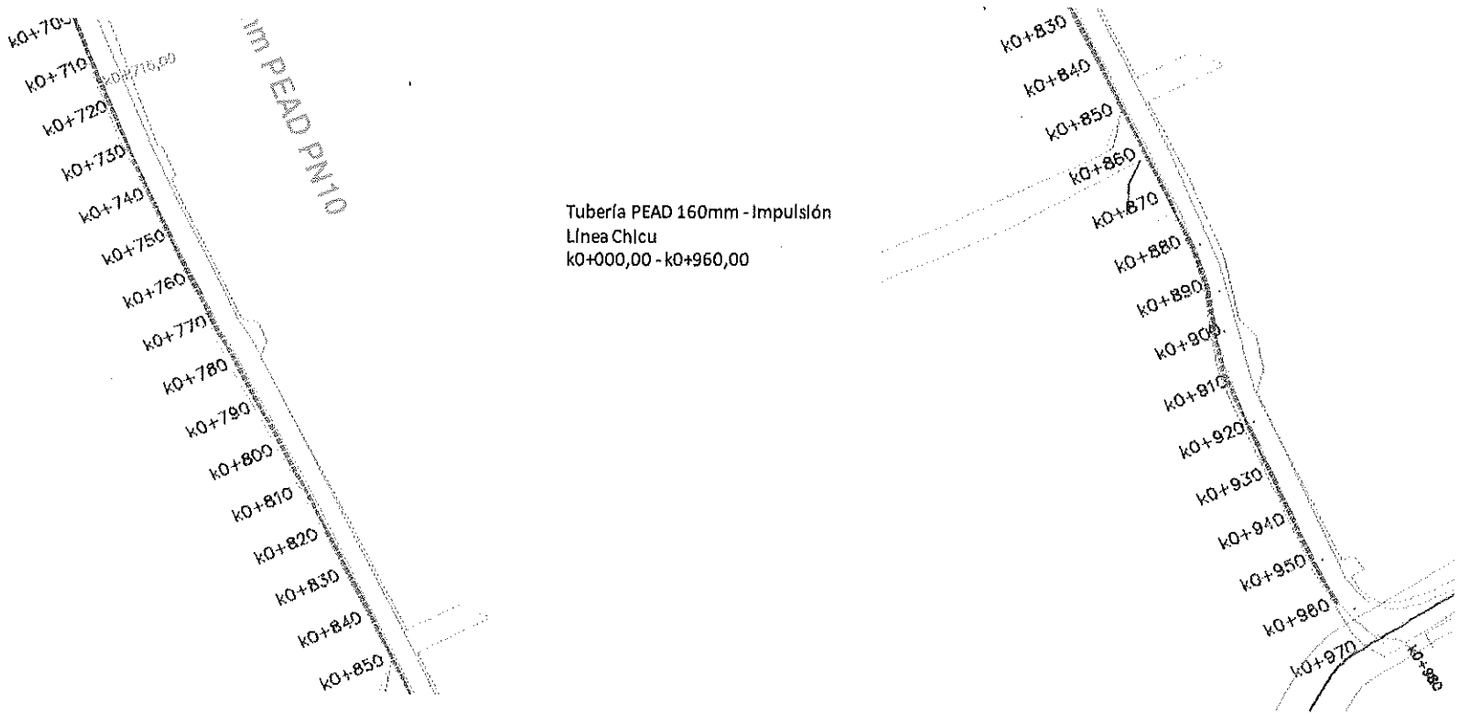

OBSERVACIONES

TOTAL	960,00
BALANCE DE CANTIDADES	
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0,0
A PAGAR PRESENTE ACTA	960,00
ACUMULADO	960,00

EPIFANIO VELASQUEZ LEAL
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO AQUA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
REPRESENTANTE LEGAL

6/12

Emsercota S.A.


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO AQUA

ACTA PARCIAL N°	3		FECHA DE CORTE	DD	6	MM	6	AA	2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA								
CONTRATISTA	CONSORCIO AQUA		NIT O C.C.	901.707.176-1		CONTRATO No.	No. 112-2023		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA		NIT O C.C.	900.124.654-4		CONTRATO No.	No. 117-2023		

COMPONENTE	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD		HOJA		
IMPULSION CULEBRERA	EPC - 3.1.3	SEÑALIZACIÓN Y AISLAMIENTO DE ÁREAS DE TRABAJO, INCLUYE CINTA DE SEGURIDAD, POSTES TUBULARES, CONOS GUIA, SEÑALES PREVENTIVAS Y REGLAMENTARIAS	ML/MES		1	DE	2



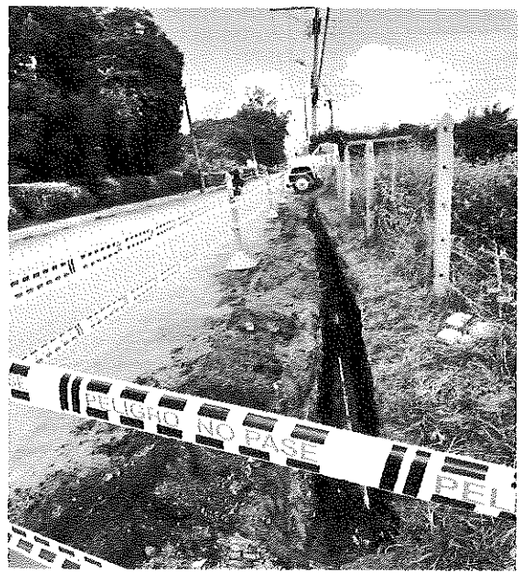

	ABSCISADO		DIMENSIONES			
UBICACIÓN	INICIO	FIN	CANT.			TOTAL
Línea 1 - CHICU (V.Principal)	K0+000,00	K0+092,70	92,70			92,70
Línea 1 - CHICU (V.Principal)	K0+092,70	K0+400,00	307,30			307,30
		TOTAL				400,00

OBSERVACIONES

TOTAL	400,00
BALANCE DE CANTIDADES	
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0,0
A PAGAR PRESENTE ACTA	400,00
ACUMULADO	400,00

EPIFANIO VELASQUEZ LEAL
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO AQUA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
REPRESENTANTE LEGAL

539

Emsercota S.A.

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO AQUA


ACTA PARCIAL N°	3		FECHA DE CORTE	DD	6	MM	6	AA	2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA								
CONTRATISTA	CONSORCIO AQUA		NIT O C.C.	901.707.176-1		CONTRATO No.		No. 112-2023	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA		NIT O C.C.	900.124.654-4		CONTRATO No.		No. 117-2023	

COMPONENTE	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD		HOJA		
IMPULSION CULEBRERA	EPC - 3.1.3	SEÑALIZACIÓN Y AISLAMIENTO DE ÁREAS DE TRABAJO, INCLUYE CINTA DE SEGURIDAD, POSTES TUBULARES, CONOS GUIA, SEÑALES PREVENTIVAS Y REGLAMENTARIAS	ML/MES		2	DE	2

ESQUEMAS



Señalización y Aislamiento Area de Trabajo
Tubería PEAD 160mm - Impulsión
Línea Chicu

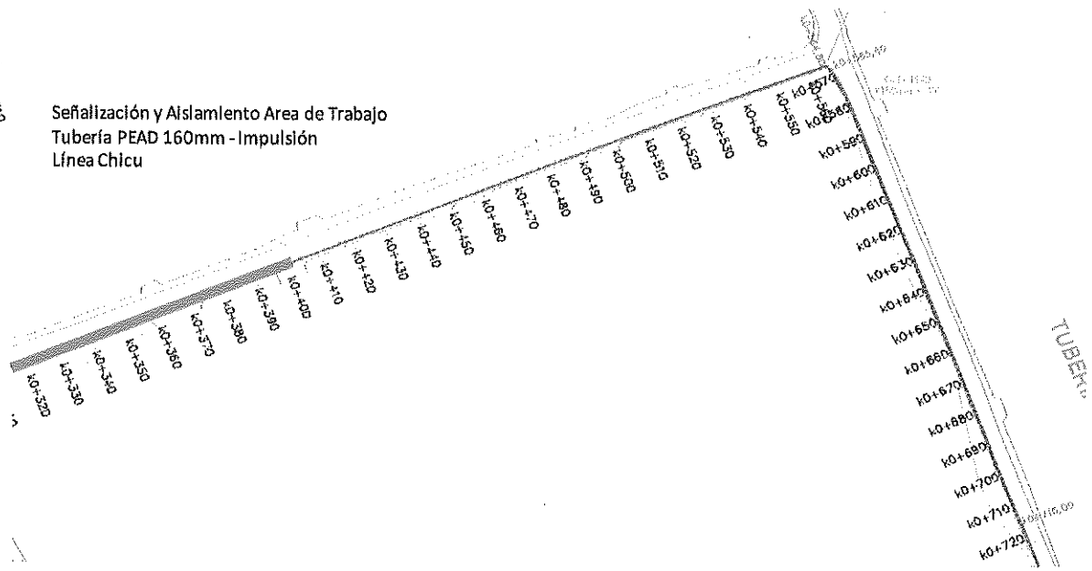

OBSERVACIONES

TOTAL	400,00
BALANCE DE CANTIDADES	
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0,0
A PAGAR PRESENTE ACTA	400,00
ACUMULADO	400,00

EPIFANIO VELASQUEZ LEAL
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO AQUA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
REPRESENTANTE LEGAL

Emsercota S.A.

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO AQUA

ACTA PARCIAL N°	3		FECHA DE CORTE	DD	6	MM	6	AA	2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA								
CONTRATISTA	CONSORCIO AQUA		NIT O C.C.	901.707.176-1		CONTRATO No.		No. 112-2023	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA		NIT O C.C.	900.124.654-4		CONTRATO No.		No. 117-2023	

COMPONENTE	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD		HOJA		
IMPULSION CULEBRERA	EPC - 4.1.1	EXCAVACIONES MANUAL EN TIERRA DE 0 A 2 M DE PROFUNDIDAD	M3		1	DE	3





	ABSCISADO		DIMENSIONES			
UBICACIÓN	INICIO	FIN	LONG.	ANCHO	ALTO	TOTAL
Línea 1 - CHICU (V.Principal)	K0+000,00	K0+092,70	92,70	0,60	1,20	66,74
Línea 1 - CHICU (V.Principal)	K0+092,70	K0+564,80	472,10	0,60	1,20	339,91
Línea 1 - CHICU (V.Culebrera)	K0+564,80	K0+715,00	150,20	0,60	1,20	108,14
Línea 1 - CHICU (V.Culebrera)	K0+715,00	K0+960,00	245,00	0,60	1,20	176,40
		TOTAL				691,20

OBSERVACIONES

TOTAL	691,20

BALANCE DE CANTIDADES	
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0,0
A PAGAR PRESENTE ACTA	691,20
SALDO POR EJECUTAR	691,20

EPIFANIO VELASQUEZ LEAL
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO AQUA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA QUIEDO
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
REPRESENTANTE LEGAL

680

Emsercota S.A.


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO AQUA


ACTA PARCIAL N°	3		FECHA DE CORTE	DD	6	MM	6	AA	2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA								
CONTRATISTA	CONSORCIO AQUA		NIT O C.C.	901.707.176-1		CONTRATO No.		No. 112-2023	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA		NIT O C.C.	900.124.654-4		CONTRATO No.		No. 117-2023	

COMPONENTE	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD		HOJA		
IMPULSION CULEBRERA	EPC - 4.1.1	EXCAVACIONES MANUAL EN TIERRA DE 0 A 2 M DE PROFUNDIDAD	M3		2	DE	3


ESQUEMAS

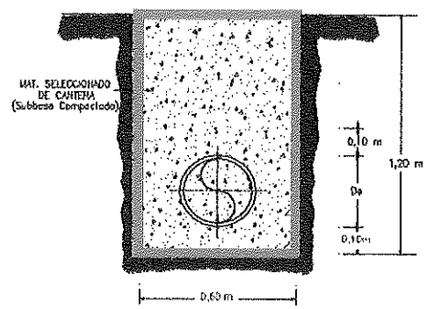

DETALLE EXCAVACION TUBERIA PEAD IMPULSION CULEBRERA

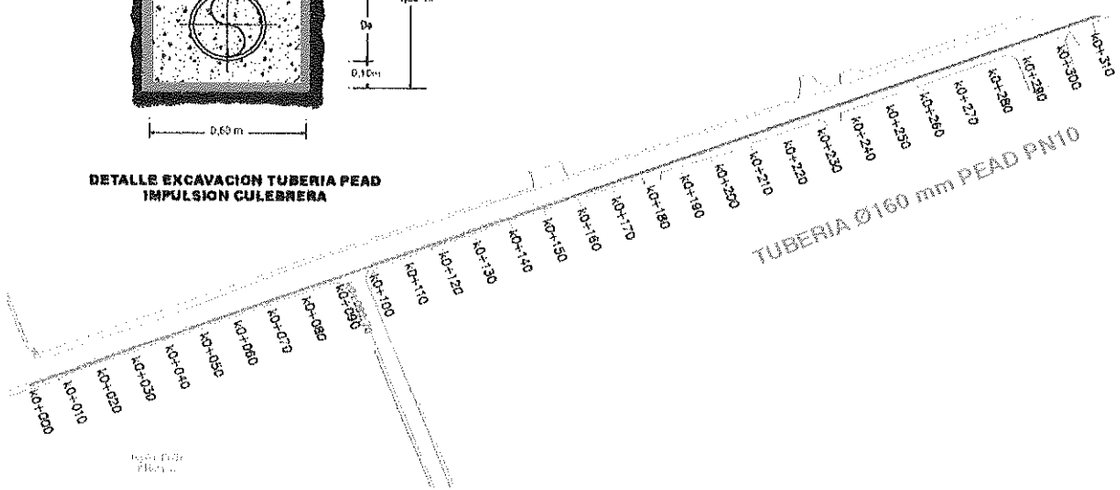

Tubería PEAD 160mm - Impulsión
Línea Chicu
k0+000,00 - k0+960,00

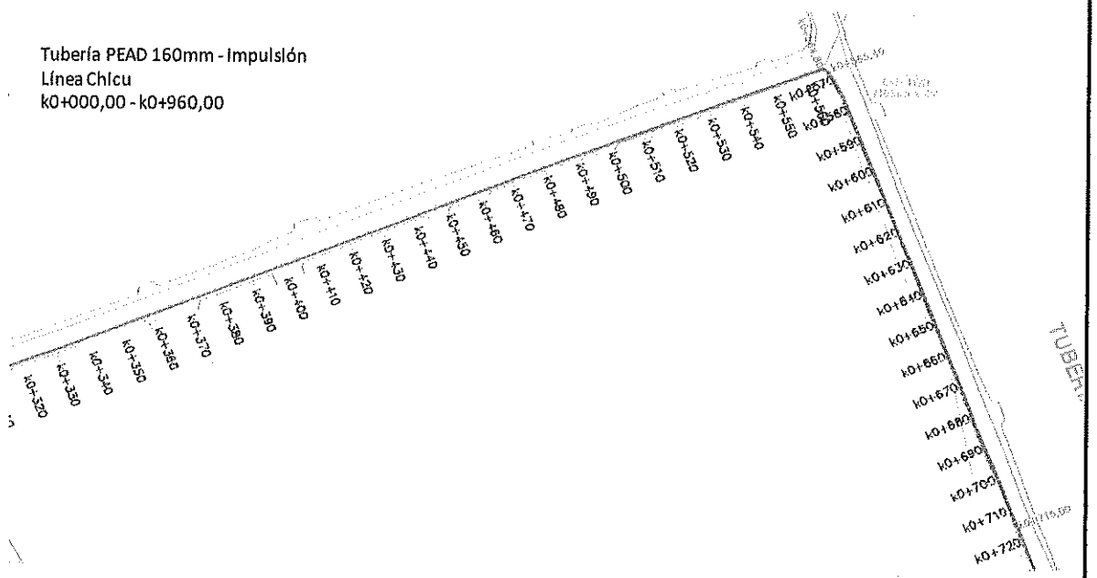

OBSERVACIONES

TOTAL	691,20
BALANCE DE CANTIDADES	
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0,0
A PAGAR PRESENTE ACTA	691,20
SALDO POR EJECUTAR	691,20

EPIFANIO VELASQUEZ LEAL
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO AQUA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
REPRESENTANTE LEGAL

Emsercota S.A.


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO AQUA

ACTA PARCIAL N°	3		FECHA DE CORTE	DD	6	MM	6	AA	2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA								
CONTRATISTA	CONSORCIO AQUA		NIT O C.C.	901.707.176-1		CONTRATO No.		No. 112-2023	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA		NIT O C.C.	900.124.654-4		CONTRATO No.		No. 117-2023	

COMPONENTE	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD		HOJA		
IMPULSION CULEBRERA	EPC - 4.1.1	EXCAVACIONES MANUAL EN TIERRA DE 0 A 2 M DE PROFUNDIDAD	M3		3	DE	3

ESQUEMAS

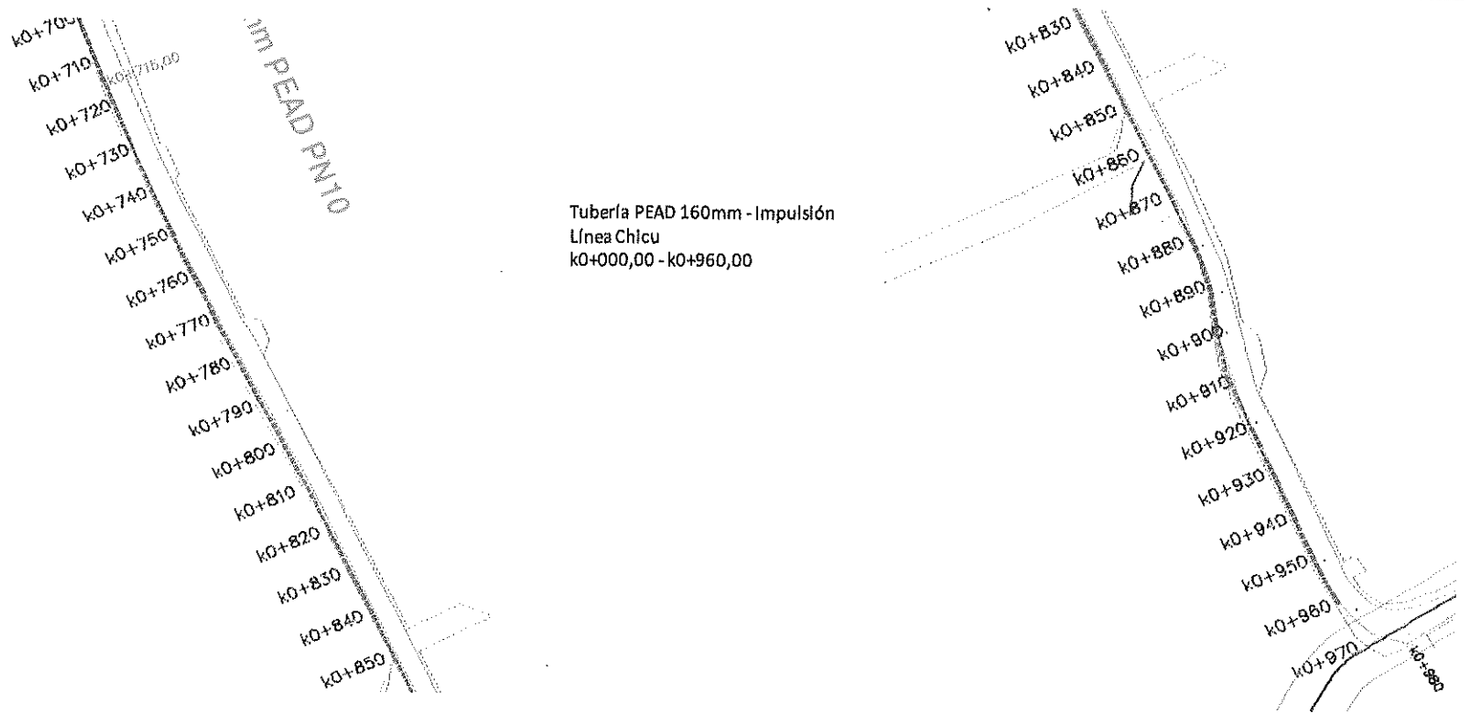

OBSERVACIONES

TOTAL	**691,20**
BALANCE DE CANTIDADES	
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0,0
A PAGAR PRESENTE ACTA	691,20
ACUMULADO	691,20

EPIFANIO VELASQUEZ LEAL
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO AQUA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
REPRESENTANTE LEGAL

682

Emsercota S.A.


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO AQUA

ACTA PARCIAL N°	3	FECHA DE CORTE	DD	6	MM	6	AA	2025	
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA								
CONTRATISTA	CONSORCIO AQUA	NIT O C.C.	901.707.176-1	CONTRATO No.	No. 112-2023				
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA	NIT O C.C.	900.124.654-4	CONTRATO No.	No. 117-2023				

COMPONENTE	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD		HOJA		
IMPULSION CULEBRERA	ICCU - 1.6 Vías	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3/KM		1	DE	2



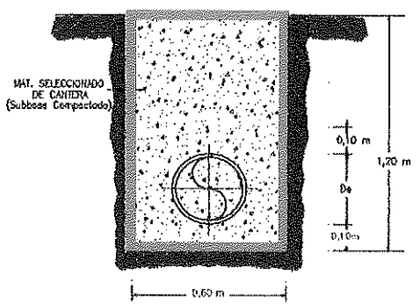

DETALLE EXCAVACION TUBERIA PEAD IMPULSION CULEBRERA

UBICACIÓN	ABSCISADO INICIO	ABSCISADO FIN	DIMENSIONES LONG.	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES ALTO	ACARREO EXPANSION	ACARREO KM	ACARREO TOTAL
Transporte Excavación Instalación Tubería PEAD (Zanja de instalación)								
Línea 1 - CHICU (V.Principal)	K0+000,00	K0+092,70	92,70	0,60	1,20	1,3	24	2082,41
Línea 1 - CHICU (V.Principal)	K0+092,70	K0+564,80	472,10	0,60	1,20	1,3	24	10605,25
Línea 1 - CHICU (V.Culebrera)	K0+564,80	K0+667,74	102,94	0,60	1,20	1,3	24	2312,33
					TOTAL			15000,00

OBSERVACIONES

TOTAL	15000,00

BALANCE DE CANTIDADES	
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0,0
A PAGAR PRESENTE ACTA	15000,00
ACUMULADO	15000,00

EPIFANIO VELASQUEZ LEAL
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO AQUA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORÍA
CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
REPRESENTANTE LEGAL

83

Emsercota S.A.


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO AQUA


ACTA PARCIAL N°	3	FECHA DE CORTE	DD	6	MM	6	AA	2025	
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA								
CONTRATISTA	CONSORCIO AQUA	NIT O C.C.	901.707.176-1	CONTRATO No.	No. 112-2023				
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA	NIT O C.C.	900.124.654-4	CONTRATO No.	No. 117-2023				

COMPONENTE	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD		HOJA		
IMPULSION CULEBRERA	ICCU - 1.6 Vias	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3/KM		2	DE	2


ESQUEMAS

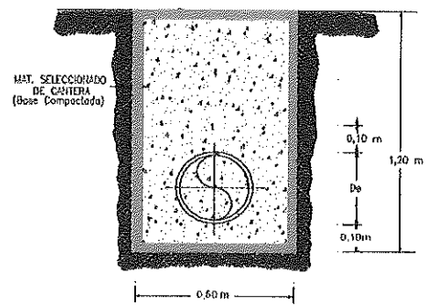

DETALLE EXCAVACION TUBERIA PEAD IMPULSION CULEBRERA

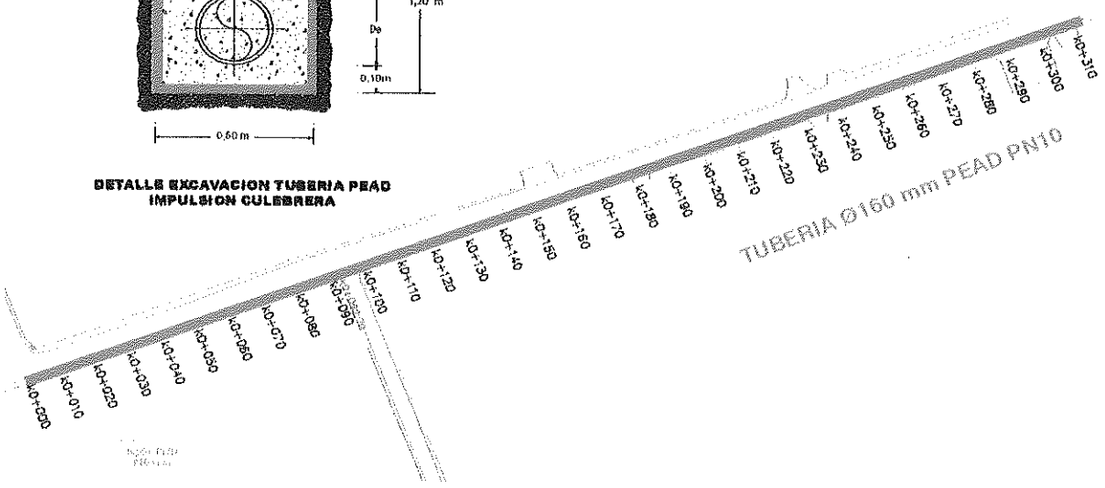

Transporte de Material de Excavación
Tubería PEAD 160mm - Impulsión
Línea Chicu
k0+000,00 - k0+667,74

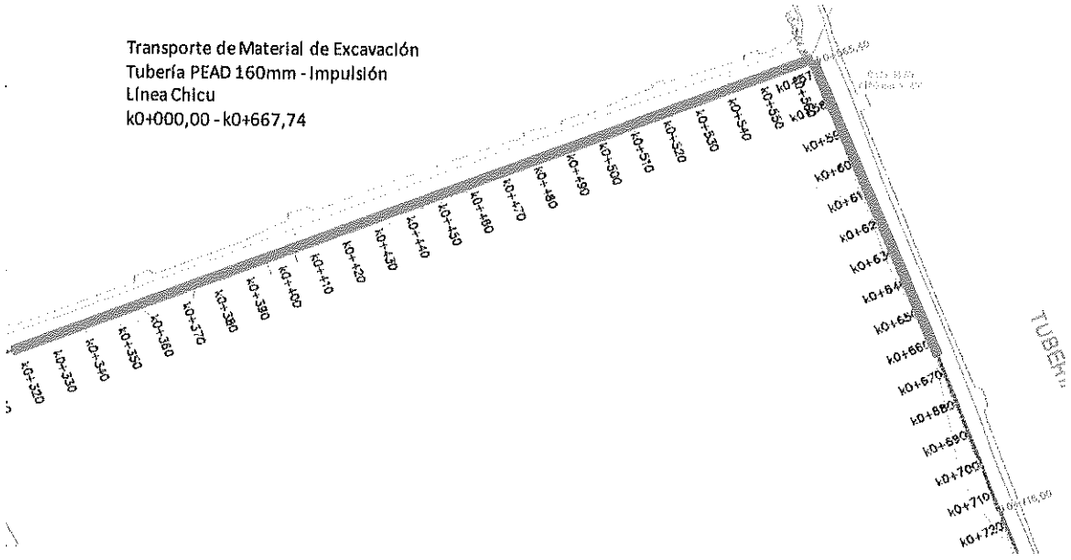

OBSERVACIONES

En los tramos donde la la excavacion es menor a 1,2m, se debe a la presencia de tuberia de gas que imposibilita excavar a mayor profundidad.

TOTAL	15000,00
BALANCE DE CANTIDADES	
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0,0
A PAGAR PRESENTE ACTA	15000,00
SALDO POR EJECUTAR	15000,00

EPIFANIO VELASQUEZ LEAL
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO AQUA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
REPRESENTANTE LEGAL


Emsercota S.A.

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO AQUA

ACTA PARCIAL N°	3		FECHA DE CORTE	DD	6	MM	6	AA	2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA							
CONTRATISTA	CONSORCIO AQUA		NIT O C.C.	901.707.176-1		CONTRATO No.		No. 112-2023	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA		NIT O C.C.	900.124.654-4		CONTRATO No.		No. 117-2023	

COMPONENTE	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD		HOJA		
IMPULSION CULEBRERA	EPC - 7.5.6	INSTALACION TUBERIA POLIETILENO 160MM PN10 PE100 (6")	ML		1	DE	2

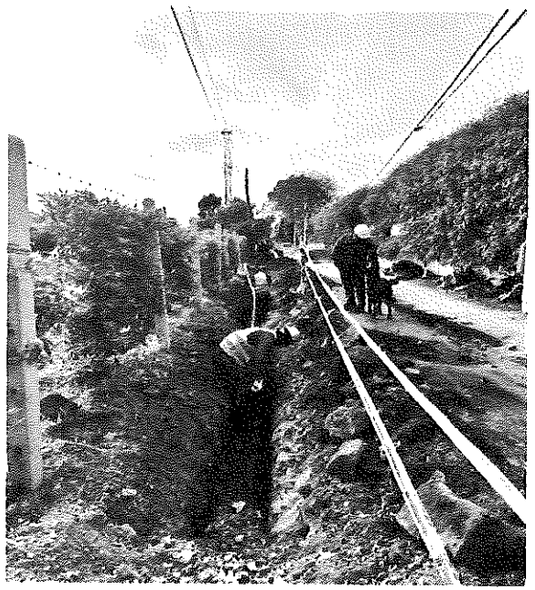



	ABSCISADO		DIMENSIONES			
UBICACIÓN	INICIO	FIN	LONG.	ANCHO	ALTO	TOTAL
Línea 1 - CHICU (V. Principal)	K0+000,00	K0+092,70	92,70			92,70
Línea 1 - CHICU (V. Principal)	K0+092,70	K0+564,80	472,10			472,10
Línea 1 - CHICU (V. Culebrera)	K0+564,80	K0+715,00	150,20			150,20
Línea 1 - CHICU (V. Culebrera)	K0+715,00	K0+960,00	245,00			245,00
		TOTAL				960,00

OBSERVACIONES

TOTAL	960,00

BALANCE DE CANTIDADES	
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0,0
A PAGAR PRESENTE ACTA	960,00
ACUMULADO	960,00

EPIFANIO VELASQUEZ LEAL
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO AQUA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
REPRESENTANTE LEGAL

68

Emsercota S.A.

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


CONSORCIO AQUA

ACTA PARCIAL N°	3		FECHA DE CORTE	DD	6	MM	6	AA	2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA								
CONTRATISTA	CONSORCIO AQUA		NIT O C.C.	901.707.176-1		CONTRATO No.		No. 112-2023	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA		NIT O C.C.	900.124.654-4		CONTRATO No.		No. 117-2023	

COMPONENTE	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD		HOJA		
IMPULSION CULEBRERA	EPC - 7.5.6	INSTALACION TUBERIA POLIETILENO 160MM PN10 PE100 (6")	ML		2	DE	3

ESQUEMAS

Tubería PEAD 160mm - Impulsión
Línea Chicu
k0+000,00 - k0+960,00

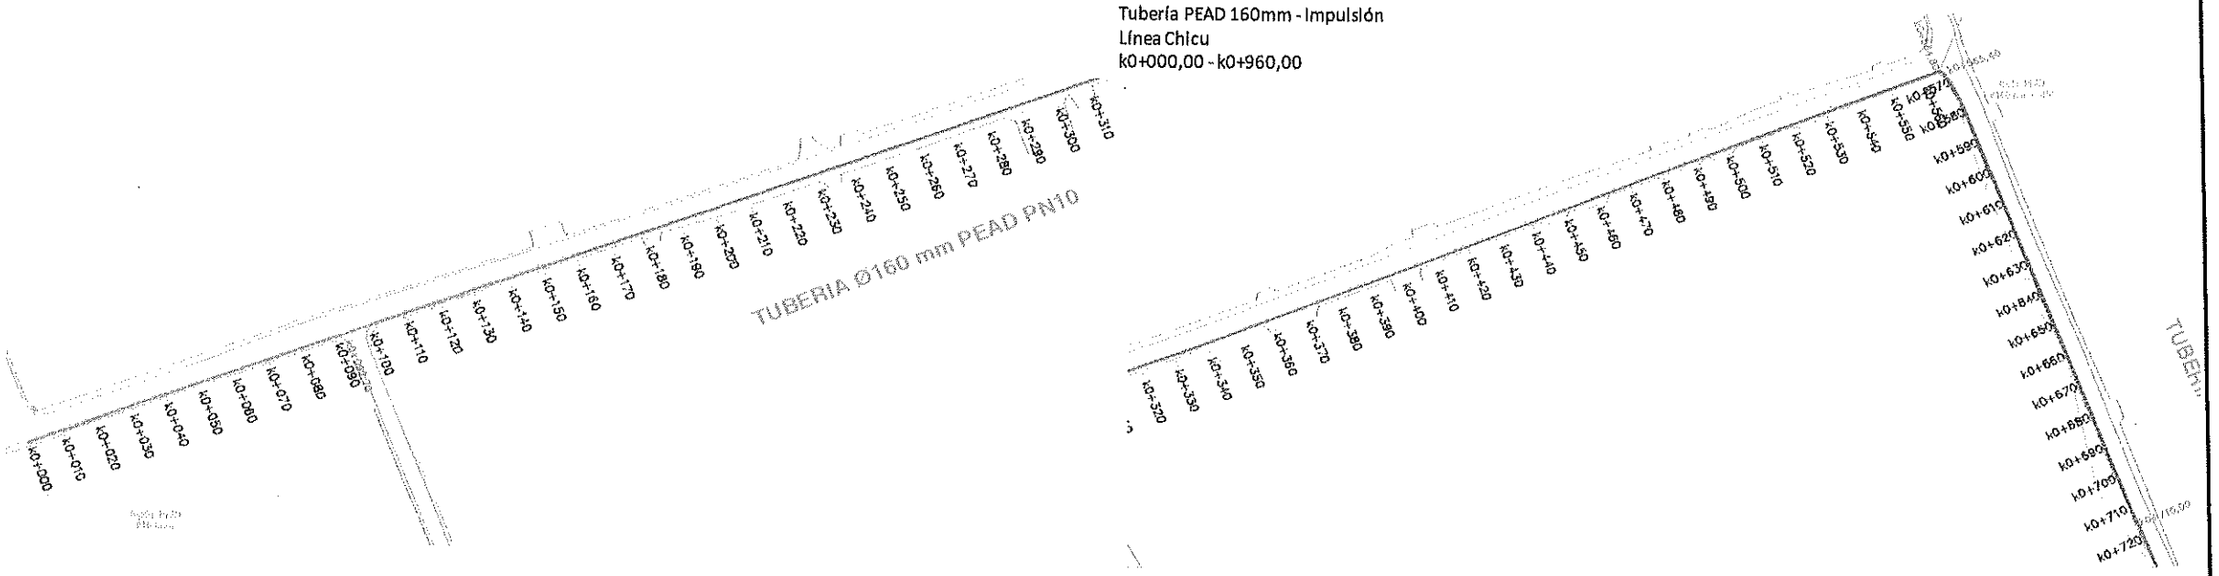

OBSERVACIONES

TOTAL	960,00
BALANCE DE CANTIDADES	
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0,0
A PAGAR PRESENTE ACTA	960,00
SALDO POR EJECUTAR	960,00

EPIFANIO VELASQUEZ LEAL
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO AQUA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
REPRESENTANTE LEGAL

Emsercota S.A.


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO AQUA

ACTA PARCIAL N°	3		FECHA DE CORTE	DD	6	MM	6	AA	2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA								
CONTRATISTA	CONSORCIO AQUA		NIT O C.C.	901.707.176-1		CONTRATO No.		No. 112-2023	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA		NIT O C.C.	900.124.654-4		CONTRATO No.		No. 117-2023	

COMPONENTE	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD		HOJA		
IMPULSION CULEBRERA	EPC - 7.5.6	INSTALACION TUBERIA POLIETILENO 160MM PN10 PE100 (6")	ML		3	DE	3

ESQUEMAS

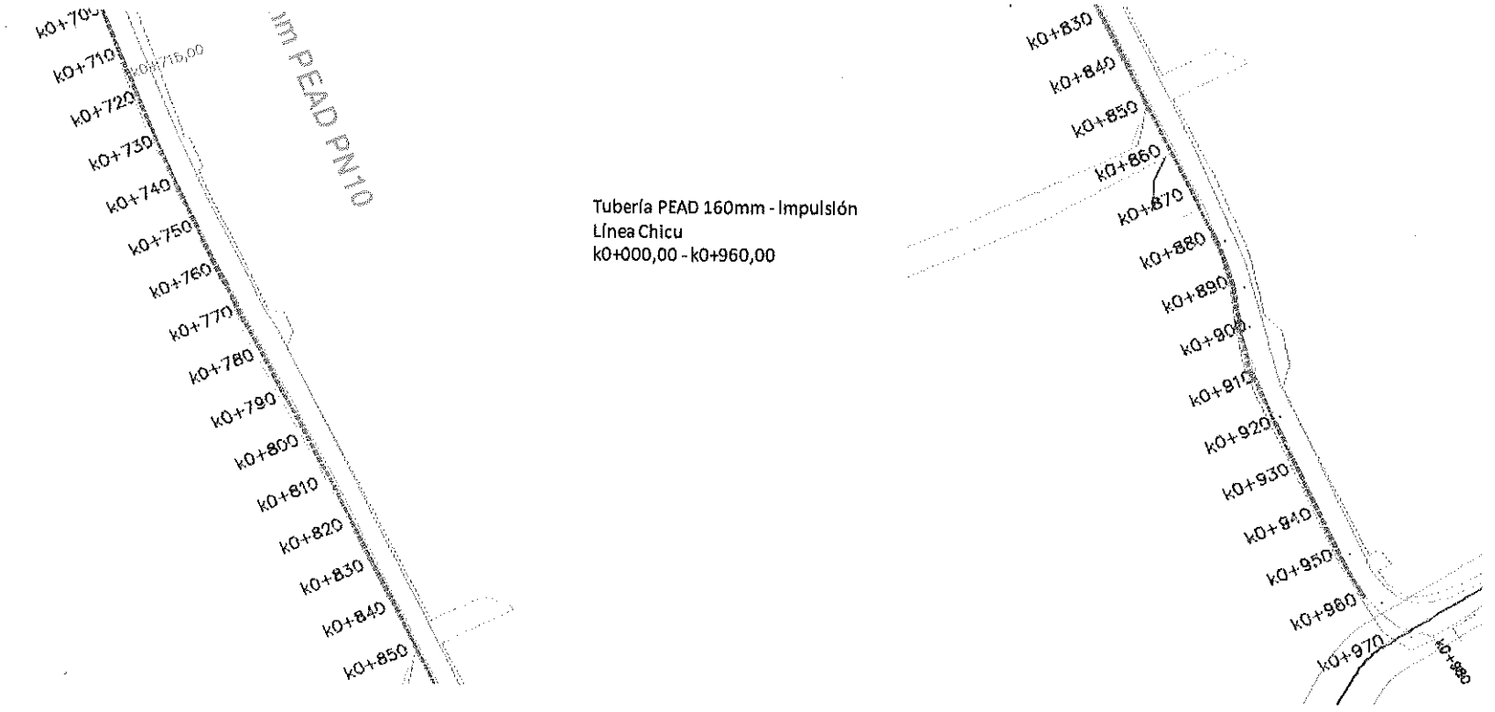

Tubería PEAD 160mm - Impulsión
Línea Chicu
k0+000,00 - k0+960,00

OBSERVACIONES

TOTAL	**960,00**
BALANCE DE CANTIDADES	
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0,0
A PAGAR PRESENTE ACTA	960,00
ACUMULADO	960,00

EPIFANIO VELASQUEZ LEAL
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO AQUA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
REPRESENTANTE LEGAL

682

Emsercota S.A.


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO AQUA

ACTA PARCIAL N°	3		FECHA DE CORTE	DD	6	MM	6	AA	2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA								
CONTRATISTA	CONSORCIO AQUA		NIT O C.C.	901.707.176-1		CONTRATO No.		No. 112-2023	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA		NIT O C.C.	900.124.654-4		CONTRATO No.		No. 117-2023	

COMPONENTE	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD		HOJA		
IMPULSION CULEBRERA	EPC - 7.6.6	INSTALACIÓN ACCESORIO POLIETILENO 160MM (6")	UND		1	DE	2



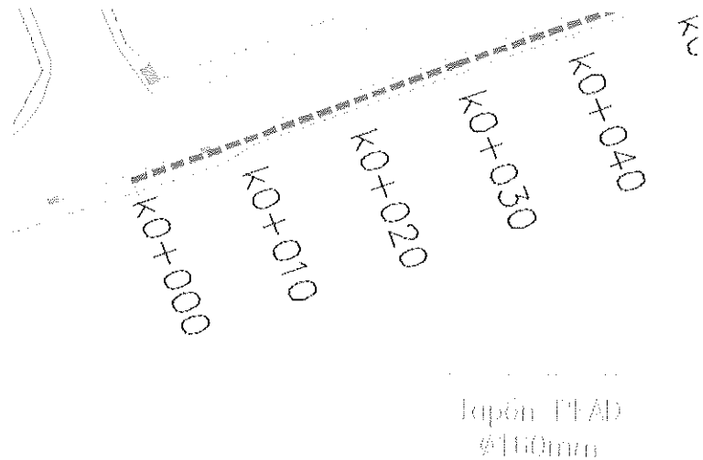

	ABSCISADO		DIMENSIONES			
UBICACIÓN	INICIO	FIN	CANT.			TOTAL
Línea 1 - CHICU (V. Principal)	K0+000,00	K0+000,00	1,00			1,00
Línea 1 - CHICU (V. Principal)	K0+564,80	K0+564,80	1,00			1,00
Línea 1 - CHICU (V. Culebrera)	K0+565,40	K0+565,40	1,00			1,00
		TOTAL				3,00

OBSERVACIONES
- Tapón PEAD 160mm en k0+000
- Codo PEAD 160mm en k0+564,8
- Codo PEAD 160mm en k0+565,4

TOTAL	3,00

BALANCE DE CANTIDADES	
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0,0
A PAGAR PRESENTE ACTA	3,00
ACUMULADO	3,00

EPIFANIO VELASQUEZ LEAL
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO AQUA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
REPRESENTANTE LEGAL

Emsercota S.A.

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


CONSORCIO AQUA

ACTA PARCIAL N°	3		FECHA DE CORTE	DD	6	MM	6	AA	2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA								
CONTRATISTA	CONSORCIO AQUA		NIT O C.C.	901.707.176-1		CONTRATO No.		No. 112-2023	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA		NIT O C.C.	900.124.654-4		CONTRATO No.		No. 117-2023	

COMPONENTE	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD		HOJA		
IMPULSION CULEBRERA	EPC - 7.6.6	INSTALACIÓN ACCESORIO POLIETILENO 160MM (6")	ML		2	DE	2

ESQUEMAS



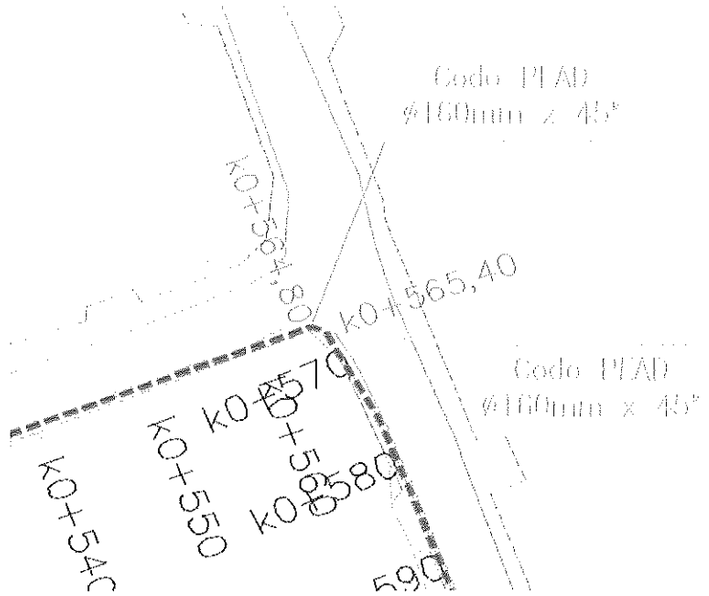

OBSERVACIONES
- Tapón PEAD 160mm en k0+000
- Codo PEAD 160mm en k0+564,8
- Codo PEAD 160mm en k0+565,4

TOTAL	3,00
BALANCE DE CANTIDADES	
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0,0
A PAGAR PRESENTE ACTA	3,00
ACUMULADO	3,00

EPIFANIO VELASQUEZ LEAL
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO AQUA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
REPRESENTANTE LEGAL

Emsercota S.A.


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO AQUA

ACTA PARCIAL N°	3		FECHA DE CORTE	DD	6	MM	6	AA	2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA								
CONTRATISTA	CONSORCIO AQUA		NIT O C.C.	901.707.176-1		CONTRATO No.		No. 112-2023	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA		NIT O C.C.	900.124.654-4		CONTRATO No.		No. 117-2023	

COMPONENTE	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD		HOJA		
IMPULSION CULEBRERA	SUM.TUB.PEAD 160	SUMINISTRO TUBERIA POLIETILENO 160MM PN10 PE100 (6")	ML		1	DE	1



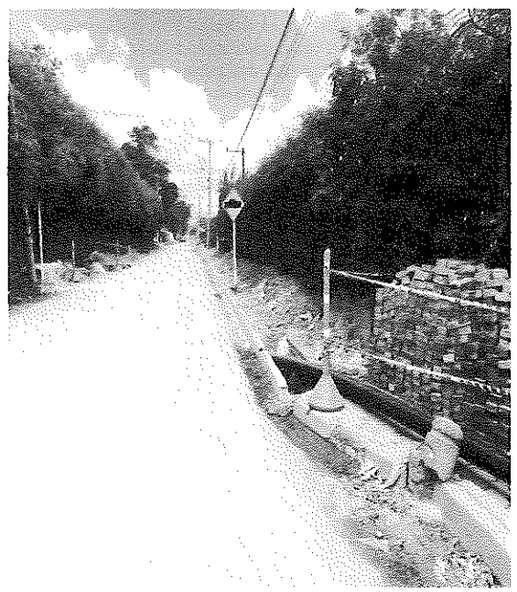

	ABSCISADO		DIMENSIONES			
UBICACIÓN	INICIO	FIN	LONG.	ANCHO	ALTO	TOTAL
Línea 1 - CHICU (V.Principal)	K0+000,00	K0+092,70	92,70			92,70
Línea 1 - CHICU (V.Principal)	K0+092,70	K0+564,80	472,10			472,10
Línea 1 - CHICU (V.Culebrera)	K0+564,80	K0+715,00	150,20			150,20
Línea 1 - CHICU (V.Culebrera)	K0+715,00	K0+960,00	245,00			245,00
		TOTAL				960,00

OBSERVACIONES

TOTAL	960,00

BALANCE DE CANTIDADES	
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0,0
A PAGAR PRESENTE ACTA	960,00
ACUMULADO	960,00

EPIFANIO VELASQUEZ LEAL
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO AQUA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
REPRESENTANTE LEGAL

Emsercota S.A.


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO AQUA

ACTA PARCIAL N°	3		FECHA DE CORTE	DD	6	MM	6	AA	2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA								
CONTRATISTA	CONSORCIO AQUA		NIT O C.C.	901.707.176-1		CONTRATO No.		No. 112-2023	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA		NIT O C.C.	900.124.654-4		CONTRATO No.		No. 117-2023	

COMPONENTE	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD		HOJA		
IMPULSION CULEBRERA	Sum.Acc.PEAD 160	SUMINISTRO ACCESORIO POLIETILENO 160MM (6")	UND		1	DE	2



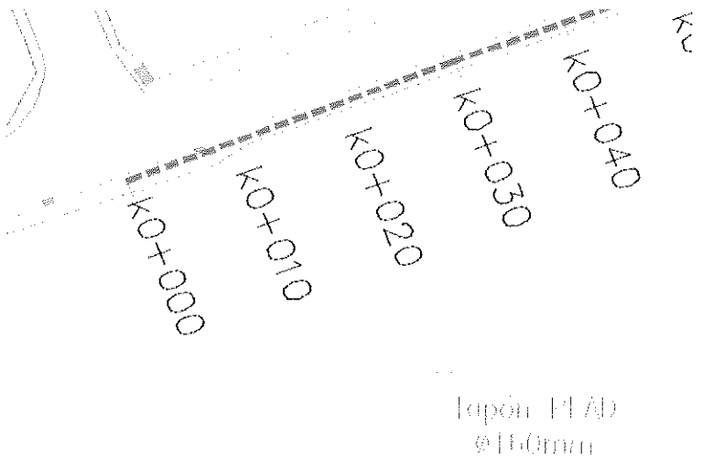

	ABSCISADO		DIMENSIONES			
UBICACIÓN	INICIO	FIN	CANT.			TOTAL
Línea 1 - CHICU (V. Principal)	K0+000,00	K0+000,00	1,00			1,00
Línea 1 - CHICU (V. Principal)	K0+564,80	K0+564,80	1,00			1,00
Línea 1 - CHICU (V. Culebrera)	K0+565,40	K0+565,40	1,00			1,00
	TOTAL					3,00

OBSERVACIONES
- Tapón PEAD 160mm en k0+000
- Codo PEAD 160mm en k0+564,8
- Codo PEAD 160mm en k0+565,4

TOTAL	3,00
BALANCE DE CANTIDADES	
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0,0
A PAGAR PRESENTE ACTA	3,00
ACUMULADO	3,00

EPIFANIO VELASQUEZ LEAL
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO AQUA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
REPRESENTANTE LEGAL

Emsercota S.A.


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


CONSORCIO AQUA

ACTA PARCIAL N°	3		FECHA DE CORTE	DD	6	MM	6	AA	2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA								
CONTRATISTA	CONSORCIO AQUA		NIT O C.C.	901.707.176-1		CONTRATO No.		No. 112-2023	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA		NIT O C.C.	900.124.654-4		CONTRATO No.		No. 117-2023	

COMPONENTE	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD		HOJA		
IMPULSION CULEBRERA	Sum.Acc.PEAD 160	SUMINISTRO ACCESORIO POLIETILENO 160MM (6")	UND		2	DE	2

ESQUEMAS

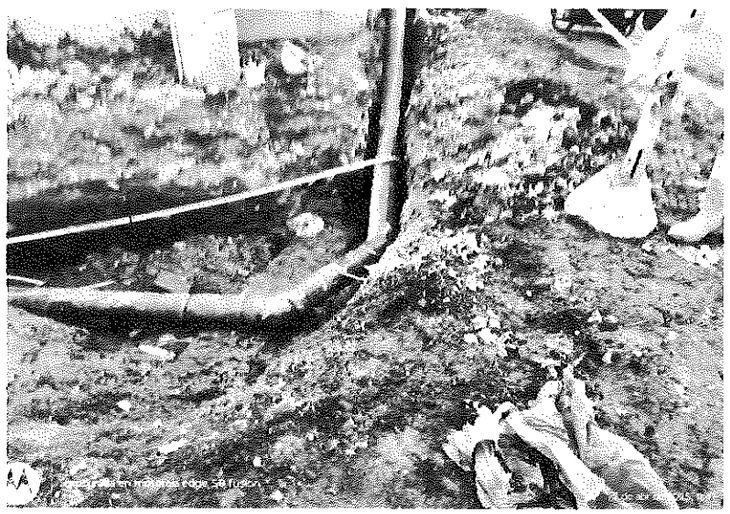

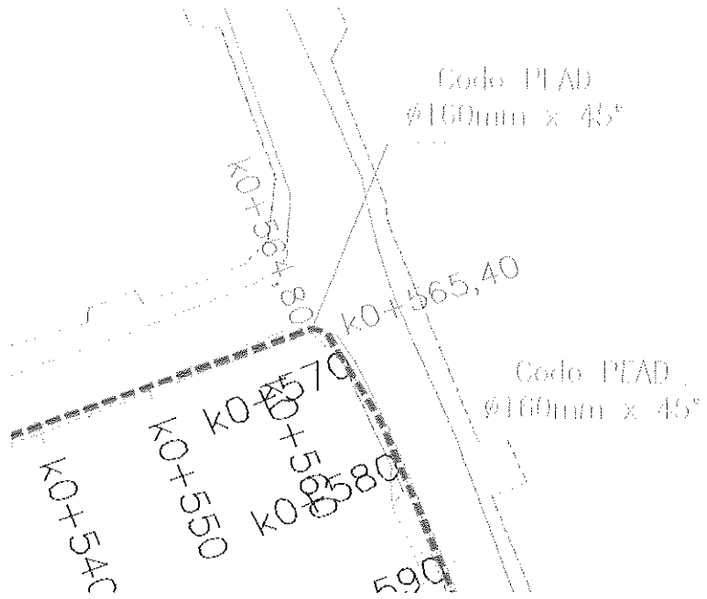

OBSERVACIONES
- Tapón PEAD 160mm en k0+000
- Codo PEAD 160mm en k0+564,8
- Codo PEAD 160mm en k0+565,4

TOTAL	**3,00**
BALANCE DE CANTIDADES	
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0,0
A PAGAR PRESENTE ACTA	3,00
ACUMULADO	3,00

EPIFANIO VELASQUEZ LEAL
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO AQUA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
REPRESENTANTE LEGAL

692


Emsercota S.A.


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO AQUA

ACTA PARCIAL N°	3		FECHA DE CORTE	DD	6	MM	6	AA	2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA								
CONTRATISTA	CONSORCIO AQUA		NIT O C.C.	901.707.176-1		CONTRATO No.		No. 112-2023	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA		NIT O C.C.	900.124.654-4		CONTRATO No.		No. 117-2023	

COMPONENTE	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD		HOJA		
ACUEDUCTO PARCELAS GLOBO 1	EPC - 1.1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES	ML		1	DE	2

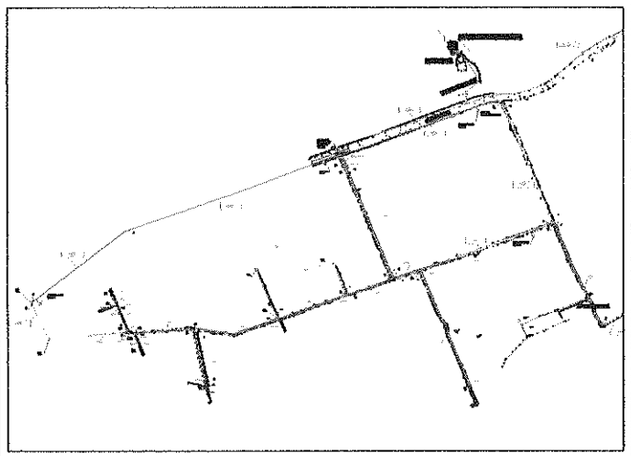

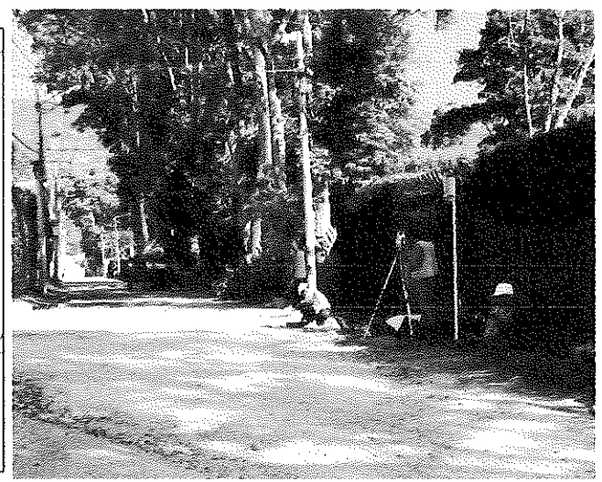

	ABSCISADO		DIMENSIONES			
UBICACIÓN	INICIO	FIN	LONG.			TOTAL
Tubería PEAD 160mm						
N8 - N9	K0+000,00	K0+480,00	480,00			480,00
N8 - N11	K0+013,00	K0+162,20	149,20			149,20
N11 - N14	K0+162,20	K0+407,80	245,60			245,60
N14 - N23	K0+407,80	K0+686,00	278,20			278,20
N23 - N21	K0+002,00	K0+197,00	195,00			195,00
Tubería PEAD 110mm						
N7 - N8	K0+463,40	K0+563,40	100,00			100,00
N3 - N7	K0+000,00	K0+463,40	463,40			463,40
Tubería PEAD 90mm						
N3 - N4	K0+010,00	K0+400,00	390,00			390,00
N7 - N6	K0+010,00	K0+455,00	445,00			445,00
N23 - N22	K0+007,00	K0+224,00	217,00			217,00
N22 - N20	K0+000,00	K0+103,80	103,80			103,80
N20 - N16	K0+103,80	K0+137,00	33,20			33,20
N20 - N19	K0+000,00	K0+010,00	10,00			10,00
N22A - N25	K0+000,00	K0+050,00	50,00			50,00
N22 - N18	K0+224,00	K0+491,00	267,00			267,00
N14 - N12	K0+002,00	K0+191,00	189,00			189,00
N11 - N10	K0+000,00	K0+119,00	119,00			119,00
N18 - N17	K0+491,00	K0+626,00	135,00			135,00
N3-N2	K0+000,00	K0+462,00	462,00			462,00
	TOTAL					4332,40

OBSERVACIONES

TOTAL	4332,40
BALANCE DE CANTIDADES	
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0,0
A PAGAR PRESENTE ACTA	4332,40
ACUMULADO	4332,40

EPIFANIO VELASQUEZ LEAL
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO AQUA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
REPRESENTANTE LEGAL

698

Emsercota S.A.


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO AQUA

ACTA PARCIAL N°	3		FECHA DE CORTE	DD	6	MM	6	AA	2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA								
CONTRATISTA	CONSORCIO AQUA		NIT O C.C.	901,707.176-1		CONTRATO No.		No. 112-2023	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA		NIT O C.C.	900.124.654-4		CONTRATO No.		No. 117-2023	

COMPONENTE	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD		HOJA		
ACUEDUCTO PARCELAS GLOBO 1	EPC - 1.1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES	ML		2	DE	2

ESQUEMAS

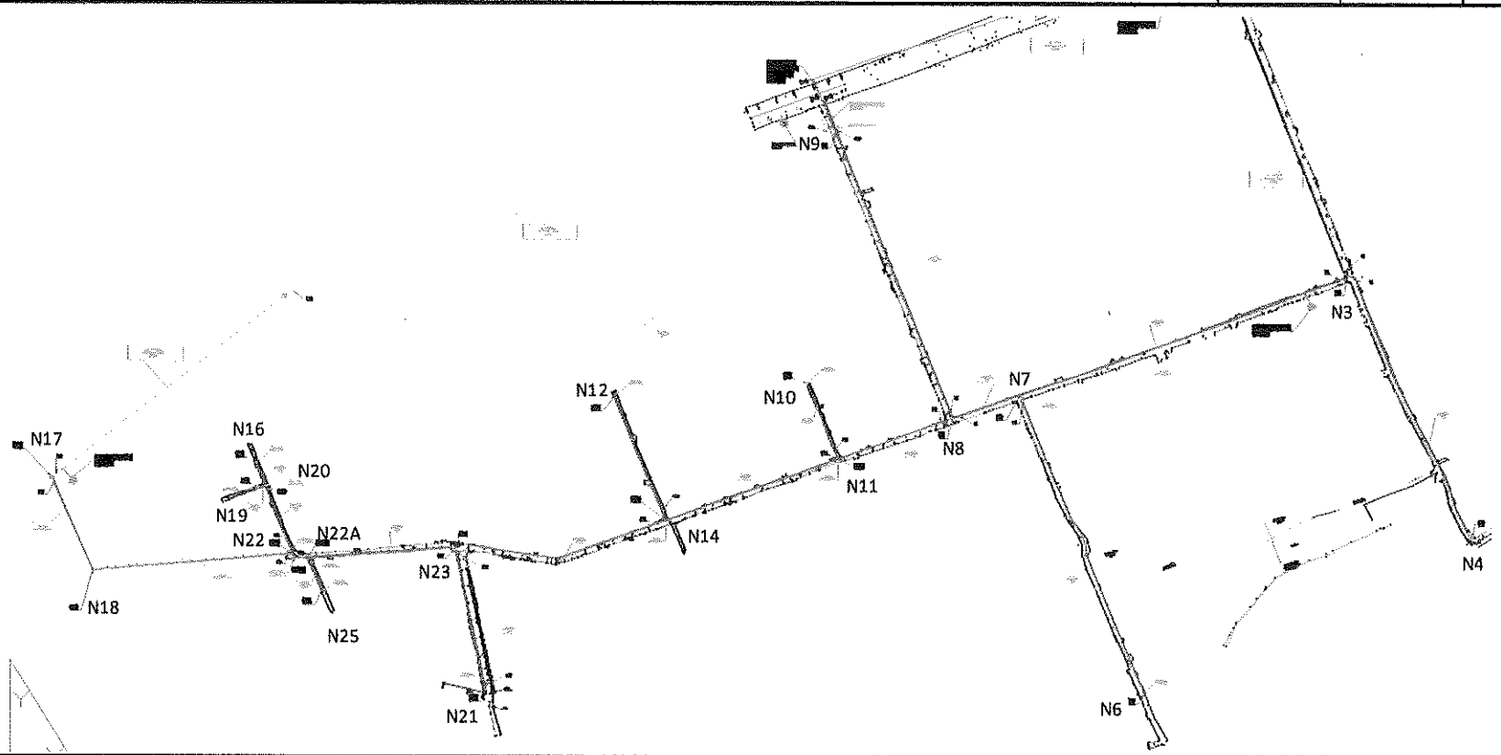

OBSERVACIONES

TOTAL	4332,40
BALANCE DE CANTIDADES	
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0,0
A PAGAR PRESENTE ACTA	4332,40
ACUMULADO	4332,40

EPIFANIO VELASQUEZ LEAL
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO AQUA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORÍA
CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
REPRESENTANTE LEGAL


Emsercota S.A.


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO AQUA

ACTA PARCIAL N°	3		FECHA DE CORTE	DD	6	MM	6	AA	2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA								
CONTRATISTA	CONSORCIO AQUA		NIT O C.C.	901.707.176-1		CONTRATO No.		No. 112-2023	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA		NIT O C.C.	900.124.654-4		CONTRATO No.		No. 117-2023	

COMPONENTE	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD		HOJA		
ACUEDUCTO PARCELAS GLOBO 1	ICCU - 1.1 Vías	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3		1	DE	3

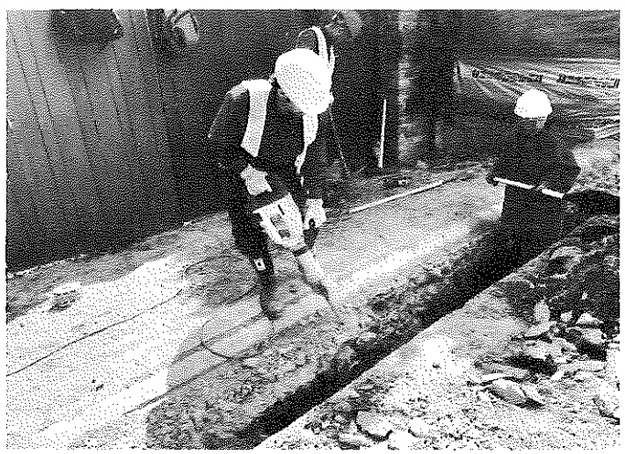

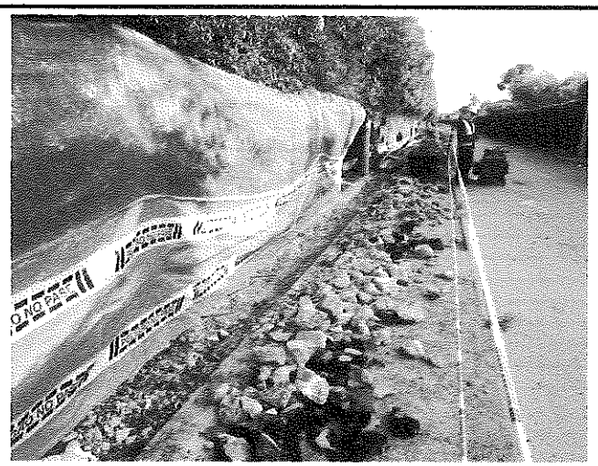

	ABSCISADO		DIMENSIONES			
UBICACIÓN	INICIO	FIN	LONG.	ANCHO	ALTO	TOTAL
N8 - N9	K0+223,70	K0+261,70	38,00	0,60	0,20	4,56
N8 - N9	K0+313,50	K0+335,50	22,00	0,60	0,20	2,64
N8 - N9	K0+423,80	K0+427,80	4,00	0,60	0,20	0,48
N8 - N9	K0+443,10	K0+455,10	12,00	0,60	0,20	1,44
N14 - N23	K0+598,10	K0+604,10	6,00	0,60	0,20	0,72
N7 - N3	K0+406,70	K0+416,70	10,00	0,50	0,15	0,75
N22 - N18	K0+326,50	K0+332,50	6,00	0,50	0,15	0,45
		TOTAL				11,04

OBSERVACIONES

TOTAL	11,04

BALANCE DE CANTIDADES	
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0,0
A PAGAR PRESENTE ACTA	11,04
ACUMULADO	11,04

EPIFANIO VELASQUEZ LEAL
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO AQUA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
REPRESENTANTE LEGAL

695

Emsercota S.A.


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO AQUA


ACTA PARCIAL N°	3		FECHA DE CORTE	DD	6	MM	6	AA	2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA								
CONTRATISTA	CONSORCIO AQUA		NIT O C.C.	901.707.176-1		CONTRATO No.		No. 112-2023	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA		NIT O C.C.	900.124.654-4		CONTRATO No.		No. 117-2023	

COMPONENTE	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD		HOJA		
ACUEDUCTO PARCELAS GLOBO 1	ICCU - 1.1 Vías	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3		2	DE	3


ESQUEMAS

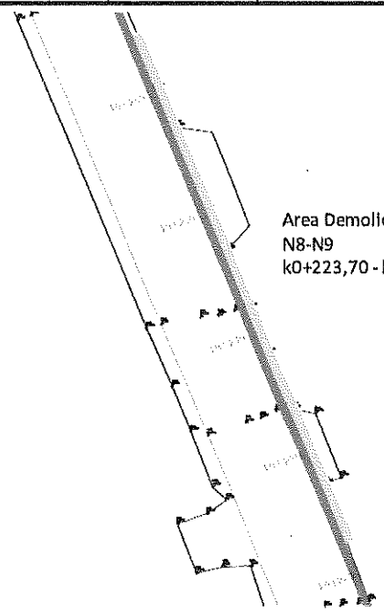

Area Demolición
N8-N9
k0+223,70 - k0+261,70

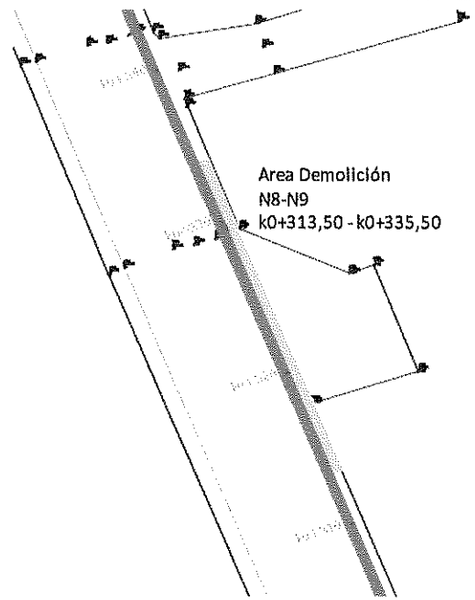

Area Demolición
N8-N9
k0+313,50 - k0+335,50

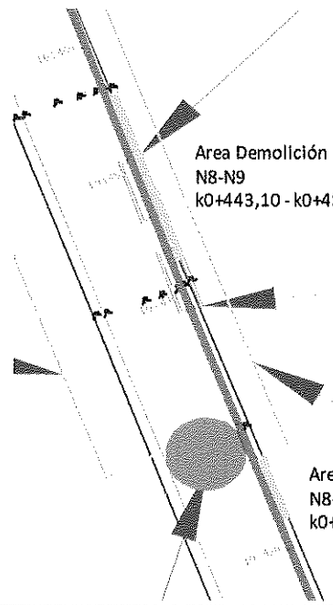

Area Demolición
N8-N9
k0+443,10 - k0+455,10

Area Demolición
N8-N9
k0+423,80 - k0+427,80

OBSERVACIONES

TOTAL	**11,04**
BALANCE DE CANTIDADES	
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0,0
A PAGAR PRESENTE ACTA	11,04
ACUMULADO	11,04

EPIFANIO VELASQUEZ LEAL
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO AQUA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
REPRESENTANTE LEGAL

696

Emsercota S.A.


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


CONSORCIO AQUA


ACTA PARCIAL N°	3		FECHA DE CORTE	DD	6	MM	6	AA	2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA								
CONTRATISTA	CONSORCIO AQUA		NIT O C.C.	901.707.176-1		CONTRATO No.		No. 112-2023	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA		NIT O C.C.	900.124.654-4		CONTRATO No.		No. 117-2023	

COMPONENTE	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD		HOJA		
ACUEDUCTO PARCELAS GLOBO 1	ICCU - 1.1 Vías	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3		3	DE	3

ESQUEMAS

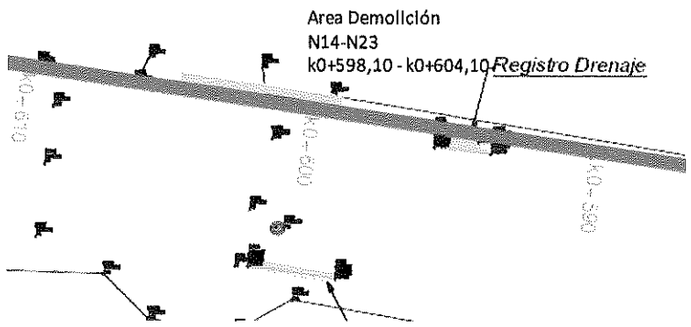

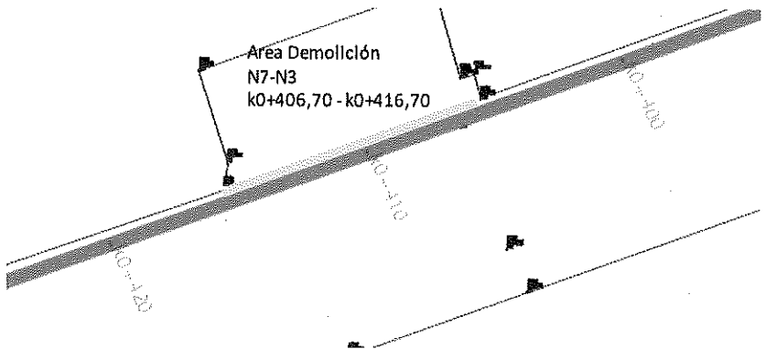



OBSERVACIONES

TOTAL	11,04
BALANCE DE CANTIDADES	
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0,0
A PAGAR PRESENTE ACTA	11,04
ACUMULADO	11,04

EPIFANIO VELASQUEZ LEAL
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO AQUA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
REPRESENTANTE LEGAL

09

Emsercota S.A.
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO AQUA

ACTA PARCIAL N°	3		FECHA DE CORTE	DD	6	MM	6	AA	2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA								
CONTRATISTA	CONSORCIO AQUA		NIT O C.C.	901.707.176-1		CONTRATO No.		No. 112-2023	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA		NIT O C.C.	900.124.654-4		CONTRATO No.		No. 117-2023	

COMPONENTE	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD		HOJA		
ACUEDUCTO PARCELAS GLOBO 1	EPC - 2.1.2	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE (INCLUYE CORTE A MÁQUINA 2 COSTADOS)	M3		1	DE	3





	ABSCISADO		DIMENSIONES			
UBICACIÓN	INICIO	FIN	LONG.	ANCHO	ALTO	TOTAL
N8 - N9	K0+408,80	K0+414,80	6,00	0,60	0,15	0,54
N23 - N22	K0+189,00	K0+204,00	15,00	0,50	0,15	1,13
N22A - N25	K0+000,00	K0+005,00	5,00	0,50	0,15	0,38
N22B - N22	K0+217,80	K0+224,00	6,20	0,50	0,15	0,46
N22 - N20	K0+000,00	K0+002,20	2,20	0,50	0,15	0,17
N3-N2	K0+362,70	K0+376,30	13,60	0,50	0,15	1,02
N3-N2	K0+243,60	K0+257,70	14,10	0,50	0,15	1,06
		TOTAL				4,75

OBSERVACIONES

TOTAL	4,75

BALANCE DE CANTIDADES	
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0,0
A PAGAR PRESENTE ACTA	4,75
ACUMULADO	4,75

EPIFANIO VELASQUEZ LEAL
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO AQUA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
REPRESENTANTE LEGAL

Emsercota S.A.
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO AQUA

ACTA PARCIAL N°	3		FECHA DE CORTE	DD	6	MM	6	AA	2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA								
CONTRATISTA	CONSORCIO AQUA		NIT O C.C.	901.707.176-1		CONTRATO No.	No. 112-2023		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA		NIT O C.C.	900.124.654-4		CONTRATO No.	No. 117-2023		

COMPONENTE	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD		HOJA		
ACUEDUCTO PARCELAS GLOBO 1	EPC - 2.1.2	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE (INCLUYE CORTE A MÁQUINA 2 COSTADOS)	M3		2	DE	3

ESQUEMAS

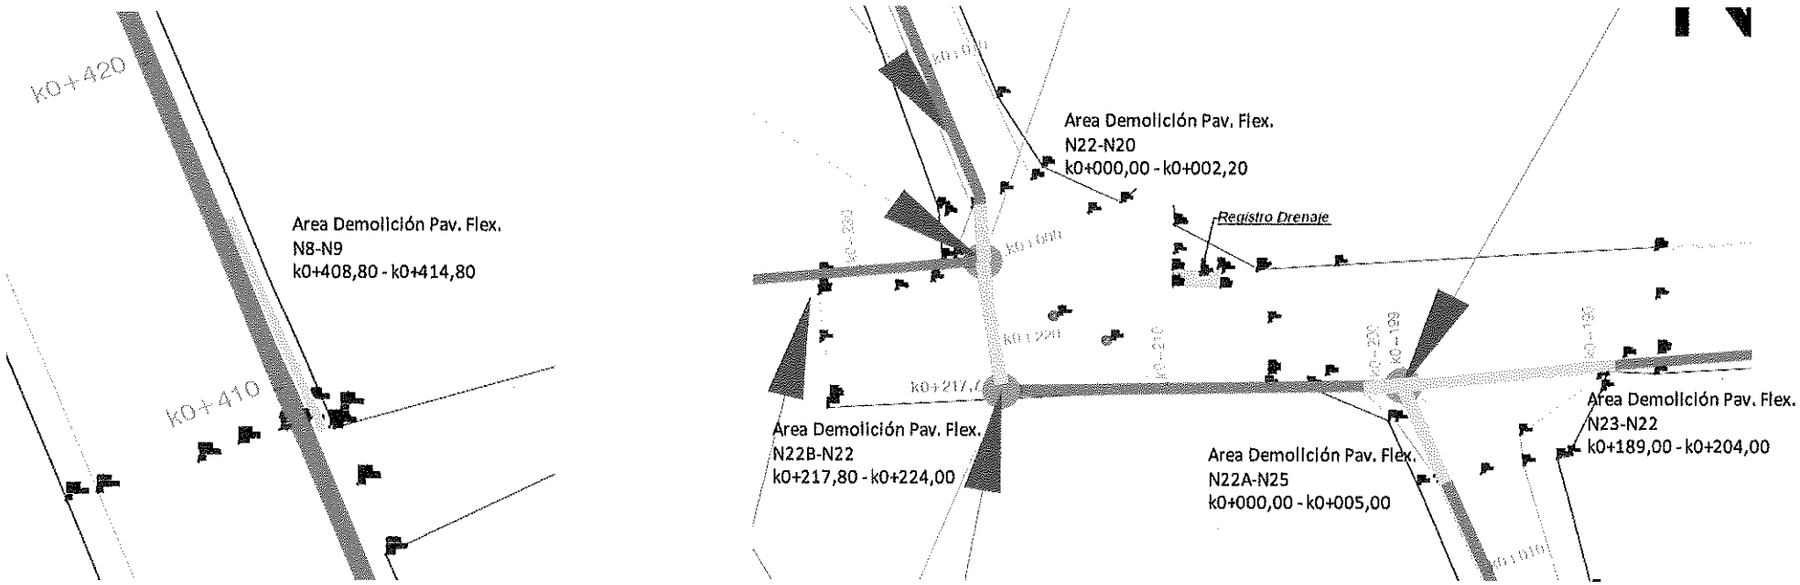

OBSERVACIONES

TOTAL	4,75
BALANCE DE CANTIDADES	
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0,0
A PAGAR PRESENTE ACTA	4,75
ACUMULADO	4,75

EPIFANIO VELASQUEZ LEAL
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO AQUA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
REPRESENTANTE LEGAL

669

Emsercota S.A.
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


CONSORCIO AQUA

ACTA PARCIAL N°	3		FECHA DE CORTE	DD	6	MM	6	AA	2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA								
CONTRATISTA	CONSORCIO AQUA		NIT O C.C.	901.707.176-1		CONTRATO No.		No. 112-2023	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA		NIT O C.C.	900.124.654-4		CONTRATO No.		No. 117-2023	

COMPONENTE	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD		HOJA		
ACUEDUCTO PARCELAS GLOBO 1	EPC - 2.1.2	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE (INCLUYE CORTE A MÁQUINA 2 COSTADOS)	M3		3	DE	3

ESQUEMAS

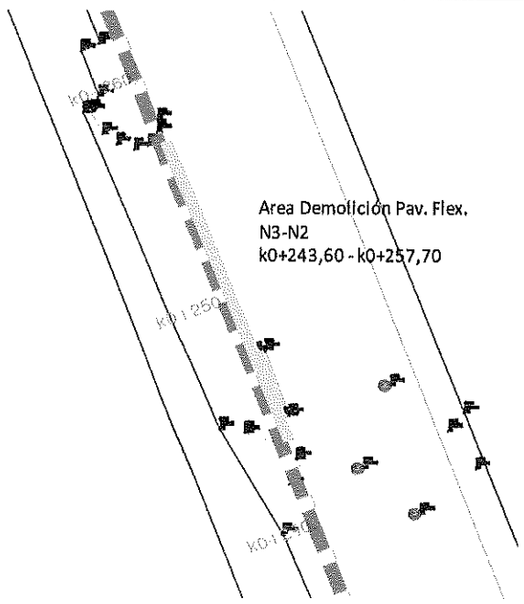

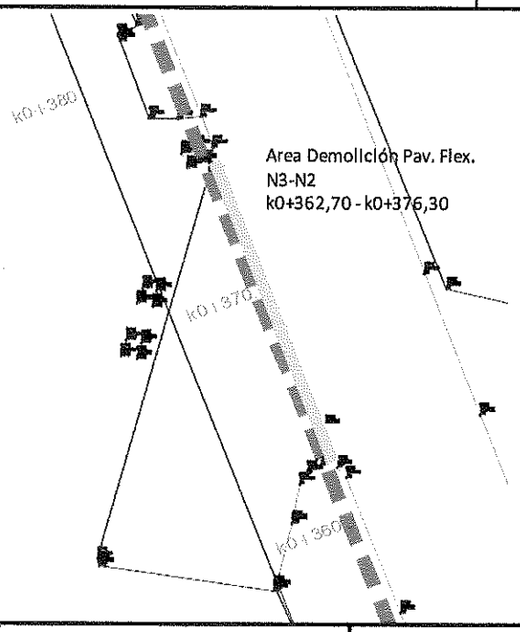

OBSERVACIONES

TOTAL	4,75
BALANCE DE CANTIDADES	
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0,0
A PAGAR PRESENTE ACTA	4,75
ACUMULADO	4,75

EPIFANIO VELASQUEZ LEAL
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO AQUA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
REPRESENTANTE LEGAL

700


Emsercota S.A.
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO AQUA

ACTA PARCIAL N°	3		FECHA DE CORTE	DD	6	MM	6	AA	2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA								
CONTRATISTA	CONSORCIO AQUA		NIT O C.C.	901.707.176-1		CONTRATO No.		No. 112-2023	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA		NIT O C.C.	900.124.654-4		CONTRATO No.		No. 117-2023	

COMPONENTE	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD		HOJA		
ACUEDUCTO PARCELAS GLOBO 1	EPC - 2.1.3	DEMOLICIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN	UND		1	DE	2

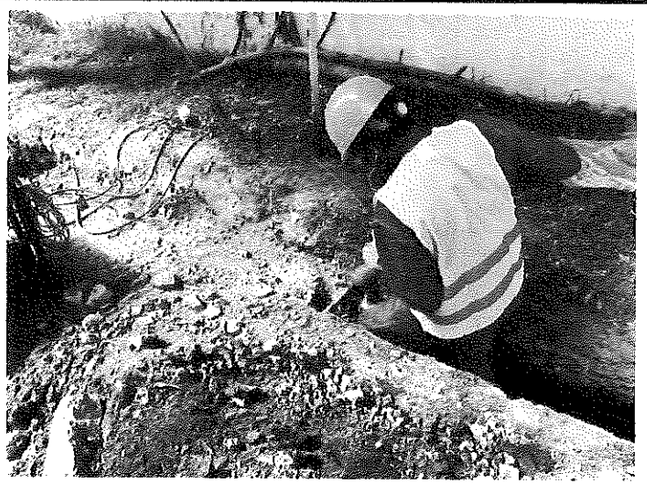

	ABSCISADO		DIMENSIONES			
UBICACIÓN	INICIO	FIN	CANT.			TOTAL
N8 - N9	K0+395,00		1,00			1,00
N14 - N23	K0+607,00		1,00			1,00
Tub. Impulsión Línea Chicu	K0+579,00		1,00			1,00
		TOTAL				3,00

OBSERVACIONES

TOTAL	3,00
BALANCE DE CANTIDADES	
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0,0
A PAGAR PRESENTE ACTA	3,00
ACUMULADO	3,00

EPIFANIO VELASQUEZ LEAL
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO AQUA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
REPRESENTANTE LEGAL

Emsercota S.A.
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO AQUA


ACTA PARCIAL N°	3		FECHA DE CORTE	DD	6	MM	6	AA	2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA								
CONTRATISTA	CONSORCIO AQUA		NIT O C.C.	901.707.176-1		CONTRATO No.		No. 112-2023	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA		NIT O C.C.	900.124.654-4		CONTRATO No.		No. 117-2023	

COMPONENTE	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD		HOJA		
ACUEDUCTO PARCELAS GLOBO 1	EPC - 2.1.3	DEMOLICIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN	UND		2	DE	2


ESQUEMAS

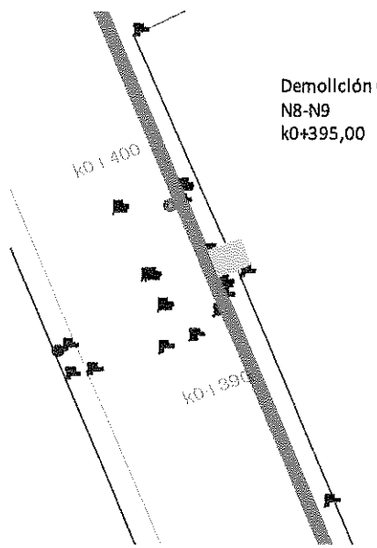

Demolición Caja Inspección
N8-N9
k0+395,00

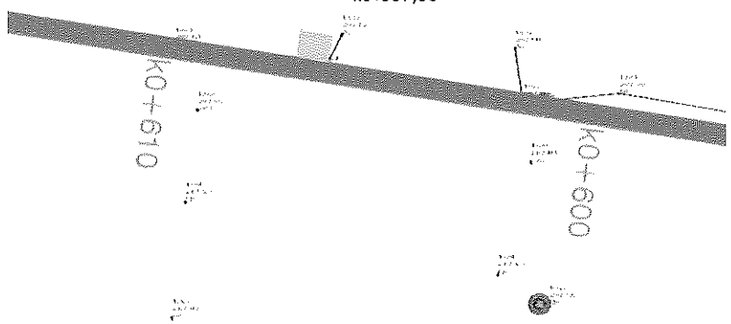

Demolición Caja Inspección
N14-N23
k0+607,00

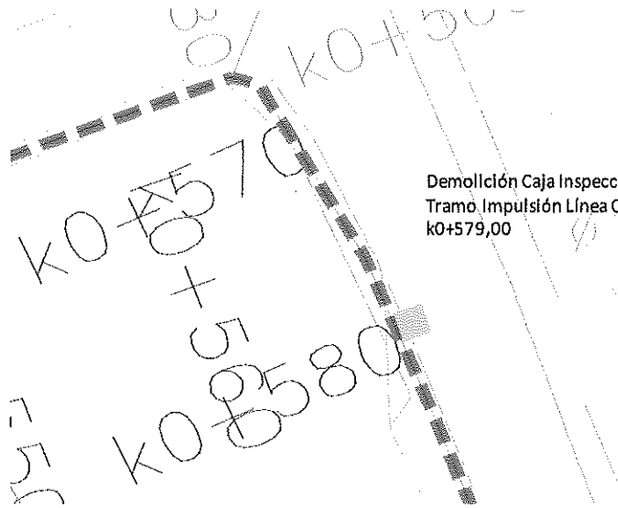

Demolición Caja Inspección
Tramo Impulsión Línea Chicu
k0+579,00

OBSERVACIONES

TOTAL	3,00
BALANCE DE CANTIDADES	
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0,0
A PAGAR PRESENTE ACTA	3,00
ACUMULADO	3,00

EPIFANIO VELASQUEZ LEAL
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO AQUA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
REPRESENTANTE LEGAL

201


Emsercota S.A.


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


CONSORCIO AQUA

ACTA PARCIAL N°	3		FECHA DE CORTE	DD	6	MM	6	AA	2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA								
CONTRATISTA	CONSORCIO AQUA		NIT O C.C.	901.707.176-1		CONTRATO No.		No. 112-2023	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA		NIT O C.C.	900.124.654-4		CONTRATO No.		No. 117-2023	

COMPONENTE	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD		HOJA		
ACUEDUCTO PARCELAS GLOBO 1	EPC - 3.1.3	SEÑALIZACIÓN Y AISLAMIENTO DE ÁREAS DE TRABAJO, INCLUYE CINTA DE SEGURIDAD, POSTES TUBULARES, CONOS GUIA, SEÑALES PREVENTIVAS Y REGLAMENTARIAS	ML/MES		1	DE	1

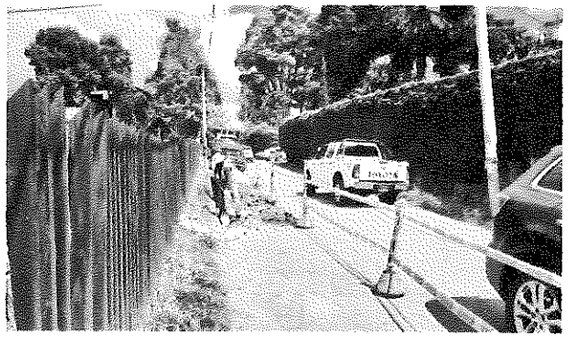

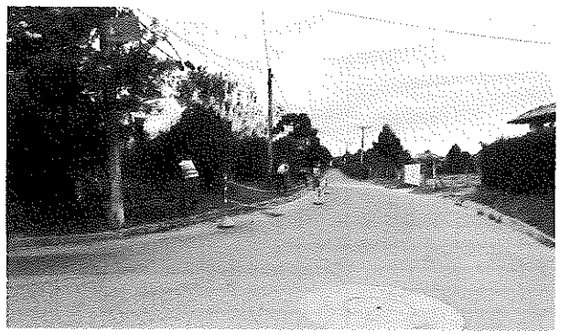

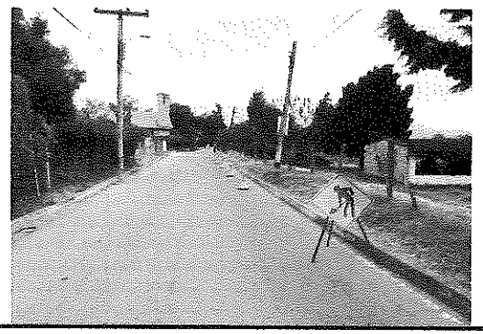

	ABSCISADO		DIMENSIONES			
UBICACIÓN	INICIO	FIN	CANT.			TOTAL
Tubería PEAD 160mm						
N8 - N9	K0+000,00	K0+400,00	400,00			400,00
N8 - N9	K0+400,00	K0+480,00				
N8 - N11	K0+013,00	K0+162,20				
N11 - N14	K0+162,20	K0+407,80				
N14 - N23	K0+407,80	K0+686,00				
N23 - N21	K0+002,00	K0+197,00				
Tubería PEAD 110mm						
N7 - N8	K0+463,40	K0+563,40				
N3 - N7	K0+000,00	K0+463,40				
Tubería PEAD 90mm						
N3 - N4	K0+010,00	K0+400,00				
N7 - N6	K0+010,00	K0+455,00				
N23 - N22	K0+007,00	K0+224,00				
N22 - N20	K0+000,00	K0+103,80				
N20 - N16	K0+103,80	K0+137,00				
N20 - N19	K0+000,00	K0+010,00				
N22A - N25	K0+000,00	K0+050,00				
N22 - N18	K0+224,00	K0+491,00				
N14 - N12	K0+002,00	K0+191,00				
N11 - N10	K0+000,00	K0+119,00				
N18 - N17	K0+491,00	K0+626,00				
N3-N2	K0+000,00	K0+462,00				
	TOTAL					400,00

OBSERVACIONES

TOTAL	400,00
BALANCE DE CANTIDADES	
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0,0
A PAGAR PRESENTE ACTA	400,00
ACUMULADO	400,00

EPIFANIO VELASQUEZ LEAL
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO AQUA
CONTRATISTA

CÁNDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
REPRESENTANTE LEGAL

202


Emsercota S.A.

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


CONSORCIO AQUA


ACTA PARCIAL N°	3		FECHA DE CORTE	DD	6	MM	6	AA	2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA								
CONTRATISTA	CONSORCIO AQUA		NIT O C.C.	901.707.176-1		CONTRATO No.		No. 112-2023	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA		NIT O C.C.	900.124.654-4		CONTRATO No.		No. 117-2023	

COMPONENTE	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD		HOJA		
ACUEDUCTO PARCELAS GLOBO 1	EPC - 4.1.1	EXCAVACIONES MANUAL EN TIERRA DE 0 A 2 M DE PROFUNDIDAD	M3		1	DE	2

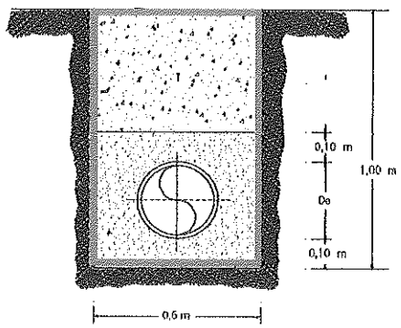



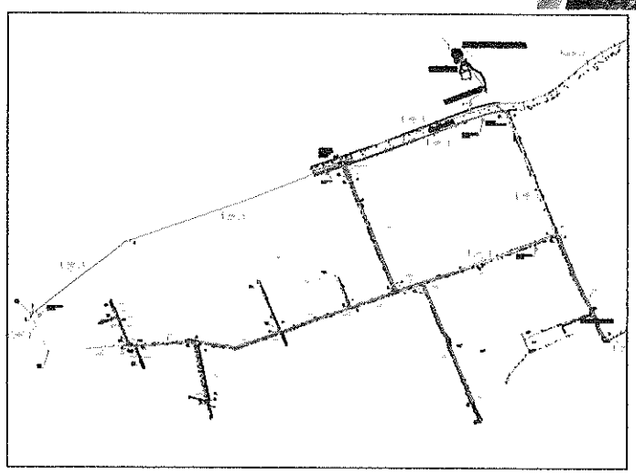

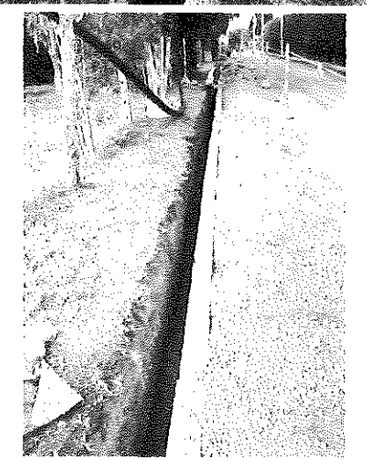

	ABSCISADO		DIMENSIONES			
UBICACIÓN	INICIO	FIN	LONG.	ANCHO	ALTO	TOTAL
Excavación Zanja Instalación de Tubería PEAD						
Tubería PEAD 160mm						
N8 - N9	K0+000,00	K0+480,00	480,00	0,60	1,00	288,00
N8 - N11	K0+013,00	K0+162,20	149,20	0,60	1,00	89,52
N11 - N14	K0+162,20	K0+407,80	245,60	0,60	1,00	147,36
N14 - N23	K0+407,80	K0+686,00	278,20	0,60	1,00	166,92
N23 - N21	K0+002,00	K0+197,00	195,00	0,60	1,00	117,00
Tubería PEAD 110mm						
N7 - N8	K0+463,40	K0+563,40	100,00	0,50	0,90	45,00
N3 - N7	K0+077,00	K0+463,40	386,40	0,50	0,90	173,88
N3 - N7	K0+000,00	K0+077,00	77,00	0,50	0,70	26,95
Tubería PEAD 90mm						
N7 - N6	K0+010,00	K0+455,00	445,00	0,50	1,00	222,50
N22 - N20	K0+000,00	K0+103,80	103,80	0,50	0,90	46,71
N20 - N16	K0+103,80	K0+137,00	33,20	0,50	0,90	14,94
N20 - N19	K0+000,00	K0+010,00	10,00	0,50	0,90	4,50
N22A - N25	K0+000,00	K0+050,00	50,00	0,50	1,00	25,00
N14 - N12	K0+002,00	K0+191,00	189,00	0,50	1,00	94,50
N23 - N22	K0+007,00	K0+224,00	217,00	0,50	1,00	108,50
N22 - N18	K0+224,00	K0+231,00	7,00	0,50	1,00	3,50
N22 - N18	K0+231,00	K0+358,00	127,00	0,50	0,80	50,80
N22 - N18	K0+358,00	K0+491,00	133,00	0,50	1,00	66,50
N3 - N4	K0+010,00	K0+160,00	150,00	0,50	1,00	75,00
N3 - N4	K0+160,00	K0+360,00	200,00	0,65	1,00	130,00
N3 - N4	K0+360,00	K0+400,00	40,00	0,50	1,00	20,00
N11 - N10	K0+000,00	K0+119,00	119,00	0,50	1,00	59,50
N18 - N17	K0+491,00	K0+626,00	135,00	0,50	1,00	67,50
N3-N2	K0+000,00	K0+295,00	235,00	0,50	0,80	94,00
N3-N2	K0+235,00	K0+462,00	227,00	0,50	1,20	136,20
EXCAVACION ADECUACION ANCHO DE VIA LA CULEBRERA (Autorizada por Interventoria en Bitacora)						
N3 - N4	K0+235,00	K0+290,00	55,00	0,80	0,42	18,48
N3 - N4	K0+170,00	K0+235,00	65,00	1,10	0,42	30,03
EXCAVACION INSTALACION ACCESORIOS PEAD						
N8 - N10	K0+000,00	K0+000,50	0,50	1,00	1,00	0,50
		TOTAL				2323,29

OBSERVACIONES

Las Excavaciones realizadas a profundidades menores a 1m, corresponde a situaciones donde por encontrarse redes de servicio públicos existente, tales como Red de Acueducto y Red de Gas no permite realizar profundización de la tubería.

TOTAL	2323,29

BALANCE DE CANTIDADES	
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0,0
A PAGAR PRESENTE ACTA	2323,29
ACUMULADO	2323,29

EPIFANIO VELASQUEZ LEAL
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO AQUA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
REPRESENTANTE LEGAL

Emsercota S.A.


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO AQUA

ACTA PARCIAL N°	3		FECHA DE CORTE	DD	6	MM	6	AA	2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA								
CONTRATISTA	CONSORCIO AQUA		NIT O C.C.	901.707.176-1		CONTRATO No.		No. 112-2023	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA		NIT O C.C.	900.124.654-4		CONTRATO No.		No. 117-2023	

COMPONENTE	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD		HOJA		
ACUEDUCTO PARCELAS GLOBO 1	EPC-4.1.1	EXCAVACIONES MANUAL EN TIERRA DE 0 A 2 M DE PROFUNDIDAD	M3		2	DE	2

ESQUEMAS | Top | 2D Wireframe

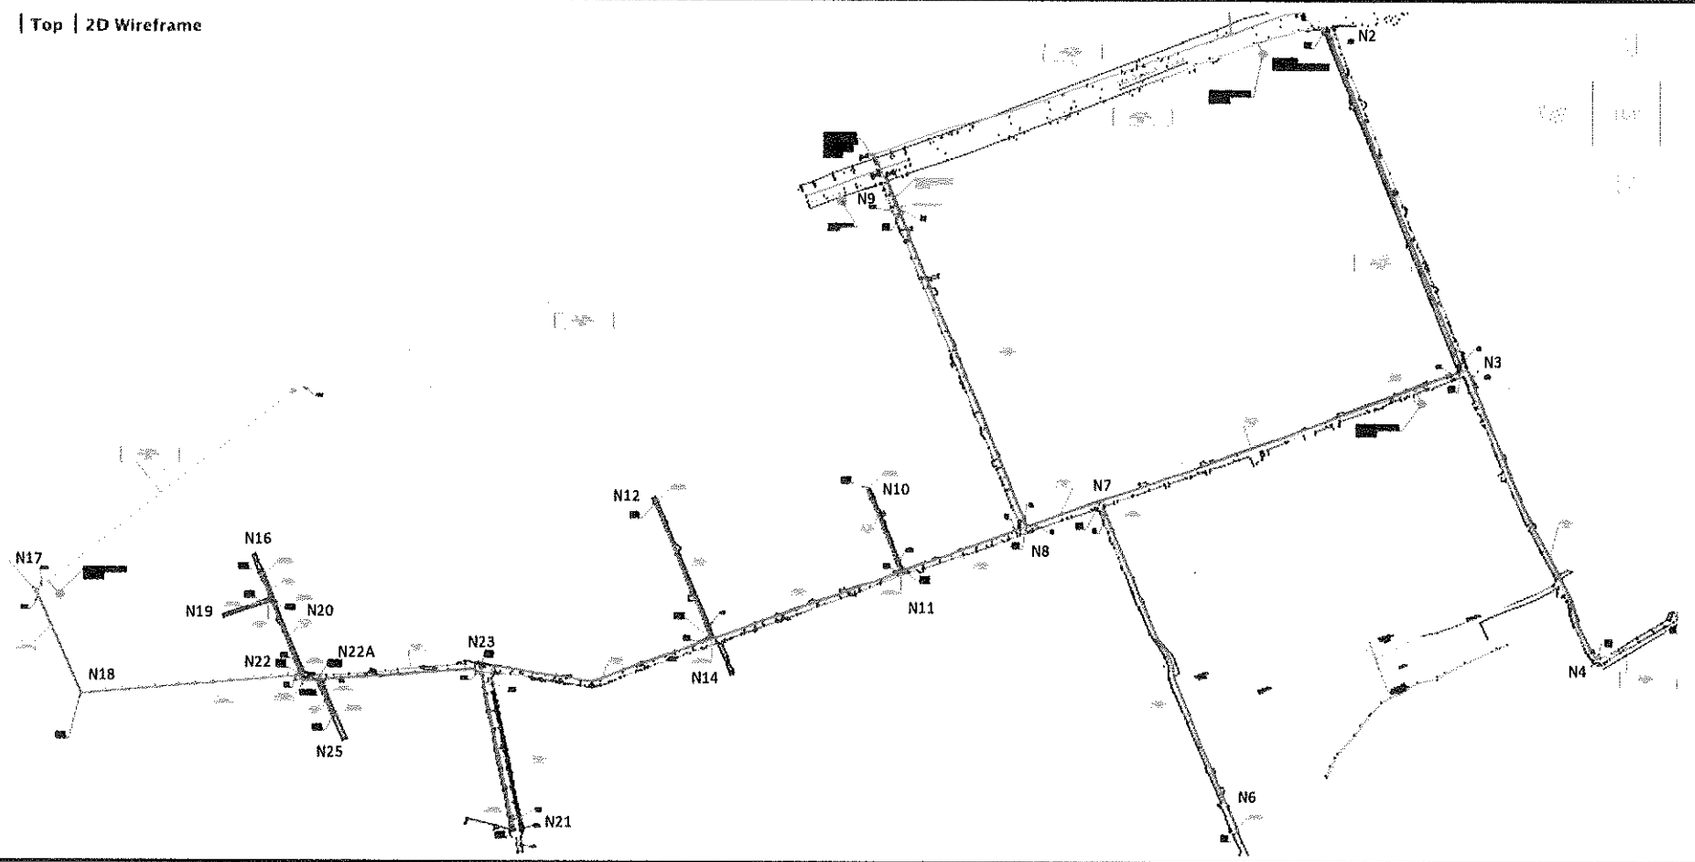

OBSERVACIONES

Las Excavaciones realizadas a profundidades menores a 1m, corresponde a situaciones donde por encontrarse redes de servicio públicos existente, tales como Red de Acueducto y Red de Gas no permite realizar profundización de la tubería.

TOTAL	2323,29
BALANCE DE CANTIDADES	
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0,0
A PAGAR PRESENTE ACTA	2323,29
ACUMULADO	2323,29

EPIFANIO VELASQUEZ LEAL
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO AQUA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
REPRESENTANTE LEGAL


Emsercota S.A.

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO AQUA

ACTA PARCIAL N°	3		FECHA DE CORTE	DD	6	MM	6	AA	2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA								
CONTRATISTA	CONSORCIO AQUA		NIT O C.C.	901.707.176-1		CONTRATO No.		No. 112-2023	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA		NIT O C.C.	900.124.654-4		CONTRATO No.		No. 117-2023	

COMPONENTE	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD		HOJA		
ACUEDUCTO PARCELAS GLOBO 1	ICCU - 16.7 Construcción	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO	M3		1	DE	3

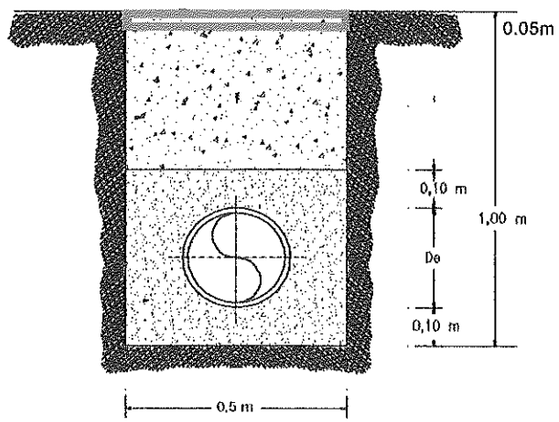



UBICACIÓN	ABSCISADO INICIO	ABSCISADO FIN	DIMENSIONES LONG.	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES TOTAL
N8 - N9	K0+010,00	K0+148,00	138,00	0,60	0,05	4,14
N8 - N11	K0+013,00	K0+043,00	30,00	0,60	0,05	0,90
N23 - N22A	K0+007,00	K0+107,00	100,00	0,50	0,05	2,50
N22 - N18	K0+231,00	K0+319,00	88,00	0,50	0,05	2,20
		TOTAL				9,74

OBSERVACIONES

TOTAL	9,74

BALANCE DE CANTIDADES	
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0,0
A PAGAR PRESENTE ACTA	9,74
ACUMULADO	9,74

EPIFANIO VELASQUEZ LEAL
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO AQUA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
REPRESENTANTE LEGAL

Emsercota S.A.


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO AQUA

ACTA PARCIAL N°	3		FECHA DE CORTE	DD	6	MM	6	AA	2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA								
CONTRATISTA	CONSORCIO AQUA		NIT O C.C.	901.707.176-1		CONTRATO No.		No. 112-2023	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA		NIT O C.C.	900.124.654-4		CONTRATO No.		No. 117-2023	

COMPONENTE	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD		HOJA		
ACUEDUCTO PARCELAS GLOBO 1	ICCU - 16.7 Construcción	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO	M3		2	DE	3

ESQUEMAS

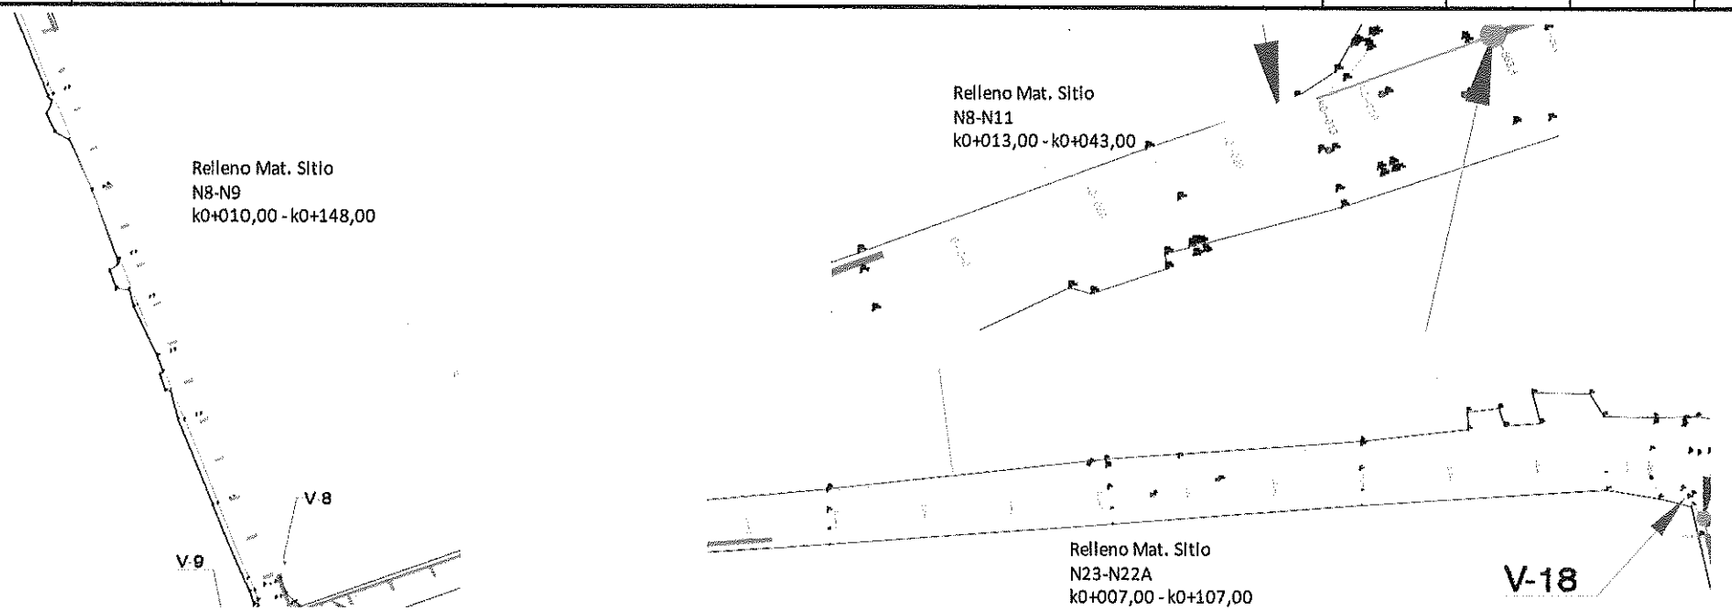

OBSERVACIONES

TOTAL	9,74
BALANCE DE CANTIDADES	
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0,0
A PAGAR PRESENTE ACTA	9,74
ACUMULADO	9,74

EPIFANIO VELASQUEZ LEAL
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO AQUA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
REPRESENTANTE LEGAL

706

Emsercota S.A.

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


CONSORCIO AQUA


ACTA PARCIAL N°	3		FECHA DE CORTE	DD	6	MM	6	AA	2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA								
CONTRATISTA	CONSORCIO AQUA		NIT O C.C.	901.707.176-1		CONTRATO No.		No. 112-2023	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA		NIT O C.C.	900.124.654-4		CONTRATO No.		No. 117-2023	

COMPONENTE	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD		HOJA		
ACUEDUCTO PARCELAS GLOBO 1	ICCU - 16.7 Construcción	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO	M3		3	DE	3

ESQUEMAS

Relleno Mat. Sitio
N22-N18
k0+231,00 - k0+319,00



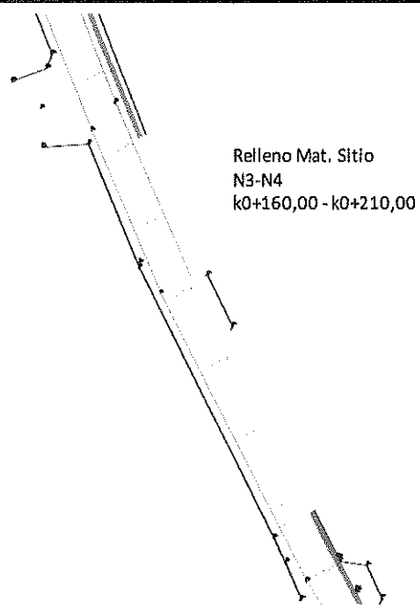

Relleno Mat. Sitio
N3-N4
k0+160,00 - k0+210,00

OBSERVACIONES

TOTAL	**9,74**
BALANCE DE CANTIDADES	
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0,0
A PAGAR PRESENTE ACTA	9,74
ACUMULADO	9,74

EPIFANIO VELASQUEZ LEAL
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO AQUA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
REPRESENTANTE LEGAL


Emsercota S.A.
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


CONSORCIO AQUA

ACTA PARCIAL N°	3	FECHA DE CORTE	DD	6	MM	6	AA	2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA						
CONTRATISTA	CONSORCIO AQUA	NIT O C.C.	901.707.176-1	CONTRATO No.	No. 112-2023		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA	NIT O C.C.	900.124.654-4	CONTRATO No.	No. 117-2023		

COMPONENTE	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD		HOJA		
ACUEDUCTO PARCELAS GLOBO 1	ICCU - 2.9 Urbanismo	RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA"	M3		1	DE	2

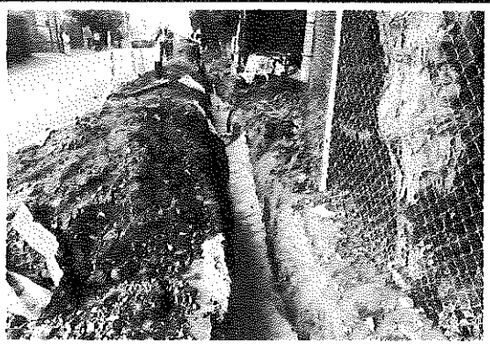



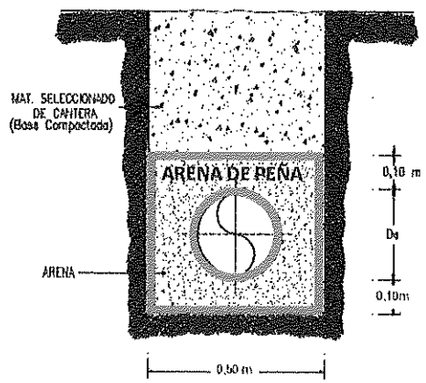

UBICACIÓN	ABSCISADO INICIO	ABSCISADO FIN	DIMENSIONES LONG.	ANCHO	ALTO	SUBTOTAL	Descuento VOL. TUBO	TOTAL
RELLENO EN ARENA PARA TUBERIA 160mm								
N8 - N9	K0+000,00	K0+480,00	480,00	0,60	0,36	103,68	-9,65	94,03
N8 - N11	K0+013,00	K0+162,20	149,20	0,60	0,36	32,23	-3,00	29,23
N11 - N14	K0+162,20	K0+407,80	245,60	0,60	0,36	53,05	-4,94	48,11
N14 - N23	K0+407,80	K0+686,00	278,20	0,60	0,36	60,09	-5,59	54,50
N23 - N21	K0+002,00	K0+197,00	195,00	0,60	0,36	42,12	-3,92	38,20
RELLENO EN ARENA PARA TUBERIA 110mm								
N7 - N8	K0+463,40	K0+563,40	100,00	0,50	0,31	15,50	-0,95	14,55
N3 - N7	K0+000,00	K0+463,40	463,40	0,50	0,31	71,83	-4,40	67,42
RELLENO EN ARENA PARA TUBERIA 90mm								
N7 - N6	K0+010,00	K0+455,00	445,00	0,50	0,29	64,53	-2,83	61,69
N22 - N20	K0+000,00	K0+103,80	103,80	0,50	0,29	15,05	-0,66	14,39
N20 - N16	K0+103,80	K0+137,00	33,20	0,50	0,29	4,81	-0,21	4,60
N20 - N19	K0+000,00	K0+010,00	10,00	0,50	0,29	1,45	-0,06	1,39
N22A - N25	K0+000,00	K0+050,00	50,00	0,50	0,29	7,25	-0,32	6,93
N14 - N12	K0+002,00	K0+191,00	189,00	0,50	0,29	27,41	-1,20	26,20
N23 - N22	K0+007,00	K0+224,00	217,00	0,50	0,29	31,47	-1,38	30,08
N22 - N18	K0+224,00	K0+491,00	267,00	0,50	0,29	38,72	-1,70	37,02
N3 - N4	K0+010,00	K0+400,00	390,00	0,50	0,29	56,55	-2,48	54,07
N11 - N10	K0+000,00	K0+119,00	119,00	0,65	0,29	22,43	-0,76	21,67
N18 - N17	K0+491,00	K0+626,00	135,00	0,50	0,29	19,58	-0,86	18,72
N3-N2	K0+000,00	K0+462,00	462,00	0,50	0,29	66,99	-2,94	64,05
RELLENO EN ARENA PARA ACCESORIO PEAD 160mm								
N8 - N10	K0+000,00	K0+000,50	0,50	1,00	0,36	0,18	0,00	0,18
				TOTAL				687,03

OBSERVACIONES

Descuentos: Volumen Tubería PEAD 160 = 3,14 x (0,16^2) / 4 x Long. Tubería
Volumen Tubería PEAD 110 = 3,14 x (0,11^2) / 4 x Long. Tubería
Volumen Tubería PEAD 90 = 3,14 x (0,09^2) / 4 x Long. Tubería

TOTAL	687,03

BALANCE DE CANTIDADES	
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0,0
A PAGAR PRESENTE ACTA	687,03
ACUMULADO	687,03

EPIFANIO VELASQUEZ LEAL
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO AQUA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
REPRESENTANTE LEGAL

Emsercota S.A.


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO AQUA

ACTA PARCIAL N°	3	FECHA DE CORTE	DD	6	MM	6	AA	2025	
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA								
CONTRATISTA	CONSORCIO AQUA	NIT O C.C.	901.707.176-1	CONTRATO No.	No. 112-2023				
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA	NIT O C.C.	900.124.654-4	CONTRATO No.	No. 117-2023				

COMPONENTE	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD		HOJA		
ACUEDUCTO PARCELAS GLOBO 1	ICCU - 2,9 Urbanismo	RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA"	M3		1	DE	2

ESQUEMAS

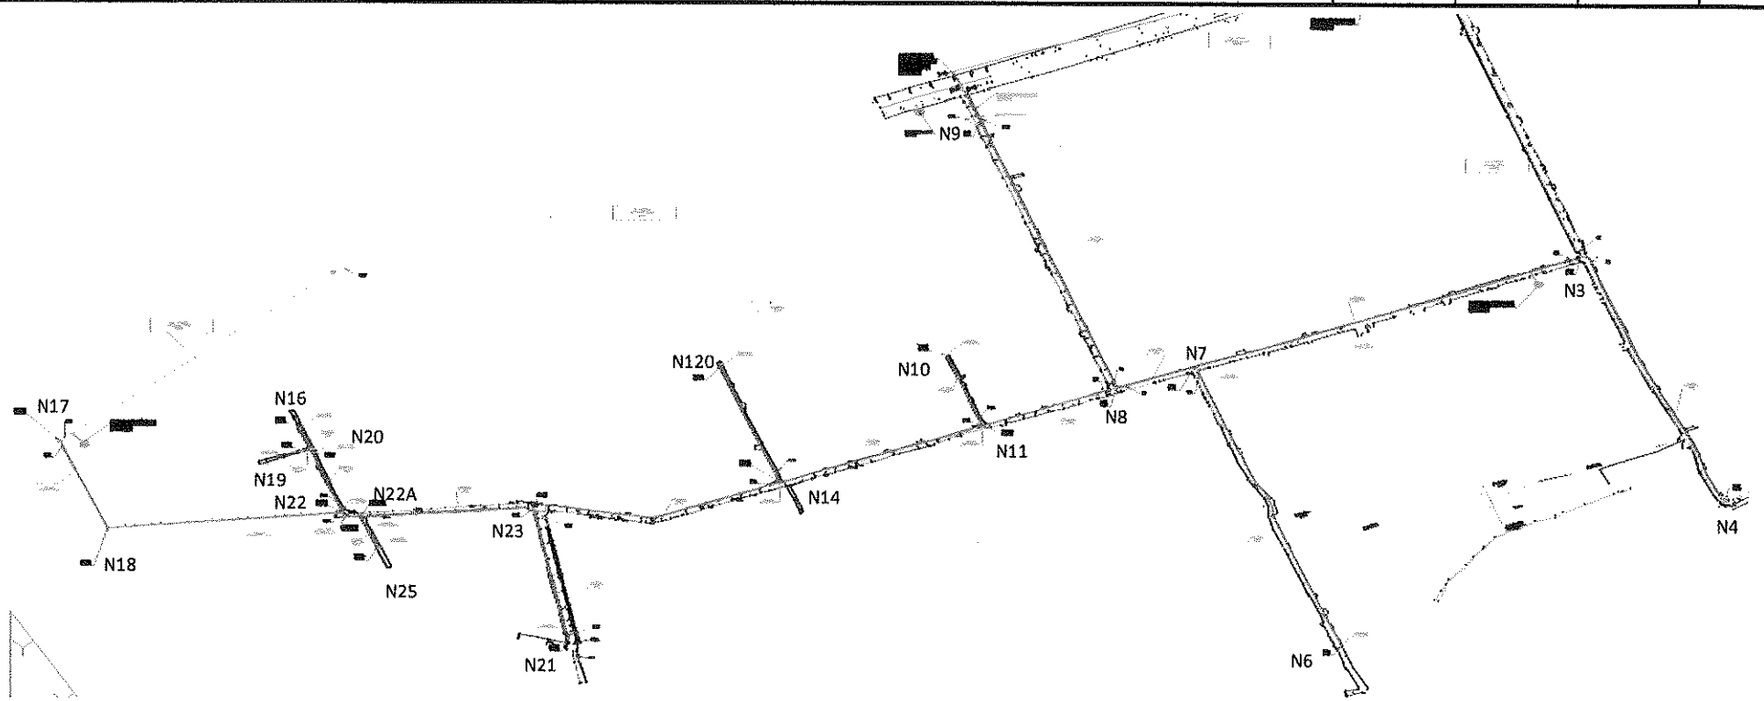

OBSERVACIONES

Descuentos: Volumen Tubería PEAD 160 = 3,14 x (0,16^2) / 4 x Long. Tubería
Volumen Tubería PEAD 110 = 3,14 x (0,11^2) / 4 x Long. Tubería
Volumen Tubería PEAD 90 = 3,14 x (0,09^2) / 4 x Long. Tubería

TOTAL	687,03
BALANCE DE CANTIDADES	
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0,0
A PAGAR PRESENTE ACTA	687,03
ACUMULADO	687,03

EPIFANIO VELASQUEZ LEAL
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO AQUA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
REPRESENTANTE LEGAL

Emsercota S.A.


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO AQUA

ACTA PARCIAL N°	3	FECHA DE CORTE	DD	6	MM	6	AA	2025	
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA								
CONTRATISTA	CONSORCIO AQUA	NIT O C.C.	901.707.176-1	CONTRATO No.	No. 112-2023				
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA	NIT O C.C.	900.124.654-4	CONTRATO No.	No. 117-2023				

COMPONENTE	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD		HOJA		
ACUEDUCTO PARCELAS GLOBO 1	ICCU - 1.6 Vías	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3/KM		1	DE	1



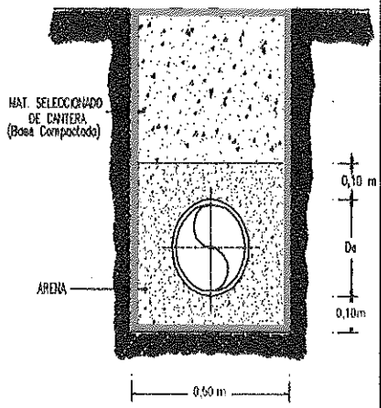

UBICACIÓN	ABSCISADO INICIO	ABSCISADO FIN	DIMENSIONES LONG.	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES ALTO	ACARREO EXPANSION	ACARREO KM	TOTAL
Transporte Excavación Zanja Instalación de Tubería PEAD								
Tubería PEAD 160mm								
N8 - N9	K0+000,00	K0+480,00	480,00	0,60	1,00	1,30	24	8985,60
N8 - N11	K0+013,00	K0+162,20	149,20	0,60	1,00	1,30	24	2793,02
N11 - N14	K0+162,20	K0+407,80	245,60	0,60	1,00	1,30	24	4597,63
N14 - N23	K0+407,80	K0+686,00	278,20	0,60	1,00	1,30	24	5207,90
N23 - N21	K0+002,00	K0+197,00	195,00	0,60	1,00	1,30	24	3650,40
Tubería PEAD 110mm								
N7 - N8	K0+463,40	K0+563,40	100,00	0,50	0,90	1,30	24	1404,00
N3 - N7	K0+077,00	K0+463,40	386,40	0,50	0,90	1,30	24	5425,06
N3 - N7	K0+000,00	K0+077,00	77,00	0,50	0,70	1,30	24	840,84
Tubería PEAD 90mm								
N7 - N6	K0+010,00	K0+455,00	445,00	0,50	1,00	1,30	24	6942,00
N22 - N20	K0+000,00	K0+103,80	103,80	0,50	0,90	1,30	24	1457,95
N20 - N16	K0+103,80	K0+137,00	33,20	0,50	0,90	1,30	24	466,13
N20 - N19	K0+000,00	K0+010,00	10,00	0,50	0,90	1,30	24	140,40
N22A - N25	K0+000,00	K0+050,00	50,00	0,50	1,00	1,30	24	780,00
N14 - N12	K0+002,00	K0+191,00	189,00	0,50	1,00	1,30	24	2948,40
N23 - N22	K0+007,00	K0+224,00	217,00	0,50	1,00	1,30	24	3385,20
N22 - N18	K0+224,00	K0+231,00	7,00	0,50	1,00	1,30	24	109,20
N22 - N18	K0+231,00	K0+358,00	127,00	0,50	0,80	1,30	24	1584,96
N22 - N18	K0+358,00	K0+491,00	133,00	0,50	1,00	1,30	24	2074,80
N3 - N4	K0+010,00	K0+160,00	150,00	0,50	1,00	1,30	24	2340,00
N3 - N4	K0+160,00	K0+360,00	200,00	0,65	1,00	1,30	24	4056,00
N3 - N4	K0+360,00	K0+400,00	40,00	0,50	1,00	1,30	24	624,00
N11 - N10	K0+000,00	K0+119,00	119,00	0,50	1,00	1,30	24	1856,40
N18 - N17	K0+491,00	K0+626,00	135,00	0,50	1,00	1,30	24	2106,00
N3-N2	K0+000,00	K0+235,00	235,00	0,50	0,80	1,30	24	2932,80
N3-N2	K0+235,00	K0+462,00	227,00	0,50	1,20	1,30	24	4249,44
EXCAVACION ADECUACION ANCHO DE VIA LA CULEBRERA (Autorizada por Interventoria en Bitacora)								
N3 - N4	K0+235,00	K0+290,00	55,00	0,80	0,42	1,30	24	576,58
N3 - N4	K0+170,00	K0+235,00	65,00	1,10	0,42	1,30	24	936,94
Transporte Excavación Instalación Accesorios PEAD								
N8 - N10	K0+000,00	K0+000,50	0,50	1,00	1,00	1,30	24	15,60
			TOTAL					72486,65

OBSERVACIONES

TOTAL	72486,65
BALANCE DE CANTIDADES	
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0,0
A PAGAR PRESENTE ACTA	72486,65
ACUMULADO	72486,65

EPIFANIO VELASQUEZ LEAL
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO AQUA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
REPRESENTANTE LEGAL


Emsercota S.A.


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO AQUA

ACTA PARCIAL N°	3		FECHA DE CORTE	DD	6	MM	6	AA	2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA								
CONTRATISTA	CONSORCIO AQUA		NIT O C.C.	901.707.176-1		CONTRATO No.		No. 112-2023	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA		NIT O C.C.	900.124.654-4		CONTRATO No.		No. 117-2023	

COMPONENTE	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD		HOJA		
ACUEDUCTO PARCELAS GLOBO 1 RECONSTRUCCION ANDENES	ICCU - 1.6 Vías	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3/KM		1	DE	1

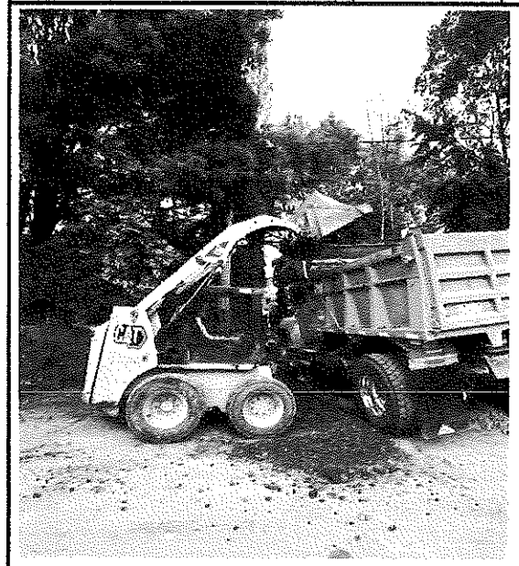

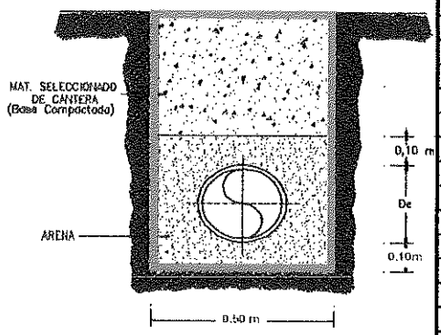

UBICACIÓN	ABSCISADO INICIO	ABSCISADO FIN	DIMENSIONES LONG.	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES ALTO	ACARREO EXPANSION	ACARREO KM	ACARREO TOTAL
Transporte Demolición Concreto Estructural - (ICCU 1.1)								
N8 - N9	K0+223,70	K0+261,70	38,00	0,60	0,20		19	86,64
N8 - N9	K0+313,50	K0+335,50	22,00	0,60	0,20		19	50,16
N8 - N9	K0+423,80	K0+427,80	4,00	0,60	0,20		19	9,12
N8 - N9	K0+443,10	K0+455,10	12,00	0,60	0,20		19	27,36
N14 - N23	K0+598,10	K0+604,10	6,00	0,60	0,20		19	13,68
N7 - N3	K0+406,70	K0+416,70	10,00	0,50	0,15		19	14,25
N22 - N18	K0+326,50	K0+332,50	6,00	0,50	0,15		19	8,55
Transporte Demolición Pavimento Flexible								
N8 - N9	K0+408,80	K0+414,80	6,00	0,60	0,15		24	12,96
N23 - N22	K0+189,00	K0+204,00	15,00	0,50	0,15		24	27,00
N22A - N25	K0+000,00	K0+005,00	5,00	0,50	0,15		24	9,00
N22B - N22	K0+217,80	K0+224,00	6,20	0,50	0,15		24	11,16
N22 - N20	K0+000,00	K0+002,20	2,20	0,50	0,15		24	3,95
N3-N2	K0+362,70	K0+376,30	13,60	0,50	0,15		24	24,47
N3-N2	K0+243,60	K0+257,70	14,10	0,50	0,15		24	25,37
					TOTAL			323,67

OBSERVACIONES

TOTAL	323,67
BALANCE DE CANTIDADES	
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0,0
A PAGAR PRESENTE ACTA	323,67
ACUMULADO	323,67

EPIFANIO VELASQUEZ LEAL
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO AQUA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
REPRESENTANTE LEGAL

Emsercota S.A.
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


CONSORCIO AQUA

ACTA PARCIAL N°	3		FECHA DE CORTE	DD	6	MM	6	AA	2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA								
CONTRATISTA	CONSORCIO AQUA		NIT O C.C.	901.707.176-1		CONTRATO No.	No. 112-2023		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA		NIT O C.C.	900.124.654-4		CONTRATO No.	No. 117-2023		

COMPONENTE	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD		HOJA		
ACUEDUCTO PARCELAS GLOBO 1 OBRAS ELECTRICAS	APU	NIVELAR O APLOMAR POSTE MT LINEAS VIVAS	UND		1	DE	1



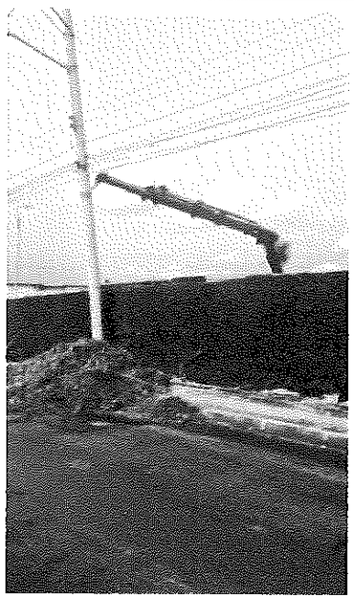

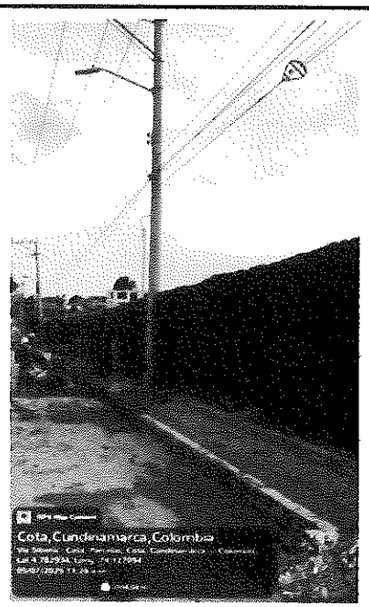

UBICACIÓN	ABSCISADO INICIO	ABSCISADO FIN	DIMENSIONES CANT			TOTAL
N3-N2	K0+347,80	K0+347,80	1,00			1,00
		TOTAL				1,00

OBSERVACIONES

TOTAL	1,00

BALANCE DE CANTIDADES	
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0,0
A PAGAR PRESENTE ACTA	1,00
ACUMULADO	1,00

EPIFANIO VELASQUEZ LEAL
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO AQUA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
REPRESENTANTE LEGAL

212

Emsercota S.A.
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO AQUA

ACTA PARCIAL N°	3		FECHA DE CORTE	DD	6	MM	6	AA	2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA								
CONTRATISTA	CONSORCIO AQUA		NIT O C.C.	901.707.176-1		CONTRATO No.		No. 112-2023	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA		NIT O C.C.	900.124.654-4		CONTRATO No.		No. 117-2023	

COMPONENTE	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD		HOJA		
ACUEDUCTO PARCELAS GLOBO 1	EPC - 7.5.6	INSTALACIÓN TUBERIA POLIETILENO 160MM PN10 PE100 (6")	ML		1	DE	2





	ABSCISADO		DIMENSIONES			
UBICACIÓN	INICIO	FIN	LONG.			TOTAL
N8 - N9	K0+000,00	K0+480,00	480,00			480,00
N8 - N11	K0+013,00	K0+162,20	149,20			149,20
N11 - N14	K0+162,20	K0+407,80	245,60			245,60
N14 - N23	K0+407,80	K0+686,00	278,20			278,20
N23 - N21	K0+002,00	K0+197,00	195,00			195,00
		TOTAL				1348,00
					TOTAL	1348,00

OBSERVACIONES

BALANCE DE CANTIDADES	
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0,0
A PAGAR PRESENTE ACTA	1348,00
ACUMULADO	1348,00

EPIFANIO VELASQUEZ LEAL
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO AQUA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
REPRESENTANTE LEGAL

213

Emsercota S.A.


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO AQUA

ACTA PARCIAL N°	3		FECHA DE CORTE	DD	6	MM	6	AA	2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA								
CONTRATISTA	CONSORCIO AQUA		NIT O C.C.	901.707.176-1		CONTRATO No.		No. 112-2023	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA		NIT O C.C.	900.124.654-4		CONTRATO No.		No. 117-2023	

COMPONENTE	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD		HOJA		
ACUEDUCTO PARCELAS GLOBO 1	EPC - 7.5.6	INSTALACIÓN TUBERIA POLIETILENO 160MM PN10 PE100 (6")	ML		2	DE	2

ESQUEMAS

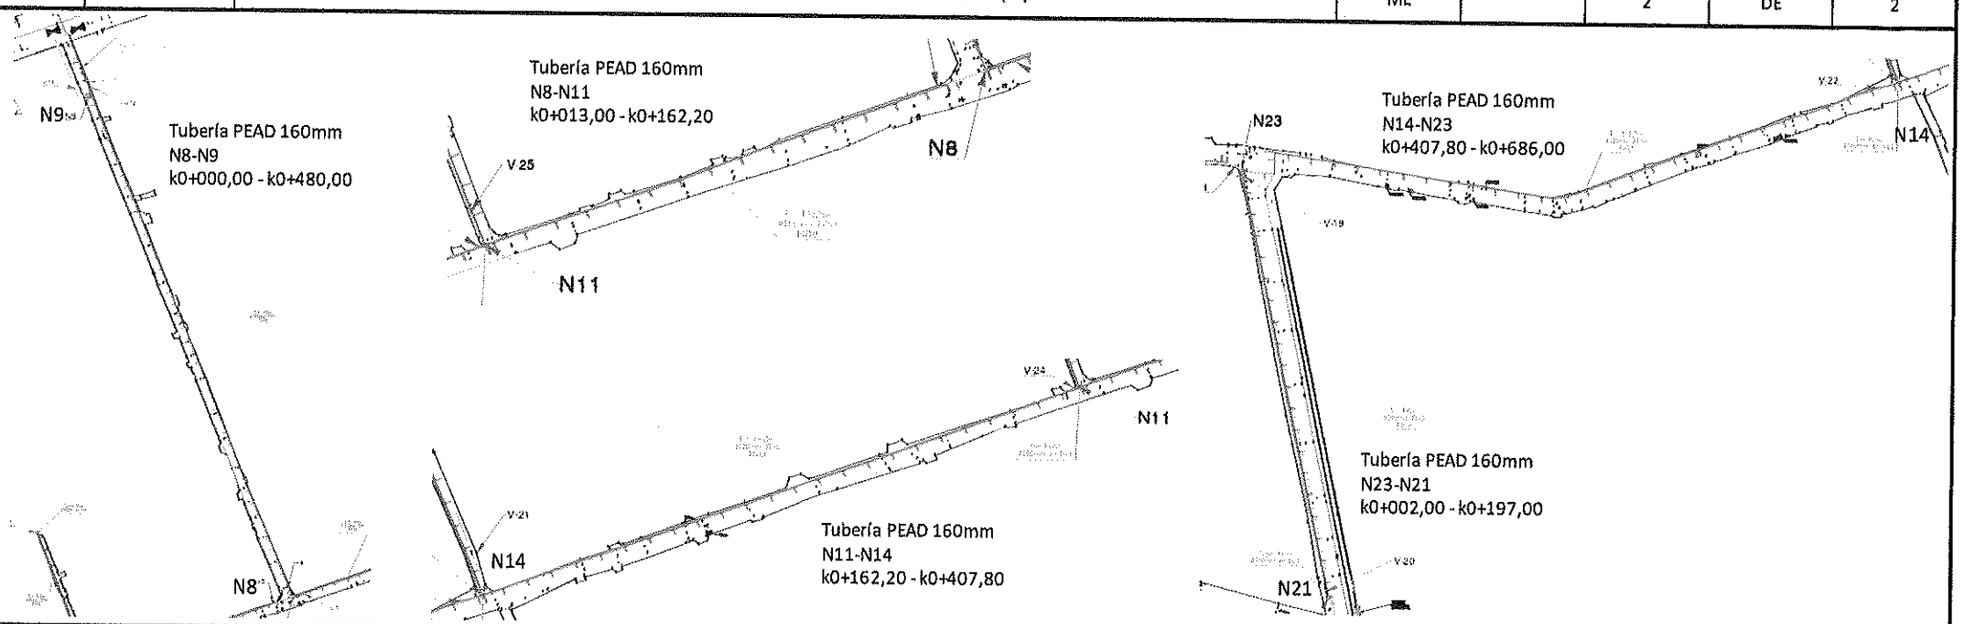

OBSERVACIONES

TOTAL	1348,00
BALANCE DE CANTIDADES	
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0,0
A PAGAR PRESENTE ACTA	1348,00
ACUMULADO	1348,00

EPIFANIO VELASQUEZ LEAL
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO AQUA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
REPRESENTANTE LEGAL

Emsercota S.A.
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO AQUA


ACTA PARCIAL N°	3		FECHA DE CORTE	DD	6	MM	6	AA	2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA								
CONTRATISTA	CONSORCIO AQUA		NIT O C.C.	901.707.176-1		CONTRATO No.		No. 112-2023	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA		NIT O C.C.	900.124.654-4		CONTRATO No.		No. 117-2023	

COMPONENTE	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD		HOJA		
ACUEDUCTO PARCELAS GLOBO 1	EPC - 7.5.5	INSTALACION TUBERIA POLIETILENO PE100 - 110MM TERMOFUSION	ML		2	DE	2

ESQUEMAS

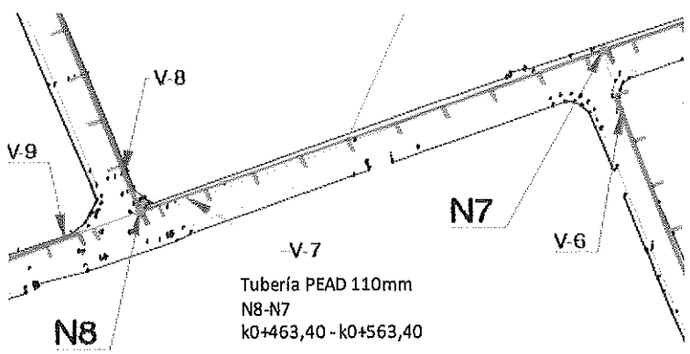

Tubería PEAD 110mm
N8-N7
k0+463,40 - k0+563,40

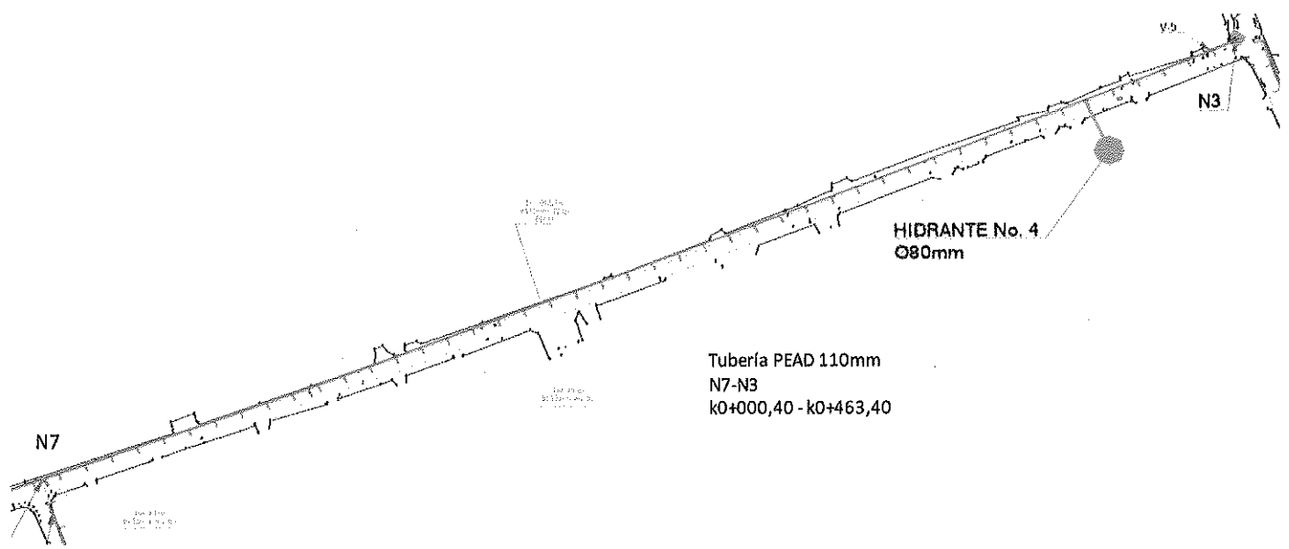

Tubería PEAD 110mm
N7-N3
k0+000,40 - k0+463,40

OBSERVACIONES

TOTAL	563,40
BALANCE DE CANTIDADES	
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0,0
A PAGAR PRESENTE ACTA	563,40
ACUMULADO	563,40

EPIFANIO VELASQUEZ LEAL
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO AQUA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
REPRESENTANTE LEGAL

2/6

Emsercota S.A.
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO AQUA

ACTA PARCIAL N°	3		FECHA DE CORTE	DD	6	MM	6	AA	2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA								
CONTRATISTA	CONSORCIO AQUA		NIT O C.C.	901.707.176-1		CONTRATO No.		No. 112-2023	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA		NIT O C.C.	900.124.654-4		CONTRATO No.		No. 117-2023	

COMPONENTE	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD		HOJA		
ACUEDUCTO PARCELAS GLOBO 1	EPC - 7.5.5	INSTALACION TUBERIA POLIETILENO PE100 - 110MM TERMOFUSION	ML		1	DE	2





	ABSCISADO		DIMENSIONES			
UBICACIÓN	INICIO	FIN	LONG.			TOTAL
N7 - N8	K0+463,40	K0+563,40	100,00			100,00
N3 - N7	K0+363,40	K0+463,40	100,00			100,00
N3 - N7	K0+000,00	K0+363,40	363,40			363,40
		TOTAL				563,40

OBSERVACIONES

TOTAL	563,40

BALANCE DE CANTIDADES	
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0,0
A PAGAR PRESENTE ACTA	563,40
ACUMULADO	563,40

EPIFANIO VELASQUEZ LEAL
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO AQUA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
REPRESENTANTE LEGAL

2/5


Emsercota S.A.


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO AQUA

ACTA PARCIAL N°	3		FECHA DE CORTE	DD	6	MM	6	AA	2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA								
CONTRATISTA	CONSORCIO AQUA		NIT O C.C.	901.707.176-1		CONTRATO No.		No. 112-2023	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA		NIT O C.C.	900.124.654-4		CONTRATO No.		No. 117-2023	

COMPONENTE	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD		HOJA		
ACUEDUCTO PARCELAS GLOBO 1	EPC - 7.5.4	INSTALACIÓN TUBERIA POLIETILENO 90MM PN10 PE100 (3")	ML		1	DE	3

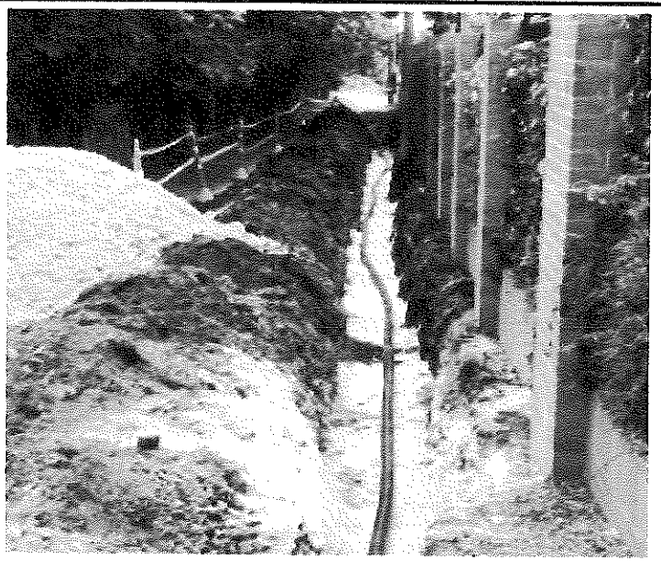

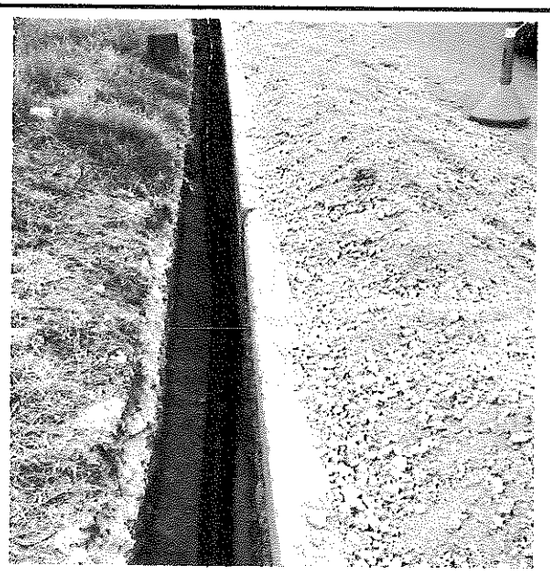

	ABSCISADO		DIMENSIONES			
UBICACIÓN	INICIO	FIN	LONG.			TOTAL
N3 - N4	K0+010,00	K0+400,00	390,00			390,00
N7 - N6	K0+010,00	K0+455,00	445,00			445,00
N23 - N22	K0+007,00	K0+224,00	217,00			217,00
N22 - N20	K0+000,00	K0+103,80	103,80			103,80
N20 - N16	K0+103,80	K0+137,00	33,20			33,20
N20 - N19	K0+000,00	K0+010,00	10,00			10,00
N22A - N25	K0+000,00	K0+050,00	50,00			50,00
N22 - N18	K0+224,00	K0+491,00	267,00			267,00
N14 - N12	K0+002,00	K0+191,00	189,00			189,00
N11 - N10	K0+000,00	K0+119,00	119,00			119,00
N18 - N17	K0+491,00	K0+626,00	135,00			135,00
N3-N2	K0+000,00	K0+462,00	462,00			462,00
	TOTAL					2421,00

OBSERVACIONES

TOTAL	2421,00

BALANCE DE CANTIDADES	
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0,0
A PAGAR PRESENTE ACTA	2421,00
ACUMULADO	2421,00

EPIFANIO VELASQUEZ LEAL
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO AQUA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
REPRESENTANTE LEGAL

2/2

Emsercota S.A.
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO AQUA

ACTA PARCIAL N°	3	FECHA DE CORTE	DD	6	MM	6	AA	2025	
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA								
CONTRATISTA	CONSORCIO AQUA	NIT O C.C.	901.707.176-1	CONTRATO No.	No. 112-2023				
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA	NIT O C.C.	900.124.654-4	CONTRATO No.	No. 117-2023				

COMPONENTE	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD		HOJA		
ACUEDUCTO PARCELAS GLOBO 1	EPC - 7.5.4	INSTALACIÓN TUBERIA POLIETILENO 90MM PN10 PE100 (3")	ML		2	DE	3

ESQUEMAS

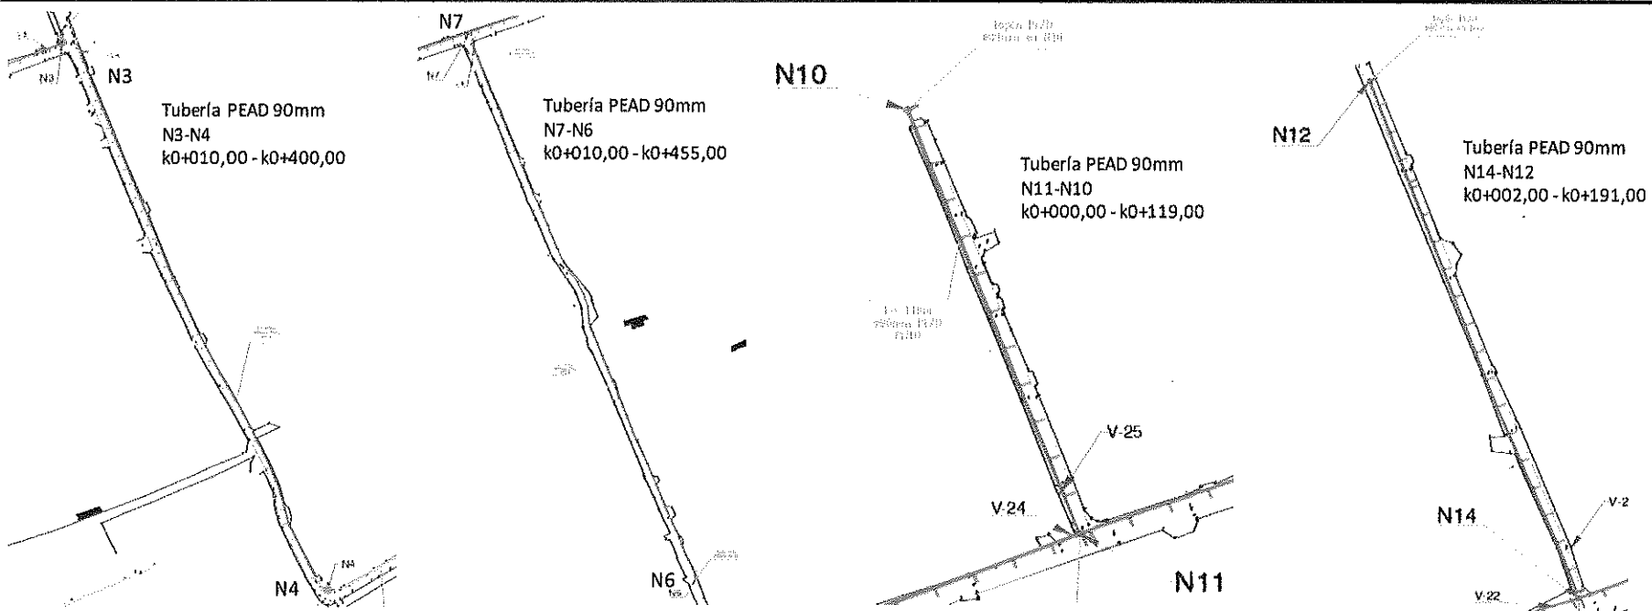

OBSERVACIONES

TOTAL	2421,00
BALANCE DE CANTIDADES	
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0,0
A PAGAR PRESENTE ACTA	2421,00
ACUMULADO	2421,00

EPIFANIO VELASQUEZ LEAL
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO AQUA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
REPRESENTANTE LEGAL

218

Emsercota S.A.


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO AQUA

ACTA PARCIAL N°	3		FECHA DE CORTE	DD	6	MM	6	AA	2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA								
CONTRATISTA	CONSORCIO AQUA		NIT O C.C.	901.707.176-1		CONTRATO No.	No. 112-2023		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA		NIT O C.C.	900.124.654-4		CONTRATO No.	No. 117-2023		

COMPONENTE	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD		HOJA		
ACUEDUCTO PARCELAS GLOBO 1	EPC - 7.5.4	INSTALACIÓN TUBERIA POLIETILENO 90MM PN10 PE100 (3")	ML		3	DE	3

ESQUEMAS

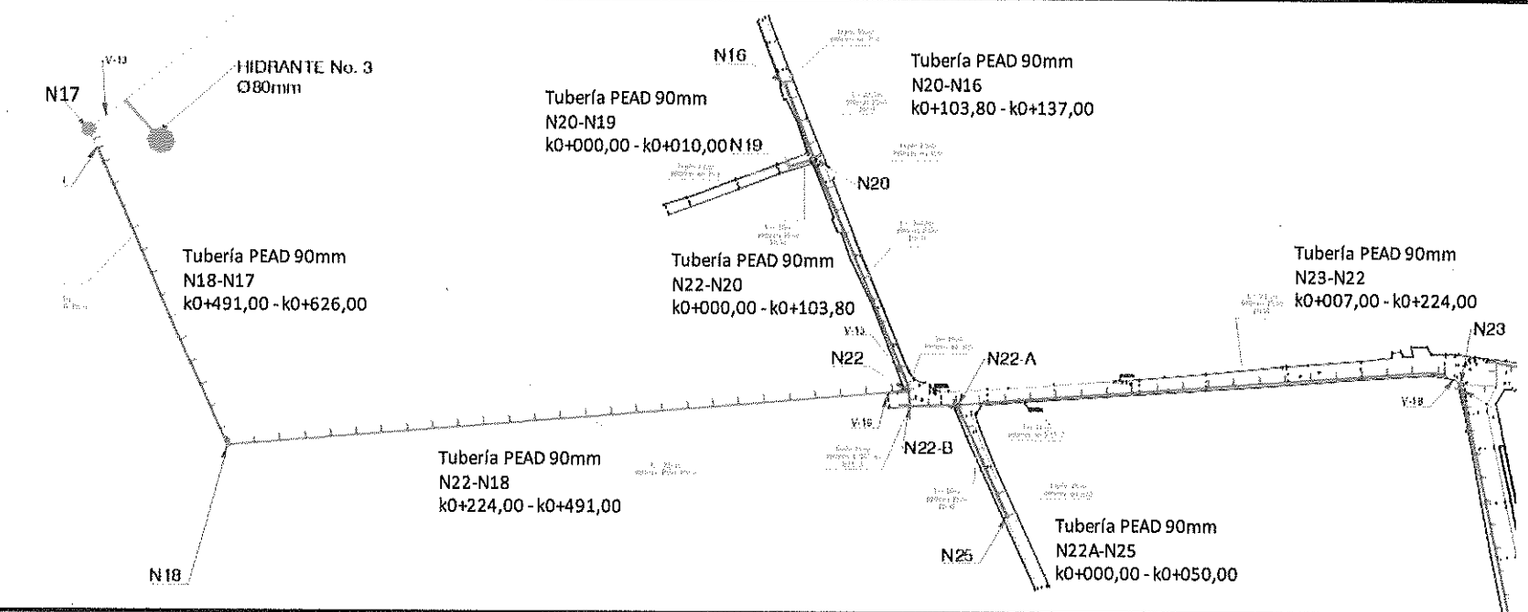

OBSERVACIONES

TOTAL	**2421,00**
BALANCE DE CANTIDADES	
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0,0
A PAGAR PRESENTE ACTA	2421,00
ACUMULADO	2421,00

EPIFANIO VELASQUEZ LEAL
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO AQUA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
REPRESENTANTE LEGAL

219

Emsercota S.A.

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO AQUA

ACTA PARCIAL N°	3		FECHA DE CORTE	DD	6	MM	6	AA	2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA								
CONTRATISTA	CONSORCIO AQUA		NIT O C.C.	901.707.176-1		CONTRATO No.		No. 112-2023	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA		NIT O C.C.	900.124.654-4		CONTRATO No.		No. 117-2023	

COMPONENTE	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD		HOJA		
ACUEDUCTO PARCELAS GLOBO 1	EPC - 7.6.6	INSTALACIÓN ACCESORIO POLIETILENO 160MM (6")	UND		1	DE	2





	ABSCISADO		DIMENSIONES			
UBICACIÓN	INICIO	FIN	CANT.			TOTAL
N11	K0+162,20		1,00			1,00
N14	K0+407,80		1,00			1,00
N21	K0+197,00		1,00			1,00
		TOTAL				3,00

OBSERVACIONES
- Tee PEAD 160mm en N11 (k0+162,2)
- Tee PEAD 160mm en N14 (k0+407,8)
- Tapón PEAD 160mm en N21 (k0+197)

	TOTAL	3,00
BALANCE DE CANTIDADES		
PAGO EN ACTAS ANTERIORES		0,0
A PAGAR PRESENTE ACTA		3,00
ACUMULADO		3,00

EPIFANIO VELASQUEZ LEAL
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO AQUA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
REPRESENTANTE LEGAL

20

Emsercota S.A.


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO AQUA

ACTA PARCIAL N°	3		FECHA DE CORTE	DD	6	MM	6	AA	2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA								
CONTRATISTA	CONSORCIO AQUA		NIT O C.C.	901.707.176-1		CONTRATO No.	No. 112-2023		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA		NIT O C.C.	900.124.654-4		CONTRATO No.	No. 117-2023		

COMPONENTE	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD		HOJA		
ACUEDUCTO PARCELAS GLOBO 1	EPC - 7.6.6	INSTALACIÓN ACCESORIO POLIETILENO 160MM (6")	UND		2	DE	2

ESQUEMAS

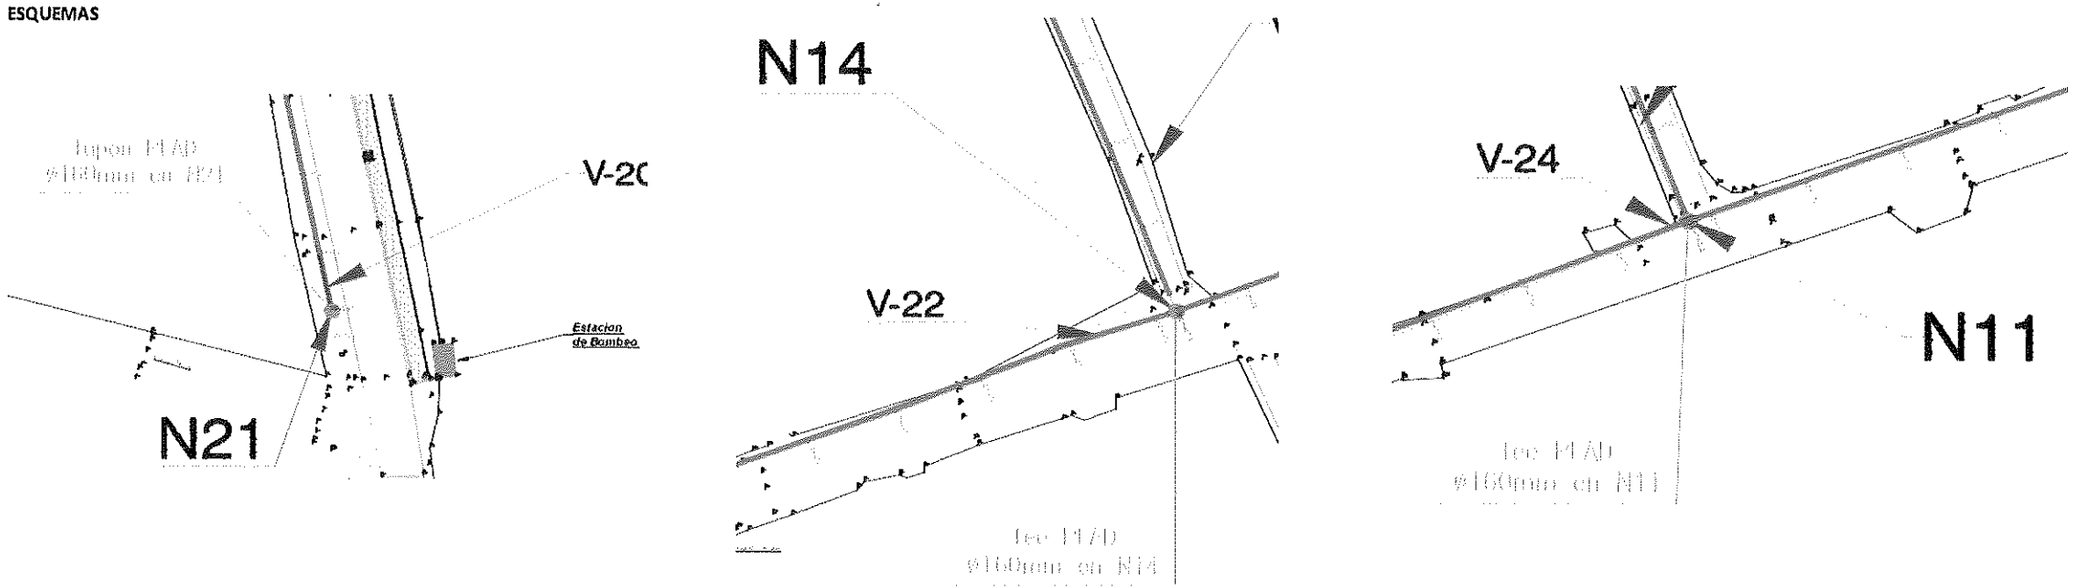

OBSERVACIONES
- Tee PEAD 160mm en N11 (k0+162,2)
- Tee PEAD 160mm en N14 (k0+407,8)
- Tapón PEAD 160mm en N21 (k0+197)

TOTAL	3,00
BALANCE DE CANTIDADES	
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0,0
A PAGAR PRESENTE ACTA	3,00
ACUMULADO	3,00

EPIFANIO VELASQUEZ LEAL
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO AQUA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
REPRESENTANTE LEGAL

Emsercota S.A.

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO AQUA

ACTA PARCIAL N°	3		FECHA DE CORTE	DD	6	MM	6	AA	2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA								
CONTRATISTA	CONSORCIO AQUA		NIT O C.C.	901.707.176-1		CONTRATO No.		No. 112-2023	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA		NIT O C.C.	900.124.654-4		CONTRATO No.		No. 117-2023	

COMPONENTE	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD		HOJA		
ACUEDUCTO PARCELAS GLOBO 1	EPC - 7.6.5	INSTALACION ACCESORIO POLIETILENO 110MM (4")	UND		1	DE	2



UBICACIÓN	ABSCISADO INICIO	ABSCISADO FIN	DIMENSIONES LONG			TOTAL
N7	K0+463,40		1,00			1,00
Hidrante 4	K0+060,00		1,00			1,00


Emsercota S.A.


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO AQUA

ACTA PARCIAL N°	3		FECHA DE CORTE	DD	6	MM	6	AA	2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA								
CONTRATISTA	CONSORCIO AQUA		NIT O C.C.	901.707.176-1		CONTRATO No.	No. 112-2023		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA		NIT O C.C.	900.124.654-4		CONTRATO No.	No. 117-2023		

COMPONENTE	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD		HOJA		
ACUEDUCTO PARCELAS GLOBO 1	EPC - 7.6.4	INSTALACION ACCESORIO POLIETILENO 90MM (3")	UND		1	DE	3

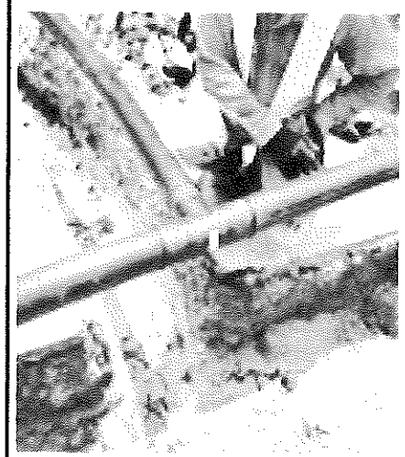

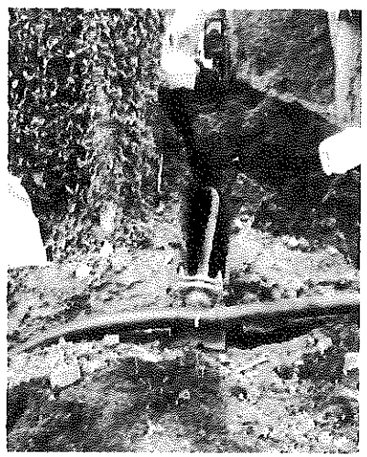

INSTALACION ACCESORIOS PEAD		
SECTOR	ACCESORIO	NODO
Apericel	Tapón PEAD 90mm	N6
SECTOR	ACCESORIO	NODO
Max León	Tee PEAD 90mm	N22A
Max León	Codo PEAD 90mm x 90°	N22B
Max León	Tee PEAD 90mm	N22
Max León	Tapón PEAD 90mm	N16
Max León	Tee PEAD 90mm	N20
Max León	Tapón PEAD 90mm	N19
Max León	Tapón PEAD 90mm	N25
Vía Principal - C2	Tapón PEAD 90mm	N12
Vía Principal - C1	Tapón PEAD 90mm	N10

	ABSCISADO		DIMENSIONES			
UBICACIÓN	INICIO	FIN	LONG			TOTAL
N25	K0+050,00		1,00			1,00
N22A	K0+199,00		1,00			1,00
N22B	K0+217,70		1,00			1,00
N22	K0+224,00		1,00			1,00
N16	K0+137,00		1,00			1,00
N20	K0+103,80		1,00			1,00
N19	K0+010,00		1,00			1,00
N6	K0+455,00		1,00			1,00
N12	K0+191,00		1,00			1,00
N10	K0+119,00		1,00			1,00
		TOTAL				10,00

OBSERVACIONES

- Tee PEAD 90mm en N22A (k0+199)
- Codo PEAD 90mm x 90º en N22B (k0+217,7)
- Tee PEAD 90mm en N22 (k0+224)
- Tapón PEAD 90mm en N16 (k0+137)
- Tee PEAD 90mm en N20 (k0+103,8)
- Tapón PEAD 90mm en N19 (k0+010)
- Tapón PEAD 90mm en N25 (k0+050)
- Tapón PEAD 90mm en N6 (k0+455)
- Tapón PEAD 90mm en N12 (k0+191)
- Tapón PEAD 90mm en N10 (k0+119)

TOTAL	10,00

BALANCE DE CANTIDADES	
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0,0
A PAGAR PRESENTE ACTA	10,00
ACUMULADO	10,00

EPIFANIO VELASQUEZ LEAL
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO AQUA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
REPRESENTANTE LEGAL

Emsercota S.A.


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


CONSORCIO AQUA

ACTA PARCIAL N°	3		FECHA DE CORTE	DD	6	MM	6	AA	2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA								
CONTRATISTA	CONSORCIO AQUA		NIT O C.C.	901.707.176-1		CONTRATO No.	No. 112-2023		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA		NIT O C.C.	900.124.654-4		CONTRATO No.	No. 117-2023		

COMPONENTE	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD		HOJA		
ACUEDUCTO PARCELAS GLOBO 1	EPC - 7.6.5	INSTALACION ACCESORIO POLIETILENO 110MM (4")	UND		2	DE	2

ESQUEMAS

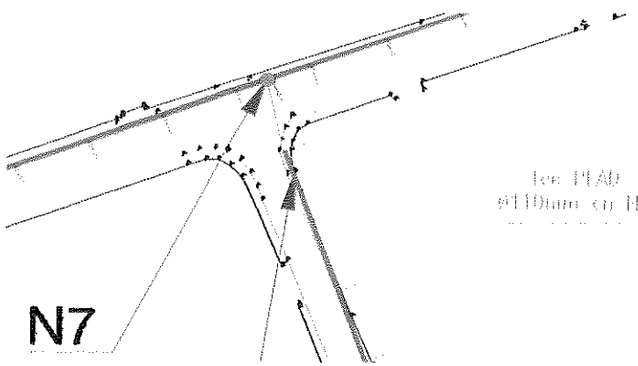

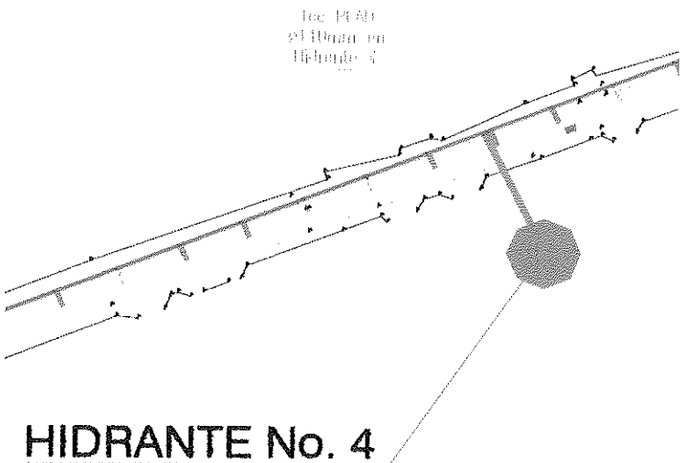

OBSERVACIONES
- Tee PEAD 110mm en N7 (k0+463,4)
- Tee PEAD 110mm en Hidrante 4 (k0+060)

TOTAL	2,00
BALANCE DE CANTIDADES	
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0,0
A PAGAR PRESENTE ACTA	2,00
ACUMULADO	2,00

EPIFANIO VELASQUEZ LEAL
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO AQUA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
REPRESENTANTE LEGAL

Emsercota S.A.


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


CONSORCIO AQUA

ACTA PARCIAL N°	3		FECHA DE CORTE	DD	6	MM	6	AA	2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA								
CONTRATISTA	CONSORCIO AQUA		NIT O C.C.	901.707.176-1		CONTRATO No.		No. 112-2023	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA		NIT O C.C.	900.124.654-4		CONTRATO No.		No. 117-2023	

COMPONENTE	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD		HOJA		
ACUEDUCTO PARCELAS GLOBO 1	EPC - 7.6.4	INSTALACION ACCESORIO POLIETILENO 90MM (3")	UND		2	DE	3

ESQUEMAS

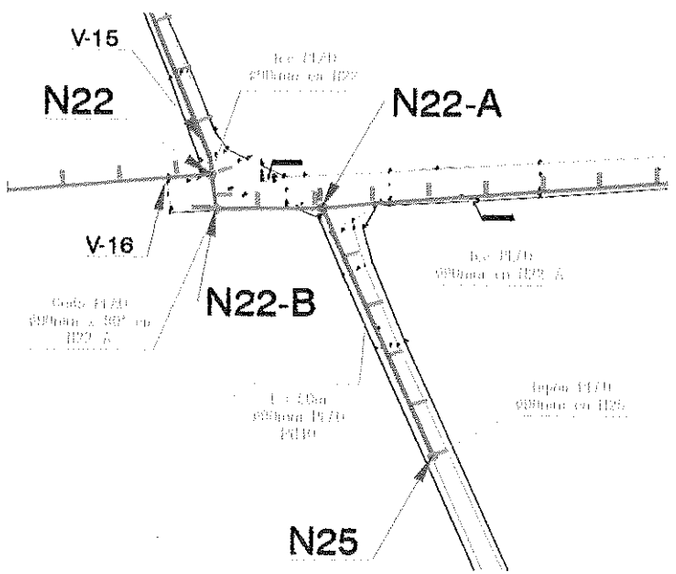

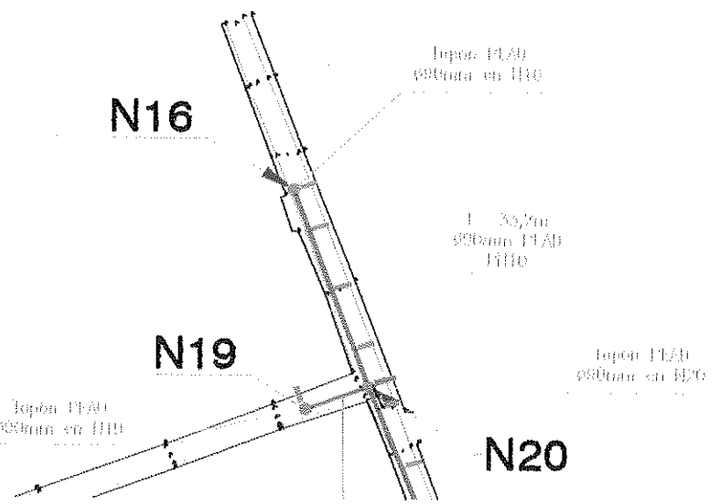

OBSERVACIONES

- Tee PEAD 90mm en N22A (k0+199)
- Codo PEAD 90mm x 90º en N22B (k0+217,7)
- Tee PEAD 90mm en N22 (k0+224)
- Tapón PEAD 90mm en N16 (k0+137)
- Tee PEAD 90mm en N20 (k0+103,8)
- Tapón PEAD 90mm en N19 (k0+010)
- Tapón PEAD 90mm en N25 (k0+050)
- Tapón PEAD 90mm en N6 (k0+455)
- Tapón PEAD 90mm en N12 (k0+191)
- Tapón PEAD 90mm en N10 (k0+119)

TOTAL	10,00
BALANCE DE CANTIDADES	
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0,0
A PAGAR PRESENTE ACTA	10,00
ACUMULADO	10,00

EPIFANIO VELASQUEZ LEAL
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO AQUA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
REPRESENTANTE LEGAL

225

Emsercota S.A.


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


CONSORCIO AQUA


ACTA PARCIAL N°	3		FECHA DE CORTE	DD	6	MM	6	AA	2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA								
CONTRATISTA	CONSORCIO AQUA		NIT O C.C.	901.707.176-1		CONTRATO No.		No. 112-2023	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA		NIT O C.C.	900.124.654-4		CONTRATO No.		No. 117-2023	

COMPONENTE	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD		HOJA		
ACUEDUCTO PARCELAS GLOBO 1	EPC - 7.6.4	INSTALACION ACCESORIO POLIETILENO 90MM (3")	UND		3	DE	3

ESQUEMAS

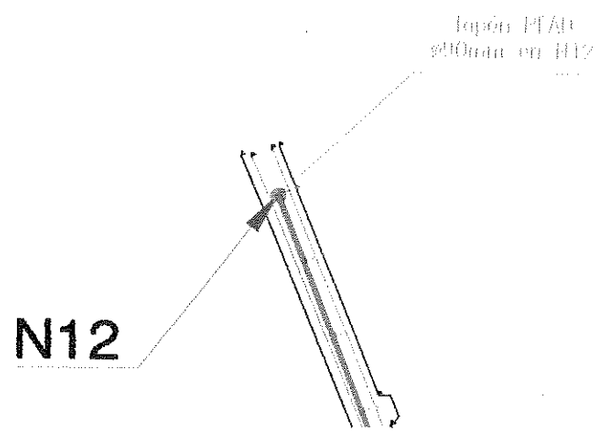

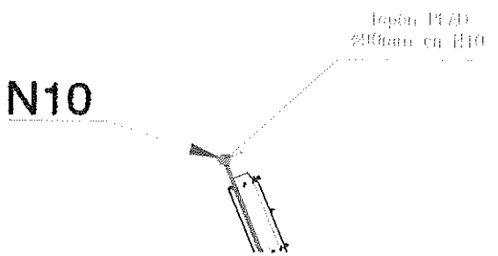

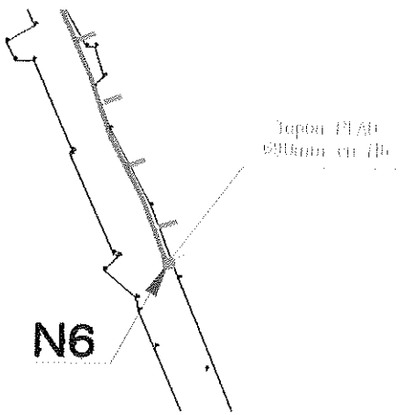

OBSERVACIONES

- Tee PEAD 90mm en N22A (k0+199)
- Codo PEAD 90mm x 90º en N22B (k0+217,7)
- Tee PEAD 90mm en N22 (k0+224)
- Tapón PEAD 90mm en N16 (k0+137)
- Tee PEAD 90mm en N20 (k0+103,8)
- Tapón PEAD 90mm en N19 (k0+010)
- Tapón PEAD 90mm en N25 (k0+050)
- Tapón PEAD 90mm en N6 (k0+455)
- Tapón PEAD 90mm en N12 (k0+191)
- Tapón PEAD 90mm en N10 (k0+119)

TOTAL	10,00
BALANCE DE CANTIDADES	
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0,0
A PAGAR PRESENTE ACTA	10,00
ACUMULADO	10,00

EPIFANIO VELASQUEZ LEAL
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO AQUA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
REPRESENTANTE LEGAL

2 26


Emsercota S.A.

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO AQUA

ACTA PARCIAL N°	3		FECHA DE CORTE	DD	6	MM	6	AA	2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA								
CONTRATISTA	CONSORCIO AQUA		NIT O C.C.	901.707.176-1		CONTRATO No.		No. 112-2023	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA		NIT O C.C.	900.124.654-4		CONTRATO No.		No. 117-2023	

COMPONENTE	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD		HOJA		
ACUEDUCTO PARCELAS GLOBO 1	Sum.Tub.PEAD 160	SUMINISTRO TUBERIA POLIETILENO 160MM PN10 PE100 (6")	ML		1	DE	1

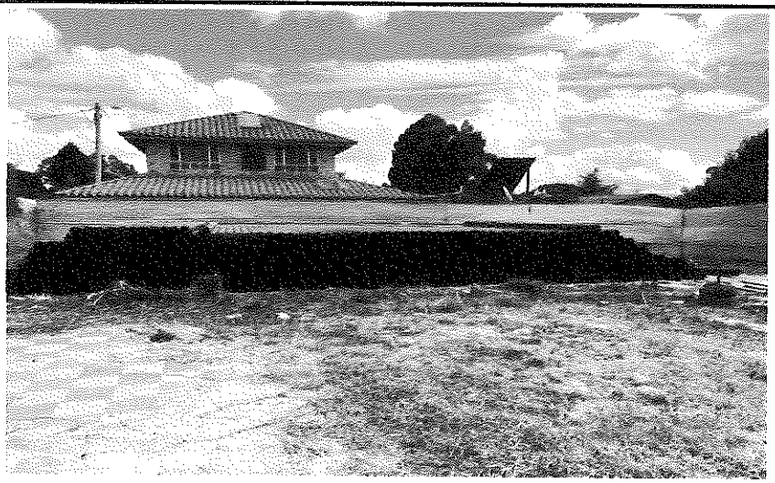

	ABSCISADO		DIMENSIONES			
UBICACIÓN	INICIO	FIN	LONG.			TOTAL
N8 - N9	K0+000,00	K0+480,00	480,00			480,00
N8 - N11	K0+013,00	K0+162,20	149,20			149,20
N11 - N14	K0+162,20	K0+407,80	245,60			245,60
N14 - N23	K0+407,80	K0+686,00	278,20			278,20
N23 - N21	K0+002,00	K0+197,00	195,00			195,00
		TOTAL				1348,00

OBSERVACIONES

TOTAL	1348,00

BALANCE DE CANTIDADES	
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0,0
A PAGAR PRESENTE ACTA	1348,00
ACUMULADO	1348,00

EPIFANIO VELASQUEZ LEAL
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO AQUA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
REPRESENTANTE LEGAL

222


Emsercota S.A.
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO AQUA

ACTA PARCIAL N°	3		FECHA DE CORTE	DD	6	MM	6	AA	2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA								
CONTRATISTA	CONSORCIO AQUA		NIT O C.C.	901.707.176-1		CONTRATO No.		No. 112-2023	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA		NIT O C.C.	900.124.654-4		CONTRATO No.		No. 117-2023	

COMPONENTE	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD		HOJA		
ACUEDUCTO PARCELAS GLOBO 1	Sum.Tub.PEAD 110	SUMINISTRO TUBERIA POLIETILENO 110MM PN10 PE100 (4")	ML		1	DE	1

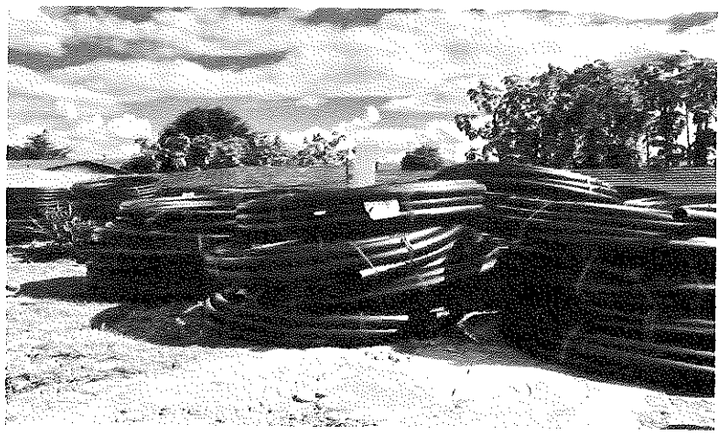

	ABSCISADO		DIMENSIONES			
UBICACIÓN	INICIO	FIN	LONG.			TOTAL
N7 - N8	K0+463,40	K0+563,40	100,00			100,00
N3 - N7	K0+363,40	K0+463,40	100,00			100,00
N3 - N7	K0+000,00	K0+363,40	363,40			363,40
		TOTAL				563,40

OBSERVACIONES

TOTAL	563,40
BALANCE DE CANTIDADES	
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0,0
A PAGAR PRESENTE ACTA	563,40
ACUMULADO	563,40

EPIFANIO VELASQUEZ LEAL
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO AQUA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
REPRESENTANTE LEGAL


Emsercota S.A.


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO AC

ACTA PARCIAL N°	3		FECHA DE CORTE	DD	6	MM	6	AA	2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA								
CONTRATISTA	CONSORCIO AQUA		NIT O C.C.	901.707.176-1		CONTRATO No.	No. 112-2023		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA		NIT O C.C.	900.124.654-4		CONTRATO No.	No. 117-2023		

COMPONENTE	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD		HOJA		
ACUEDUCTO PARCELAS GLOBO 1	Sum.Acc.PEAD 160	SUMINISTRO ACCESORIO POLIETILENO 160MM (6")	UND		1	DE	1



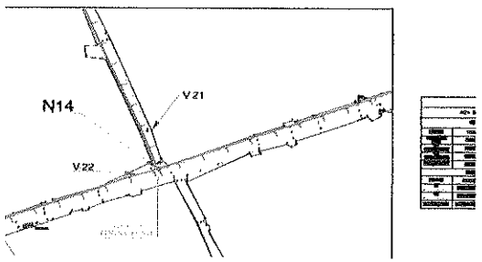



UBICACIÓN	ABSCISADO INICIO	ABSCISADO FIN	DIMENSIONES CANT.			TOTAL
N11	K0+162,20		1,00			1,00
N14	K0+407,80		1,00			1,00
N21	K0+197,00		1,00			1,00
		TOTAL				3,00

OBSERVACIONES
- Tee PEAD 160mm en N11 (k0+162,2)
- Tee PEAD 160mm en N14 (k0+407,8)
- Tapón PEAD 160mm en N21 (k0+197)

TOTAL	3,00

BALANCE DE CANTIDADES	
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0,0
A PAGAR PRESENTE ACTA	3,00
ACUMULADO	3,00

EPIFANIO VELASQUEZ LEAL
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO AQUA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
REPRESENTANTE LEGAL

Emsercota S.A.

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO AQUA

ACTA PARCIAL N°	3		FECHA DE CORTE	DD	6	MM	6	AA	2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA								
CONTRATISTA	CONSORCIO AQUA		NIT O C.C.	901.707.176-1		CONTRATO No.		No. 112-2023	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA		NIT O C.C.	900.124.654-4		CONTRATO No.		No. 117-2023	

COMPONENTE	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD		HOJA		
ACUEDUCTO PARCELAS GLOBO 1	Sum.Tub.PEAD 90	SUMINISTRO TUBERIA POLIETILENO 90MM PN10 PE100 (3")	ML		1	DE	1

INSTALACION TUBERIA PEAD 90mm				
SECTOR	TRAMO	ABS. INICIAL	ABS. FINAL	LONGITUD
Culebrera	N3 – N4	k0+010	k0+400	390 m
SECTOR	TRAMO	ABS. INICIAL	ABS. FINAL	LONGITUD
Apancel	N7 – N6	k0+010	k0+455	445 m
SECTOR	TRAMO	ABS. INICIAL	ABS. FINAL	LONGITUD
Max León	N23 - N22	k0+007	k0+224	217 m
Max León	N22 - N20	k0+000	k0+103,8	103,8 m
Max León	N20 - N16	k0+103,8	k0+137	33,2 m
Max León	N20 - N19	k0+000	k0+010	10 m
Max León	N22A - N25	k0+000	k0+050	50 m
Max León	N22 - N18	k0+224	k0+491	267 m
Max León	N18 - N17	k0+491	k0+626	135 m
Via Principal - C2	N14 - N12	k0+002	k0+191	189 m
Via Principal - C1	N11 - N10	k0+000	k0+119	119 m



	ABSCISADO		DIMENSIONES			
UBICACIÓN	INICIO	FIN	LONG.			TOTAL
N3 - N4	K0+010,00	K0+400,00	390,00			390,00
N7 - N6	K0+010,00	K0+455,00	445,00			445,00
N23 - N22	K0+007,00	K0+224,00	217,00			217,00
N22 - N20	K0+000,00	K0+103,80	103,80			103,80
N20 - N16	K0+103,80	K0+137,00	33,20			33,20
N20 - N19	K0+000,00	K0+010,00	10,00			10,00
N22A - N25	K0+000,00	K0+050,00	50,00			50,00
N22 - N18	K0+224,00	K0+491,00	267,00			267,00
N14 - N12	K0+002,00	K0+191,00	189,00			189,00
N11 - N10	K0+000,00	K0+119,00	119,00			119,00
N18 - N17	K0+491,00	K0+626,00	135,00			135,00
N3-N2	K0+000,00	K0+462,00	462,00			462,00
		TOTAL				2421,00

TOTAL	2421,00

BALANCE DE CANTIDADES	
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0,0
A PAGAR PRESENTE ACTA	2421,00
ACUMULADO	2421,00

OBSERVACIONES

EPIFANIO VELASQUEZ LEAL
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO AQUA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
REPRESENTANTE LEGAL

229

Emsercota S.A.

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO AQUA

ACTA PARCIAL N°	3		FECHA DE CORTE	DD	6	MM	6	AA	2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA								
CONTRATISTA	CONSORCIO AQUA		NIT O C.C.	901.707.176-1		CONTRATO No.		No. 112-2023	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA		NIT O C.C.	900.124.654-4		CONTRATO No.		No. 117-2023	

COMPONENTE	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD		HOJA		
ACUEDUCTO PARCELAS GLOBO 1	Sum.Acc.PEAD 110	SUMINISTRO ACCESORIO POLIETILENO 110MM (4")	UND		1	DE	1



	ABSCISADO		DIMENSIONES			
UBICACIÓN	INICIO	FIN	LONG			TOTAL
N7	K0+463,40		1,00			1,00
Hidrante 4	K0+060,00		1,00			1,00


Emsercota S.A.


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO AQUA

ACTA PARCIAL N°	3		FECHA DE CORTE	DD	6	MM	6	AA	2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA								
CONTRATISTA	CONSORCIO AQUA		NIT O C.C.	901.707.176-1		CONTRATO No.		No. 112-2023	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA		NIT O C.C.	900.124.654-4		CONTRATO No.		No. 117-2023	

COMPONENTE	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD		HOJA		
ACUEDUCTO PARCELAS GLOBO 1	Sum.Acc.PEAD 90	SUMINISTRO ACCESORIO POLIETILENO 90MM (3")	UND		1	DE	1

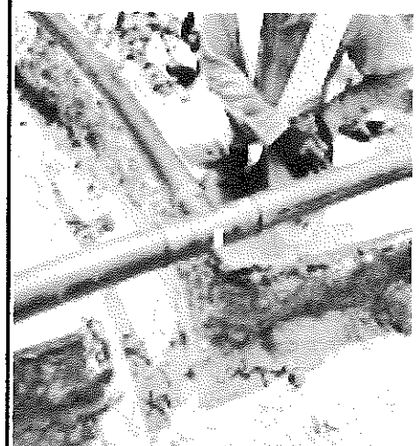

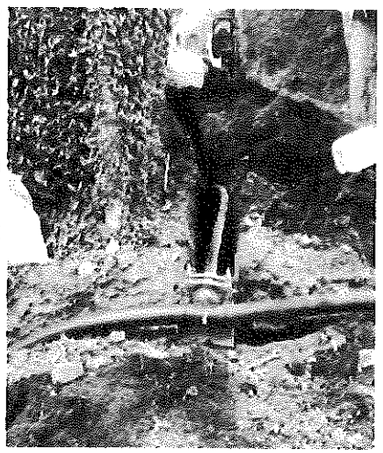

INSTALACION ACCESORIOS PEAD		
SECTOR	ACCESORIO	NODO
Apencel	Tapón PEAD 90mm	N6
SECTOR	ACCESORIO	NODO
Max León	Tee PEAD 90mm	N22A
Max León	Codo PEAD 90mm x 90°	N22B
Max León	Tee PEAD 90mm	N22
Max León	Tapón PEAD 90mm	N16
Max León	Tee PEAD 90mm	N20
Max León	Tapón PEAD 90mm	N19
Max León	Tapón PEAD 90mm	N25
Vía Principal - C2	Tapón PEAD 90mm	N12
Vía Principal - C1	Tapón PEAD 90mm	N10

	ABSCISADO		DIMENSIONES			
UBICACIÓN	INICIO	FIN	LONG			TOTAL
N25	K0+050,00		1,00			1,00
N22A	K0+199,00		1,00			1,00
N22B	K0+217,70		1,00			1,00
N22	K0+224,00		1,00			1,00
N16	K0+137,00		1,00			1,00
N20	K0+103,80		1,00			1,00
N19	K0+010,00		1,00			1,00
N6	K0+455,00		1,00			1,00
N12	K0+191,00		1,00			1,00
N10	K0+119,00		1,00			1,00
		TOTAL				10,00

TOTAL	10,00

OBSERVACIONES

- Tee PEAD 90mm en N22A (k0+199)
- Codo PEAD 90mm x 90º en N22B (k0+217,7)
- Tee PEAD 90mm en N22 (k0+224)
- Tapón PEAD 90mm en N16 (k0+137)
- Tee PEAD 90mm en N20 (k0+103,8)
- Tapón PEAD 90mm en N19 (k0+010)
- Tapón PEAD 90mm en N25 (k0+050)
- Tapón PEAD 90mm en N6 (k0+455)
- Tapón PEAD 90mm en N12 (k0+191)
- Tapón PEAD 90mm en N10 (k0+119)

BALANCE DE CANTIDADES	
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0,0
A PAGAR PRESENTE ACTA	10,00
ACUMULADO	10,00

EPIFANIO VELASQUEZ LEAL
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO AQUA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
REPRESENTANTE LEGAL

332


Emsercota S.A.


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO AQUA

ACTA PARCIAL N°	1		FECHA DE CORTE	DD	6	MM	6	AA	2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA								
CONTRATISTA	CONSORCIO AQUA		NIT O C.C.	901.707.176-1		CONTRATO No.		No. 112-2023	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA		NIT O C.C.	900.124.654-4		CONTRATO No.		No. 117-2023	

COMPONENTE	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD		HOJA		
CONSTRUCCION VIA LA CULEBRERA	ICCU - 4.44 Vías	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TR 2100 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2		1	DE	3

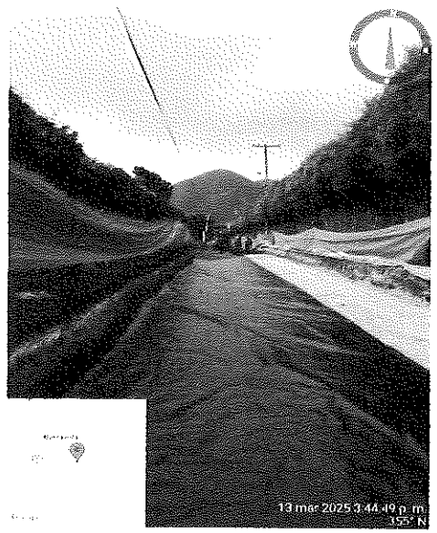

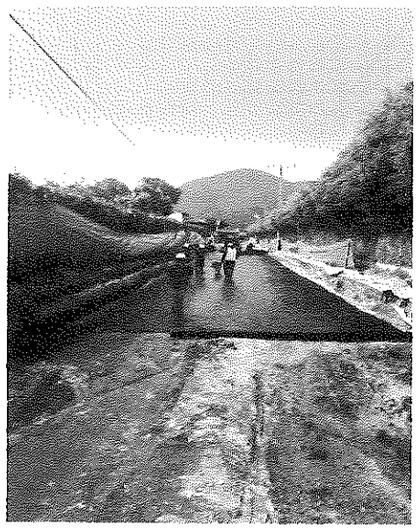

UBICACIÓN	ABSCISADO INICIO	ABSCISADO FIN	DIMENSIONES LONG.	ANCHO	ALTO	TOTAL
MH30A-MH30	K0+000,00	K0+002,90	2,90	5,7		16,53
MH30-MH38B	K0+002,90	K0+014,90	12,00	5,7		68,40
MH38B-MH38	K0+014,90	K0+059,70	44,80	5,7		255,36
MH38-MH37	K0+059,70	K0+116,74	57,04	5,7		325,13
MH37-MH36	K0+116,74	K0+176,72	59,98	5,7		341,89
MH36-MH35	K0+176,72	K0+236,54	59,82	5,7		340,97
MH35-MH34	K0+236,54	K0+296,42	59,88	5,7		341,32
		TOTAL				1689,59

OBSERVACIONES

TOTAL	1689,59

BALANCE DE CANTIDADES	
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0,0
A PAGAR PRESENTE ACTA	1689,59
SALDO POR EJECUTAR	1689,59

EPIFANIO VELASQUEZ LEAL
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO AQUA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
REPRESENTANTE LEGAL

Emsercota S.A.


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO AQUA

ACTA PARCIAL N°	1		FECHA DE CORTE	DD	6	MM	6	AA	2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA								
CONTRATISTA	CONSORCIO AQUA		NIT O C.C.	901.707.176-1		CONTRATO No.		No. 112-2023	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA		NIT O C.C.	900.124.654-4		CONTRATO No.		No. 117-2023	

COMPONENTE	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD		HOJA		
CONSTRUCCION VIA LA CULEBRERA	ICCU - 4.44 Vías	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TR 2100 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2		2	DE	3

ESQUEMAS

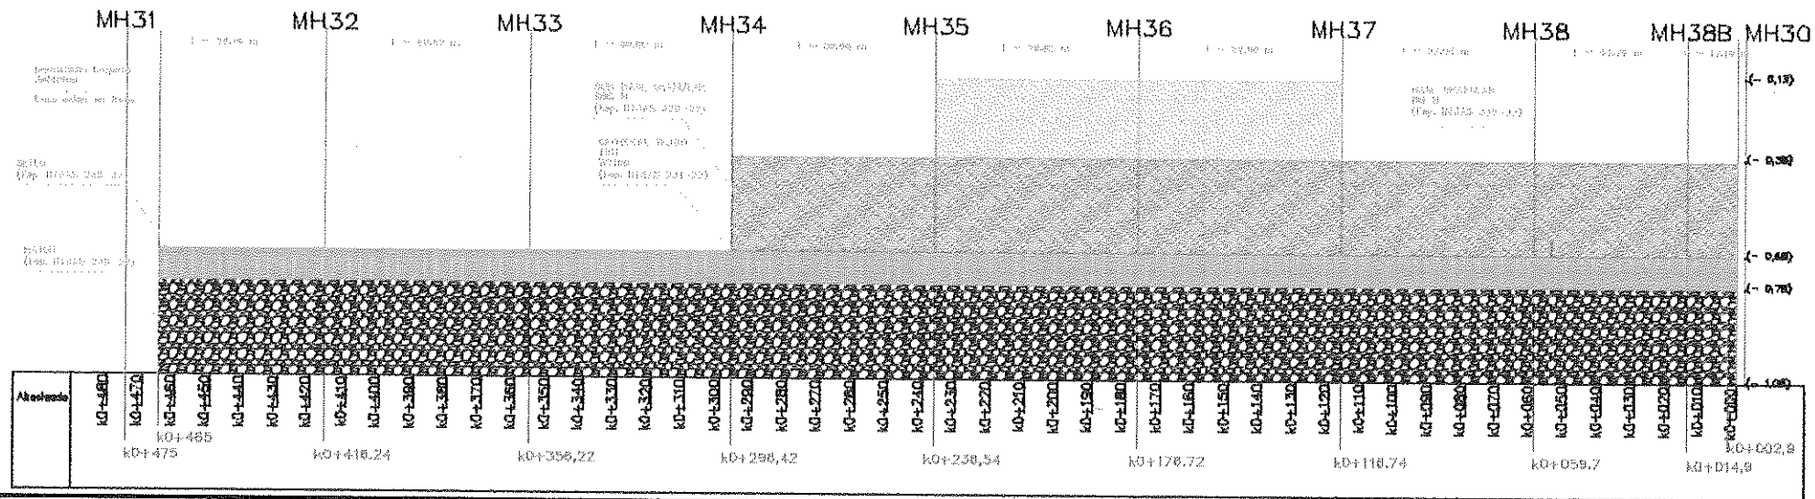

OBSERVACIONES

TOTAL	1689,59
BALANCE DE CANTIDADES	
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0,0
A PAGAR PRESENTE ACTA	1689,59
SALDO POR EJECUTAR	1689,59

EPIFANIO VELASQUEZ LEAL
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO AQUA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
REPRESENTANTE LEGAL

234

Emsercota S.A.


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO AQUA

ACTA PARCIAL N°	3		FECHA DE CORTE	DD	6	MM	6	AA	2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA								
CONTRATISTA	CONSORCIO AQUA		NIT O C.C.	901.707.176-1		CONTRATO No.		No. 112-2023	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA		NIT O C.C.	900.124.654-4		CONTRATO No.		No. 117-2023	

COMPONENTE	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD		HOJA		
CONSTRUCCION VIA LA CULEBRERA	ICCU - 4.44 Vias	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TR 2100 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	ML		3	DE	3

ESQUEMAS

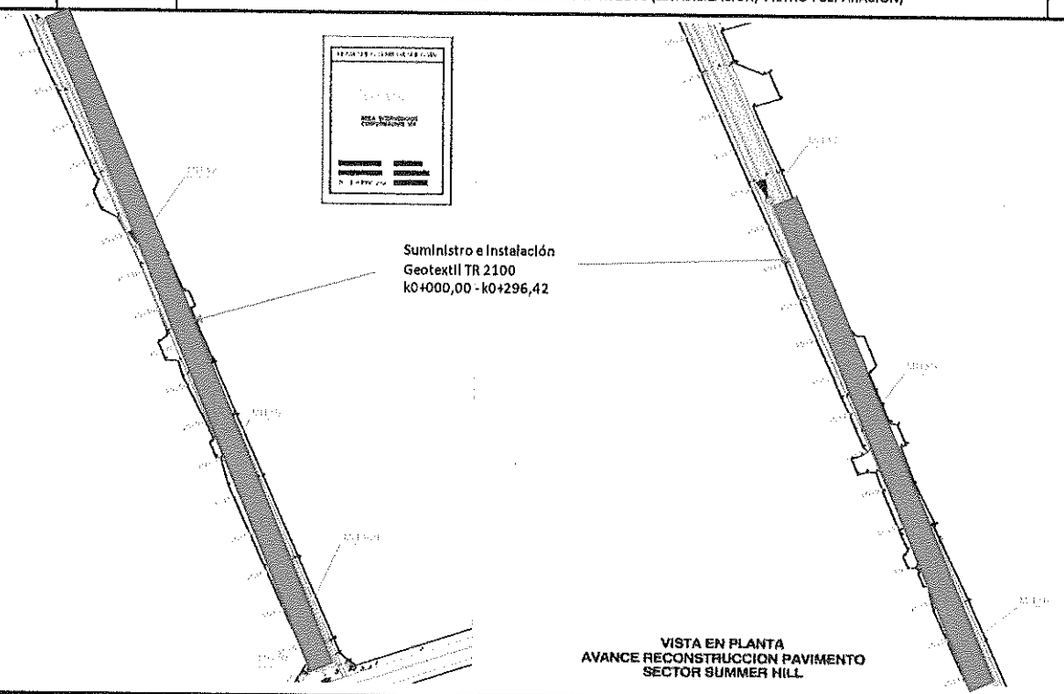

VISTA EN PLANTA
AVANCE RECONSTRUCCION PAVIMENTO
SECTOR SUMMER HILL

OBSERVACIONES

TOTAL	1689,59
BALANCE DE CANTIDADES	
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0,0
A PAGAR PRESENTE ACTA	1689,59
ACUMULADO	1689,59

EPIFANIO VELASQUEZ LEAL
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO AQUA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
REPRESENTANTE LEGAL


Emsercota S.A.


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO AQUA

ACTA PARCIAL N°	3	FECHA DE CORTE	DD	6	MM	6	AA	2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA							
CONTRATISTA	CONSORCIO AQUA	NIT O C.C.	901.707.176-1		CONTRATO No.		No. 112-2023	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA	NIT O C.C.	900.124.654-4		CONTRATO No.		No. 117-2023	

COMPONENTE	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD		HOJA		
CONSTRUCCION VIA LA CULEBRERA	ICCU - 2.9 Vías	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3		1	DE	2

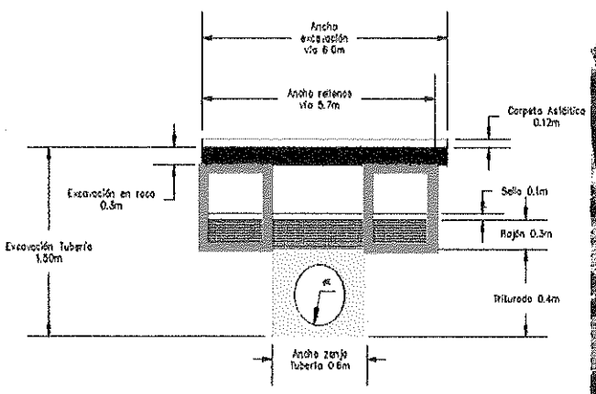

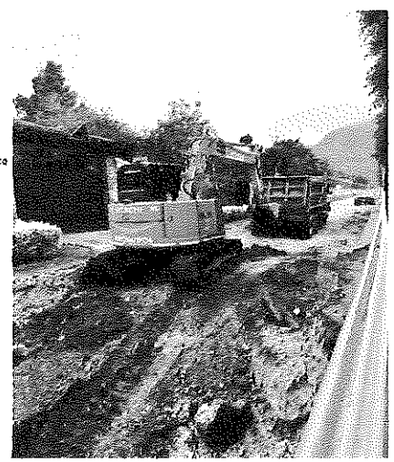

	ABSCISADO		DIMENSIONES			
UBICACIÓN	INICIO	FIN	LONG.	ANCHO	ALTO	TOTAL
MH30A-MH30	K0+000,00	K0+002,90	2,90	5,4	0,78	12,21
MH30-MH38B	K0+002,90	K0+014,90	12,00	5,4	0,78	50,54
MH38B-MH38	K0+014,90	K0+059,70	44,80	5,4	0,78	188,70
MH38-MH37	K0+059,70	K0+116,74	57,04	5,4	0,78	240,25
MH37-MH36	K0+116,74	K0+176,72	59,98	5,4	0,78	252,64
MH36-MH35	K0+176,72	K0+236,54	59,82	5,4	0,78	251,96
MH35-MH34	K0+236,54	K0+296,42	59,88	5,4	0,78	252,21
MH34-MH33	K0+296,42	K0+356,22	59,80	5,4	0,78	251,88
MH33-MH32	K0+356,22	K0+416,24	60,02	5,4	0,78	252,80
MH32-MH31	K0+416,24	K0+465,00	48,76	5,4	0,78	205,38
	TOTAL					1958,58

OBSERVACIONES

TOTAL	1958,58
BALANCE DE CANTIDADES	
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0,0
A PAGAR PRESENTE ACTA	1958,58
ACUMULADO	1958,58

EPIFANIO VELASQUEZ LEAL
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO AQUA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
REPRESENTANTE LEGAL

356


Emsercota S.A.


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO AQUA

ACTA PARCIAL N°	3	FECHA DE CORTE	DD	6	MM	6	AA	2025	
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA								
CONTRATISTA	CONSORCIO AQUA	NIT O C.C.	901.707.176-1		CONTRATO No.		No. 112-2023		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA	NIT O C.C.	900.124.654-4		CONTRATO No.		No. 117-2023		

COMPONENTE	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD		HOJA		
CONSTRUCCION VIA LA CULEBRERA	ICCU - 2.9 Vías	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3/KM		2	DE	2

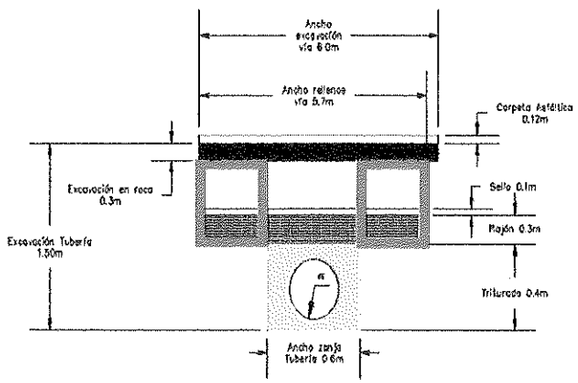

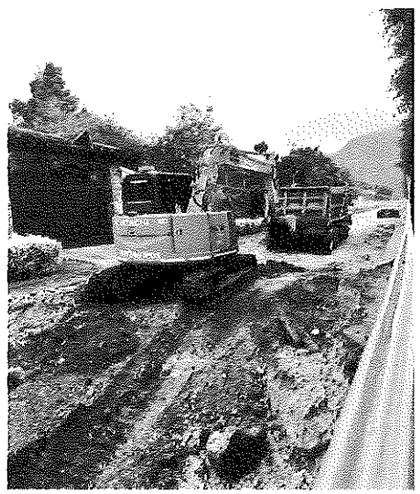

UBICACIÓN	ABSCISADO	COTAS SUPERIOR	COTAS INFERIOR	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES LONG.	DIMENSIONES ANCHO	TOTAL
MH30-MH38B	K0+002,90	2575,963	2575,183	0,780			
MH38B	K0+014,90	2576,072	2575,292	0,780	12,000	5,4	50,54
MH38	K0+059,70	2576,479	2575,699	0,780	44,800	5,4	188,70
MH37	K0+116,74	2577,098	2576,318	0,780	57,040	5,4	240,25
MH36	K0+176,72	2577,676	2576,896	0,780	59,980	5,4	252,64
MH35	K0+236,54	2578,189	2577,409	0,780	59,820	5,4	251,96
MH34	K0+296,42	2578,664	2577,884	0,780	59,880	5,4	252,21
MH33	K0+356,22	2579,095	2578,315	0,780	59,800	5,4	251,88
MH32	K0+416,24	2579,458	2578,678	0,780	60,020	5,4	252,80
MH32-MH31	K0+465,00	2579,683	2578,903	0,780	48,760	5,4	205,38
			TOTAL				1946,37

OBSERVACIONES

TOTAL	1946,37

BALANCE DE CANTIDADES	
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0,0
A PAGAR PRESENTE ACTA	1946,37
ACUMULADO	1946,37

EFRANIO VELASQUEZ LEAL
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO AQUA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
REPRESENTANTE LEGAL

337

Emsercota S.A.


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO AQUA

ACTA PARCIAL N°	3		FECHA DE CORTE	DD	6	MM	6	AA	2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA								
CONTRATISTA	CONSORCIO AQUA		NIT O C.C.	901.707.176-1		CONTRATO No.		No. 112-2023	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA		NIT O C.C.	900.124.654-4		CONTRATO No.		No. 117-2023	

COMPONENTE	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD		HOJA		
CONSTRUCCION VIA LA CULEBRERA	ICCU - 3.2 Vías	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	M3		1	DE	2

relleno subbase

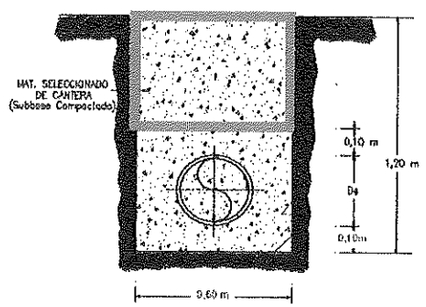

DETALLE EXCAVACION TUBERIA PEAD IMPULSION CULEBRERA



UBICACIÓN	ABSCISADO INICIO	ABSCISADO FIN	DIMENSIONES LONG.	ANCHO	ALTO	TOTAL
Línea 1 - CHICU (V.Principal)	K0+000,00	K0+092,70	92,70	0,60	0,84	46,72
Línea 1 - CHICU (V.Principal)	K0+092,70	K0+564,80	472,10	0,60	0,84	237,94
Línea 1 - CHICU (V.Culebrera)	K0+564,80	K0+715,00	150,20	0,60	0,84	75,70
Línea 1 - CHICU (V.Culebrera)	K0+715,00	K0+960,00	245,00	0,60	0,64	94,08
		TOTAL				454,44

OBSERVACIONES

De acuerdo a Comité de Obra del 25 de Abril de 2025, a partir de la abscisa k0+715,00 se disminuye la altura de relleno con material seleccionado de cantera (subbase compactada) a una altura de 1,0m con el fin de colocar 20cm de material triturado que permita el transito de peatones, dado las condiciones de la vía la cual se ve afectada a causa de las lluvias y la escorrentias de aguas superficiales y residuales

TOTAL	454,44

BALANCE DE CANTIDADES

PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0,0
A PAGAR PRESENTE ACTA	454,44
ACUMULADO	454,44

EPIFANIO VELASQUEZ LEAL
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO AQUA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
REPRESENTANTE LEGAL

230

Emsercota S.A.


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO AQUA


ACTA PARCIAL N°	3		FECHA DE CORTE	DD	6	MM	6	AA	2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA								
CONTRATISTA	CONSORCIO AQUA		NIT O C.C.	901.707.176-1		CONTRATO No.		No. 112-2023	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA		NIT O C.C.	900.124.654-4		CONTRATO No.		No. 117-2023	

COMPONENTE	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD		HOJA		
CONSTRUCCION VIA LA CULEBRERA	ICCU - 3.2 Vías	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	M3		2	DE	3


ESQUEMAS

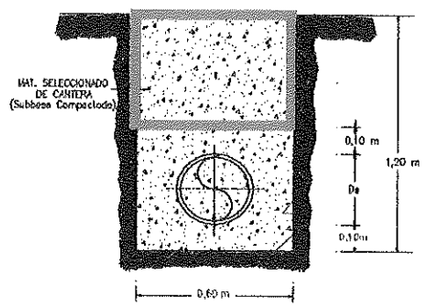

DETALLE EXCAVACION TUBERIA PEAD IMPULSION CULEBRERA

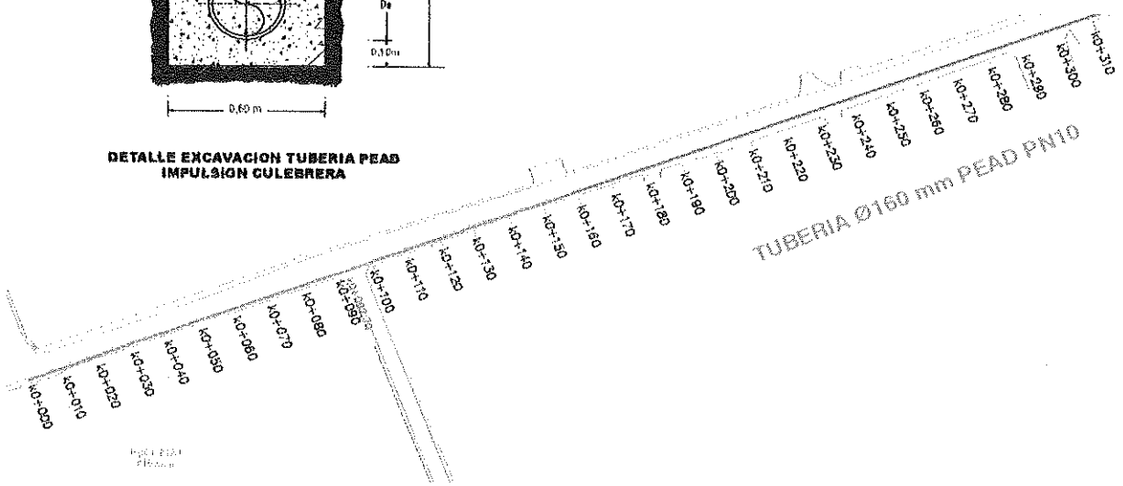

Tubería PEAD 160mm - Impulsión
Línea Chicu
k0+000,00 - k0+960,00

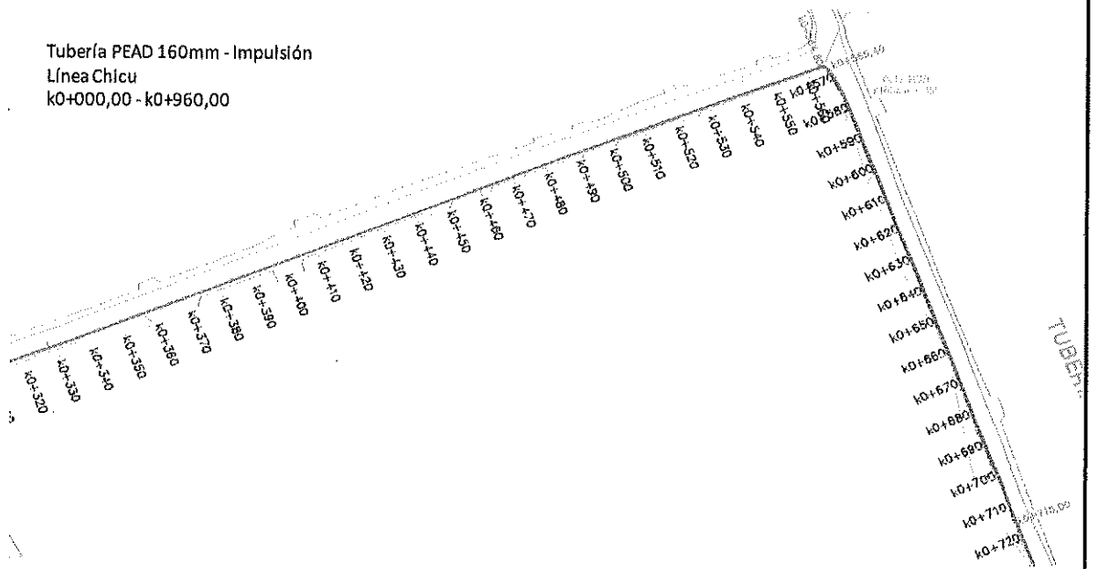

OBSERVACIONES

De acuerdo a Comité de Obra del 25 de Abril de 2025, se disminuye la altura de relleno con material seleccionado de cantera (base Compactada) a una altura de 1,0m con el fin de colocar 20cm de material triturado que permita el transito de pestones, dado las condiciones de la vía la cual se ve afectada a causa de las lluvias y la escorrentías de aguas superficiales y residuales

Descuento de Tubería = Volumen Tubería PEAD 160 = 3,14 x (0,160^2) / 4 x Long. Tubería

TOTAL	454,44
BALANCE DE CANTIDADES	
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0,0
A PAGAR PRESENTE ACTA	454,44
SALDO POR EJECUTAR	454,44

EPIFANIO VELASQUEZ LEAL
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO AQUA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
REPRESENTANTE LEGAL

32

Emsercota S.A.


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO AQUA

ACTA PARCIAL N°	3		FECHA DE CORTE	DD	6	MM	6	AA	2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA								
CONTRATISTA	CONSORCIO AQUA		NIT O C.C.	901.707.176-1		CONTRATO No.		No. 112-2023	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA		NIT O C.C.	900.124.654-4		CONTRATO No.		No. 117-2023	

COMPONENTE	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD		HOJA		
CONSTRUCCION VIA LA CULEBRERA	ICCU - 3.2 Vías	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	M3		3	DE	3

ESQUEMAS

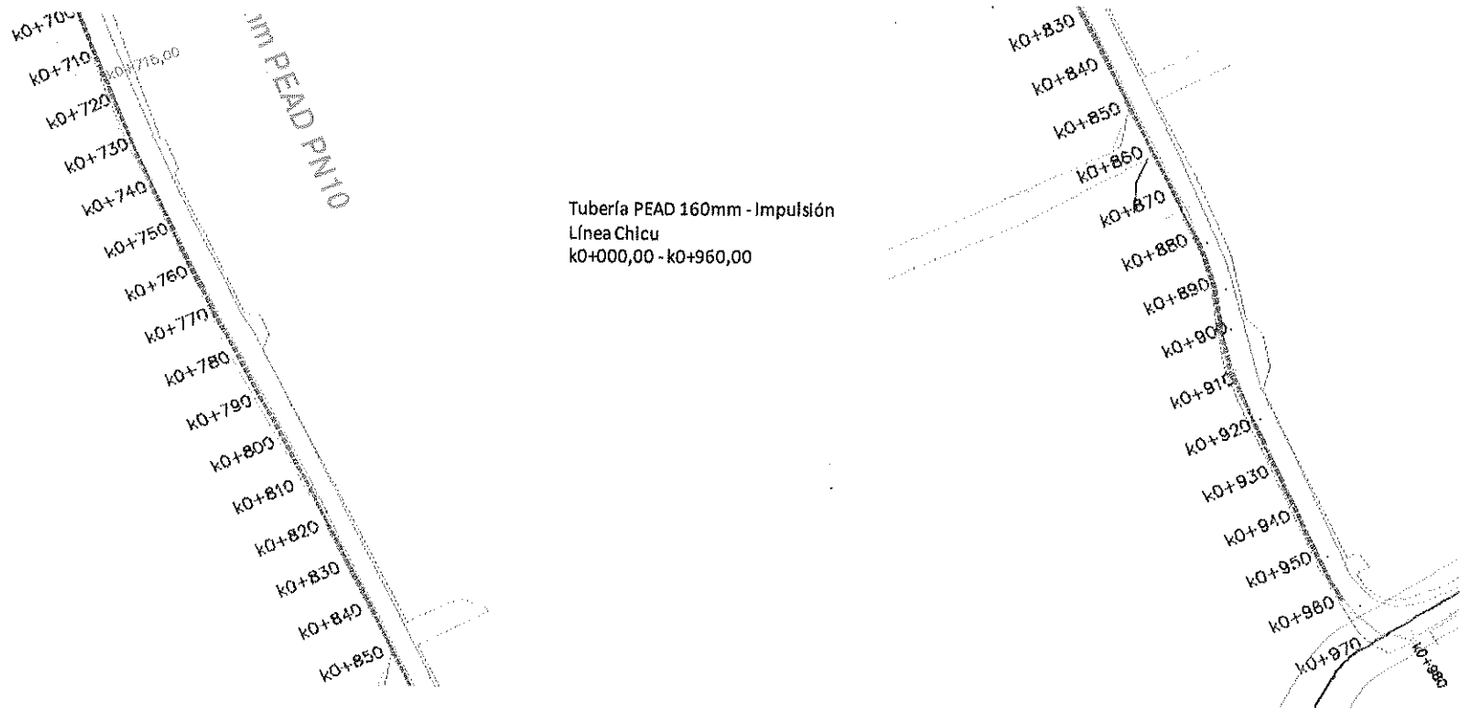

Tubería PEAD 160mm - Impulsión
Línea Chicu
k0+000,00 - k0+960,00

OBSERVACIONES

De acuerdo a Comité de Obra del 25 de Abril de 2025, se disminuye la altura de relleno con material seleccionado de cantera (base Compactada) a una altura de 1,0m con el fin de colocar 20cm de material triturado que permita el transito de pestones, dado las condiciones de la vía la cual se ve afectada a causa de las lluvias y la escorrentías de aguas superficiales y residuales

Descuento de Tubería = Volumen Tubería PEAD 160 =3,14 x (0,160^2) / 4 x Long. Tubería

TOTAL	454,44
BALANCE DE CANTIDADES	
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0,0
A PAGAR PRESENTE ACTA	454,44
ACUMULADO	454,44

EPIFANIO VELASQUEZ LEAL
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO AQUA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
REPRESENTANTE LEGAL

2/0

Emsercota S.A.

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO AQUA

ACTA PARCIAL N°	3		FECHA DE CORTE	DD	6	MM	6	AA	2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA								
CONTRATISTA	CONSORCIO AQUA		NIT O C.C.	901.707.176-1		CONTRATO No.		No. 112-2023	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA		NIT O C.C.	900.124.654-4		CONTRATO No.		No. 117-2023	

COMPONENTE	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD		HOJA		
TANQUE VIDRIOFUSIONADO EN ACERO	EPC - 2.1.7	DESMONTE Y LIMPIEZA (CON RETIRO)	M2		1	DE	2





UBICACIÓN	ABSCISADO INICIO	ABSCISADO FIN	DIMENSIONES LONG.	DIMENSIONES ANCHO		TOTAL
Area Desmonte			45,56	38,66		1761,35
					TOTAL	1761,35

OBSERVACIONES

TOTAL	1761,35
BALANCE DE CANTIDADES	
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0,0
A PAGAR PRESENTE ACTA	1761,35
ACUMULADO	1761,35

EPIFANIO VELASQUEZ LEAL
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO AQUA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
REPRESENTANTE LEGAL

Emsercota S.A.


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO AQUA

ACTA PARCIAL N°	3		FECHA DE CORTE	DD	6	MM	6	AA	2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA								
CONTRATISTA	CONSORCIO AQUA		NIT O C.C.	901.707.176-1		CONTRATO No.		No. 112-2023	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA		NIT O C.C.	900.124.654-4		CONTRATO No.		No. 117-2023	

COMPONENTE	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD		HOJA		
TANQUE VIDRIOFUSIONADO EN ACERO	EPC - 2.1.7	DESMONTE Y LIMPIEZA (CON RETIRO)	M2		2	DE	2

ESQUEMAS

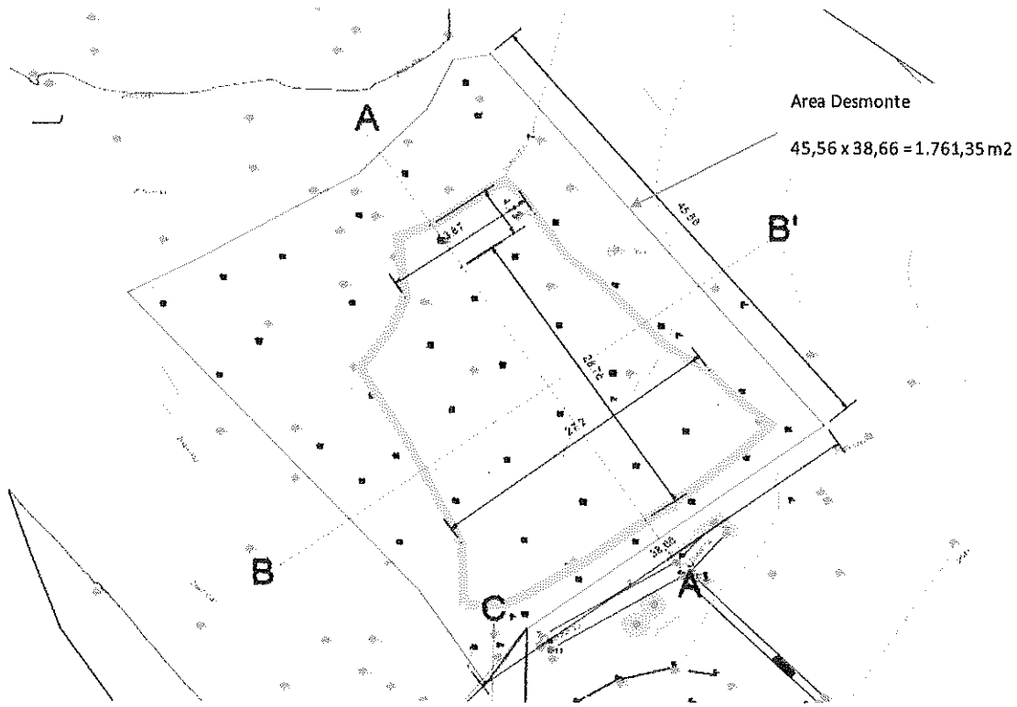

Area Desmonte

45,56 x 38,66 = 1.761,35 m2

OBSERVACIONES

TOTAL	1761,35
BALANCE DE CANTIDADES	
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0,0
A PAGAR PRESENTE ACTA	1761,35
ACUMULADO	1761,35

EPIFANIO VELASQUEZ LEAL
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO AQUA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
REPRESENTANTE LEGAL

242

Emsercota S.A.

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO AQUA

ACTA PARCIAL N°	3		FECHA DE CORTE	DD	6	MM	6	AA	2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA								
CONTRATISTA	CONSORCIO AQUA		NIT O C.C.	901.707.176-1		CONTRATO No.		No. 112-2023	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA		NIT O C.C.	900.124.654-4		CONTRATO No.		No. 117-2023	

COMPONENTE	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD		HOJA		
TANQUE VIDRIOFUSIONADO EN ACERO	ICCU - 2.10	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3		1	DE	4





	ABSCISADO		DIMENSIONES			
UBICACIÓN	INICIO	FIN	LONG.	ANCHO	ALTO	TOTAL
Base Tanque						
Corte A-A´	K0+008,64	K0+013,61	4,97	13,87	2,31	158,89
Corte A-A´	K0+013,61	K0+017,70	4,09	27,20	1,90	211,09
Corte A-A´	K0+017,70	K0+031,02	13,32	27,20	1,55	562,48
Corte A-A´	K0+031,02	K0+043,76	12,74	27,20	0,95	329,20
Vía Acceso						
Corte C-C´	K0+006,25	K0+010,00	3,75	4,80	2,62	47,07
Corte C-C´	K0+010,00	K0+016,82	6,82	4,80	2,81	91,82
Corte C-C´	K0+016,82	K0+019,22	2,40	4,80	2,60	29,89
Corte C-C´	K0+019,22	K0+024,30	5,08	4,80	2,38	58,09
Corte C-C´	K0+024,30	K0+026,25	1,95	4,80	2,48	23,19
Corte C-C´	K0+026,25	K0+037,42	11,17	4,80	2,69	144,23
Corte C-C´	K0+037,42	K0+046,40	8,98	4,80	2,40	103,34
Corte C-C´	K0+046,40	K0+050,56	4,16	4,80	1,01	20,17
	TOTAL					1779,47

OBSERVACIONES

TOTAL	1779,47
BALANCE DE CANTIDADES	
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0,0
A PAGAR PRESENTE ACTA	1779,47
ACUMULADO	1779,47

EPIFANIO VELASQUEZ LEAL
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO AQUA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
REPRESENTANTE LEGAL

243

Emsercota S.A.


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO AQUA


ACTA PARCIAL N°	3		FECHA DE CORTE	DD	6	MM	6	AA	2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA								
CONTRATISTA	CONSORCIO AQUA		NIT O C.C.	901.707.176-1		CONTRATO No.		No. 112-2023	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA		NIT O C.C.	900.124.654-4		CONTRATO No.		No. 117-2023	

COMPONENTE	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD		HOJA		
TANQUE VIDRIOFUSIONADO EN ACERO	ICCU - 2.10	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3		2	DE	4

PLANTA CORTE BASE TANQUE

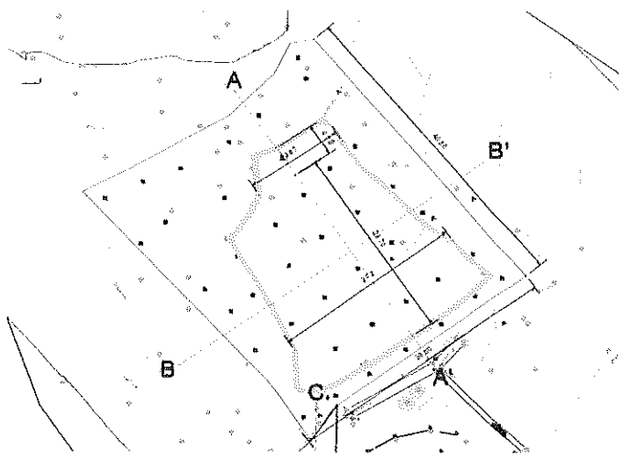

PLANTA CORTE VIA ACCESO

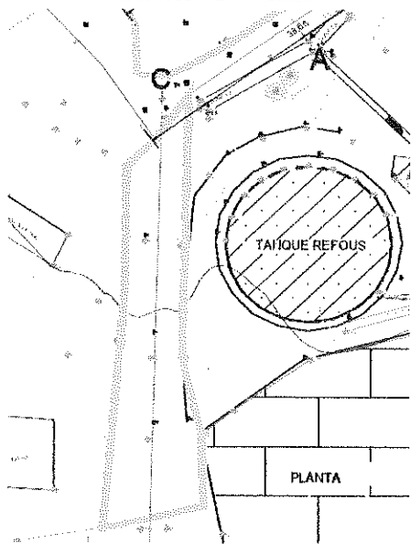

UBICACIÓN	ABSCISADO	COTAS SUPERIOR	COTAS INFERIOR	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES LONG.	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES TOTAL
			Base Tanque				
Corte A-A'	K0+008,64	2653,740	2651,200	2,540			
Corte A-A'	K0+013,61	2653,005	2650,935	2,070	4,97	13,87	158,89
Corte A-A'	K0+017,70	2652,445	2650,720	1,725	4,09	27,2	211,09
Corte A-A'	K0+031,02	2651,685	2650,305	1,380	13,32	27,2	562,48
Corte A-A'	K0+043,76	2650,495	2649,975	0,520	12,74	27,2	329,20
			Vía Acceso				
Corte C-C'	K0+006,25	2649,620	2647,225	2,395			
Corte C-C'	K0+010,00	2649,205	2646,370	2,835	3,75	4,80	47,07
Corte C-C'	K0+016,82	2647,775	2645,000	2,775	6,82	4,80	91,82
Corte C-C'	K0+019,22	2646,930	2644,515	2,415	2,40	4,80	29,89
Corte C-C'	K0+024,30	2645,830	2643,480	2,350	5,08	4,80	58,09
Corte C-C'	K0+026,25	2645,665	2643,060	2,605	1,95	4,80	23,19
Corte C-C'	K0+037,42	2643,265	2640,490	2,775	11,17	4,80	144,23
Corte C-C'	K0+046,40	2640,140	2638,120	2,020	8,98	4,80	103,34
Corte C-C'	K0+050,56	2637,495	2637,495	0,000	4,16	4,80	20,17
			TOTAL				1779,47

OBSERVACIONES

Instalación Sello de Mejoramiento

TOTAL	1779,47
BALANCE DE CANTIDADES	
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0,0
A PAGAR PRESENTE ACTA	1779,47
ACUMULADO	1779,47

EPIFANIO VELASQUEZ LEAL
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO AQUA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
REPRESENTANTE LEGAL

244

Emsercota S.A.

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


CONSORCIO AQUA

ACTA PARCIAL N°	3		FECHA DE CORTE	DD	6	MM	6	AA	2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA								
CONTRATISTA	CONSORCIO AQUA		NIT O C.C.	901.707.176-1		CONTRATO No.	No. 112-2023		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA		NIT O C.C.	900.124.654-4		CONTRATO No.	No. 117-2023		

COMPONENTE	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD		HOJA		
TANQUE VIDRIOFUSIONADO EN ACERO	ICCU - 2.10	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3		3	DE	4

ESQUEMAS

PERFIL CORTE BASE TANQUE

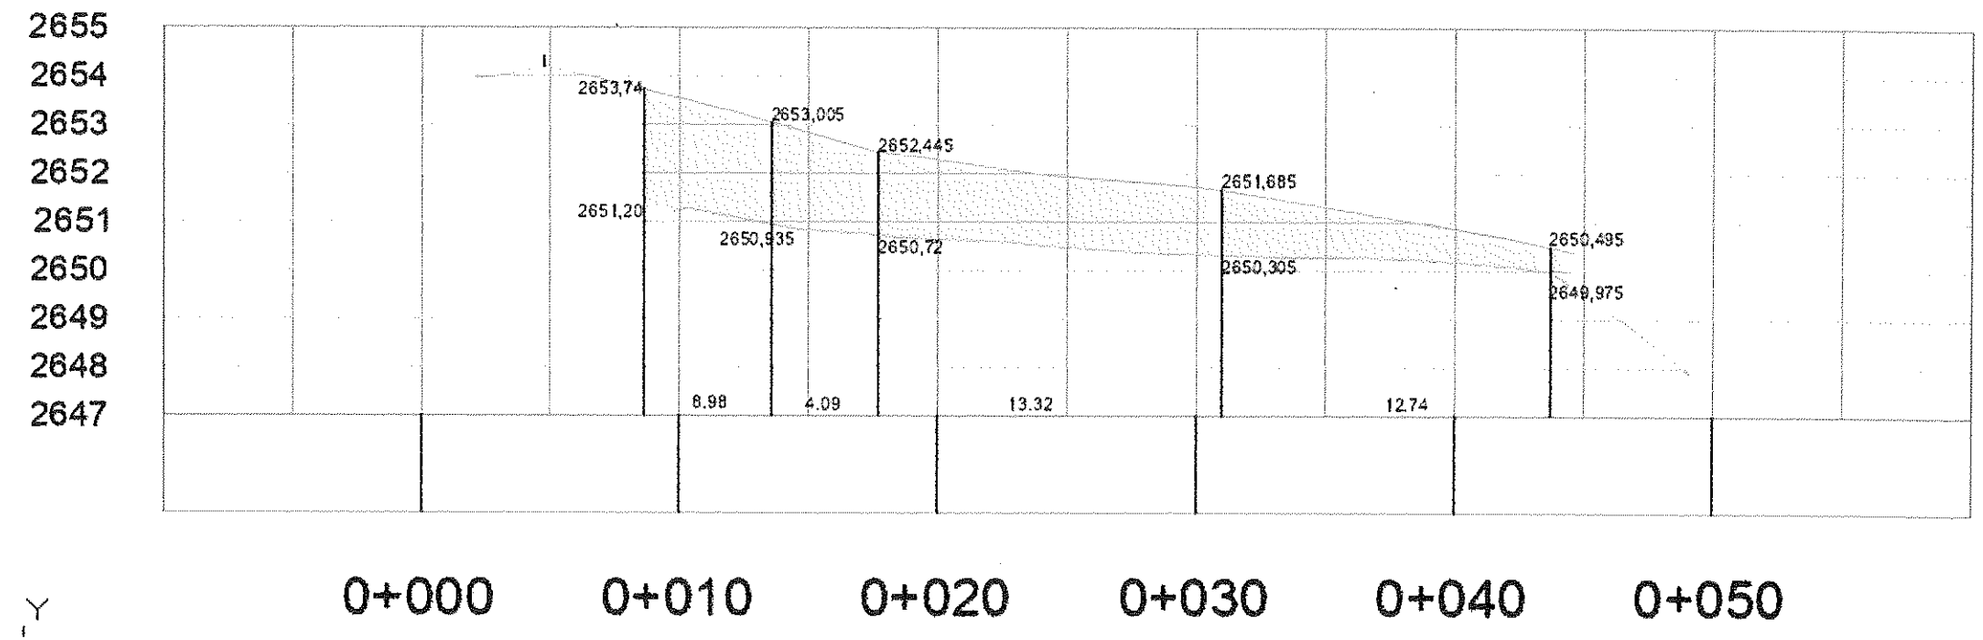

OBSERVACIONES

TOTAL	1779,47
BALANCE DE CANTIDADES	
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0,0
A PAGAR PRESENTE ACTA	1779,47
ACUMULADO	1779,47

EPIFANIO VELASQUEZ LEAL
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO AQUA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORÍA
CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
REPRESENTANTE LEGAL

Emsercota S.A.

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


CONSORCIO AQUA

ACTA PARCIAL N°	3		FECHA DE CORTE	DD	6	MM	6	AA	2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA								
CONTRATISTA	CONSORCIO AQUA		NIT O C.C.	901.707.176-1		CONTRATO No.		No. 112-2023	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA		NIT O C.C.	900.124.654-4		CONTRATO No.		No. 117-2023	

COMPONENTE	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD		HOJA		
TANQUE VIDRIOFUSIONADO EN ACERO	ICCU - 2.10	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3		4	DE	4

ESQUEMAS

PERFIL CORTE VIA ACCESO

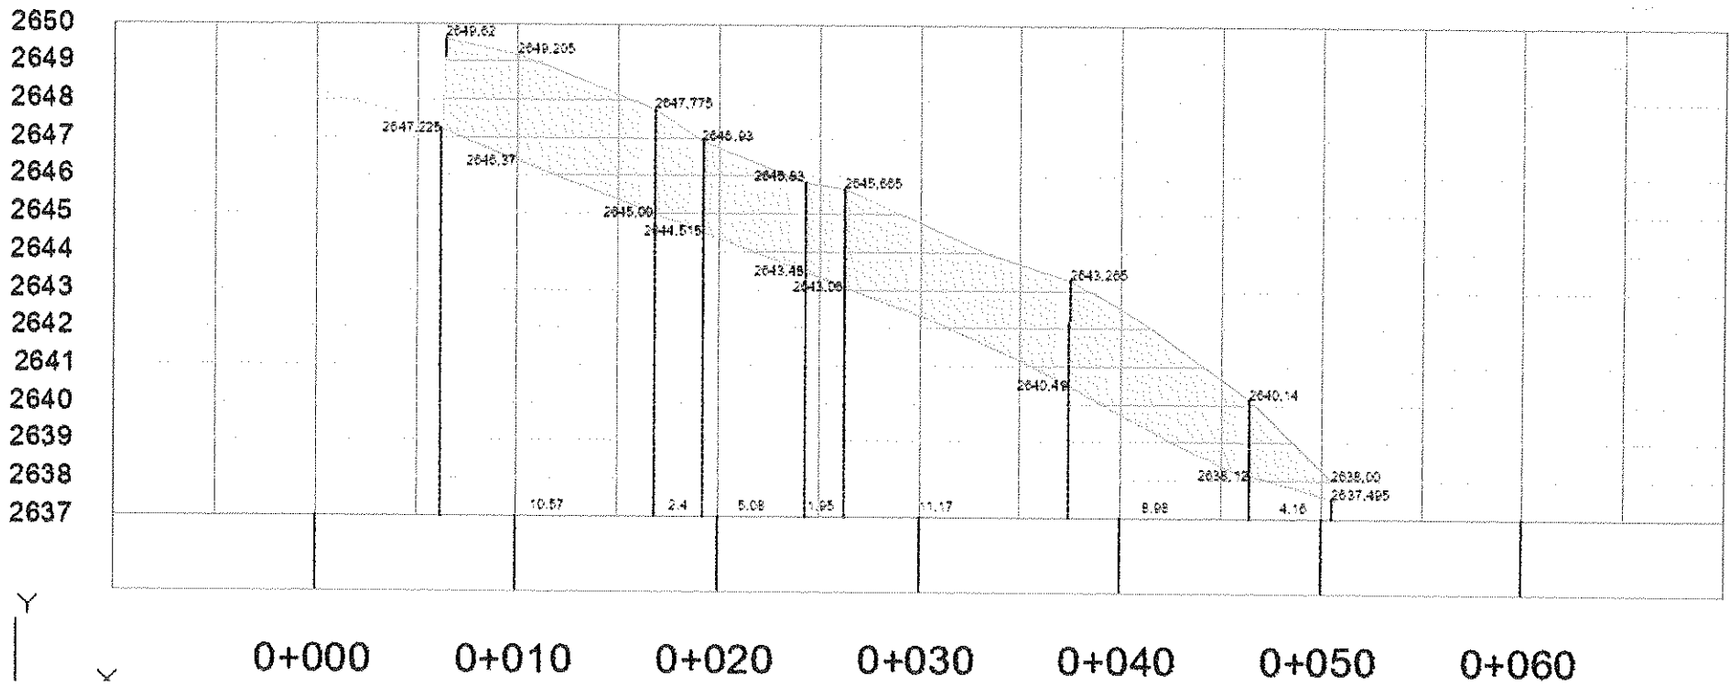

OBSERVACIONES

TOTAL	1779,47
BALANCE DE CANTIDADES	
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0,0
A PAGAR PRESENTE ACTA	1779,47
ACUMULADO	1779,47

EPIFANIO VELASQUEZ LEAL
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO AQUA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
REPRESENTANTE LEGAL

246


Emsercota S.A.


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO AQUA

ACTA PARCIAL N°	3	FECHA DE CORTE	DD	6	MM	6	AA	2025	
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA								
CONTRATISTA	CONSORCIO AQUA	NIT O C.C.	901.707.176-1	CONTRATO No.	No. 112-2023				
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA	NIT O C.C.	900.124.654-4	CONTRATO No.	No. 117-2023				

COMPONENTE	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD		HOJA		
TANQUE VIDRIOFUSIONADO EN ACERO	ICCU - 1.6 Vías	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3/KM		1	DE	1

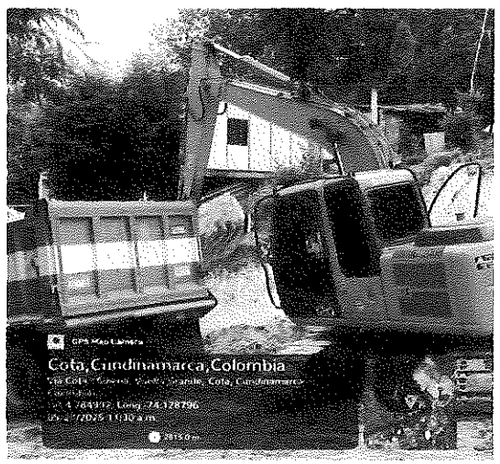

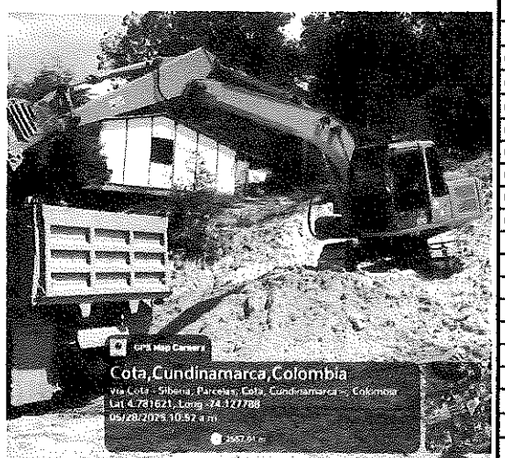

UBICACIÓN	ABSCISADO INICIO	ABSCISADO FIN	DIMENSIONES LONG.	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES ALTO	ACARREO EXPANSION	ACARREO KM	ACARREO TOTAL
Transporte Excavación Vía Acceso (ICCU - 2.10)								
Corte C-C´	K0+006,25	K0+010,00	3,75	4,80	2,62	1,30	19	1162,63
Corte C-C´	K0+010,00	K0+016,82	6,82	4,80	2,81	1,30	19	2268,06
Corte C-C´	K0+016,82	K0+019,22	2,40	4,80	2,60	1,30	19	738,39
Corte C-C´	K0+019,22	K0+024,30	5,08	4,80	2,38	1,30	19	1434,94
Corte C-C´	K0+024,30	K0+026,25	1,95	4,80	2,48	1,30	19	572,78
Corte C-C´	K0+026,25	K0+037,42	11,17	4,80	2,69	1,30	19	3562,41
Corte C-C´	K0+037,42	K0+046,40	8,98	4,80	2,40	1,30	19	2552,54
Corte C-C´	K0+046,40	K0+050,56	4,16	4,80	1,01	1,30	19	498,14
				TOTAL				12789,90

OBSERVACIONES

TOTAL	12789,90

BALANCE DE CANTIDADES	
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0,0
A PAGAR PRESENTE ACTA	12789,90
ACUMULADO	12789,90

EPIFANIO VELASQUEZ LEAL
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO AQUA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERACUEDUCTO COTA
REPRESENTANTE LEGAL

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901707176	1	CONSORCIO AQUA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 16 106 65 AP 403 ED ROCALLA	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3016193827	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1214403520	9480667997	E	2025/01/21	2025/01/23	BANCOLOMBIA	2	$12,275,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerada SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (9 Afiliados)							$21,800,000	$4,038,000			$21,800,000	$2,725,000			$21,800,000	$872,000			$21,800,000		$1,517,300		$21,800,000	$1,090,000		$10,242,300
Centro de Trabajo: Principal (9 Afiliados)							$21,800,000	$4,038,000			$21,800,000	$2,725,000			$21,800,000	$872,000			$21,800,000		$1,517,300		$21,800,000	$1,090,000		$10,242,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (9 Afiliados)							$21,800,000	$4,038,000			$21,800,000	$2,725,000			$21,800,000	$872,000			$21,800,000		$1,517,300		$21,800,000	$1,090,000		$10,242,300
1	CC	1037710095	ACOSTA NEIRA JUAN CAMILO		23020 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS008	30	$2,000,000	$250,000	CCF22	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$2,000,000	$100,000	No	$889,200
2	CC	66683378	ARANGO SOTELO LUZ KARINE		23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$250,000	CCF22	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$2,000,000	$100,000	No	$889,200
3	CC	73188644	ARRIETA LOZANO JUAN JOSE		25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS010	30	$2,000,000	$250,000	CCF22	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$2,000,000	$100,000	No	$889,200
4	CC	73577753	CORREA MARIMON RICARDO		23030 1	30	$3,500,000	$910,000	EPS002	30	$3,500,000	$437,500	CCF22	30	$3,500,000	$140,000	14-11	30	$3,500,000	6.960%	$243,600	30	$3,500,000	$175,000	No	$1,906,100
5	CC	9149350	DAIAZA GUERRA CRISTIAN MAURICIO		25-14	30	$2,000,000	$520,000	EPS010	30	$2,000,000	$250,000	CCF22	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$2,000,000	$100,000	No	$1,089,200
6	CC	1020752041	GONZALEZ CASTELBLANCO ANDRES FELIPE		23100 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS008	30	$2,000,000	$250,000	CCF22	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$2,000,000	$100,000	No	$889,200
7	CC	79072691	JIMENEZ MAURICIO		23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS010	30	$2,000,000	$250,000	CCF22	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$2,000,000	$100,000	No	$889,200
8	CC	1022394213	PINZON GONZALEZ JEAN PAUL		23030 1	30	$1,800,000	$288,000	EPS017	30	$1,800,000	$225,000	CCF22	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	6.960%	$125,300	30	$1,800,000	$90,000	No	$800,300
9	CC	72000831	VELASQUEZ LEAL EPIFANIO		23020 1	30	$4,500,000	$720,000	EPS005	30	$4,500,000	$562,500	CCF22	30	$4,500,000	$180,000	14-11	30	$4,500,000	6.960%	$313,200	30	$4,500,000	$225,000	No	$2,000,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerada SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMINISTRATIVA (1 Afiliados)							$4,200,000	$1,092,000			$4,200,000	$525,000			$4,200,000	$168,000			$4,200,000		$22,000		$4,200,000	$210,000		$2,017,000
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVA (1 Afiliados)							$4,200,000	$1,092,000			$4,200,000	$525,000			$4,200,000	$168,000			$4,200,000		$22,000		$4,200,000	$210,000		$2,017,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)							$4,200,000	$1,092,000			$4,200,000	$525,000			$4,200,000	$168,000			$4,200,000		$22,000		$4,200,000	$210,000		$2,017,000
10	CC	1122811442	FONSECA SOLANO DORIKA ANDREA		23030 1	30	$4,200,000	$1,092,000	EPS005	30	$4,200,000	$525,000	CCF22	30	$4,200,000	$168,000	14-11	30	$4,200,000	0.522%	$22,000	30	$4,200,000	$210,000	No	$2,017,000
Total Afiliados(10)							$26,000,000	$5,130,000			$26,000,000	$3,250,000			$26,000,000	$1,040,000			$26,000,000		$1,539,300		$26,000,000	$1,300,000		$12,259,300

2/10

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901707176	1	CONSORCIO AQUA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 16 106 65 AP 403 ED ROCALLA	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3016193827	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1214403520	9480667997	E	2025/01/21	2025/01/23	BANCOLOMBIA	2	$12,275,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				10	$5,130,000	$6,700	$0	$5,136,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$320,000	$500	$0	$320,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$840,000	$1,100	$0	$841,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$2,930,000	$3,700	$0	$2,933,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$1,040,000	$1,400	$0	$1,041,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$1,539,300	$2,000	$0	$1,541,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	10	$1,539,300	$2,000	$0	$1,541,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$1,040,000	$1,400	$0	$1,041,400
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	10	$1,040,000	$1,400	$0	$1,041,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				10	$3,250,000	$4,300	$0	$3,254,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$500,000	$700	$0	$500,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$750,000	$1,000	$0	$751,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$225,000	$300	$0	$225,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$687,500	$900	$0	$688,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$1,087,500	$1,400	$0	$1,088,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$780,000	$1,000	$0	$781,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	10	$780,000	$1,000	$0	$781,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$520,000	$700	$0	$520,700
SENA	PASENA	899,999,034	1	10	$520,000	$700	$0	$520,700
TOTAL				10	$12,259,300	$16,100	$0	$12,275,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901707176	1	CONSORCIO AQUA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 16 106 65 AP 403 ED ROCALLA	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3016193827	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1272990856	9481647984	E	2025/02/19	2025/02/17	BANCOLOMBIA	0	$14,656,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (16 Afiliados)																							$26,643,450	$4,863,200			$26,643,450	$3,330,700			$26,643,450	$1,065,900			$26,643,450		$1,854,900		$26,643,450	$1,332,800		$12,447,500
Centro de Trabajo: Principal (16 Afiliados)																							$26,643,450	$4,863,200			$26,643,450	$3,330,700			$26,643,450	$1,065,900			$26,643,450		$1,854,900		$26,643,450	$1,332,800		$12,447,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (16 Afiliados)																							$26,643,450	$4,863,200			$26,643,450	$3,330,700			$26,643,450	$1,065,900			$26,643,450		$1,854,900		$26,643,450	$1,332,800		$12,447,500
1	CC	1037710095	ACOSTA NEIRA JUAN CAMILO																		23020 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS008	30	$2,000,000	$250,000	CCF22	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$2,000,000	$100,000	No	$889,200
2	CC	66683378	ARANGO SOTELO LUZ KARINE																		23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$250,000	CCF22	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$2,000,000	$100,000	No	$889,200
3	CC	73188644	ARRIETA LOZANO JUAN JOSE																		25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS010	30	$2,000,000	$250,000	CCF22	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$2,000,000	$100,000	No	$889,200
4	CC	1072647805	CALDERON NEIRA ANDRES FELIPE	X																	23030 1	22	$1,043,900	$167,100	EPS002	22	$1,043,900	$130,500	CCF22	22	$1,043,900	$41,800	14-11	22	$1,043,900	6.960%	$72,700	22	$1,043,900	$52,300	No	$464,400
5	CC	1115941360	CAMPAZ OSPINA JESUS ANDRES	X																	23030 1	2	$94,900	$15,200	EPS017	2	$94,900	$11,900	CCF22	2	$94,900	$3,800	14-11	2	$94,900	6.960%	$6,700	2	$94,900	$4,800	No	$42,400
6	CC	1014194404	CANO SIERRA BRAYAN FELIPE	X																	23020 1	22	$1,043,900	$167,100	EPS002	22	$1,043,900	$130,500	CCF22	22	$1,043,900	$41,800	14-11	22	$1,043,900	6.960%	$72,700	22	$1,043,900	$52,300	No	$464,400
7	CC	73577753	CORREA MARIMON RICARDO							X											23030 1	30	$4,000,000	$1,040,000	EPS002	30	$4,000,000	$500,000	CCF22	30	$4,000,000	$160,000	14-11	30	$4,000,000	6.960%	$278,400	30	$4,000,000	$200,000	No	$2,178,400
8	CC	9149350	DRIAZA GUERRA CRISTIAN MAURICIO																		25-14	30	$2,000,000	$520,000	EPS010	30	$2,000,000	$250,000	CCF22	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$2,000,000	$100,000	No	$1,089,200
9	CC	80450450	GARAY QUEVEDO JAVIER MAURICIO	X																	23100 1	2	$94,900	$15,200	EPS017	2	$94,900	$11,900	CCF22	2	$94,900	$3,800	14-11	2	$94,900	6.960%	$6,700	2	$94,900	$4,800	No	$42,400
10	CC	1020752041	GONZALEZ CASTELBLANCO ANDRES FELIPE																		23100 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS008	30	$2,000,000	$250,000	CCF22	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$2,000,000	$100,000	No	$889,200
11	CC	75072691	JIMENEZ MAURICIO																		23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS010	30	$2,000,000	$250,000	CCF22	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$2,000,000	$100,000	No	$889,200
12	CC	1022394213	PINZON GONZALEZ JEAN PAUL																		23030 1	30	$1,800,000	$288,000	EPS017	30	$1,800,000	$225,000	CCF22	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	6.960%	$125,300	30	$1,800,000	$90,000	No	$800,300
13	CC	1066188494	RIVERO VASQUEZ MANUEL ANTONIO	X																	23030 1	2	$94,900	$15,200	EPS008	2	$94,900	$11,900	CCF22	2	$94,900	$3,800	14-11	2	$94,900	6.960%	$6,700	2	$94,900	$4,800	No	$42,400
14	CC	1047461385	TORRES AYOLA JHON LUIS	X	X																23100 1	1	$47,450	$7,600	EPS002	1	$47,450	$6,000	CCF21	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	6.960%	$3,400	1	$47,450	$2,500	No	$21,400
15	PT	6960846	YAMONDE MORENO MOISES EDUARDO	X	X																25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$1,423,500	$71,300	No	$633,200
16	CC	72000831	VELASQUEZ LEAL EPIFANIO							X											23020 1	30	$5,000,000	$800,000	EPS005	30	$5,000,000	$625,000	CCF22	30	$5,000,000	$200,000	14-11	30	$5,000,000	6.960%	$348,000	30	$5,000,000	$250,000	No	$2,223,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMINISTRATIVA (1 Afiliados)																							$4,600,000	$1,196,000			$4,600,000	$575,000			$4,600,000	$184,000			$4,600,000		$24,100		$4,600,000	$230,000		$2,209,100
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVA (1 Afiliados)																							$4,600,000	$1,196,000			$4,600,000	$575,000			$4,600,000	$184,000			$4,600,000		$24,100		$4,600,000	$230,000		$2,209,100
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																							$4,600,000	$1,196,000			$4,600,000	$575,000			$4,600,000	$184,000			$4,600,000		$24,100		$4,600,000	$230,000		$2,209,100
17	CC	1122811442	FONSECA SOLANO DORIKA ANDREA							X											23030 1	30	$4,600,000	$1,196,000	EPS005	30	$4,600,000	$575,000	CCF22	30	$4,600,000	$184,000	14-11	30	$4,600,000	0.522%	$24,100	30	$4,600,000	$230,000	No	$2,209,100
Total Afiliados(17)																							$31,243,450	$6,059,200			$31,243,450	$3,905,700			$31,243,450	$1,249,900			$31,243,450		$1,879,000		$31,243,450	$1,562,800		$14,656,600

0 3123

S&Z 250

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901707176	1	CONSORCIO AQUA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 16 106 65 AP 403 ED ROCALLA	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3016193827	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-01	2025-02	1272990856	9481647984	E	2025/02/19	2025/02/17	BANCOLOMBIA	0	$14,656,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				17	$6,059,200	$0	$0	$6,059,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$342,800	$0	$0	$342,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,067,800	$0	$0	$1,067,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$3,361,500	$0	$0	$3,361,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$1,287,100	$0	$0	$1,287,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$1,879,000	$0	$0	$1,879,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	17	$1,879,000	$0	$0	$1,879,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$1,249,900	$0	$0	$1,249,900
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	17	$1,249,900	$0	$0	$1,249,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				17	$3,905,700	$0	$0	$3,905,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$511,900	$0	$0	$511,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$750,000	$0	$0	$750,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$248,800	$0	$0	$248,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$1,017,000	$0	$0	$1,017,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$1,378,000	$0	$0	$1,378,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$937,800	$0	$0	$937,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	17	$937,800	$0	$0	$937,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$625,000	$0	$0	$625,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	17	$625,000	$0	$0	$625,000
TOTAL				17	$14,656,600	$0	$0	$14,656,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901707176	1	CONSORCIO AQUA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 16 106 65 AP 403 ED ROCALLA	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3016193827	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1374584253	9483485452	E	2025/03/19	2025/03/31	BANCOLOMBIA	12	$20,458,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (18 Afiliados)																							$39,346,467	$6,893,700			$39,346,467	$4,918,800			$39,346,467	$1,574,300			$39,346,467		$2,738,800		$39,346,467	$1,968,400		$18,096,000
Centro de Trabajo: Principal (18 Afiliados)																							$39,346,467	$6,893,700			$39,346,467	$4,918,800			$39,346,467	$1,574,300			$39,346,467		$2,738,800		$39,346,467	$1,968,400		$18,096,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (18 Afiliados)																							$39,346,467	$6,893,700			$39,346,467	$4,918,800			$39,346,467	$1,574,300			$39,346,467		$2,738,800		$39,346,467	$1,968,400		$18,096,000
1	CC	1124191506	ACOSTA CHITIVA DERLY JASBREIDY	X																	23020 1	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$379,000	CCF22	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	30	$3,000,000	$150,000	No	$1,333,800
2	CC	1057710095	ACOSTA NEIRA JUAN CAMILO																		23020 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS008	30	$2,000,000	$250,000	CCF22	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$2,000,000	$100,000	No	$889,200
3	CC	66683378	ARANGO SOTELO LUZ XARINE																		23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$250,000	CCF22	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$2,000,000	$100,000	No	$889,200
4	CC	73188644	ARRIETA LOZANO JUAN JOSE																		25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS010	30	$2,000,000	$250,000	CCF22	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$2,000,000	$100,000	No	$889,200
5	CC	1072647805	CALDERON NEIRA ANDRES FELIPE																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$1,423,500	$71,300	No	$633,200
6	CC	1115941360	CAMPAZ OSPINA JESUS ANDRES																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$178,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$1,423,500	$71,300	No	$633,200
7	CC	1014194404	CANO SIERRA BRAYAN FELIPE																		23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$1,423,500	$71,300	No	$633,200
8	CC	73577753	CORREA MARIMON RICARDO																		23030 1	30	$4,000,000	$1,040,000	EPS002	30	$4,000,000	$500,000	CCF22	30	$4,000,000	$160,000	14-11	30	$4,000,000	6.960%	$278,400	30	$4,000,000	$200,000	No	$2,178,400
9	CC	9149350	DRIAZA GUERRA CRISTIAN MAURICIO																		25-14	30	$2,000,000	$520,000	EPS010	30	$2,000,000	$250,000	CCF22	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$2,000,000	$100,000	No	$1,089,200
10	CC	80450450	GARAY QUEVEDO JAVIER MAURICIO																		23100 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$178,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$1,423,500	$71,300	No	$633,200
11	CC	1020752041	GONZALEZ CASTELBLANCO ANDRES FELIPE																		23100 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS008	30	$2,000,000	$250,000	CCF22	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$2,000,000	$100,000	No	$889,200
12	CC	75072691	JIMENEZ MAURICIO																		23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS010	30	$2,000,000	$250,000	CCF22	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$2,000,000	$100,000	No	$889,200
13	CC	40331681	MARROQUIN MURCIA ANELEY	X																	23020 1	27	$1,281,150	$205,000	EPS005	27	$1,281,150	$160,200	CCF22	27	$1,281,150	$51,300	14-11	27	$1,281,150	6.960%	$89,200	27	$1,281,150	$64,200	No	$569,900
14	CC	13478040	NOSSA CABANZO CARLOS AUGUSTO	X																	25-14	29	$3,866,667	$618,700	EPS010	29	$3,866,667	$483,400	CCF22	29	$3,866,667	$154,700	14-11	29	$3,866,667	6.960%	$269,200	29	$3,866,667	$193,500	No	$1,719,500
15	CC	1022394213	PINZON GONZALEZ JEAN PAUL																		23030 1	30	$1,800,000	$288,000	EPS017	30	$1,800,000	$225,000	CCF22	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	6.960%	$125,300	30	$1,800,000	$90,000	No	$800,300
16	CC	1066188494	RIVERO VASQUEZ MANUEL ANTONIO																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$178,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$1,423,500	$71,300	No	$633,200
17	CC	1006220408	TORRES PLAZAS ERIKA JULIETH	X																	25-14	27	$1,281,150	$205,000	EPS008	27	$1,281,150	$160,200	CCF22	27	$1,281,150	$51,300	14-11	27	$1,281,150	6.960%	$89,200	27	$1,281,150	$64,200	No	$569,900
18	CC	72000831	VELASQUEZ LEAL EPIFANIO																		23020 1	30	$5,000,000	$800,000	EPS005	30	$5,000,000	$625,000	CCF22	30	$5,000,000	$200,000	14-11	30	$5,000,000	6.960%	$348,000	30	$5,000,000	$250,000	No	$2,223,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMINISTRATIVA (1 Afiliados)																							$4,600,000	$1,196,000			$4,600,000	$575,000			$4,600,000	$184,000			$4,600,000		$24,100		$4,600,000	$230,000		$2,209,100
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVA (1 Afiliados)																							$4,600,000	$1,196,000			$4,600,000	$575,000			$4,600,000	$184,000			$4,600,000		$24,100		$4,600,000	$230,000		$2,209,100
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																							$4,600,000	$1,196,000			$4,600,000	$575,000			$4,600,000	$184,000			$4,600,000		$24,100		$4,600,000	$230,000		$2,209,100
19	CC	1122811442	FONSECA SOLANO DORIKA ANDREA																		23030 1	30	$4,600,000	$1,196,000	EPS005	30	$4,600,000	$575,000	CCF22	30	$4,600,000	$184,000	14-11	30	$4,600,000	0.522%	$24,100	30	$4,600,000	$230,000	No	$2,209,100
Total Afiliados(19)																							$43,946,467	$8,091,700			$43,946,467	$5,493,800			$43,946,467	$1,758,300			$43,946,467		$2,762,900		$43,946,467	$2,198,400		$20,305,100

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901707176	1	CONSORCIO AQUA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 16 106 65 AP 403 ED ROCALLA	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3016193827	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1374584253	9483485452	E	2025/03/19	2025/03/31	BANCOLOMBIA	12	$20,458,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				19	$8,091,700	$61,100	$0	$8,152,800
COLFONDOS	23100l	800,227,940	6	2	$547,800	$4,200	$0	$552,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,663,700	$12,600	$0	$1,676,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$3,847,400	$29,000	$0	$3,876,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$2,032,800	$15,300	$0	$2,048,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$2,762,900	$20,800	$0	$2,783,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	19	$2,762,900	$20,800	$0	$2,783,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$1,758,300	$13,300	$0	$1,771,600
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	19	$1,758,300	$13,300	$0	$1,771,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				19	$5,493,800	$41,500	$0	$5,535,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	$838,200	$6,300	$0	$844,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$1,233,400	$9,300	$0	$1,242,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$581,000	$4,400	$0	$585,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$1,106,000	$8,400	$0	$1,114,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$1,735,200	$13,100	$0	$1,748,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$1,319,100	$10,000	$0	$1,329,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	19	$1,319,100	$10,000	$0	$1,329,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$879,300	$6,700	$0	$886,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	19	$879,300	$6,700	$0	$886,000
TOTAL				19	$20,305,100	$153,400	$0	$20,458,500

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901707176	1	CONSORCIO AQUA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 16 106 65 AP 403 ED ROCALLA	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3016193827	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1374584253	9483485452	E	2025/03/19	2025/03/31	BANCOLOMBIA	12	$20,458,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (18 Afiliados)																							$39,346,467	$6,895,700			$39,346,467	$4,918,800			$39,346,467	$1,574,300			$39,346,467		$2,738,800		$39,346,467	$1,968,400		$18,096,000
Centro de Trabajo: Principal (18 Afiliados)																							$39,346,467	$6,895,700			$39,346,467	$4,918,800			$39,346,467	$1,574,300			$39,346,467		$2,738,800		$39,346,467	$1,968,400		$18,096,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (18 Afiliados)																							$39,346,467	$6,895,700			$39,346,467	$4,918,800			$39,346,467	$1,574,300			$39,346,467		$2,738,800		$39,346,467	$1,968,400		$18,096,000
1	CC	1124191506	ACOSTA CHITIVA DERLY JASBREIDY	X																	23020 1	30	$3,000,000	$480,000	EPS003	30	$3,000,000	$375,000	CCF22	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	30	$3,000,000	$150,000	No	$1,333,800
2	CC	1057710095	ACOSTA NEIRA JUAN CAMILO																		23020 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS008	30	$2,000,000	$250,000	CCF22	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$2,000,000	$100,000	No	$889,200
3	CC	66683378	ARANGO SOTELO LUZ KARIHE																		23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$250,000	CCF22	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$2,000,000	$100,000	No	$889,200
4	CC	73188644	ARRIETA LOZANO JUAN JOSE																		25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS010	30	$2,000,000	$250,000	CCF22	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$2,000,000	$100,000	No	$889,200
5	CC	1072647805	CALDERON NEIRA ANDRES FELIPE																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$1,423,500	$71,300	No	$633,200
6	CC	1115941360	CAMPAZ OSPINA JESUS ANDRES																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$178,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$1,423,500	$71,300	No	$633,200
7	CC	1014194404	CANO SIERRA BRAYAN FELIPE																		23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$1,423,500	$71,300	No	$633,200
8	CC	73577753	CORREA MARIMON RICARDO																		23030 1	30	$4,000,000	$1,040,000	EPS002	30	$4,000,000	$500,000	CCF22	30	$4,000,000	$160,000	14-11	30	$4,000,000	6.960%	$278,400	30	$4,000,000	$200,000	No	$2,178,400
9	CC	9149350	DRIAZA GUERRA KRISTIAN MAURICIO																		25-14	30	$2,000,000	$520,000	EPS010	30	$2,000,000	$250,000	CCF22	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$2,000,000	$100,000	No	$1,089,200
10	CC	80450450	GARAY QUEVEDO JAVIER MAURICIO																		23100 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$178,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$1,423,500	$71,300	No	$633,200
11	CC	1020752041	GONZALEZ CASTELBLANCO ANDRES FELIPE																		23100 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS008	30	$2,000,000	$250,000	CCF22	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$2,000,000	$100,000	No	$889,200
12	CC	75072691	JIMENEZ MAURICIO																		23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS010	30	$2,000,000	$250,000	CCF22	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$2,000,000	$100,000	No	$889,200
13	CC	40331681	MARROQUIN MURCIA ANELEY	X																	23020 1	27	$1,281,150	$205,000	EPS005	27	$1,281,150	$160,200	CCF22	27	$1,281,150	$51,300	14-11	27	$1,281,150	6.960%	$89,200	27	$1,281,150	$64,200	No	$569,900
14	CC	13478040	NOSSA CABANZO CARLOS AUGUSTO	X																	25-14	29	$3,866,667	$618,700	EPS010	29	$3,866,667	$483,400	CCF22	29	$3,866,667	$154,700	14-11	29	$3,866,667	6.960%	$269,200	29	$3,866,667	$193,500	No	$1,719,500
15	CC	1022394213	PINZON GONZALEZ JEAN PAUL																		23030 1	30	$1,800,000	$288,000	EPS017	30	$1,800,000	$225,000	CCF22	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	6.960%	$125,300	30	$1,800,000	$90,000	No	$800,300
16	CC	1066188494	RIVERO VASQUEZ MANUEL ANTONIO																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$178,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$1,423,500	$71,300	No	$633,200
17	CC	1006220408	TORRES PLAZAS ERIKA JULIETH	X																	25-14	27	$1,281,150	$205,000	EPS008	27	$1,281,150	$160,200	CCF22	27	$1,281,150	$51,300	14-11	27	$1,281,150	6.960%	$89,200	27	$1,281,150	$64,200	No	$569,900
18	CC	72000831	VELASQUEZ LEAL EPIFANIO																		23020 1	30	$5,000,000	$800,000	EPS005	30	$5,000,000	$625,000	CCF22	30	$5,000,000	$200,000	14-11	30	$5,000,000	6.960%	$348,000	30	$5,000,000	$250,000	No	$2,223,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMINISTRATIVA (1 Afiliados)																							$4,600,000	$1,196,000			$4,600,000	$575,000			$4,600,000	$184,000			$4,600,000		$24,100		$4,600,000	$230,000		$2,209,100
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVA (1 Afiliados)																							$4,600,000	$1,196,000			$4,600,000	$575,000			$4,600,000	$184,000			$4,600,000		$24,100		$4,600,000	$230,000		$2,209,100
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																							$4,600,000	$1,196,000			$4,600,000	$575,000			$4,600,000	$184,000			$4,600,000		$24,100		$4,600,000	$230,000		$2,209,100
19	CC	1122811442	FONSECA SOLANO DORIKA ANDREA																		23030 1	30	$4,600,000	$1,196,000	EPS005	30	$4,600,000	$575,000	CCF22	30	$4,600,000	$184,000	14-11	30	$4,600,000	0.522%	$24,100	30	$4,600,000	$230,000	No	$2,209,100
Total			**Afiliados(19)**																				$43,946,467	$8,091,700			$43,946,467	$5,493,800			$43,946,467	$1,758,300			$43,946,467		$2,762,900		$43,946,467	$2,198,400		$20,305,100

0 314

586 254

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901707176	1	CONSORCIO AQUA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 16 106 65 AP 403 ED ROCALLA	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3016193827	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1374584253	9483485452	E	2025/03/19	2025/03/31	BANCOLOMBIA	12	$20,458,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				19	$8,091,700	$61,100	$0	$8,152,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$547,800	$4,200	$0	$552,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,663,700	$12,600	$0	$1,676,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$3,847,400	$29,000	$0	$3,876,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$2,032,800	$15,300	$0	$2,048,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$2,762,900	$20,800	$0	$2,783,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	19	$2,762,900	$20,800	$0	$2,783,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$1,758,300	$13,300	$0	$1,771,600
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	19	$1,758,300	$13,300	$0	$1,771,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				19	$5,493,800	$41,500	$0	$5,535,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	$838,200	$6,300	$0	$844,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$1,233,400	$9,300	$0	$1,242,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$581,000	$4,400	$0	$585,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$1,106,000	$8,400	$0	$1,114,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$1,735,200	$13,100	$0	$1,748,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$1,319,100	$10,000	$0	$1,329,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	19	$1,319,100	$10,000	$0	$1,329,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$879,300	$6,700	$0	$886,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	19	$879,300	$6,700	$0	$886,000
TOTAL				19	$20,305,100	$153,400	$0	$20,458,500

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901707176	1	CONSORCIO AQUA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 16 106 65 AP 403 ED ROCALLA	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3016193827	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1485756996	9486061932	E	2025/05/20	2025/05/16	BANCOLOMBIA	0	$19,224,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

						SALARIO			PENSION															SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	frl	Fecha Inicio frl	Fecha Fin frl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				$6,507,000						$4,615,000	
																				$6,507,000						$4,615,000	
						$3,000,000	No	Fijo	PROTECCION	30	$3,000,000	16%	SIN RIESGO	$480,000	$0	$0	$0	$0	$0	$480,000		SANITAS	30	$3,000,000	12.5%	$375,000	
						$2,000,000	No	Fijo	PROTECCION	30	$2,000,000	16%	SIN RIESGO	$320,000	$0	$0	$0	$0	$0	$320,000		COMPENSAR	30	$2,000,000	12.5%	$250,000	
						$2,000,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$2,000,000	16%	SIN RIESGO	$320,000	$0	$0	$0	$0	$0	$320,000		SALUD TOTAL	30	$2,000,000	12.5%	$250,000	
						$2,000,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$2,000,000	16%	SIN RIESGO	$320,000	$0	$0	$0	$0	$0	$320,000		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	$2,000,000	12.5%	$250,000	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		FAMISANAR	30	$1,423,500	12.5%	$178,000	
						$1,423,500	No	Fijo	PROTECCION	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		SALUD TOTAL	30	$1,423,500	12.5%	$178,000	
						$4,000,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$4,000,000	26%	ALTO RIESGO	$1,040,000	$0	$0	$0	$0	$0	$1,040,000		SALUD TOTAL	30	$4,000,000	12.5%	$500,000	
						$2,000,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$2,000,000	26%	ALTO RIESGO	$520,000	$0	$0	$0	$0	$0	$520,000		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	$2,000,000	12.5%	$250,000	
						$1,423,500	No	Fijo	COLFONDOS	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		FAMISANAR	30	$1,423,500	12.5%	$178,000	
						$2,000,000	No	Fijo	COLFONDOS	30	$2,000,000	16%	SIN RIESGO	$320,000	$0	$0	$0	$0	$0	$320,000		COMPENSAR	30	$2,000,000	12.5%	$250,000	
						$2,000,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$2,000,000	16%	SIN RIESGO	$320,000	$0	$0	$0	$0	$0	$320,000		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	$2,000,000	12.5%	$250,000	
						$1,423,500	No	Fijo	PROTECCION	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		SANITAS	30	$1,423,500	12.5%	$178,000	
						$4,000,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$4,000,000	16%	SIN RIESGO	$640,000	$0	$0	$0	$0	$0	$640,000		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	$4,000,000	12.5%	$500,000	
						$1,800,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,800,000	16%	SIN RIESGO	$288,000	$0	$0	$0	$0	$0	$288,000		FAMISANAR	30	$1,800,000	12.5%	$225,000	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		COMPENSAR	30	$1,423,500	12.5%	$178,000	
						$5,000,000	No	Fijo	PROTECCION	30	$5,000,000	16%	SIN RIESGO	$800,000	$0	$0	$0	$0	$0	$800,000		SANITAS	30	$5,000,000	12.5%	$625,000	
						SALARIO			PENSION															SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	frl	Fecha Inicio frl	Fecha Fin frl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				$1,196,000						$575,000	
																				$1,196,000						$575,000	
						$4,600,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$4,600,000	26%	ALTO RIESGO	$1,196,000	$0	$0	$0	$0	$0	$1,196,000		SANITAS	30	$4,600,000	12.5%	$575,000	
																				$7,703,000						$5,190,000	

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$4,615,000						$1,477,000						$2,569,600				$738,500		$1,108,000		$0		$0	
	$4,615,000						$1,477,000						$2,569,600				$738,500		$1,108,000		$0		$0	
$0	$375,000		COLSUBSIDIO	30	$3,000,000	4%	$120,000	ARL SURA	30	$3,000,000	6.96%	5	$208,800	30	$3,000,000	2%	$60,000	3%	$90,000	0%	$0	0%	$0	No
$0	$250,000		COLSUBSIDIO	30	$2,000,000	4%	$80,000	ARL SURA	30	$2,000,000	6.96%	5	$139,200	30	$2,000,000	2%	$40,000	3%	$60,000	0%	$0	0%	$0	No
$0	$250,000		COLSUBSIDIO	30	$2,000,000	4%	$80,000	ARL SURA	30	$2,000,000	6.96%	5	$139,200	30	$2,000,000	2%	$40,000	3%	$60,000	0%	$0	0%	$0	No
$0	$250,000		COLSUBSIDIO	30	$2,000,000	4%	$80,000	ARL SURA	30	$2,000,000	6.96%	5	$139,200	30	$2,000,000	2%	$40,000	3%	$60,000	0%	$0	0%	$0	No
$0	$178,000		COLSUBSIDIO	30	$1,423,500	4%	$57,000	ARL SURA	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$1,423,500	2%	$28,500	3%	$42,800	0%	$0	0%	$0	No
$0	$178,000		COLSUBSIDIO	30	$1,423,500	4%	$57,000	ARL SURA	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$1,423,500	2%	$28,500	3%	$42,800	0%	$0	0%	$0	No
$0	$500,000		COLSUBSIDIO	30	$4,000,000	4%	$160,000	ARL SURA	30	$4,000,000	6.96%	5	$278,400	30	$4,000,000	2%	$80,000	3%	$120,000	0%	$0	0%	$0	No
$0	$250,000		COLSUBSIDIO	30	$2,000,000	4%	$80,000	ARL SURA	30	$2,000,000	6.96%	5	$139,200	30	$2,000,000	2%	$40,000	3%	$60,000	0%	$0	0%	$0	No
$0	$178,000		COLSUBSIDIO	30	$1,423,500	4%	$57,000	ARL SURA	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$1,423,500	2%	$28,500	3%	$42,800	0%	$0	0%	$0	No
$0	$250,000		COLSUBSIDIO	30	$2,000,000	4%	$80,000	ARL SURA	30	$2,000,000	6.96%	5	$139,200	30	$2,000,000	2%	$40,000	3%	$60,000	0%	$0	0%	$0	No
$0	$250,000		COLSUBSIDIO	30	$2,000,000	4%	$80,000	ARL SURA	30	$2,000,000	6.96%	5	$139,200	30	$2,000,000	2%	$40,000	3%	$60,000	0%	$0	0%	$0	No
$0	$178,000		COLSUBSIDIO	30	$1,423,500	4%	$57,000	ARL SURA	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$1,423,500	2%	$28,500	3%	$42,800	0%	$0	0%	$0	No
$0	$500,000		COLSUBSIDIO	30	$4,000,000	4%	$160,000	ARL SURA	30	$4,000,000	6.96%	5	$278,400	30	$4,000,000	2%	$80,000	3%	$120,000	0%	$0	0%	$0	No
$0	$225,000		COLSUBSIDIO	30	$1,800,000	4%	$72,000	ARL SURA	30	$1,800,000	6.96%	5	$125,300	30	$1,800,000	2%	$36,000	3%	$54,000	0%	$0	0%	$0	No
$0	$178,000		COLSUBSIDIO	30	$1,423,500	4%	$57,000	ARL SURA	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$1,423,500	2%	$28,500	3%	$42,800	0%	$0	0%	$0	No
$0	$625,000		COLSUBSIDIO	30	$5,000,000	4%	$200,000	ARL SURA	30	$5,000,000	6.96%	5	$348,000	30	$5,000,000	2%	$100,000	3%	$150,000	0%	$0	0%	$0	No

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$575,000						$184,000						$24,100				$92,000		$138,000		$0		$0	
	$575,000						$184,000						$24,100				$92,000		$138,000		$0		$0	
$0	$575,000		COLSUBSIDIO	30	$4,600,000	4%	$184,000	ARL SURA	30	$4,600,000	0.522%	1	$24,100	30	$4,600,000	2%	$92,000	3%	$138,000	0%	$0	0%	$0	No
	$5,190,000						$1,661,000						$2,593,700				$830,500		$1,246,000		$0		$0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901707176	1	CONSORCIO AQUA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 16 106 65 AP 403 ED ROCALLA	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3016193827	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1485756996	94866061932	E	2025/05/20	2025/05/16	BANCOLOMBIA	0	$19,224,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				17	$7,703,000	$0	$0	$7,703,000
COLFONDOS	23100I	800,227,940	6	2	$547,800	$0	$0	$547,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,480,000	$0	$0	$1,480,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$3,619,600	$0	$0	$3,619,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$2,055,600	$0	$0	$2,055,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$2,593,700	$0	$0	$2,593,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	17	$2,593,700	$0	$0	$2,593,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$1,661,000	$0	$0	$1,661,000
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	17	$1,661,000	$0	$0	$1,661,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				17	$5,190,000	$0	$0	$5,190,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$678,000	$0	$0	$678,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$1,250,000	$0	$0	$1,250,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$581,000	$0	$0	$581,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$928,000	$0	$0	$928,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$1,753,000	$0	$0	$1,753,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$1,246,000	$0	$0	$1,246,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	17	$1,246,000	$0	$0	$1,246,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$830,500	$0	$0	$830,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	17	$830,500	$0	$0	$830,500
TOTAL				17	$19,224,200	$0	$0	$19,224,200

2025/05/20 03:22 p.m.

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901707176	1	CONSORCIO AQUA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 16 106 65 AP 403 ED ROCALLA	BOGOTÁ-BOGOTA D.E.	3016193827	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1485756996	9486061932	E	2025/05/20	2025/05/16	BANCOLOMBIA		$19,224,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									NOVEDADES																																			
No.	Tipo Id	No Id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	Ing	Fecha Ing	Ret	Fecha Ret	Tde	Tae	Tdp	Tap	Vsp	Fecha Inicio Vsp	Cor	Vst	Sln	Fecha Inicio Sln	Fecha Fin Sln	Ige	Fecha Inicio Ige	Fecha Fin Ige	Lma	Fecha Inicio Lma	Fecha Fin Lma	Vac-lr	Fecha Inicio Vac-lr	Fecha Fin Vac-lr	Avp	Vct
Sucursal: PRINCIPAL (16 Afiliados)																																												
Centro de Trabajo: Principal(16 Afiliados)																																												
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E.(16 Afiliados)																																												
1	CC	1124191506	ACOSTA CHITIVA DERLY JASBREIDY	Dependiente	0	No	No																																						
2	CC	1057710095	ACOSTA NEIRA JUAN CAMILO	Dependiente	0	No	No																																						
3	CC	66683378	ARANGO SOTELO LUZ KARINE	Dependiente	0	No	No																																						
4	CC	73188644	ARRIETA LOZANO JUAN JOSE	Dependiente	0	No	No																																						
5	CC	1115941360	CAMPAZ OSPINA JESUS ANDRES	Dependiente	0	No	No																																						
6	CC	1014194404	CANO SIERRA BRAYAN FELIPE	Dependiente	0	No	No																																						
7	CC	73577753	CORREA MARMON RICARDO	Dependiente	0	No	No																																						
8	CC	9149350	DRIAZA GUERRA CRISTIAN MAURICIO	Dependiente	0	No	No																																						
9	CC	80450450	GARAY QUEVEDO JAVIER MAURICIO	Dependiente	0	No	No																																						
10	CC	1020752041	GONZALEZ CASTELBLANCO ANDRES FELIPE	Dependiente	0	No	No																																						
11	CC	75072691	JIMENEZ MAURICIO	Dependiente	0	No	No																																						
12	CC	40331681	MARROQUIN MURCIA ANELEY	Dependiente	0	No	No																																						
13	CC	13478040	HOSSA CABANZO CARLOS AUGUSTO	Dependiente	0	No	No																																						
14	CC	1022394213	PINZON GONZALEZ JEAN PAUL	Dependiente	0	No	No																																						
15	CC	1066188494	RIVERO VASQUEZ MANUEL ANTONIO	Dependiente	0	No	No																																						
16	CC	72000831	VELASQUEZ LEAL EPIFANIO	Dependiente	0	No	No																																						

EMPLEADO									NOVEDADES																																				
No.	Tipo Id	No Id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	Ing	Fecha Ing	Ret	Fecha Ret	Tde	Tae	Tdp	Tap	Vsp	Fecha Inicio Vsp	Cor	Vst	Sln	Fecha Inicio Sln	Fecha Fin Sln	Ige	Fecha Inicio Ige	Fecha Fin Ige	Lma	Fecha Inicio Lma	Fecha Fin Lma	Vac-lr	Fecha Inicio Vac-lr	Fecha Fin Vac-lr	Avp	Vct
Sucursal: ADMINISTRATIVA (1 Afiliados)																																												
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVA(1 Afiliados)																																												
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E.(1 Afiliados)																																												
17	CC	1122811442	FONSECA SOLANO DORIKA ANDREA	Dependiente	0	No	No																																						
Total		**Afiliados(17)**																																										

2025/06/10 09:57 a. m.

360

						SALARIO			PENSION														SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	Irl	Fecha Inicio Irl	Fecha Fin Irl	Vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				$6,507,000						$4,615,000	
																				$6,507,000						$4,615,000	
																				$6,507,000						$4,615,000	
						$3,000,000	No	Fijo	PROTECCION	30	$3,000,000	16%	SIN RIESGO	$480,000	$0	$0	$0	$0	$0	$480,000		SANITAS	30	$3,000,000	12.5%	$375,000	
						$2,000,000	No	Fijo	PROTECCION	30	$2,000,000	16%	SIN RIESGO	$320,000	$0	$0	$0	$0	$0	$320,000		COMPENSAR	30	$2,000,000	12.5%	$250,000	
						$2,000,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$2,000,000	16%	SIN RIESGO	$320,000	$0	$0	$0	$0	$0	$320,000		SALUD TOTAL	30	$2,000,000	12.5%	$250,000	
						$2,000,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$2,000,000	16%	SIN RIESGO	$320,000	$0	$0	$0	$0	$0	$320,000		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	$2,000,000	12.5%	$250,000	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		FAMISANAR	30	$1,423,500	12.5%	$178,000	
						$1,423,500	No	Fijo	PROTECCION	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		SALUD TOTAL	30	$1,423,500	12.5%	$178,000	
						$4,000,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$4,000,000	26%	ALTO RIESGO	$1,040,000	$0	$0	$0	$0	$0	$1,040,000		SALUD TOTAL	30	$4,000,000	12.5%	$500,000	
						$2,000,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$2,000,000	26%	ALTO RIESGO	$520,000	$0	$0	$0	$0	$0	$520,000		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	$2,000,000	12.5%	$250,000	
						$1,423,500	No	Fijo	COLFONDOS	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		FAMISANAR	30	$1,423,500	12.5%	$178,000	
						$2,000,000	No	Fijo	COLFONDOS	30	$2,000,000	16%	SIN RIESGO	$320,000	$0	$0	$0	$0	$0	$320,000		COMPENSAR	30	$2,000,000	12.5%	$250,000	
						$2,000,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$2,000,000	16%	SIN RIESGO	$320,000	$0	$0	$0	$0	$0	$320,000		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	$2,000,000	12.5%	$250,000	
						$1,423,500	No	Fijo	PROTECCION	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		SANITAS	30	$1,423,500	12.5%	$178,000	
						$4,000,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$4,000,000	16%	SIN RIESGO	$640,000	$0	$0	$0	$0	$0	$640,000		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	$4,000,000	12.5%	$500,000	
						$1,800,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,800,000	16%	SIN RIESGO	$288,000	$0	$0	$0	$0	$0	$288,000		FAMISANAR	30	$1,800,000	12.5%	$225,000	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		COMPENSAR	30	$1,423,500	12.5%	$178,000	
						$5,000,000	No	Fijo	PROTECCION	30	$5,000,000	16%	SIN RIESGO	$800,000	$0	$0	$0	$0	$0	$800,000		SANITAS	30	$5,000,000	12.5%	$625,000	
						SALARIO			PENSION														SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	Irl	Fecha Inicio Irl	Fecha Fin Irl	Vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				$1,196,000						$575,000	
																				$1,196,000						$575,000	
																				$1,196,000						$575,000	
						$4,600,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$4,600,000	26%	ALTO RIESGO	$1,196,000	$0	$0	$0	$0	$0	$1,196,000		SANITAS	30	$4,600,000	12.5%	$575,000	
																				$7,703,000						$5,190,000	

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$4,615,000						$1,477,000						$2,569,600				$738,500		$1,108,000		$0		$0	
	$4,615,000						$1,477,000						$2,569,600				$738,500		$1,108,000		$0		$0	
$0	$375,000		COLSUBSIDIO	30	$3,000,000	4%	$120,000	ARL SURA	30	$3,000,000	6.96%	5	$208,800	30	$3,000,000	2%	$60,000	3%	$90,000	0%	$0	0%	$0	No
$0	$250,000		COLSUBSIDIO	30	$2,000,000	4%	$80,000	ARL SURA	30	$2,000,000	6.96%	5	$139,200	30	$2,000,000	2%	$40,000	3%	$60,000	0%	$0	0%	$0	No
$0	$250,000		COLSUBSIDIO	30	$2,000,000	4%	$80,000	ARL SURA	30	$2,000,000	6.96%	5	$139,200	30	$2,000,000	2%	$40,000	3%	$60,000	0%	$0	0%	$0	No
$0	$250,000		COLSUBSIDIO	30	$2,000,000	4%	$80,000	ARL SURA	30	$2,000,000	6.96%	5	$139,200	30	$2,000,000	2%	$40,000	3%	$60,000	0%	$0	0%	$0	No
$0	$178,000		COLSUBSIDIO	30	$1,423,500	4%	$57,000	ARL SURA	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$1,423,500	2%	$28,500	3%	$42,800	0%	$0	0%	$0	No
$0	$178,000		COLSUBSIDIO	30	$1,423,500	4%	$57,000	ARL SURA	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$1,423,500	2%	$28,500	3%	$42,800	0%	$0	0%	$0	No
$0	$500,000		COLSUBSIDIO	30	$4,000,000	4%	$160,000	ARL SURA	30	$4,000,000	6.96%	5	$278,400	30	$4,000,000	2%	$80,000	3%	$120,000	0%	$0	0%	$0	No
$0	$250,000		COLSUBSIDIO	30	$2,000,000	4%	$80,000	ARL SURA	30	$2,000,000	6.96%	5	$139,200	30	$2,000,000	2%	$40,000	3%	$60,000	0%	$0	0%	$0	No
$0	$178,000		COLSUBSIDIO	30	$1,423,500	4%	$57,000	ARL SURA	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$1,423,500	2%	$28,500	3%	$42,800	0%	$0	0%	$0	No
$0	$250,000		COLSUBSIDIO	30	$2,000,000	4%	$80,000	ARL SURA	30	$2,000,000	6.96%	5	$139,200	30	$2,000,000	2%	$40,000	3%	$60,000	0%	$0	0%	$0	No
$0	$250,000		COLSUBSIDIO	30	$2,000,000	4%	$80,000	ARL SURA	30	$2,000,000	6.96%	5	$139,200	30	$2,000,000	2%	$40,000	3%	$60,000	0%	$0	0%	$0	No
$0	$178,000		COLSUBSIDIO	30	$1,423,500	4%	$57,000	ARL SURA	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$1,423,500	2%	$28,500	3%	$42,800	0%	$0	0%	$0	No
$0	$500,000		COLSUBSIDIO	30	$4,000,000	4%	$160,000	ARL SURA	30	$4,000,000	6.96%	5	$278,400	30	$4,000,000	2%	$80,000	3%	$120,000	0%	$0	0%	$0	No
$0	$225,000		COLSUBSIDIO	30	$1,800,000	4%	$72,000	ARL SURA	30	$1,800,000	6.96%	5	$125,300	30	$1,800,000	2%	$36,000	3%	$54,000	0%	$0	0%	$0	No
$0	$178,000		COLSUBSIDIO	30	$1,423,500	4%	$57,000	ARL SURA	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$1,423,500	2%	$28,500	3%	$42,800	0%	$0	0%	$0	No
$0	$625,000		COLSUBSIDIO	30	$5,000,000	4%	$200,000	ARL SURA	30	$5,000,000	6.96%	5	$348,000	30	$5,000,000	2%	$100,000	3%	$150,000	0%	$0	0%	$0	No

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$575,000						$184,000						$24,100				$92,000		$138,000		$0		$0	
	$575,000						$184,000						$24,100				$92,000		$138,000		$0		$0	
$0	$575,000		COLSUBSIDIO	30	$4,600,000	4%	$184,000	ARL SURA	30	$4,600,000	0.522%	1	$24,100	30	$4,600,000	2%	$92,000	3%	$138,000	0%	$0	0%	$0	No
	$5,190,000						$1,661,000						$2,593,700				$830,500		$1,246,000		$0		$0	

2025/06/10 09:57 a. m.

362

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901707176	1	CONSORCIO AQUA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 16 106 65 AP 403 ED ROCALLA	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3016193827	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1485756996	9486061932	E	2025/05/20	2025/05/16	BANCOLOMBIA	0	$19,224,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				17	$7,703,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$547,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,480,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$3,619,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$2,055,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$2,593,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	17	$2,593,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$1,661,000
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	17	$1,661,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				17	$5,190,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$678,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$1,250,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$581,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$928,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$1,753,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$1,246,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	17	$1,246,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$830,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	17	$830,500
TOTAL				17	$19,224,200

263

CONSORCIO AQUA

FORMATO 6
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

ZACARIAS MORELO RODRIGUEZ identificado con cedula de ciudadanía No. 7921464 y con tarjeta profesional No. 124569-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de revisor fiscal de **INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA S.A.S**, identificada con NIT 830.031.937 1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción *(artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983),* pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Los empleados, contratistas e independientes adscritos al contrato 112-2023 contrato con la empresa de servicios públicos del Municipio de Cota EMSERCOTA S.A E.S.P se encuentran al día con los pagos correspondientes a la seguridad social.

Conforme con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Bogotá, a los 31 días del mes de marzo de 2025.

ZACARIAS MORELO RODRIGUEZ
Revisor fiscal
C.C. 7921464
T.P 124569-T

0 316

542

CONSORCIO AQUA



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradeceremos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

0 317

765

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1 7 2 7 4 7 C 9 4 F A D E 6 3 B

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ZACARIAS MORELO RODRIGUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7921464 de CARTAGENA (BOLIVAR) Y Tarjeta Profesional No 124569-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Febrero de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

0 318

366

CONSORCIO AQUA

FORMATO 6
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

HEIMER JOSE SAN MARTIN CONRADO identificado con cedula de ciudadanía No. 7.572.200 y con tarjeta profesional No.142883-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de revisor fiscal de **CONSTRUMAS DE LA COSTA S.A.S.**, identificada con NIT 900843927-4, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Valledupar, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción *(artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983),* pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Los empleados, contratistas e independientes adscritos al contrato 112-2023 contrato con la empresa de servicios públicos del Municipio de Cota EMSERCOTA S.A E.S.P se encuentran al día con los pagos correspondientes a la seguridad social.

Conforme con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Bogotá, a los 31 días del mes de marzo de 2025.

HEIMER JOSE SAN MARTIN CONRADO
Revisor fiscal
C.C. . 7.572.200
T.P 142883-T

0 319

SS 367

CONSORCIO AQUA





0 320

760

546

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3 0 F 2 7 8 2 6 5 F C F 0 1 5 F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **HEIMER JOSE SAN MARTIN CONRADO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7572200 de VALLEDUPAR (CESAR) Y Tarjeta Profesional No 142883-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 31 días del mes de Marzo de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

0 321

369

SH

CONSORCIO AQUA

FORMATO 6
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

YURIBIA SOLANO LORDUY identificada con cedula de ciudadanía No. 45.531.738 y con tarjeta profesional No.184762 -T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de revisor fiscal de **CONSTRUCCIONES Y OBRAS CIVILES DE LA COSTA S.A.S.**, identificada con NIT 900442782-2, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Cartagena, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción *(artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983),* pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Los empleados, contratistas e independientes adscritos al contrato 112-2023 contrato con la empresa de servicios públicos del Municipio de Cota EMSERCOTA S.A E.S.P se encuentran al día con los pagos correspondientes a la seguridad social.

Conforme con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Bogotá, a los 31 días del mes de marzo de 2025.

YURIBIA SOLANO LORDUY
Revisor fiscal
C.C. 45.531.738
T.P 184762 -T

0 322

CONSORCIO AQUA

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

184762-T



YURIBIA
SOLANO LORDUY
C.C. 45531738
RESOLUCION INSCRIPCION 848 FECHA 23/12/2013
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 190434

185161

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX 648 46 00 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 94 No. 9A - 31 Bogotá D.C.

0 323

Sp 321

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0 7 6 9 E 6 F E 4 A E 4 9 7 8 1

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **YURIBIA SOLANO LORDUY** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 45531738 de CARTAGENA (BOLIVAR) Y Tarjeta Profesional No 184762-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 31 días del mes de Marzo de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

0 324

SBO 272

VERIFICA TU POLIZA AQUÍ

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL

nacional de seguros

NIT.: 860.002.527-9
www.nacionaldeseguros.com.co

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	BOGOTÁ, D.C.	DIRECCIÓN GENERAL	CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
		TELÉFONO	(601) 7463219

REFERENCIA	SUCURSAL		CÓD. SUCURSAL	CÓD.PUNTO DE VENTA		RAMO	No. PÓLIZA	ANEXO
178094	BOGOTA		11			30	400048525	7
FECHA EXPEDICIÓN	**VIGENCIA DESDE**	**A LAS**	**VIGENCIA HASTA**	**A LAS**	**TIPO DE MOVIMIENTO**			**HOJA**
Día - Mes - Año	Día - Mes - Año	Horas	Día - Mes - Año	Horas				
17 / 12 / 2024	14 / 11 / 2024	00:00	28 / 12 / 2030	00:00	MODIFICACIÓN			1

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE	CONSORCIO AQUA.	NIT	901.707.176 - 1
DIRECCIÓN	CR 16 # 106-65 AP 403 ED ROCALLA, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3165339306

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE	CONSORCIO AQUA.	NIT	901.707.176 - 1
DIRECCIÓN	CR 16 # 106-65 AP 403 ED ROCALLA, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3165339306

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	EMSERCOTA S.A. E.S.P.	NIT	900.124.654 - 4	TELÉFONO	3192930
BENEFICIARIO	EMSERCOTA S.A. E.S.P.	NIT	900.124.654 - 4	TELÉFONO	3192930

OBJETO DEL SEGURO

ANEXO 7:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE CONFORMIDAD CON OTROSÍ MODIFICATORIO Y PRORROGA N. 2 AL CONTRATO 112 DEL 28 DE ABRIL DE 2023 DE FECHA DE FIRMA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 SE PRORROGAN LAS VIGENCIAS DE LA POLIZA ARRIBA CITADA POR EL TERMINO DE 12 MESES

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS PERMANENCE VIGENTES

PO DE OBLIGACIÓN: CUMP-CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	14/11/2024	28/06/2026	9.404.582.837,46	28.213.749,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	14/11/2024	28/12/2028	4.702.291.418,73	14.145.523,00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	14/11/2024	28/06/2026	9.404.582.837,46	28.213.749,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	28/12/2025	28/12/2030	7.053.437.128,10	0,00
CALIDAD DE LOS ESTUDIOS	28/12/2025	28/12/2030	84.641.245,54	0,00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA	GASTOS	IVA	TOTAL A PAGAR	FECHA LÍMITE DE PAGO	No DOCUMENTO PARA PAGO
$ 70.573.021,00	$ 0,00	$ 13.408.873,99	$ 83.981.894,99	Día - Mes - Año 18/12/2024	901707176

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR ASEGURADO EN LETRAS
$ 30.649.535.467,29	TREINTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESO

INTERMEDIARIO			COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	%	NOMBRE COMPAÑÍA	%	VALOR ASEGURADO
STRATEGY SEGUROS LTDA	40175	100,00			

FIRMA AUTORIZADA
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511
TARIFA ICA 11.04/1000

FIRMA TOMADOR

Nacional de Seguros S.A.
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO
COMORA
01/09/2022|13-7|NT-PI05|NT-CUMP-ESTATAL5|D001 01/04/2020|13-7|PI05|CL-CUMP-ESTATAL4|D001

0 325

No. PÓLIZA	ANEXO	SUCURSAL	FECHA SOLICITUD	CIUDAD DE EXPEDICIÓN
400048525	7	BOGOTA	17 /12 /2024	BOGOTÁ, D.C.

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	TIPO DE MOVIMIENTO	DIRECCIÓN GENERAL	CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
00:00 Horas del 14 /11 /2024	00:00 Horas del 28 /12 /2030	MODIFICACIÓN	TELÉFONO	7463219

TOMADOR	CONSORCIO AQUA.	NIT	901.707.176 - 1
DIRECCIÓN	CR 16 # 106-65 AP 403 ED ROCALLA, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3165339306
ASEGURADO	EMSERCOTA S.A. E.S.P.	NIT	900.124.654 - 4
DIRECCIÓN	SIN DIRECCION CONDOR, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3192930
BENEFICIARIO	EMSERCOTA S.A. E.S.P.	NIT	900.124.654 - 4
DIRECCIÓN	SIN DIRECCION CONDOR, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3192930

ANEXO 6:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SEGÚN PRORROGA NO. 01 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE 2023 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. CTO-112-2023 LAS PARTES ACUERDAN:
* SE PRORROGA LA VIGENCIA HASTA EL 28 DE DICIEMBRE DE 2024.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO SE MODIFICAN.

ANEXO 5:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SEGUN ACTA DE REINICIO NO. 001 DE FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2023, LAS PARTES ACUERDAN REANUDAR EL CONTRATO A PARTIR DEL 06 DE OCTUBRE DE 2023, QUEDANDO COMO NUEVA FECHA DE TERMINACION EL 26 DE MARZO DE 2024. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO SE MODIFICAN.

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SEGUN ACTA DE AMPLIACION NO. 1 SUSPENSION NO. 1 DE FECHA 07 SEPTIEMBRE DE 2023, LAS PARTES ACUERDAN SUSPENDER EL CONTRATO HASTA EL 06 DE OCTUBRE DE 2023. LOS DEMAS TEMINOS Y CONDICIONES NO SE MODIFICAN.

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SEGUN ACTA DE SUSPENSION NO. 001 DE FECHA 24 JULIO DE 2023, LAS PARTES ACUERDAN SUSPENDER EL CONTRATO HASTA EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023. LOS DEMAS TEMINOS Y CONDICIONES NO SE MODIFICAN.

ANEXO 4:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SEGUN OTROSI NO. 01 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2023, SE AJUSTA EL VALOR ASEGURADADO PARA EL AMPARO DE CALIDAD DE LA REVISION CORRESPONDE AL 20% DEL VALOR DE LA FASE 1 CORRESPONDE A $ 419.170.896. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO SE MODIFICAN.

IEXO 3:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 26 JUNIO 2023 SE PROCEDE A TRASLADAR LAS VIGENCIAS. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO SE MODIFICAN.

ANEXO 2:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 26 JUNIO 2023 SE PROCEDE A TRASLADAR LAS VIGENCIAS. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO SE MODIFICAN.

ANEXO 1:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA EL VALOR ASEGURADO PARA EL AMPARO DE CALIDAD DE LOS ESTUDIOS POR EL 20% DEL VALOR DEL CONTRATO. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO SE MODIFICAN.

OBJETO DE LA POLIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO. 112-2023 CUYO OBJETO ES REFERENTE A LA CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADOS PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA.

CONSORCIO AQUA CONFORMADO POR:
- INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA S.A.S. NIT: 830031937-1 20%
- CONSTRUCCIONES Y OBRAS CIVILES DE LA COSTA S.A.S. NIT: 900442782-2 70%
- CONSTRUMAS DE LA COSTA S.A.S. NIT: 900843927-4 10%

ASEGURADO-BENEFICIARIO: EMSERCOTA S.A. E.S.P identificada con NIT 900.124.654-4 y Municipio de Cota NIT 899999705-3

********** **FIN PÓLIZA** **********

0 326

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS

ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES DETALLADOS EN EL SIGUIENTE CUADRO.

VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL :	$	83.981.895,00
VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA :	$	0
FORMA DE PAGO CONVENIDA :		CONTADO 30 DÍAS

PLAN DE PAGOS

FECHA DE PAGO	VALOR DE LA PRIMA SEGÚN CONVENIO
18/12/2024	$ 83.981.894,99

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA TREINTA DÍAS (30) CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN DICIEMBRE 17 DE 2024

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

CERTIFICA

Que la garantía de cumplimiento contenida en la póliza No. 400048525, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del tomador o de la compañía.

Tomador : CONSORCIO AQUA.
NIT : 901.707.176 - 1
Asegurado : EMSERCOTA S.A. E.S.P.
NIT : 900.124.654 - 4

Se expide la presente certificación a los 17 días del mes de Diciembre de 2024.

Cordialmente,

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

0 328

574 276

VERIFICA TU POLIZA AQUÍ

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

nacional de seguros

NIT.: 860.002.527-9
www.nacionaldeseguros.com.co

CIUDAD DE EXPEDICIÓN: BOGOTÁ, D.C.
DIRECCIÓN GENERAL: CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO: (601) 7463219

REFERENCIA	SUCURSAL		CÓD. SUCURSAL	CÓD.PUNTO DE VENTA	RAMO	No. PÓLIZA	ANEXO
178090	BOGOTA		11		15	400048527	6
FECHA EXPEDICIÓN	**VIGENCIA DESDE**	**A LAS Horas**	**VIGENCIA HASTA**	**A LAS**	**TIPO DE MOVIMIENTO**		**HOJA**
Día - Mes - Año	Día - Mes - Año		Día - Mes - Año	Horas			
17 / 12 / 2024	14 / 11 / 2024	00:00	28 / 12 / 2025	00:00	MODIFICACIÓN		1

DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

NOMBRE	CONSORCIO AQUA.	NIT	901.707.176 - 1
DIRECCIÓN	CR 16 # 106-65 AP 403 ED ROCALLA, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3165339306

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	CONSORCIO AQUA.	NIT	901.707.176 - 1	TELÉFONO	3165339306
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	NIT	000.000.000 - 0	TELÉFONO	1000000

AMPAROS	SUBLIMITE POR EVENTO	SUBLIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO	2,351,145,709,37	2,351,145,709,37	2,351,145,709,37	7.053.437,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	352.671.856,40	705,343,712,81	705,343,712,81	0,00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	705,343,712,81	705,343,712,81	705,343,712,81	0,00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	352.671.856,40	705,343,712,81	705,343,712,81	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	352.671.856,40	705,343,712,81	705,343,712,81	0,00

DEDUCIBLES

PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 15.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 10.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 15.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 15.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA

VALOR PRIMA	GASTOS	IVA	TOTAL A PAGAR	FECHA LÍMITE DE PAGO	No DOCUMENTO PARA PAGO
$ 7.053.437,00	$ 0,00	$ 1.340.153,03	$ 8.393.590,03	Día - Mes - Año 29/11/2024	901707176

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR ASEGURADO EN LETRAS
$ 2.351.145.709,37	DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS CON TREINTA Y SIETI

INTERMEDIARIO			COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	%	NOMBRE	% PARTICIPACIÓN	VALOR ASEGURADO
STRATEGY SEGUROS LTDA	40175	100,00			

FIRMA AUTORIZADA
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511
TARIFA ICA 11.04/1000

FIRMA TOMADOR

CANALES DE ATENCIÓN:
Calle 94 # 11-30 Piso 4 / Bogotá D.C.
(601) 746 3219
informacion@nacionaldeseguros.com.co
www.nacionaldeseguros.com.co

Pague en línea en:
www.nacionaldeseguros.com.co

PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO:
Cra. 13 73-34 Ed. Catania. Of: 202 / Bogotá D.C.
(601) 926 0801
3137993800
defensomacionaldeseguros@umoabogados.com

Nacional de Seguros S.A. SUPERINTENDENCIA FINANCIERA COLOMBIA VIGILADO

06/06/2014|13-7|NT-P|06|NT-RC-CUMP*|D00I 13/05/2014|13-7|P|06|CL-RC-PARTICULAR-01|D00I CCMORA

0 329

584

nacional de seguros

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO 7463219

www.nacionaldeseguros.com.co

No. PÓLIZA	ANEXO	SUCURSAL	FECHA SOLICITUD	CIUDAD DE EXPEDICIÓN
400048527	6	BOGOTA	Día - Mes - Año 17 12 2024	BOGOTÁ, D.C.

VIGENCIA DESDE	A LAS	VIGENCIA HASTA	A LAS	TIPO DE MOVIMIENTO
Día - Mes - Año	Horas	Día - Mes - Año	Horas	
14 11 2024	00:00	28 12 2025	00:00	MODIFICACIÓN

DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

NOMBRE	CONSORCIO AQUA.	NIT	901.707.176 - 1
DIRECCIÓN	CR 16 # 106-65 AP 403 ED ROCALLA, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3165339306

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	CONSORCIO AQUA.	NIT	901.707.176 - 1	TELÉFONO	3165339306
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	NIT	000.000.000 - 0	TELÉFONO	1000000

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE CONFORMIDAD CON OTROSÍ MODIFICATORIO Y PRORROGA N. 2 AL CONTRATO 112 DEL 28 DE ABRIL DE 2023 DE FECHA DE FIRMA 14 DE NOVIEMBRE
DEL 2024 SE PRORROGAN LAS VIGENCIAS DE LA POLIZA ARRIBA CITADA POR EL TERMINO DE 12 MESES

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS PERMANENCE VIGENTES

OBJETO DE LA POLIZA:

AMPARAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DEL CONTRATO NO. 112-2023 CUYO OBJETO ES REFERENTE A LA CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADOS PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA.

CONSORCIO AQUA CONFORMADO POR:
- INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA S.A.S. NIT: 830031937-1 20%
- CONSTRUCCIONES Y OBRAS CIVILES DE LA COSTA S.A.S. NIT: 900442782-2 70%
- CONSTRUMAS DE LA COSTA S.A.S. NIT: 900843927-4 10%

ASEGURADO: CONSORCIO AQUA; SE TENDRÁ A LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE COTA EMSERCOTA S.A. E.S.P Y MUNICIPIO DE COTA NIT. 8999999705-3. COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR PARTE DEL CONSORCIO AQUA. EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE COTA EMSERCOTA S.A. E.S.P Y MUNICIPIO DE COTA NIT. 8999999705-3

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS. ADICIONALMENTE, SE TENDRA A LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE COTA EMSERCOTA S.A. E.S.P Y MUNICIPIO DE COTA NIT. 8999999705-3 COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

LA PRESENTE POLIZA CUBRE DENTRO DE LOS LIMITES Y SUBLIMITES ESTABLECIDOS EN LA CARATULA DE LA MISMA, LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES (DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE) Y EXTRAPATRIMONIALES CAUSADOS A TERCEROS CON OCASION DEL CONTRATO DESCRITO EN LA CARATULA. SE ACLARA QUE LOS PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES TALES COMO DAÑOS MORALES, DAÑOS FISIOLÓGICOS O DAÑOS A LA VIDA EN RELACIÓN SE ENCUENTRAN INCLUIDOS, SIEMPRE Y CUANDO HAYA EXISTIDO UN DAÑO FÍSICO CUBIERTO EN LA PÓLIZA.

*RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS. POR EL PRESENTE AMPARO LA ASEGURADORA INDEMNIZARÁ LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL QUE LE SEA IMPUTABLE AL ASEGURADO, POR DAÑOS CAUSADOS POR LOS CONTRATISTAS O SUBCONTRATISTAS EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PARA LAS CUALES FUERON CONTRATADOS. EL PRESENTE AMPARO OPERARÁ EN EXCESO DE LAS PÓLIZAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL QUE CON LOS MISMOS AMPAROS AQUÍ REQUERIDOS TENGAN CONTRATADAS LOS SUBCONTRATISTAS QUE OPEREN AL SERVICIO DEL CONTRATISTA ASEGURADO PRINCIPAL. EN EL EVENTO DE QUE LOS SUBCONTRATISTAS NO TUVIESEN CONTRATADAS DICHAS PÓLIZAS DE SEGURO O DE QUE EL RIESGO NO SE ENCUENTRE AMPARADO BAJO LAS MISMAS, LA COBERTURA OTORGADA BAJO LA PRESENTE PÓLIZA OPERARÁ COMO CAPA PRIMARIA, SIN PERJUICIO DE LA APLICACIÓN DE UN DEDUCIBLE DE $50.000.000 TODA Y CADA PÉRDIDA.

*RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL LA ASEGURADORA INDEMNIZARÁ LOS PERJUICIOS QUE TENGA QUE PAGAR EL ASEGURADO EN RAZÓN DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL QUE LE SEA IMPUTABLE POR LOS ACCIDENTES DE TRABAJO QUE SUFRAN LOS EMPLEADOS A SU SERVICIO EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ASIGNADAS A ELLOS CON OCASIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. EL PRESENTE AMPARO OPERARÁ EN EXCESO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES CONSIGNADAS EN EL CÓDIGO LABORAL O EN EL RÉGIMEN PROPIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL, Y O CUALQUIER OTRO SEGURO OBLIGATORIO QUE HAYA SIDO CONTRATADO O HAYA DEBIDO SER CONTRATADO PARA EL MISMO FIN.

*RESPONSABILIDAD CIVIL PARA VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS: POR EL PRESENTE AMPARO LA ASEGURADORA INDEMNIZARÁ LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL QUE LE SEA IMPUTABLE AL ASEGURADO, COMO CONSECUENCIA DIRECTA DE DAÑOS MATERIALES, LESIONES PERSONALES Y O MUERTE, QUE SE OCASIONEN A TERCEROS CON VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS QUE ESTÉN AL SERVICIO DEL CONTRATISTA ASEGURADO PRINCIPAL EN EL GIRO NORMAL DE LAS ACTIVIDADES ESPECIFICADAS EN LA CARÁTULA O EN ANEXO

0 330

No. PÓLIZA	ANEXO	SUCURSAL	FECHA SOLICITUD	CIUDAD DE EXPEDICIÓN
400048527	6	BOGOTA	Dia - Mes - Año 17 12 2024	BOGOTÁ, D.C.

VIGENCIA DESDE	A LAS	VIGENCIA HASTA	A LAS	TIPO DE MOVIMIENTO
Dia - Mes - Año	Horas	Dia - Mes - Año	Horas	
14 11 2024	00:00	28 12 2025	00:00	MODIFICACIÓN

DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

NOMBRE	CONSORCIO AQUA.	NIT	901.707.176 - 1
DIRECCIÓN	CR 16 # 106-65 AP 403 ED ROCALLA, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3165339306

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	CONSORCIO AQUA.	NIT	901.707.176 - 1	TELÉFONO	3165339306
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	NIT	000.000.000 - 0	TELÉFONO	1000000

DE ESTA PÓLIZA.

EL PRESENTE AMPARO OPERA EN EXCESO DE LOS SIGUIENTES LÍMITES ASEGURADOS O CUALQUIER LÍMITE SUPERIOR CONTRATADO POR EL ASEGURADO BAJO LA PÓLIZA VOLUNTARIA DE AUTOMÓVILES. EN EL EVENTO DE QUE LOS VEHÍCULOS NO CUENTEN CON ALGUNA DE ESTAS PÓLIZAS O DE QUE EL RIESGO NO SE ENCUENTRE AMPARADO BAJO LAS MISMAS, SE TOMARÁN ESTOS VALORES COMO DEDUCIBLES. NO CUBRE PASAJEROS. DAÑOS A PROPIEDADES DE TERCEROS $100.000.000 – LESIONES O MUERTE A UNA PERSONA $100.000.000 – LESIONES O MUERTE A DOS O MÁS PERSONAS $200.000.000.

PARA EFECTOS DEL PRESENTE AMPARO, SE ENTENDERÁ POR VEHÍCULOS NO PROPIOS TODO AUTOMOTOR DE TRANSPORTE TERRESTRE, QUE SEA TOMADO POR EL ASEGURADO PRINCIPAL EN CALIDAD DE ARRENDAMIENTO, USUFRUCTO, COMODATO O CUALQUIER OTRO TÍTULO NO TRASLATICIO DE DOMINIO Y QUE UTILICE PARA EL DESARROLLO NORMAL DE LAS ACTIVIDADES AMPARADAS EN LA PÓLIZA. POR EL PRESENTE AMPARO LA ASEGURADORA INDEMNIZARÁ LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL QUE LE SEA IMPUTABLE AL ASEGURADO, COMO CONSECUENCIA DIRECTA DE DAÑOS MATERIALES, LESIONES PERSONALES Y O MUERTE, QUE SE OCASIONEN A TERCEROS CON VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS QUE ESTÉN AL SERVICIO DEL CONTRATISTA ASEGURADO PRINCIPAL EN EL GIRO NORMAL DE LAS ACTIVIDADES ESPECIFICADAS EN LA CARÁTULA O EN ANEXO DE ESTA PÓLIZA.

********** **FIN PÓLIZA** **********

0 331

379

527

SUC.	RAMO	POLIZA No.
11	15	400048527

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS

ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES

VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL :	$	8.393.590,00
VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA :	$	0
FORMA DE PAGO CONVENIDA :		CONTADO 30 DÍAS

PLAN DE PAGOS

FECHA DE PAGO	VALOR DE LA PRIMA SEGUN CONVENIO
29/11/2024	$ 8.393.590,03

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA (30) TREINTA DÍAS CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN DICIEMBRE 17 DE 2.024

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

0 332,80

CONSORCIO AQUA

SAMC-002-2023.

FORMATO 2

DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Señores
EMSERCOTA S.A.S E.S.P.
Cota - Cundinamarca

REFERENCIA: Proceso de contratación SAMC-002-2023 en adelante el "Proceso de contratación"
Objeto: CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADOS PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA.

Estimados señores:
Los suscritos, CAMILO ANDRES MARTINEZ LOPEZ, DIANA CAROLINA VELVERDE TORRES y MARILUZ CORTES GUERRA debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA S.A.S, CONSTRUCCIONES Y OBRAS CIVILES DE LA COSTA S.A.S. y CONSTRUMAS DE LA COSTA S.A.S, respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en consorcio, para participar en el proceso de contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. El consorcio está integrado siguientes miembros:

Nombre del integrante	Compromiso (%) [1]
INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA S.A. S N.I.T: 830.031.937 1	20%
CONSTRUCCIONES Y OBRAS CIVILES DE LA COSTA S.A.S. N.I.T: 900.442.782-2	70%
CONSTRUMAS DE LA COSTA S.A.S NIT: 900843927-4	10%

[1] El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.

2. El consorcio se denomina **CONSORCIO AQUA.**
3. El objeto del consorcio es CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADOS PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA.
4. La duración de este consorcio no será inferior a la del plazo del contrato y un año más.
5. La responsabilidad de los integrantes del consorcio es solidaria en el cumplimiento de las obligaciones y de las sanciones que se deriven de la ejecución del contrato.
6. El representante del consorcio es DORIKA ANDREA FONSECA SOLANO identificado con C. C. No. 1.122.811.442 de Barrancas, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
7. La Señora **DORIKA ANDREA FONSECA SOLANO** acepta su nombramiento como representante legal del **CONSORCIO AQUA.**

0 335
783

8. En caso de resultar adjudicatario, la facturación del proponente la realizará: a nombre del CONSORCIO.
9. El domicilio del consorcio es:
   Dirección de correo CR 16 # 106-65 AP 403 ED ROCALLA
   Dirección electrónica GERENCIA@IGVINFRAESTRUCTURA.COM
   Teléfono 3165339306
   Ciudad Bogotá D.C.

En constancia, se firma en BOGOTA D.C., a los 03 días del mes de abril de 2023.

CAMILO ANDRES MARTINEZ LOPEZ
C.C. 9.101.062
INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA S.A.S
N.I.T: 830.031.937 1

DIANA CAROLINA VELVERDE TORRES
C.C. 43.251.280
CONSTRUCCIONES Y OBRAS CIVILES DE LA COSTA S.A.S
N.I.T: 900.442.782-2

MARILUZ CORTES GUERRA
C.C. 26946164
CONSTRUMAS DE LA COSTA S.A.S
NIT: 900843927-4

DORIKA ANDREA FONSECA SOLANO
C.C. 1.122.811.442
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO SANEAMIENTO COTA

0 336

332

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14957761883

(415)7707212489984(8020) 000001495776188 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 0 7 1 7 6	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO AQUA

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 16 106 65 AP 403 ED ROCALLA

42. Correo electrónico consorcioaqua2023@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 8 6 8 8 9 1 1 3	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 3 0 4 0 3					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	5																			

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros																						Exportadores						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código																								57. Modo			
																								58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 10 - 19 / 11 : 09: 58

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre FONSECA SOLANO DORIKA ANDREA
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 19-10-2023 11:10:25AM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

0 337

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14957761883

(415)7707212489984(8020) 000001495776188 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 7 0 7 1 7 6	1	Impuestos de Bogotá	3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 3 0 0 0 3 1 9 3 7	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	2 0	2 0 2 3 0 4 0 3	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 4 4 2 7 8 2	2	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CONSTRUCCIONES Y OBRAS CIVILES DE LA COSTA S. A. S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	7 0	2 0 2 3 0 4 0 3	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 8 4 3 9 2 7	4	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CONSTRUMAS DE LA COSTA S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	1 0	2 0 2 3 0 4 0 3	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social:

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social:

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 19-10-2023 11:10:25AM

0 340

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14957761883

(415)7707212489984(8020) 000001495776188 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 0 7 1 7 6	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 0 4 0 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	1 1 2 2 8 1 1 4 4 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
FONSECA	SOLANO	DORIKA	ANDREA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 19-10-2023 11:10:25AM

0 339 287
585

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14831320706

(415)7707212489984(8020) 000001483132070 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 4 2 7 8 2	2	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSTRUCCIONES Y OBRAS CIVILES DE LA COSTA S. A. S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Turbaná 8 3 8

41. Dirección principal
KM 21 SEC LA TORTUGA VTE MAMONAL GAMBOTE FCA VILLA ZULENA

42. Correo electrónico intralogistics.ae@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 4 3 7 7 2 6 2 6	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 1 1 0 5 0 6	4 2 9 0	2 0 1 3 0 5 0 6		4 2 2 0	4 1 1 2		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	0	1	4	4	2	4	8	5	2													

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar 52 - Facturador electrónico
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros																					Exportadores				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código	2 3	2 2																			1	1	57. Modo			
																							58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 06 - 02 / 17 : 17: 08

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre OÑATE ARIAS KATTIA
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 02-06-2022 05:23:54PM

0 341

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 6 **Hoja 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14831320706

(415)7707212489984(8020) 000001483132070 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 4 2 7 8 2 1	2	Impuestos de Cartagena 6	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 1
72. Número		0 0 4
73. Fecha	2 0 1 1 0 5 0 6	2 0 1 3 1 0 0 7
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 1 0 6 1 4	2 0 1 3 1 0 1 6
77. No. Matrícula mercantil	0 9 2 8 8 0 8 2 1 2	0 9 2 8 8 0 8 2 1 2
78. Departamento	1 3	1 3
79. Ciudad/Municipio	9	9

Vigencia

80. Desde	2 0 1 1 0 5 0 6
81. Hasta	2 0 6 1 0 5 0 6

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 7 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generación documento PDF: 02-06-2022 05:23:54PM

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

0 342

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 6 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14831320706

(415)7707212489984(8020) 000001483132070 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 4 2 7 8 2	2	Impuestos de Cartagena	6

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 0 2 0 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 6 5 5 6 8 7 8 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
OÑATE	ARIAS	KATTIA	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 02-06-2022 05:23:54PM

0 343-21
539

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14957761883

(415)7707212489984(8020) 000001495776188 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 0 7 1 7 6	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 3 0 4 0 3	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento		
79. Ciudad/Municipio		
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 3 0 4 0 3	
81. Hasta	2 0 2 6 0 4 0 3	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generación documento PDF: 19-10-2023 11:10:25AM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

0 338

386

534

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Página 4 de 6 **Hoja 4**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14831320706

(415)7707212489984(8020) 000001483132070 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 4 2 7 8 2	2	Impuestos de Cartagena	6

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 3 2 0 2 4 5 7		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
MARRUGO	GUZMAN	ANDERSON	MANUEL

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
30,000,000		1 0 2 0 1 1 0 6 1 4	2 0 1 9 0 2 2 0

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 02-06-2022 05:23:54PM

0 344

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 5 de 6 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14831320706

(415)7707212489984(8020) 000001483132070 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 4 2 7 8 2	2	Impuestos de Cartagena 6	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	4 5 5 3 1 7 3 8		1 8 4 7 6 2 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
SOLANO	LORDUY	YURIBIA	

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 0 0 7 1 7

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 02-06-2022 05:23:54PM

0 345

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 6 de 6 **Hoja 6**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14831320706

(415)7707212489984(8020) 000001483132070 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 4 2 7 8 2	2	Impuestos de Cartagena 6	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 4 2 1 0

162. Nombre del establecimiento: CONSTRUCCIONES Y OBRAS CIVILES DE LA COSTA S .AS.

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Bolívar 1 3	Turbaná 8 3 8

165. Dirección: KM 21 SEC LA TORTUGA VTE MAMONAL GAMBOTE FCA VILLA ZULENA

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 9 2 8 8 0 8 3 0 2	2 0 1 1 0 6 1 4
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 02-06-2022 05:23:54PM

0 346

547

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14737309479

(415)7707212489984(8020) 000001473730947 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 4 3 9 2 7	4	Impuestos y Aduanas de Valledupar 2 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSTRUMAS DE LA COSTA S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla
CONSTRUMAS DE LA COSTA	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cesar 2 0	Valledupar 0 0 1

41. Dirección principal
MZ D CA 9 BRR MARIA CAMILA SUR

42. Correo electrónico contador.mary@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 7 6 4 4 1 3 5 0	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 1 5 0 4 2 9	4 2 1 0	2 0 1 5 0 4 2 9	4 2 2 0			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	7	9	1	4	4	8	5	2																	

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros										Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código												57. Modo			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2021-01-28 / 18:26:20

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

Fecha generación documento PDF: 24-08-2021 04:24:28PM

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

0 347 295
593

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14913901730

(415)7707212489984(8020) 000001491390173 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 3 1 9 3 7	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
	IGV INFRAESTRUCTURA

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
C R 11 A 94 46 O F 602

42. Correo electrónico gerencia@igvinfraestructura.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 0 6 7 9 4 5 1 2	3 0 0 6 7 5 9 6 2 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 1 2 1 2 1 5	4 1 1 2	2 0 1 3 0 2 0 1	4 2 2 0	4 2 9 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 8 9 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar 52 - Facturador electrónico
07- Retención en la fuente a título de rent 55 - Informante de Beneficiarios Finales
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 05 - 11 / 16 : 41: 37

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre MARTINEZ LOPEZ CAMILO ANDRES
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 25-07-2023 03:15:04PM

COPIA DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

0 345 396

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: **14913901730**

(415)7707212489984(8020) 000001491390173 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 0 3 1 9 3 7	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	1 6 7 6	1 3
73. Fecha	1 9 9 7 0 5 2 6	2 0 1 8 0 5 2 9
74. Número de notaría	5 0	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 9 7 0 6 1 3	2 0 1 8 0 5 3 0
77. No. Matricula mercantil	7 9 7 8 4 5	0 9 2 9 3 0 8 5 1 2
78. Departamento	1 1	1 3
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	9

Vigencia

80. Desde	1 9 9 7 0 5 2 6
81. Hasta	2 1 0 0 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 5 1 2 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generación documento PDF: 25-07-2023 03:15:04PM

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

0 349

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14913901730

(415)7707212489984(8020) 000001491390173 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 3 1 9 3 7	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 0 1 1 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	9 1 0 1 0 6 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MARTINEZ	LOPEZ	CAMILO	ANDRES

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 25-07-2023 03:15:04PM

0 350

546

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 4 de 4 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14913901730

(415)7707212489984(8020) 000001491390173 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 3 1 9 3 7	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 2 1 4 6 4		1 2 4 5 6 9 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
MORELO	RODRIGUEZ	ZACARIAS	

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 1 7 0 6 2 2

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 25-07-2023 03:15:04PM

0 351

299
547

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 6 de febrero de 2025 Hora: 09:33:20
Recibo No. AA25159677
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2515967728DD1

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA S A S
Sigla: IGV INFRAESTRUCTURA
Nit: 830.031.937-1
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 03274063
Fecha de matrícula: 20 de agosto de 2020
Último año renovado: 2024
Fecha de renovación: 29 de marzo de 2024
Grupo NIIF: Grupo II.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Calle 109 No. 14 B -60 Oficina 204
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: gerencia@igvinfraestructura.com
Teléfono comercial 1: 6014674438
Teléfono comercial 2: No reportó.
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Calle 109 No. 14 B -60 Oficina 204
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: gerencia@igvinfraestructura.com
Teléfono para notificación 1: 6014674438
Teléfono para notificación 2: No reportó.
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica NO autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Constanza del Pilar Puentes Trujillo

0 352 800
548

Administrativo.

Por Acta No. 23 del 16 de junio de 2022 de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 12 de Julio de 2022, con el No. 00329519 del libro VI, se inscribió la Apertura de Sucursal denominada INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA SUCURSAL PERU, en la ciudad de Piura (Perú).

CONSTITUCIÓN

Por Escritura Pública No. 0001676 del 26 de mayo de 1997 de Notaría 50 de Bogotá D.C., inscrito en esta Cámara de Comercio el 13 de junio de 1997, con el No. 00588929 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA S.A. S.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 2 de la Junta de Socios, del 15 de septiembre de 2010, inscrita el 1 de octubre de 2010 bajo el número 01418503 del libro IX, la sociedad de la referencia se transformó de sociedad limitada a sociedad por acciones simplificada bajo el nombre de: INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA S.A.S.

Por Acta No. 2 de la Asamblea de Accionistas, del 8 de julio de 2011, inscrita el 2 de septiembre de 2011 bajo el No. 01509376 del libro IX, consta el cambio de domicilio de la ciudad/municipio de Bogotá D.C. a la ciudad/municipio de Cartagena (Bolívar).

Por Acta No. 07 del 22 de junio de 2017 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 20 de agosto de 2020, con el No. 02607960 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA S.A. S a INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA S A S.

Por Acta No. 07 de la Asamblea de Accionistas del 22 de junio de

0 353

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 6 de febrero de 2025 Hora: 09:33:20
Recibo No. AA25159677
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2515967728DD1

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

2017, inscrito el 20 de Agosto de 2020 bajo el No. 02607960 del libro IX, la sociedad de la referencia cambió su sigla de: IGV S.A.S., por: IGV INFRAESTRUCTURA.

Por Acta No. 16 de la Asamblea de Accionistas del 6 de agosto de 2020, inscrita el 20 de Agosto de 2020 bajo el número 02607960 del libro IX, la sociedad de la referencia inscrita previamente en la Cámara de Comercio de Cartagena el 3 de noviembre de 2011 bajo el número 74.124 del libro IX, trasladó su domicilio de la ciudad/municipio de: Cartagena (Bolívar) a la ciudad/municipio de: Bogotá D.C.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es hasta el 31 de diciembre de 2100.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tendrá como objeto principal las siguientes actividades: A) La realización de obras de construcción de cualquier tipo casas, urbanizaciones, puentes, carreteras, túneles, distritos de riego, estructuras, presas, infraestructuras para centrales hidroeléctricas y termoeléctricas, bodegas, edificios, centros comerciales y en general todo tipo de obras civiles relacionadas con el ejercicio de las profesiones de ingeniería en todas sus ramas y arquitectura, incluyendo obras vinculadas con la explotación, exploración y comercialización de minerales o de cualquier otro recurso natural. B) La prestación de servicios profesionales de Asesoría, consultoría, Interventoría, Diseño, Programación, Gerencia de Proyectos de construcción, Estudios de factibilidad de inversiones en obras públicas o privadas y cualquier otro servicio relacionado con las ramas de la ingeniería, la arquitectura y el diseño. C) La explotación de cualquier industria relacionada con el sector de la construcción. D) La administración de bienes inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal o separada. E) La comercialización de toda clase de productos, elementos, maquinaria y equipo relacionados con la construcción y el diseño. F) La administración, corretaje,

0 354

compraventa, arriendo, permuta, comodato o cualquier acto o contrato sobre bienes muebles e inmuebles. G) La adquisición, enajenación, arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, así como la pignoración e hipoteca de dichos bienes según el caso. H) La remodelación o restauración de construcciones. I) Organizar y financiar empresas de cualquier naturaleza, que tengan objetos similares o complementarios con los de la sociedad y llevar la representación de personas jurídicas o naturales, nacionales o extranjeras, dedicadas a la construcción u obras civiles, lo mismo que con la maquinaria dedicada a dicha actividad. J) Contratar con personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, privadas o públicas en su propio nombre o de terceros la ejecución de obras civiles o asociarse con otras sociedades para la realización de las mismas, bajo cualquiera de las formas de asociación previstas en la ley comercial y administrativa sea bajo el esquema de contratos en participación, consorcios, uniones temporales y otras. K) La realización de operaciones de comercio exterior, tales como la importación y exportación de toda clase de bienes y servicios. L) La promoción y comercialización de productos colombianos en los mercados externos, especialmente en los países del Grupo Andino, Mercosur y Unasur. M) Participar en todo tipo de licitaciones privadas o públicas. N) Todas las actividades relacionadas con el establecimiento, aislamiento, mantenimiento y conservación de plantaciones forestales protectoras, productoras y todas aquellas actividades necesarias para el manejo y control ambiental y forestal; así como consultoría y prestación de servicios en proyectos y actividades de: restauración ecológica, restauración y protección de ecosistemas, siembra, resiembra y mantenimiento de especies nativas e introducidas, establecimiento de plantaciones con fines protectores, productores y comerciales, mantenimiento de plantaciones con fines protectores, productores y comerciales, compensación de pérdida de biodiversidad, aprovechamiento forestal, forestales, silvicultura, elaboración de planes de restauración ecológica pasiva y activa, monitoreo de restauración, regeneración natural, restauración activa, restauración pasiva, establecimiento de viveros, trasplante de plántulas y semillas, cosecha de semillas o plántulas, re forestación con especies nativas, re forestación con especies introducidas, aislamiento en zonas de importancia ecológica, cercas vivas, bancos dendroenergéticos, estufas ecoeficiente, sistemas productivos agrícolas, sistemas productivos forestales, erradicación de especies invasoras, sistemas forestales, sistemas agro forestales, rehabilitación ecológica de ecosistemas, recuperación ecológica de ecosistemas, entre otras, al igual que

0 355

ejecución. interventorías y asesorías a todo tipo de proyectos ambientales y forestales y cualquier otro que sea útil para la actividad social. O) La producción, distribución, importación, exportación, compra, venta, instalación, arrendamiento y/o operación, concesión, mantenimiento y reparación de equipos y materiales de energía eléctrica, mecánica y/o térmica, incluyendo las fuentes de energía alternativas, entre las cuales se pueden considerar: baterías o acumuladores para radios de comunicaciones, alarmas, computadores, módulos solares fotovoltaicos, sistemas de rectificación y cargadores de baterías, tecnología SCRS, ferroresonante y PWM, sistemas ininterrumpidos de potencia U.P.S., equipos de conversión y transformación eléctrica y electrónica de energía voltaje y corriente, elementos semiconductores para la protección contra sobretensiones transitorias TVS. Sistemas de acondicionamiento ambiental, refrigeración y calefacción, pequeñas centrales hidroeléctricas, redes eléctricas en baja tensión y media tensión, motores diesel y motogeneradores diesel y/o eléctricos para uso en generación de energía eléctrica, además del suministro de materiales, accesorios y servicios de ingeniería para redes eléctricas HVDC, HVAC, AT, BT, y MT. P) Suministro, distribución e instalación de sistemas de iluminación de alumbrado público e interior, alumbrado de emergencia e iluminación de vías y escenarios. Q) Desarrollar programas de reducción de pérdidas consistentes en la verificación del funcionamiento, retiro e instalación de medidores de servicio de energía eléctrica, ejecutar el control de morosidad de los clientes de la empresa de servicio de energía consistente en la verificación de la suspensión, verificación de la suspensión, seguimiento de las suspensiones, reconexión de los servicios de energía en sus diferentes aspectos y modalidades. R) Diseño, interventoría, supervisión e inspección de redes eléctricas industriales, domiciliarias, comerciales o gubernamentales. S) Desarrollo, diseño e implementación de proyectos de automatización, gestión y control remoto de equipos de energía y complementarios, así como para sistemas de telecomunicaciones y equipos de control, accionamiento y supervisor. Diseño, suministro, construcción, concesión, instalación, remodelación, mantenimiento, reparación y/o adaptación de elementos y equipos de planta interna y de planta externa, bienes de planta externa, redes de energía y de telefonía alámbrica o inalámbrica, incluyendo el suministro e instalación de torres para comunicaciones, así como el estudio y la presentación de servicios de diseños, asesorías, interventorías, consultoría, construcción, operación de servicios de telecomunicaciones para la prestación de servicios de

0 356

valor agregado, como socio o aliado estratégico en contratos de asociación y operador de redes y proveedor de equipos relacionados, fabricación de sistemas y equipos de codificación direccionables y servicios complementarios. T) Diseño, fabricación, suministro, instalación, concesión, interconexión, prueba y puesta en funcionamiento de las redes, equipos y elementos para la expansión de la red de servicios de banda ancha. Obras civiles para redes de distribución aéreas y subterráneas, canalizaciones y enrutamiento, con el objeto de prestar servicios a poblaciones de clientes, usuarios, abonados o suscriptores y en general todo lo relacionado en concesiones de telecomunicaciones. También prestará el servicio público de telecomunicaciones a través de la explotación, contratación, distribución, concesión, operación, asesoría, auditoría, interventoría y asistencia técnica de los servicios de televisión abierta y por suscripción, radiodifundida, cableada, cerrada y satelital de señales tanto incidentales como codificadas, la prestación del servicio de valor agregado y/o telemático haciendo uso de la propia red y/o de las redes de telecomunicaciones del estado o privadas; en general la explotación y prestación de servicios de telecomunicaciones básicos, especiales y auxiliares de ayuda, walkout, producción de televisión e ingeniería en general tales como: cableado, diseño de redes, ductos, obras civiles y otros que conlleven o no la comercialización de equipos electrónicos, mantenimientos, transferencia de tecnología, sistemas de comunicación y obras complementarias en: centrales telefónicas, redes de fibra óptica, redes de transmisión de datos, antenas y equipos de repetición, redes de computación y conmutación, el diseño, selección, instalación, operación, concesión y mantenimiento de todo tipo de equipos electrónicos especializados, líneas y accesorios para comunicaciones, soluciones de vigilancia y seguridad privada, automatización de procesos y el diseño, suministro, integración, instalación, implementación, pruebas, puesta en servicio y mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas electrónicos de seguridad y blindaje arquitectónico. U) Actividades de la ingeniería electromecánica tales como diseñar, seleccionar, instalar, operar, supervisar, dar mantenimiento de sistemas electromecánicos, electroneumáticos y electrohidráulicos, así como los sistemas de protección y control de equipo eléctrico y subestaciones eléctricas, sistemas de transmisión y distribución de energía eléctrica, redes y máquinas hidráulicas, maquinaria industrial y equipo. Seleccionar, instalar, controlar y operar motores de combustión interna, transmisiones mecánicas, turbogeneradores, generadores y turbinas de

0 357

vapor, cambiadores de calor, equipos de aire acondicionado y refrigeración y máquinas eléctricas y transformadores. Seleccionar, instalar y operar instrumentos de medición del área electromecánica y todas las labores y aspectos, incluyendo la automatización de servicios industriales, automatización de edificios, sistemas de transporte masivo, equipos de control y automatización de tráfico y transporte, señalización. Seguridad de instalaciones industriales. La sociedad podrá ser fiadora y garantizar con todo o parte de sus bienes, obligaciones de terceros y por lo tanto, tienen valor para ella las obligaciones que por este concepto lleguen a constituirse por cualquiera de los socios. En desarrollo de su objeto social la sociedad podrá realizar actividades que tengan relación directa con el mismo tales como: a) Tomar o recibir dinero en mutuo con interés o sin él, con garantía o sin ella; b) Girar, otorgar, aceptar, endosar, avalar, y negociar toda clase de títulos valores; c) Celebrar toda clase de contratos y operaciones bancarias y bursátiles con las entidades del sector financiero público o privado, tales como bancos, corporaciones financieras, fondos fiduciarios, bolsas de valores, etc.; d) intervenir como asociado en todo tipo de sociedades comerciales o civiles y formar parte de personas jurídicas de derecho privado y economía mixta; e) Celebrar con personas jurídicas o naturales el negocio jurídico de cuentas en participación respecto a operaciones comerciales relacionadas con su objeto social; f) importar los bienes muebles y accesorios necesarios para la dotación de los inmuebles de la sociedad o construidos por ella para terceros; g) Celebrar contratos de compra y venta de bienes muebles e inmuebles, arrendamiento y demás negocios que versen sobre muebles e inmuebles; h) obtener y explotar concesiones y privilegios de cualquier naturaleza, tales como patentes de invención, marcas de productos o servicios, lemas comerciales y cualquier otro tipo que sea útil para la actividad social. Ejecutar en condición de operador todas las actividades correspondientes al diseño, financiación, operación, gestión, construcción, ampliación, expansión, reposición, rehabilitación, mantenimiento, recuperación y administración de la infraestructura de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, recolección y procesamiento de basuras, desechos y escombros y todas las actividades complementarias, afines o análogas acordes con el régimen jurídico vigente y aplicable, así como la ejecución de obras de ampliación y limpieza de cauces y cuerpos de agua. Estas actividades podrán desarrollarse en cualquier sitio o región geográfica de la República de Colombia y en cualquier país o república del mundo, por lo tanto la empresa podrá desarrollar

0 358 806

todas sus actividades en el exterior, negociar internacionalmente, establecer sucursales en el extranjero, constituir y participar en consorcios y demás formas de asociación empresarial y comercial permitidas en el país correspondiente, participar en licitaciones públicas y privadas y en las demás formas de contratación estatal y privada legalmente definidas en el país respectivo, con sujeción a las leyes y normas de cada nación. En desarrollo del objeto social, la empresa podrá ofrecer además de las garantías comerciales legales a las que está obligada, las garantías adicionales o extendidas que considere, emitiendo y suscribiendo paro ello los documentos que sean necesarios.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor	: $15.000.000.000,00
No. de acciones	: 15.000.000,00
Valor nominal	: $1.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor	: $15.000.000.000,00
No. de acciones	: 15.000.000,00
Valor nominal	: $1.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor	: $15.000.000.000,00
No. de acciones	: 15.000.000,00
Valor nominal	: $1.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

0 359

La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. Se establece que todas las autorizaciones, documentos y poderes que suscriba u otorgue que comprometan a la Sociedad, sean autenticados con presentación personal, únicamente en las Notarías 4a. del Circulo de Cartagena, 22° del Círculo de Bogotá, 11° del Círculo de Barranquilla, 1° del Círculo de Riohacha y 3° del Círculo de Valledupar. El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas y conservando la limitación que todas las autorizaciones, documentos y poderes que suscriba u otorgue que comprometan a la sociedad, sean autenticados con presentación personal, únicamente en las Notarías 4a. del Circulo de Cartagena, 22° del Círculo de Bogotá, 11° del Círculo de Barranquilla, 1° del Círculo de Riohacha y 3° del Círculo de Valledupar. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal. Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales. Parágrafo: Como Representante Legal de la compañía judicial y extrajudicialmente, el Gerente y su suplente tiene las más amplias facultades para celebrar o ejecutar y para actuar en nombre de la sociedad en todos los actos y contratos comprendidos dentro del objeto social o que tengan carácter simplemente preparatorio, accesorio o complementario para la realización de los fines que persigue la compañía y los que se relacionen directamente con la existencia y funcionamiento de la misma. El Gerente y su suplente con las limitaciones previstas en estos estatutos y en la ley con la condición de protocolizar únicamente en las Notarías 4a. del Circulo de Cartagena, 22° del Círculo de Bogotá, 11° del Círculo de Barranquilla, 1° del Círculo de Riohacha y 3° del Círculo de Valledupar, los documentos y poderes que otorgue, previstas en el artículo 29° de estos Estatutos, queda investidos de poderes

D 360

especiales para transigir, arbitrar y comprometer los negocios sociales; solicitar créditos, constituir hipotecas; constituir fideicomisos; promover o coadyuvar acciones judiciales, administrativas o contencioso - administrativas en que la compañía tenga interés o debe intervenir e interponer todos los recursos que sean procedentes conforme con la ley, desistir de las acciones o recursos que interponga y constituir, para tales efectos, los apoderados especiales que juzgue necesarios para representar a la sociedad y delegarles facultades; novar obligaciones o créditos; suscribir títulos valores de contenido crediticio a condición de que exista contraprestación cambiaria a favor de la compañía; dar o recibir bienes en pago; revocar mandatos y sustituciones. En cumplimiento de lo anterior el Gerente podrá: A) Ejecutar los decretos de la Asamblea de Accionistas; B) Nombrar trabajadores y velar por el cumplimiento de sus deberes, suspender a los de su dependencia cuando lo juzgue necesario y designar a quienes deban reemplazarlos; C) Constituir los apoderados judiciales y extrajudiciales que juzgue necesarios para que, obrando bajo sus órdenes, representen a la compañía y determinar sus facultades; D) Ejecutar los actos y celebrar los contratos que tiendan a llenar los fines sociales, sin limitación, Cumplir y hacer que se cumplan oportunamente todos los requisitos y exigencias legales relacionadas con el funcionamiento de la sociedad; E) Si hay lugar a ello, otorgar a los gerentes de las sucursales el poder de que trata el artículo 263 del Código de Comercio en el cual se fijarán las facultades de cada uno de ellos; F) Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos de la compañía y de que todos los valores pertenecientes a ella y los que se reciban en custodia o depósito se mantengan con la seguridad debida; G) Asistir a las reuniones de la Asamblea de Accionistas, asociaciones (incluida la Cámara de Comercio) o comunidades en que la compañía tenga intereses, dar su voto en ellas en representación de ésta; H) Convocar a la Asamblea de Accionistas a reuniones extraordinarias; I) Visitar las instalaciones, obras y dependencias de la compañía cuando lo estime conveniente; J) Las demás que le correspondan de acuerdo con la ley y la naturaleza de su encargo. K) Ejercer la vigilancia control y evaluación del funcionamiento de las sucursales en el exterior que la sociedad haya decidido constituir, cumplir y hacer cumplir las leyes, exigencias y disposiciones de cada país en cuanto al funcionamiento de las respectivas sucursales la ejecución correcta y oportuna de los contratos que hayan sido adjudicadas, adoptar los correctivos que fueren necesarios si están dentro de sus atribuciones o informar de

0 361

inmediato de la posible anomalía a la Asamblea de Accionistas.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 26-2023 del 10 de enero de 2023, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 11 de enero de 2023 con el No. 02920849 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal	Camilo Andres Martinez Lopez	C.C. No. 9101062

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 07 del 22 de junio de 2017, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 20 de agosto de 2020 con el No. 02607960 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal	Zacarias Morelo Rodriguez	C.C. No. 7921464 T.P. No. 124569-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
E. P. No. 0000538 del 31 de marzo de 2005 de la Notaría 1 de Montería (Córdoba)	00984298 del 5 de abril de 2005 del Libro IX
Acta No. 0000004 del 20 de diciembre de 2006 de la Junta de Socios	01116680 del 15 de marzo de 2007 del Libro IX
E. P. No. 0008845 del 28 de diciembre de 2006 de la Notaría 45	01116679 del 15 de marzo de 2007 del Libro IX

0 362 810

558

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 6 de febrero de 2025 Hora: 09:33:20
Recibo No. AA25159677
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2515967728DD1

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

de Bogotá D.C.	
E. P. No. 0008845 del 28 de diciembre de 2006 de la Notaría 45 de Bogotá D.C.	01116682 del 15 de marzo de 2007 del Libro IX
E. P. No. 0002340 del 18 de septiembre de 2007 de la Notaría 62 de Bogotá D.C.	01159490 del 21 de septiembre de 2007 del Libro IX
E. P. No. 0002715 del 22 de octubre de 2007 de la Notaría 62 de Bogotá D.C.	01166276 del 23 de octubre de 2007 del Libro IX
E. P. No. 0001362 del 28 de diciembre de 2007 de la Notaría 77 de Bogotá D.C.	01255563 del 12 de noviembre de 2008 del Libro IX
E. P. No. 8102 del 23 de diciembre de 2008 de la Notaría 45 de Bogotá D.C.	01293142 del 28 de abril de 2009 del Libro IX
E. P. No. 8102 del 23 de diciembre de 2008 de la Notaría 45 de Bogotá D.C.	01336646 del 27 de octubre de 2009 del Libro IX
E. P. No. 1803 del 1 de diciembre de 2009 de la Notaría 77 de Bogotá D.C.	01344392 del 2 de diciembre de 2009 del Libro IX
Acta No. 2 del 15 de septiembre de 2010 de la Junta de Socios	01418503 del 1 de octubre de 2010 del Libro IX
Acta No. 2 del 8 de julio de 2011 de la Asamblea de Accionistas	01509376 del 2 de septiembre de 2011 del Libro IX
Acta No. 01 del 27 de agosto de 2015 de la Asamblea de Accionistas	02607960 del 20 de agosto de 2020 del Libro IX
Acta No. 10 del 17 de agosto de 2016 de la Asamblea de Accionistas	02607960 del 20 de agosto de 2020 del Libro IX
Acta No. 07 del 22 de junio de 2017 de la Asamblea de Accionistas	02607960 del 20 de agosto de 2020 del Libro IX
Acta No. 11 del 10 de enero de 2018 de la Asamblea de Accionistas	02607960 del 20 de agosto de 2020 del Libro IX
Acta No. 13 del 29 de mayo de 2018 de la Asamblea de Accionistas	02607960 del 20 de agosto de 2020 del Libro IX
Acta No. 16 del 6 de agosto de 2020 de la Asamblea de Accionistas	02607960 del 20 de agosto de 2020 del Libro IX
Acta No. 19 del 3 de mayo de 2021 de la Asamblea de Accionistas	02709827 del 27 de mayo de 2021 del Libro IX
Acta No. 25 del 15 de noviembre de 2022 de la Accionista Único	02901861 del 23 de noviembre de 2022 del Libro IX

0 363

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 6 de febrero de 2025 Hora: 09:33:20
Recibo No. AA25159677
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2515967728DD1

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

SITUACIÓN DE CONTROL Y/O GRUPO EMPRESARIAL

Por Documento Privado del 24 de junio de 2024 de Representante Legal, inscrito el 27 de junio de 2024 bajo el número 03133316 del libro IX, comunicó la persona natural matríz:
- Miguel Camilo Castillo Baute
Domicilio: Cartagena (Bolívar)
Nacionalidad: Colombiana
Actividad: Ingeniero civil
Presupuesto: Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio
Que se ha configurado una situación de control con la sociedad de la referencia.
Fecha de configuración de la situación de control : 2024-06-18

Se aclara la situación de control inscrita el 27 de Junio de 2024 bajo el No. 03133316 del libro IX, en el sentido de indicar que la persona natural Miguel Camilo Castillo Baute (matriz) comunica que ejerce situación de control indirecto sobre la sociedad INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA S A S (subordinada) a través de GRUPO EMPRESARIAL IGV SAS (filial).

CERTIFICAS ESPECIALES

Los actos certificados y que fueron inscritos con fecha anterior al 20 de Agosto de 2020, fueron inscritos previamente por otra cámara de comercio. Lo anterior de acuerdo a lo establecido por el numeral 1.7.1 de la circular única de la Superintendencia de Industria y Comercio.

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son

0 364

días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 4210
Actividad secundaria Código CIIU: 4112
Otras actividades Código CIIU: 4220, 4290

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Grande

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $ 28.013.758.321
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 4210

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 9 de marzo de 2021. Fecha de envío

0 365

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 6 de febrero de 2025 Hora: 09:33:20
Recibo No. AA25159677
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2515967728DD1

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

de información a Planeación : 27 de junio de 2024. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

****

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

****

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

****

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

0 366 814
562

Cámara de Comercio de Cartagena

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha de expedición: 12/03/2025 - 1:42:03 PM

Recibo No.: 0009694225 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: EULJiHiDnshMdabc

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DE ESTE CERTIFICADO, EXISTE UNA PETICIÓN EN TRÁMITE, LA CUAL PUEDE AFECTAR EL CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN QUE CONSTA EN EL MISMO.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social:	CONSTRUCCIONES Y OBRAS CIVILES DE LA COSTA S.A.S.
Sigla:	No reportó
Nit:	900442782-2
Domicilio principal:	TURBANA, BOLIVAR, COLOMBIA

MATRÍCULA

Matrícula No.:	09-288082-12
Fecha de matrícula:	14 de Junio de 2011
Último año renovado:	2024
Fecha de renovación:	30 de Marzo de 2024
Grupo NIIF:	GRUPO II.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal:	KM 21 SECTOR LA TORTUGA, FINCA VILLA ZULENA, VARIANTE MAMONAL GAMBOTE
Municipio:	TURBANA, BOLIVAR, COLOMBIA
Correo electrónico:	intralogistics.ae@gmail.com
Teléfono comercial 1:	3133930304
Teléfono comercial 2:	No reportó
Teléfono comercial 3:	No reportó
Página web:	No reportó
Dirección para notificación judicial:	KM 21 SECTOR LA TORTUGA, FINCA VILLA ZULENA, VARIANTE MAMONAL GAMBOTE
Municipio:	TURBANA, BOLIVAR, COLOMBIA

0 367

583

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Correo electrónico de notificación: intralogistics.ae@gmail.com
Teléfono para notificación 1: 3133930304
Teléfono para notificación 2: No reportó
Teléfono para notificación 3: No reportó

La persona jurídica CONSTRUCCIONES Y OBRAS CIVILES DE LA COSTA S.A.S. SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

CONSTITUCIÓN

CONSTITUCION: Que por Documento Privado del 6 de Mayo de 2011, otorgado en Cartagena, inscrito en esta Cámara de Comercio el 14 de Junio de 2011 bajo el número 71,980 del Libro IX del Registro Mercantil, se constituyó una sociedad por acciones simplificadas de naturaleza comercial denominada:

INTERNATIONAL TRADING & LOGISTICS A.& E. S.A.S.

REFORMAS ESPECIALES

Que por Acta No. 004 del 07 de Octubre de 2013, correspondiente a la Asamblea General de Accionistas, celebrada en Cartagena, inscrita en esta Cámara de Comercio el 16 de Octubre de 2013, bajo el número 97,146 del libro IX del Registro Mercantil, la sociedad cambió de razón social por:

CONSTRUCCIONES Y OBRAS CIVILES DE LA COSTA S.A.S.

TERMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es hasta mayo 06 de 2061.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tendrá como objeto social lo siguiente: prestar los servicios de ingeniería civil, eléctrica, mecánica, metalmecánica, arquitectura, como la prestación de servicios de asesorías,

0 368
564

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

consultorías, diseño, gestión, control, proveeduría, estudios, construcción y mantenimiento en las ramas de ingeniería civil, eléctrica, mecánica, metalmecánica, arquitectura, suministro de mano de obra y materiales en la rama de ingeniería anotadas, además 1) celebrar y ejecutar programas, proyectos y convenios, entre entidades públicas y privadas, de carácter nacional e internacional. Además concertar o contratar con particulares o con el estado y/o sus entidades territoriales la promoción, ejecución, evaluación, asesoría o elaboración de planes de desarrollo, programas y proyectos de desarrollo social y económico e interventorías de estudios jurídicos y socioeconómicos, de pre inversión o inversión, pre factibilidad o factibilidad. 2) celebrar convenios de asociación con personas jurídicas derecho público y privado con el fin de impulsar programas y actividades de interés público. 3) implementación de procesos de modernización empresarial para las empresas prestadoras de servicios públicos y todo lo relacionado a realizar consultorías en lo referente a fortalecimiento institucional de dichas empresas. 4) promocionar, gestionar y ejecutar programas y proyectos de vivienda de interés social. 5) promoción y ejecución de planes de atención básica de los entes territoriales, así como la formulación de planes locales para la prevención de desastres. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio a la industria de la sociedad. También podrá prestar servicios de logística y manipulación de carga nacional e internacional así como el transporte de la misma a nivel nacional e intermunicipal.
Párrafo: En el desarrollo del objeto social, la empresa podrá ofrecer además de garantías comerciales legales a las que está obligada y las garantías adicionales o extendidas que considera, emitiendo, suscribiendo para ello documentos que sean necesarios.

CAPITAL

		CAPITAL AUTORIZADO
Valor	:	$500,000,000.00
No. de acciones	:	25,000.00
Valor Nominal	:	$20,000.00
		CAPITAL SUSCRITO
Valor	:	$500,000,000.00

0 369

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

No. de acciones	:	25,000.00
Valor Nominal	:	$20,000.00

CAPITAL PAGADO

Valor	:	$500,000,000.00
No. de acciones	:	25,000.00
Valor Nominal	:	$20,000.00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica; accionista o no, quien podrá tener uno o varios suplentes envestidos con las mismas facultades del principal salvo las restricciones declaradas en estos estatutos, designados por un término de un año por la asamblea general de accionistas.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente arte terceros por el representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad irá obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal. Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales. El representante legal suplente al momento de enajenar activos de la sociedad requerirá autorización previa del Representante Legal Principal, esta autorización debe ser autenticada en la notaría Segunda de la ciudad de Cartagena para que puedan surtir efectos legales ante terceros

0 370

566

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 27 del 28 de noviembre de 2022, de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 5 de diciembre de 2022 con el No. 186124 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	DIANA CAROLINA VALVERDE TORRES	C.C. 43.251.280

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL	YURIBIA SOLANO LORDUY DESIGNACION	C 45.531.738

Por acta No. 18 del 8 de Julio de 2020, correspondiente a la reunión de Asamblea de Accionistas celebrada en Turbana, inscrita en esta Cámara de Comercio el 17 de Julio de 2020 bajo el número 159,085 del Libro IX del Registro Mercantil.

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la Sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO		INSCRIPCION	
Acta No. 002	26/07/2013 Asamblea	95699	30/07/2013 del Libro IX
Acta No. 004	07/10/2013 Asamblea	97146	16/10/2013 del Libro IX
Acta No. 015	26/02/2019 Asamblea	147642	07/03/2019 del Libro IX
Acta No. 21	08/05/2021 Asamble	169418	11/05/2021 del Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la

0 371

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Cámara de Comercio de Cartagena, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal código CIIU: 4210
Actividad secundaria código CIIU: 4290
Otras actividades código CIIU: 4220, 4112

ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

A nombre de la persona jurídica figura matriculado en esta Cámara de Comercio el siguiente establecimiento de comercio/sucursal o agencia:

Nombre:	CONSTRUCCIONES Y OBRAS CIVILES DE LA COSTA S.AS.
Matrícula No.:	09-288083-02
Fecha de Matrícula:	14 de Junio de 2011
Ultimo año renovado:	2024
Categoría:	Establecimiento-Principal
Dirección:	KM 21 SECTOR LA TORTUGA, FINCA VILLA ZULENA, VARIANTE MAMONAL GAMBOTE
Municipio:	TURBANA, BOLIVAR, COLOMBIA

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

0 372

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SE RECOMIENDA VERIFICAR EL PORTAL WWW.GARANTIASMOBILIARIAS.COM.CO DONDE PUEDEN OBRAR INSCRIPCIONES ADICIONALES RELATIVAS A GARANTIAS MOBILIARIAS, CONTRATOS QUE GARANTICEN OBLIGACIONES O LIMITACIONES DE LA PROPIEDAD.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es mediana.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $8,226,199,309.00

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU: 4210

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en la ley 527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es una representación gráfica de la firma del Secretario de la Cámara de Comercio de Cartagena, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos PDF.

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual, puede imprimirlo con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio de Cartagena. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar su contenido, hasta cuatro (4) veces durante 60 días calendario contados a partir del momento de su expedición, ingresando a www.certificadoscamara.com y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento.

0 373

364

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o a través de la plataforma virtual de la Cámara.

CESAR ALONSO ALVARADO BARRETO
DIRECTOR DE SERVICIOS REGISTRALES,
ARBITRAJE Y CONCILIACION

0 374

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: CONSTRUMAS DE LA COSTA S.A.S
ORGANIZACIÓN JURÍDICA: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
CATEGORÍA : PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL
NIT : 900843927-4
ADMINISTRACIÓN DIAN : VALLEDUPAR
DOMICILIO : VALLEDUPAR

MATRICULA - INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 128410
FECHA DE MATRÍCULA : ABRIL 29 DE 2015
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2024
FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : MARZO 31 DE 2024
ACTIVO TOTAL : 3,983,198,672.00
GRUPO NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : CRA 50 NO. 08 - 16
BARRIO : EL PROGRESO
MUNICIPIO / DOMICILIO: 20001 - VALLEDUPAR
TELÉFONO COMERCIAL 1 : 3508685299
TELÉFONO COMERCIAL 2 : NO REPORTÓ
TELÉFONO COMERCIAL 3 : NO REPORTÓ
CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : contador.mary@gmail.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : CRA 50 NO. 08 - 16
MUNICIPIO : 20001 - VALLEDUPAR
BARRIO : EL PROGRESO
CORREO ELECTRÓNICO : contador.mary@gmail.com

NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **SI AUTORIZO** para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico de notificación : contador.mary@gmail.com

CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL : F4290 - CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
ACTIVIDAD SECUNDARIA : F4210 - CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS DE FERROCARRIL
OTRAS ACTIVIDADES : F4220 - CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO

CERTIFICA - CONSTITUCIÓN

POR DOCUMENTO PRIVADO NÚMERO 1 DEL 27 DE ABRIL DE 2015 DE LA ASAMBLEA CONSTITUTIVA, REGISTRADO EN

0 375

ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 27461 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 29 DE ABRIL DE 2015, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA CONSTRUMAS DE LA COSTA S.A.S.

CERTIFICA - VIGENCIA

QUE LA DURACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA (VIGENCIA) ES HASTA EL 28 DE ABRIL DE 2065

CERTIFICA - OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRA COMO OBJETO SOCIAL LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: PRESTAR SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL, MECANICA, METALMECANICA, ARQUITECTURA, COMO LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIAS, CONSULTORIAS, DISEÑO, GESTION, CONTROL, PROVEEDURIA, ESTUDIOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LAS RAMAS DE INGENIERIA CIVIL, ELECTRICA, MECANICA, METALMECANICA, ARQUITECTURA, SUMINISTRO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES EN LA RAMA DE LA INGENIERIA, ANOTADAS, ADEMAS: 1) CELEBRAR Y EJECUTAR PROGRAMAS, PROYECTOS Y CONVENIOS, ENTRE ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS, DE CARACTER NACIONAL E INTERNACIONAL. ADEMAS CONCERTAR O CONTRATAR CON PARTICULARES O CON EL ESTADO Y/O SUS ENTIDADES TERRITORIALES LA PROMOCION, EJECUCION, EVALUACION, ASESORIA O ELABORACION DE PLANES DE DESARROLLO, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO E INTERVENTORIAS DE ESTUDIOS JURIDICOS Y SOCIOECONOMICOS, DE PRE INVERSION O INVERSION, PRE FACTIBILIDAD O FACTIBILIDAD. 2) CELEBRAR CONVENIOS DE ASOCIACION CON PERSONAS JURIDICAS DERECHO PUBLICO Y PRIVADO CON EL FIN DE IMPULSAR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE INTERES PUBLICO. 3) IMPLEMENTACION DE PROCESOS DE MODERNIZACION EMPRESARIAL PARA LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS Y TODO LO RELACIONADO A REALIZAR CONSULTORIAS EN LO REFERENTE A FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE DICHAS EMPRESAS. 4) PROMOCIONAR GESTIONAR Y EJECUTAR PROGRAMAS Y PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL. 5) PROMOCION Y EJECUCION DE PLANES DE ATENCION BASICA DE LOS ENTES TERRITORIALES, ASI COMO LA FORMULACION DE PLANES LOCALES PARA LA PREVENCION DE DESASTRES. LA SOCIEDAD PODRA LLEVAR A CABO, EN GENERAL, TODAS LAS OPERACIONES, DE CUALQUIER NATURALEZA QUE ELLAS FUEREN, RELACIONADAS CON EL OBJETO MENCIONADO, ASI COMO CUALESQUIERA ACTIVIDADES SIMILARES, CONEXAS O COMPLEMENTARIAS O QUE PERMITAN FACILITAR O DESARROLLAR EL COMERCIO A LA INDUSTRIA DE LA SOCIEDAD. TAMBIEN PODRA PRESTAR SERVICIOS DE LOGISTICA Y MANIPULACION DE CARGA NACIONAL E INTERNACIONAL ASI COMO EL TRANSPORTE DE LA MISMA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL.

CERTIFICA - CAPITAL

TIPO DE CAPITAL	VALOR	ACCIONES	VALOR NOMINAL
CAPITAL AUTORIZADO	1.000.000,00	1.000,00	1.000,00
CAPITAL SUSCRITO	1.000.000,00	1.000,00	1.000,00
CAPITAL PAGADO	1.000.000,00	1.000,00	1.000,00

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES

POR DOCUMENTO PRIVADO NÚMERO 1 DEL 27 DE ABRIL DE 2015 DE ASAMBLEA CONSTITUTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 27461 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 29 DE ABRIL DE 2015, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	CORTES GUERRA MARILUZ	CC 26,946,164

CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES

0 376

REPRESENTACION LEGAL: LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARA A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN PODRA UNO O VARIOS SUPLENTES ENVESTIDOSS CON LAS MISMAS FACULTADES DEL PRINCIPAL, DESIGNADOS PARA UN TERMINO DE UN AÑO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. LAS FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL TERMINARAN EN CASO DE DIMISION O REVOCACION POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, DE DECESO O DE INCAPACIDAD EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA NATURAL Y EN CASO DE LIQUIDACION PRIVADA O JUDICIAL, CUANDO EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA JURIDICA. LA CESACION DE LAS FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL, POR CUALQUIER CAUSA, NO DA LUGAR A NINGUNA INDEMNIZACION DE CUALQUIER NATURALEZA, DIFERENTE DE AQUELLAS QUE LE CORRESPONDIEREN CONFORME A LA LEY LABORAL, SI FUERE EL CASO. LA REVOCACION POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS NO TENDRA QUE ESTAR MOTIVADA Y PODRA REALIZARSE EN CUALQUIER TIEMPO. EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA JURIDICA, LAS FUNCIONES QUEDARAN A CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD. TODA REMUNERACION A QUE TUVIERE DERECHO EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, DEBERA SER APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LA SOCIEDAD SERA GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRA RESTRICCIONES DE CONTRATACION POR RAZON DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTIA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERA QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRA CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERA INVESTIDO DE LOS MAS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCION DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARA OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTA PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMAS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SI O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURIDICA PRESTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTIA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

CERTIFICA

REVISOR FISCAL - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 6 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 39888 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2019, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL	SAN MARTIN CONRADO HEIMER JOSE	CC 7,572,200	142883T

CERTIFICA - ESTABLECIMIENTOS

QUE ES PROPIETARIO DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO EN LA JURISDICCIÓN DE ESTA CÁMARA DE COMERCIO:

*** **NOMBRE ESTABLECIMIENTO** : CONSTRUMAS DE LA COSTA
MATRICULA : 128411
FECHA DE MATRICULA : 20150429
FECHA DE RENOVACION : 20240331
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2024
DIRECCION : MZ D CA 9 BRR MARIA CAMILA SUR
BARRIO : ALAMOS II
MUNICIPIO : 20001 - VALLEDUPAR
TELEFONO 1 : 3508685299

0 377

CORREO ELECTRONICO : contador.mary@gmail.com
ACTIVIDAD PRINCIPAL : F4290 - CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
ACTIVIDAD SECUNDARIA : F4210 - CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS DE FERROCARRIL
OTRAS ACTIVIDADES : F4220 - CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO
VALOR DEL ESTABLECIMIENTO : 3,983,198,672

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MEDIANA EMPRESA

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $7,184,722,865
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : F4290

CERTIFICA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

CERTIFICA

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : $11,600

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar hasta po 60 días y cuantas veces lo requiera, el contenido del mismo, ingresando al enlace https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=39 seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación hHrW63TxHQ

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

EDGAR RINCON CASTILLA
Secretario

***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

0 378
