ACTA No. 5.			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Reunion N° 3 Revision Diseño Arquitectónico			
CIUDAD Y FECHA: PEREIRA.	Jun-25-2025	HORA INICIO: 8:00 Am.	HORA FIN: 11:00 Am.
LUGAR Y/O ENLACE:	TALLER BOSCO.	DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO: Centro de Comercio y Servicios	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: Revision Avance de las obras. Revisión Diseño Arquitectónico TALLER BOSCO.			
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Realizar Acompañamiento al Desarrollo de las obras.			

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Ya ejecutadas las demoliciones y desmontes en un 100%. se evidencian varias Actividades Nuevas que se requieren ejecutar No contempladas en el contrato, para lo cual se pasará al Apoyo tecnico de la supervisión ing. Alaicol Galvis Ramirez los correspondientes Análisis de precios unitarios de las siguientes Actividades

1. cerramiento provisional con tela verde Yute h=3.30
2. Demolicion Muro en Soga Manual.
3. Demolición Piso en Concreto sobre terreno Natural
4. Desmonte Puntos Electricos
5. Desmonte Puntos Hidrosanitarios.
6. Desmonte tablero de distribución.
7. Demolición Fachaleta. Escarificacion Muro de CONTENSION.

Powered by CamScanner

8. Cork y Demolicion de gabinete proteccion tuberia hidraulica.

9. Caja de paso Electrica.

- Se socaliza con el ing. Marcal Galvis Ramirez en calidad de Apoyo tecnico a la supervision. se socaliza con los instructores sena Jose Barreto y Michael Jimenez junto con el supervisor del contrato el Diseño Arquitectonico del TALLER BOSCO.
  se procede a dar Visto Bueno al diseño Arquitectónico para proceder asi con la construccion de Muros, contratacion del Acero inoxidable, Diseño Estructural. de los elementos No estructurales, Diseño Electrico y diseño hidrosanitario.
- Se socaliza al supervisor del contrato junto con el ing. Marcal galvis Ramirez el Avance de obra, se Muestran detalles de Nivel de piso por lo superficial de la Cimentacion para el riego de la tuberia hidrosanitaria.
- Se solicita al supervisor y al ing. Marcal la Necesidad de realizar en el sitio de la obra reunion con el Sr. Jimmy Perez encargado de la parte electrica de las instalaciones fisicas del SENA para revisar los temas electricos de la instalacion a tierra localizada en el sitio de la obra.


Powered by CamScanner

Instalación de ventana de 150cm no se instalara.

Item 9.05.

Tampoco se comprueban sillan para barras acero inoxidable

Item 9.06.

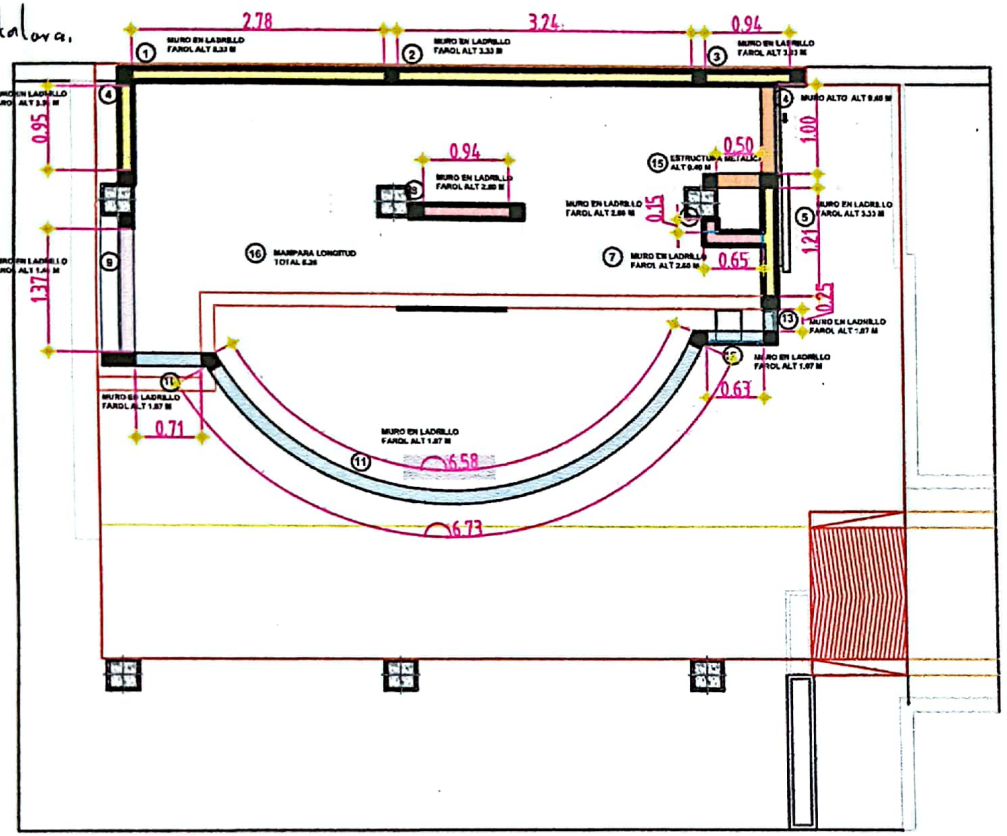


NTIDADES DE MURO

LA 1_75 CIM-01

ENCARGADOS		OBJETO DE CONTRATO	DATOS GENERALES	CONTENIDO	DEL PLANO
Contratista Arq. Beatriz Eugenia Ramirez Restrepo. M.P 1770053416	Residente Arq. Jhonier Fernando Duque Marles. M.P A17832020-1112765788			01 - CANTIDADES DE MURO	
Interventor Ing. C.C				ESCALA: 1/75 · FECHA: Junio - 25 - 2025 · PLANO:	

Reunión ajustes ... José Barreto y Michael ... Arq. Beatriz Ramirez.

1. Mueble Recibo lavaplatos Ancho 55cm. entrepaño con puerta corrediza. agregar
2. poceta o lavaplatos .45x.60 largo.
3. 2 salida de agua del lavaplatos.
4. se acuerda llevar nivel interior ± 12 cm nivel ext. a nivel de circulación.

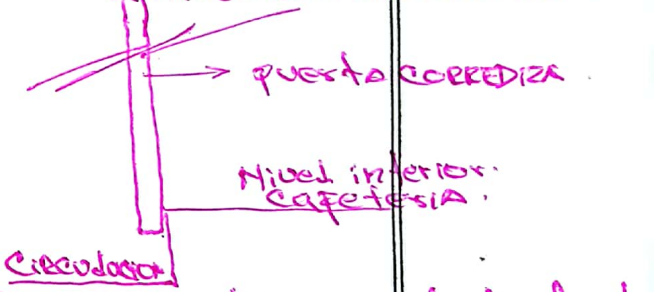

5. piso interior industrializado piso exterior en tablon o tableta trafico 5.
6. se va pasar el plano empotrados al electricista. Para realizar el diseño electrico.

Michael Jimenez T.

JUN-26-2025

4/6

Powered by CamScanner

CONCLUSIONES

Coordinar Reunion con los encargados de la parte electrica del ~~Edificio SENA~~ para determinar Acciones a realizar con el sistema a tierra encontrado en la demolicion del pa

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Coordinar Reunion	1 de Julio	Apoyo a la supervi Sarg. Maicol G.	

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES

NOMBRE	DEPENDENCIA/ EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
José Rogelio Baena Gómez	Centro de Comercio y servicios	SI	SIN	
Maicol Galvis Ramirez	Centro de Comercio y servicios	SI	SIN	

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

Powered by CamScanner
