INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA

INFORME MENSUAL No. 12
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MICROEMPRESA "COOTRAFLOR"

CONTRATO 1437 de 2024

PERIODO: 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025

MAYO DE 2025

1. INTRODUCCIÓN

Los contratos de las microempresas están encaminados en realizar el mantenimiento rutinario en las vías a cargo del Instituto Nacional de Vías, de acuerdo las actividades descritas continuación, atendiendo y dando cumplimiento a la logística de trabajos, logística de personal y logística de transporte.

El cumplimiento de nuestro mantenimiento rutinario es el conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente a lo largo de la vía, que tiene como finalidad principal la preservación de todos los elementos de la infraestructura vial con la mínima cantidad de alteraciones o de daños y, en lo posible, conservando las condiciones que tiene después de la construcción o mejoramiento.

Por lo anterior y teniendo en cuenta que se requiere garantizar el mantenimiento rutinario de algunas vías a cargo del Instituto Nacional de Vías, se adelanta el programa de Mantenimiento Rutinario con el fin de contribuir, mantener y aplicar el significado ya mencionado, preservando el patrimonio de la nación durante periodos continuos, evitando el periodo prematuro de las estructuras viales, ofreciendo una atención oportuna con tiempo de respuesta casi inmediata ante cualquier evento, buscando mantener los tiempo de desplazamiento para los cuales está diseñada la vía.

Partiendo de las obligaciones contractuales de la **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS LAS FLOREZ "COOTRAFLOR", Lote 1, Dirección Territorial Córdoba – INVIAS,** expuestas en el párrafo anterior, se realiza el presente Informe mensual, el cual corresponde al conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente a lo largo de la vía, comprendidas en el periodo del primero (1) y el treinta (30) de abril de 2025.

2. OBJETIVOS

Realizar las actividades de Mantenimiento Rutinario de las Carreteras a cargo de la Dirección Territorial Córdoba – INVÍAS, coordinadas, inspeccionadas, revisadas, evaluadas, etc. bajo la responsabilidad del Administración Vial, Grupo 1.

3. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO DE LA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS LAS FLOREZ COOTRAFLOR"

El contrato 1437 de 2024 tiene como objeto el SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN LOS SECTORES 74CR02 SANTA LUCIA - MOÑITOS, PR0+0000 LAS CRUCES) - PR55+0000 9002 ARBOLETES - PUERTO REY, PR82+0000 -PR86+0858 7401 PUERTO REY - MONTERÍA, PR63+0340 - PR64+0000 (INCLUYE PUENTE GUSTAVO ROJAS PINILLA), LOTE 1.

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A CARGO DE LA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS LAS FLOREZ "COOTRAFLOR"

4.1 SECTORES A CARGO DE COOTRAFLOR.

La microempresa COOTRAFLOR encargada del Mantenimiento Vial Rutinario, tiene a su cargo el siguiente sector:

→ ***COOTRAFLOR***

- Vía 74CR02 Santa Lucia - Moñitos PR0+0000 (Las Cruces) - PR55+0000
- Vía 9002 Arboletes - Puerto Rey PR82+0000 - PR86+0858
- Vía 7401 Puerto Rey - Montería, PR63+0340 - PR 64+0000 (Incluye Puente Gustavo Rojas Pinilla)

4.2 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DE LA MICROEMPRESA COOTRAFLOR.

4.2.1 ACTIVIDADES GENERALES

La presente A.M.V., tiene a su cargo a la microempresa "COOTRAFLOR", la cual se encarga de realizar las actividades de Mantenimiento Vial Rutinario en los sectores de las VIAS 74CR02 SANTA LUCIA MOÑITOS PR0+0000 (LAS CRUCES) - PR55+0000, 9002 ARBOLETES - PUERTO REY PR82+0000 - PR86+0858, 7401 PUERTO REY - MONTERIA, PR63+0340 - PR64+0000 (INCLUYE PUENTE GUSTAVO ROJAS PINILLA, a cargo de la Dirección Territorial Córdoba – INVÍAS. Las actividades con las cuales se evalúa la labor desempeñada por los mismos, son las siguientes:

425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m
	G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)	
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U
	LIMPIEZA DE PUENTES	
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U
545	LIMPIEZA MANUAL DEL LECHO DEL RÍO	m
547	LIMPIEZA MANUAL DE CURSOS DE AGUA	m
	I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS	
625	DESPEJE DE DERRUMBES	m3
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	U
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	U
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m
694	VIGILANCIA	Gl

4.2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO EVALUADO

A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas durante el mes de abril de 2025 para dar cumplimiento a lo establecido en los pliegos de condiciones:

→ ***COOTRAFLOR (CONTRATO 1437 DE 2024)***

Las actividades desarrolladas por la cooperativa durante este periodo fueron las siguientes:

- ***VIA 74CR02 SANTA LUCIA – MOÑITOS.***

Semana 1: Martes 1 – Domingo 6 de Abril de 2025.

- Rocería y desmonte manual desde el PR19+0800 hasta el PR23+0500, desde el PR23+0500 hasta el PR27+0000, desde el PR27+0000 hasta el PR31+0000, desde el PR33+0000 hasta el PR34+0300 y desde el PR9+0000 hasta el PR12+0400, en ambos lados de la vía con 40 jornales de trabajo.
- Limpieza de cunetas desde el PR24+0800 hasta el PR25+0020 y desde el PR47+0100 hasta el PR47+0250, en donde se limpiaron 370 metros lineales con 12 jornales de trabajo.
- Limpieza de obras de arte desde el PR10+0257 hasta el PR15+0850, en donde se limpiaron 2 obras con 3 jornales de trabajo.
- Limpieza de calzada en el PR51+0800 y en el PR21+0050, con 3 jornales de trabajo.
- Limpieza de andenes en el PR51+0800 y en el PR52+0250, con 2 jornales de trabajo.
- Poda, corte y/o retiro de árboles en el PR22+0700, en el PR39+0100 y en el PR39+0151, en donde se podaron 3 árboles con 2 jornales de trabajo.
- Despeje de señales verticales desde el PR47+0350 hasta el PR47+0400, en donde se despejaron 3 señales con 2 jornales de trabajo.
- Limpieza de descole y disipador de energía en el PR47+0260, con 2 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 2: Lunes 7 – Domingo 13 de Abril de 2025.

- Rocería y desmonte manual desde el PR12+0400 hasta el PR16+0000, desde el PR8+0550 hasta el PR9+0250, desde el PR19+0000 hasta el PR20+0000, desde el PR46+0500 hasta el PR55+0000 y desde el PR27+0550 hasta el PR29+0000, en ambos lados de la vía con 42 jornales de trabajo.

- Limpieza de cunetas desde el PR13+0100 hasta el PR13+0250, desde el PR49+0200 hasta el PR50+0300, desde el PR50+0600 hasta el PR51+0000, desde el PR51+0100 hasta el PR51+0600 y desde el PR25+0000 hasta el PR25+0120, en donde se limpiaron 2100 metros lineales con 24 jornales de trabajo.
- Poda, corte y/o retiro de árboles en el PR49+0350, en el PR19+0300 y en el PR27+0550, en donde se podaron 3 árboles con 2 jornales de trabajo.
- Limpieza de descole y disipador de energía en el PR50+0300, con 2 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 3: Lunes 14 – Domingo 20 de Abril de 2025.

- Rocería y desmonte manual desde el PR4+0500 hasta el PR7+0100, en ambos lados de la vía con 10 jornales de trabajo.
- Limpieza de cunetas desde el PR47+0500 hasta el PR47+0700, en donde se limpiaron 200 metros lineales con 4 jornales de trabajo.
- limpieza de descole y disipador de energía en el PR5+0300 y en el PR6+0900, con 2 jornales de trabajo.
- Despeje de señales verticales en el PR5+0200, en el PR47+0250 y en el PR47+0600 en donde se despejaron tres señales con 2 jornales de trabajo.
- Despeje de zona de carretera en el PR44+0600, con 3 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 4: Lunes 21 – Domingo 27 de Abril de 2025.

- Rocería y desmonte manual desde el PR0+0000 hasta el PR3+0100, desde el PR3+0100 hasta el PR5+0500, desde el PR6+0900 hasta el PR9+0050, desde el PR35+0600 hasta el PR38+0100, desde el PR16+0000 hasta el PR20+0000 y desde el PR38+0000 hasta el PR40+0200, en ambos lados de la vía con 58 jornales de trabajo.
- Limpieza de cunetas desde el PR0+0300 hasta el PR0+0450 desde el PR4+0700 hasta el PR4+0950, desde el PR7+0450 hasta el PR7+0660 y desde el PR17+0800 hasta el PR18+0050, en donde se limpiaron 860 metros lineales con 16 jornales de trabajo.
- Limpieza de obras de arte desde el PR37+0100 hasta el PR37+0700 y desde el PR38+0700 hasta el PR38+0750, en donde se limpiaron 4 obras con 7 jornales de trabajo.
- Limpieza del puente Regino en el PR34+0542 y el puente Aguas Blancas en el PR6+0979, con 22 jornales de trabajo.

- Despeje de señales verticales en el PR1+0150, en el PR1+0400, en el PR18+0200 y en el PR38+0070, en donde se despejaron 4 señales con 2 jornales de trabajo.
- Limpieza de descole y disipador de energía en el PR3+0300, en el PR4+0730 en el PR4+0900, y en el PR17+0850, con 4 jornales de trabajo.
- Limpieza de gavión desde el PR7+0050 hasta el PR7+0070, en donde se limpiaron 20 metros lineales con 2 jornales de trabajo.
- Poda, corte y/o retiro de árboles en el PR37+0750, en el PR38+0050 y en el PR39+0000, en donde se podaron 3 árboles con 2 jornales de trabajo.
- Despeje de zona de carretera en el PR37+0800, con 2 jornales de trabajo.
- Bacheo con material de afirmado en el PR32+0500, con 2 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 5: Lunes 28 – Miércoles 30 de Abril de 2025.

- Rocería y desmonte manual desde el PR20+0000 hasta el PR22+0000 y desde el PR22+0000 hasta el PR24+0500, en ambos lados de la vía con 18 jornales de trabajo.
- Elaboración e instalación de postes de referencia entre el PR45+0000 y el PR55+0000, en donde se colocaron 11 postes con 4 jornales de trabajo.
- Despeje de zona de carretera en el PR43+0350, con 2 jornales de trabajo.
- Aplomado de señal vertical en el PR44+0000, con 2 jornales de trabajo.
- Poda, corte y/o retiro de árboles en el PR40+0200, en donde se podo un árbol con 2 jornales de trabajo.
- Limpieza de berma desde el PR20+0100 hasta el PR20+0370, en donde se limpiaron 270 metros lineales con 6 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

➢ ***VIA 7401 PUERTO REY – MONTERIA.***

Semana 1: Martes 1 – Domingo 6 de Abril de 2025.

- Control de tráfico pesado con paleteros en el PR63+0450 - Puente Gustavo Rojas Pinilla, con 42 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 2: Lunes 7 – Domingo 13 de Abril de 2025.

- Control de tráfico pesado con paleteros en el PR63+0450 - Puente Gustavo Rojas Pinilla, con 49 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 3: Lunes 14 – Domingo 20 de Abril de 2025.

- Control de tráfico pesado con paleteros en el PR63+0450 - Puente Gustavo Rojas Pinilla, con 49 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 4: Lunes 21 – Domingo 27 de Abril de 2025.

- Control de tráfico pesado con paleteros en el PR63+0450 - Puente Gustavo Rojas Pinilla, con 49 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 5: Lunes 28 – Miércoles 30 de Abril de 2025.

- Control de tráfico pesado con paleteros en el PR63+0450 - Puente Gustavo Rojas Pinilla, con 21 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

➢ ***VIA 9002 ARBOLETES - PUERTO REY.***

Semana 1: Martes 1 – Domingo 6 de Abril de 2025.

- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 2: Lunes 7 – Domingo 13 de Abril de 2025.

- Parcheo con asfalto frio en el PR85+0480, en el PR85+0380, y en el PR84+0080, en donde se colocaron 4 sacos con 2 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 3: Lunes 14 – Domingo 20 de Abril de 2025.

- Rocería y desmonte manual desde el PR82+0000 hasta el PR86+0858, en ambos lados de la vía con 8 jornales de trabajo.

- Limpieza de cunetas desde el PR84+0000 hasta el PR84+0150, en donde se limpiaron 150 metros lineales con 4 jornales de trabajo.
- Limpieza de puente El Volcán en el PR82+0010, con 11 jornales de trabajo.
- Poda, corte y/o retiro de árboles en el PR86+0600, en donde se podaron 2 árboles con 2 jornales de trabajo.
- Limpieza de Gavión desde el PR83+0900 hasta el PR83+0960, en donde se limpiaron 60 metros lineales con 3 jornales de trabajo.
- limpieza de descole y disipador de energía en el PR84+0050, con 2 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 4: Lunes 21 – Domingo 27 de Abril de 2025.

- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 5: Lunes 28 – Miércoles 30 de Abril de 2025.

- Elaboración e instalación de poste de referencia en el PR83+0000, en donde se colocó 1 poste con 2 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Las actividades programadas por la A.M.V. para el período comprendido entre el primero (1) y el treinta (30) de abril de 2025. fueron ejecutadas en su totalidad por la cooperativa.

4.3 PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La Seguridad y Salud en el trabajo tiene por objeto la prevención y limitación de riesgos, así como la protección contra accidentes, enfermedades profesionales y en general capaces de producir daños a las personas.
La cooperativa está cumpliendo con los elementos de protección personal que deben ser utilizados cada vez que se ejecute una actividad en el mantenimiento rutinario, lo que requiere y exige el Instituto nacional de Vías, las cuales son las siguientes:

- Botas de seguridad.
- Delantales para las guadañas.
- Canilleras.
- Caretas.
- Gafas.
- Tapa oídos.
- Guantes.

La sede de la cooperativa está ubicada en el corregimiento las Florez, en el PR35+0600, vía 74CR02, en donde puede consultar la documentación del contrato de la cooperativa y de los temas administrativos.

4.4 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL EN LA JORNADA DE TRABAJO.

Se cuenta con la señalización temporal en la jornada de trabajo acorde con lo exigido por INVIAS, para brindar protección tanto a los trabajadores como a los usuarios de la vía mientras se ejecutan las distintas actividades de mantenimiento rutinario.

Se dispone de la siguiente señalización temporal mientras se ejecutan dichas labores:

- 4 señales temporales.
- 4 conos
- 1 malla protectora siempre y cuando se trabaje con la actividad de rocería.

5. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE LA MICROEMPRESA

MICROEMPRESA	**COOTRAFLOR C.T.A.**
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN LOS SECTORES 74CR02 SANTA LUCIA - MOÑITOS, PR0+0000 LAS CRUCES) - PR55+0000 9002 ARBOLETES - PUERTO REY, PR82+0000 -PR86+0858 7401 PUERTO REY - MONTERÍA, PR63+0340 -PR64+0000 (INCLUYE PUENTE GUSTAVO ROJAS PINILLA), LOTE 1.
NÚMERO DEL CONTRATO	1437 de 2024.
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL	Hasta el 31 de julio de 2026.
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	17 de mayo de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	31 de julio de 2026
VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL	$2.760.457.438,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$2.760.457.438,00

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Una vez pasada la revista de la Interventoría correspondiente al presente informe, se resalta que la cooperativa en lo que respecta a sus labores de mantenimiento rutinario de la carretera cumplieron con los indicadores medidos por el Administrador Vial.

La cooperativa Cootraflor informó diariamente por medio del aplicativo WhatsApp publicando las evidencias (fotos) de las actividades desarrolladas durante el día.

En el transcurso del mes de abril de 2025 se ejecutaron las actividades en varios sectores para cumplir con lo exigido por INVIAS en lo relacionado con el ornato y embellecimiento de la vía.

En este periodo se realizaron actividades complementarias. Todo esto con el fin de mantener un funcionamiento óptimo de la vía.

Se elaboraron e instalaron 12 postes de referencia en concreto en puntos faltantes para mejorar la referenciación sobre la vía 74CR02 y la vía 9002.

Se colocaron 4 sacos de asfalto frio para la actividad de tapahuecos en puntos críticos de la vía 9002.

La cooperativa estuvo disponible para atender las emergencias que pudieran ocurrir en las vías a cargo.

Los trabajadores de mantenimiento rutinario asistieron a la capacitación programada por la AMV cuyo tema fue "Salud Mental".

ANEXOS

CUADRO RENDIMIENTOS MENSUALES

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS LAS FLOREZ - COOTRAFLOR C.T.A.
NIT. No. 800161679-2.
CONTRATO No. 1437 DE 2024

PERÍODO: 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025

ACTIVIDAD ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

VÍAS 74CR02: SANTA LUCIA - MOÑITOS, 9002: ARBOLETES - PUERTO REY Y 7401: PUERTO REY - MONTERIA

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		ANCHO PROMEDIO		LONG	CANT (Ha)	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	KM				
PR19+0800	PR23+0500	4	5	3,70	3,33	8	0,42	VIA 74CR02
PR23+0500	PR27+0000	4	5	3,50	3,15	8	0,39	VIA 74CR02
PR27+0000	PR31+0000	4	4	4,00	3,20	8	0,40	VIA 74CR02
PR33+0000	PR34+0300	4	4	1,30	1,04	8	0,13	VIA 74CR02
PR9+0000	PR12+0400	3	4	3,40	2,38	8	0,30	VIA 74CR02
PR12+0400	PR16+0000	4	3	3,60	2,52	8	0,32	VIA 74CR02
PR8+0550	PR9+0250	4	4	0,70	0,56	8	0,07	VIA 74CR02
PR19+0000	PR20+0000	4	5	1,00	0,90	6	0,15	VIA 74CR02
PR46+0500	PR55+0000	3	3	8,50	5,10	10	0,51	VIA 74CR02
PR27+0550	PR29+0000	4	4	1,45	1,16	10	0,12	VIA 74CR02
PR4+0500	PR7+0100	4	4	2,60	2,08	10	0,21	VIA 74CR02
PR82+0000	PR86+0858	3	4	4,86	3,40	8	0,43	VIA 9002
PR+00	PR3+0100	4	3	3,10	2,17	10	0,22	VIA 74CR02
PR3+0100	PR5+0500	4	4	2,40	1,92	10	0,19	VIA 74CR02
PR6+0900	PR9+0050	4	4	2,15	1,72	10	0,17	VIA 74CR02
PR35+0600	PR38+0100	5	5	2,50	2,50	8	0,31	VIA 74CR02
PR16+0000	PR20+0000	4	5	4,00	3,60	10	0,36	VIA 74CR02
PR38+0000	PR40+0200	4	4	2,20	1,76	10	0,18	VIA 74CR02
PR20+0000	PR22+0000	4	4	2,00	1,60	8	0,20	VIA 74CR02
PR22+0000	PR24+0500	4	4	2,50	2,00	8	0,25	VIA 74CR02

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE CUNETAS

VÍAS 74CR02: SANTA LUCIA - MOÑITOS, 9002: ARBOLETES - PUERTO REY Y 7401: PUERTO REY - MONTERIA

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO CUNETA		SECCIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
PR24+0800	PR25+0020	X		V	220	6	36,7	VIA 74CR02
PR47+0100	PR47+0250	X		V	150	6	25,0	VIA 74CR02
PR13+0100	PR13+0250	X		V	150	4	37,5	VIA 74CR02
PR49+0200	PR50+0300	X		V	780	6	130,0	VIA 74CR02
PR50+0600	PR51+0000	X		V	800	6	133,3	VIA 74CR02
PR51+0100	PR51+0600	X		V	250	4	62,5	VIA 74CR02
PR25+0000	PR25+0120	X		V	120	4	30,0	VIA 74CR02
PR84+0000	PR84+0150	X		V	150	4	37,5	VIA 9002
PR47+0500	PR47+0700	X		V	200	4	50,0	VIA 74CR02
PR+0300	PR+0450	X		V	150	4	37,5	VIA 74CR02
PR4+0700	PR4+0950	X		V	250	4	62,5	VIA 74CR02
PR7+0450	PR7+0660	X		V	210	4	52,5	VIA 74CR02
PR17+0800	PR18+0050	X		V	250	4	62,5	VIA 74CR02

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE DEFENSAS METALICAS

VÍAS 74CR02: SANTA LUCIA - MOÑITOS, 9002: ARBOLETES - PUERTO REY Y 7401: PUERTO REY - MONTERIA

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		UBICACIÓN		CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER				

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE BERMAS

VÍAS 74CR02: SANTA LUCIA - MOÑITOS, 9002: ARBOLETES - PUERTO REY Y 7401: PUERTO REY - MONTERIA

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO DE BERMA		UBICACIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
PR20+0100	PR20+0370	X		I-D	270	6	45,0	VIA 74CR02

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS LAS FLOREZ - COOTRAFLOR C.T.A.
NIT. No. 800161679-2.
CONTRATO No. 1437 DE 2024

PERÍODO: 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS

VÍAS 74CR02: SANTA LUCIA - MOÑITOS, 9002: ARBOLETES - PUERTO REY Y 7401: PUERTO REY - MONTERIA

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		CANTIDAD	CANTIDAD (ML)		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	UND	ENCOLES	DESCOLES			
PR10+0257	PR15+0850	2	2	2	3	0,67	VIA 74CR02
PR37+0100	PR37+0700	3	3	3	4	0,75	VIA 74CR02
PR38+0700	PR38+0750	1	1	1	3	0,33	VIA 74CR02

ACTIVIDAD RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

VIA 74CR02: SANTA LUCIA - MOÑITOS, 9002: ARBOLETES - PUERTO REY Y 7401: PUERTO REY - MONTERIA

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR	TIPO DE SUELO	VOLUMEN	ABSCISAS		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
			INICIAL	FINAL			

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

VÍAS 74CR02: SANTA LUCIA - MOÑITOS, 9002: ARBOLETES - PUERTO REY Y 7401: PUERTO REY - MONTERIA

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	NOMBRE	LONGITUD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
PR82+0010	EL VOLCAN	20	11	1,82	VÍA 9002
PR34+0452	REGINO	12,95	11	1,18	VÍA 74CR02
PR6+0979	PUENTE AGUAS BLANCAS	30	11	2,73	VÍA 74CR02

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE SEÑALES

VÍAS 74CR02 SANTA LUCIA - MOÑITOS

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	UBICACIÓN		CANT	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
	DER	IZQ				

OTRAS ACTIVIDADES

- Se realizó la actividad de Limpieza de calzada en el PR51+0800 y PR21+0050 de la vía 74CR02.
- Se realizó la actividad de limpieza de andenes en el PR51+0800 y en el PR52+0250 de la vía 74CR02.
- Se realizó la actividad de poda, corte y/o retiro de arboles en sectores varios de la vía 74CR02 y 9002.
- Se realizó la actividad de despeje de señales verticales en sectores varios de la vía 74CR02.
- Se realizó la actividad de limpieza de descole y disipadores de energia en sectores varios de la vía 74CR02 y 9002.
- Se realizó la actividad de tapahuecos con asfalto frio en el PR85+0480, en el PR85+0380 y en el PR84+0080 de la vía 9002
- Se realizó la actividad de limpieza de gavión desde el PR83+0900 hasta el PR83+0960 de la vía 9002 y desde el PR7+0050 hasta el PR7+0070 de la vía 74CR02.
- Se realizó la actividad de despeje de zona de carretera en el PR43+0350, en el PR44+0600 y en el PR37+0800 de la vía 74CR02.
- Se realizó la actividad de bacheo con material de afirmado en el PR32+0500 de la vía 74CR02 (sector en afirmado).
-Se realizó la actividad de elaboración e instalación de doce (12) postes de referencia en las vías 9002 y 74CR02.
- Se enderezó señal vertical de tránsito en el PR44+0000 de la vía 74CR02.
RESUMEN

ID	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	UND	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	% EJECUCIÓN
1	ROCERIA Y DESMONTE MANUAL		Ha	46,1	174	0,26	85%
2	LIMPIEZA DE CUNETAS		ML	3680	60	61,33	95%
3	LIMPIEZA DE BERMAS		ML	270	6	45,00	96%
4	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS		UND	6	3	2,00	95%
5	LIMPIEZA DE PUENTES		UND	3	33	0,09	97%
6	DESPEJE DE ZONA DE CARRETERA		ML	6	6	1,00	96%
7	TAPAHUECOS CON ASFALTO FRIO		UND	4	2	2,00	100%
8	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ARBOLES		UND	5	2	3	95%
9	CONTROL DE TRAFICO PESADO		JORNAL	210	7	30	100%

OBSERVACIONES

- Durante el mes de mayo se debe priorizar la actividad de rocería dada la deficiencia que se presenta en este indicador.
- Se debe realizar el retiro manual de pequeños derrumbes de las cunetas en concreto.
- Se debe continuar con la actividad de poda de ramas para despejar señales verticales y zona de carretera.
- En el mes de mayo se debe ejecutar la actividad de limpeza de zona de carretera como parte del ornato y embellecimiento de la vía.
- Se solicita verificar periodicamente el estado de las obras de drenaje, puentes y pontones para programar la limpieza donde se requiera.
- Durante este mes se debe delantar la limpieza de las señales capta faros y demás dispositivos de seguridad vial, para mantener en estado optimo estos elementos.

Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJOS ASOCIADOS DE LAS FLORES - COOTRAFLOR
ELIAS MANUEL VELASQUEZ LOPEZ
C.C. No. 15.030.359 de Lorica
Representante Legal

Nombre: COPEBA S.A.S
ANDREA DEL PILAR PEÑA SÁNCHEZ
C.C. No. 52.253.696 de Bogotá
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor - AMV G1

REGISTRO FOTOGRÁFICO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRAFLOR

ADMINISTRADOR VIAL:	COPEBA S.A.S	LOTE	1
CARRETERA:	74CR02: PUERTO REY - MOÑITOS - LORICA	SECTOR:	PUERTO REY - MOÑITOS - LORICA
FECHA:	01 - 06 DE ABRIL DE 2025	PR´s:	VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

VÍA 74CR02; PUERTO REY - MOÑITOS - LORICA

LIMPIEZA DE ANDENES

VÍA 74CR02; PR51+0950

ANTES



DESPUES



LIMPIEZA DE CALZADA

VÍA 74CR02; PR51+0800

ANTES




DESPUES



ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL

VÍA 74CR02; PR20+0000

ANTES

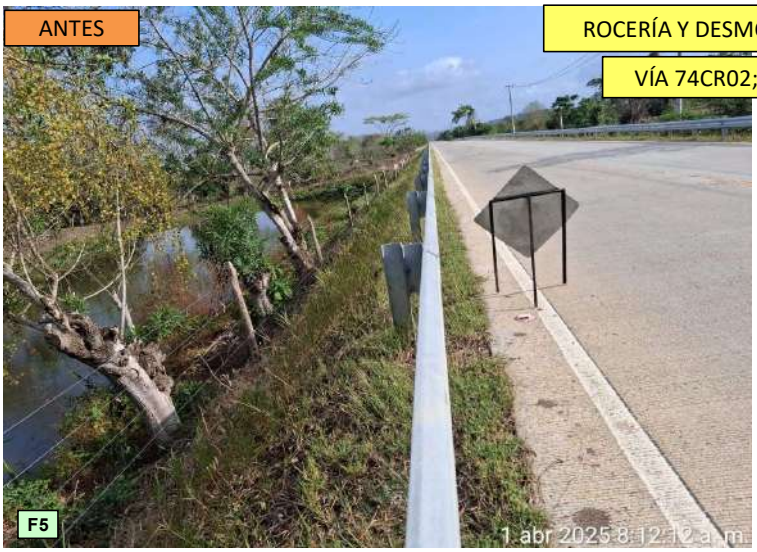

DESPUES



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRAFLOR

ADMINISTRADOR VIAL:	**COPEBA S.A.S**	**LOTE**	**1**
CARRETERA:	**74CR02: PUERTO REY - MOÑITOS - LORICA**	**SECTOR:**	**PUERTO REY - MOÑITOS - LORICA**
FECHA:	**01 - 06 DE ABRIL DE 2025**	**PR´s:**	**VARIOS**

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

VÍA 74CR02; PUERTO REY - MOÑITOS - LORICA

ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL

VÍA 74CR02; PR21+0150

ANTES



DURANTE



DESPEJE DE SEÑAL VERTICAL

VÍA 74CR02; PR22+0700

ANTES




DESPUES



LIMPIEZA DE CUNETA

VÍA 74CR02; PR24+0800

ANTES

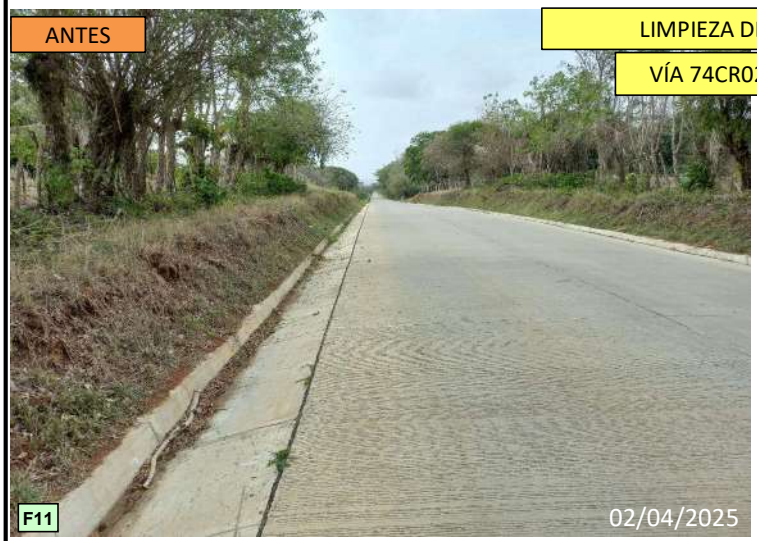

DURANTE



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRAFLOR

ADMINISTRADOR VIAL:	COPEBA S.A.S	LOTE	1
CARRETERA:	74CR02: PUERTO REY - MOÑITOS - LORICA	SECTOR:	PUERTO REY - MOÑITOS - LORICA
FECHA:	01 - 06 DE ABRIL DE 2025	PR´s:	VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

VÍA 74CR02; PUERTO REY - MOÑITOS - LORICA

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

VÍA 74CR02; PR24+0500

ANTES



DESPUES



DESPEJE DE SEÑALES VERTICALES

VÍA 74CR02; PR47+0350

DURANTE



DESPUES



DESPEJE DE SEÑALES VERTICALES

VÍA 74CR02; PR47+0400

ANTES



DESPUES



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACAVIL

ADMINISTRADOR VIAL:	COPEBA S.A.S	LOTE	1
CARRETERA:	74CR02: PUERTO REY - MOÑITOS - LORICA	SECTOR:	PUERTO REY - MOÑITOS - LORICA
FECHA:	08 - 14 DE JULIO DE 2024	PR´s:	VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

VÍA 74CR02; PUERTO REY - MOÑITOS - LORICA
ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL
VÍA 74CR02; PR32+0500

ANTES



DESPUES



LIMPIEZA DE CUNETAS
VÍA 74CR02; PR51+0300

ANTES



DESPUES



LIMPIEZA DE CUNETAS
VÍA 74CR02; PR51+0100

ANTES



DESPUES



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRAFLOR

ADMINISTRADOR VIAL:	**COPEBA S.A.S**	**LOTE**	**1**
CARRETERA:	**74CR02: PUERTO REY - MOÑITOS - LORICA**	**SECTOR:**	**PUERTO REY - MOÑITOS - LORICA**
FECHA:	**01 - 06 DE ABRIL DE 2025**	**PR´s:**	**VARIOS**

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

VÍA 74CR02; PUERTO REY - MOÑITOS - LORICA

ANTES

LIMPIEZA DE DESCOLE Y DISIPADOR

VÍA 74CR02; PR47+0260

DESPUES





ANTES

LIMPIEZA DE CUNETA

VÍA 74CR02; PR47+0100

DESPUES





DURANTE

ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL

VÍA 74CR02; PR36+0900

DESPUES





INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRAFLOR

ADMINISTRADOR VIAL:	COPEBA S.A.S	LOTE	1
CARRETERA:	74CR02: PUERTO REY - MOÑITOS - LORICA	SECTOR:	PUERTO REY - MOÑITOS - LORICA
FECHA:	01 - 06 DE ABRIL DE 2025	PR´s:	VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

VÍA 74CR02; PUERTO REY - MOÑITOS - LORICA

LIMPIEZA DE OBRA DE ARTE

VÍA 74CR02; PR10+0257

ANTES



DURANTE



LIMPIEZA DE OBRA DE ARTE

VÍA 74CR02; PR15+0850

ANTES



DESPUES



ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL

VÍA 74CR02; PR9+0220

ANTES



DESPUES



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRAFLOR

ADMINISTRADOR VIAL:	COPEBA S.A.S	LOTE	1
CARRETERA:	74CR02: PUERTO REY - MOÑITOS - LORICA	SECTOR:	PUERTO REY - MOÑITOS - LORICA
FECHA:	07 - 13 DE ABRIL DE 2025	PR´s:	VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

VÍA 74CR02; PUERTO REY - MOÑITOS - LORICA

LIMPIEZA DE CUNETAS

VÍA 74CR02; PR13+0100

ANTES



DESPUES



DURANTE

ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL

VÍA 74CR02; PR13+0250



DESPUES



ANTES

LIMPIEZA DE DESCOLE

VÍA 74CR02; PR50+0300



DESPUES



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRAFLOR

ADMINISTRADOR VIAL:	COPEBA S.A.S	LOTE	1
CARRETERA:	74CR02: PUERTO REY - MOÑITOS - LORICA	SECTOR:	PUERTO REY - MOÑITOS - LORICA
FECHA:	07 - 13 DE ABRIL DE 2025	PR´s:	VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

VÍA 74CR02; PUERTO REY - MOÑITOS - LORICA

ANTES

LIMPIEZA DE CUNETA

VÍA 74CR02; PR49+0350



DESPUES



ANTES

LIMPIEZA DE CUNETA

VÍA 74CR02; PR49+0200



DURANTE



ANTES

PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ARBOLES

VÍA 74CR02; PR19+0300



DESPUES



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRAFLOR

ADMINISTRADOR VIAL:	COPEBA S.A.S	LOTE	1
CARRETERA:	74CR02: PUERTO REY - MOÑITOS - LORICA	SECTOR:	PUERTO REY - MOÑITOS - LORICA
FECHA:	07 - 13 DE ABRIL DE 2025	PR´s:	VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

VÍA 74CR02; PUERTO REY - MOÑITOS - LORICA

LIMPIEZA DE CUNETAS

VÍA 74CR02; PR50+0600

ANTES




DESPUES



ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL

VÍA 74CR02; PR9+0250

ANTES

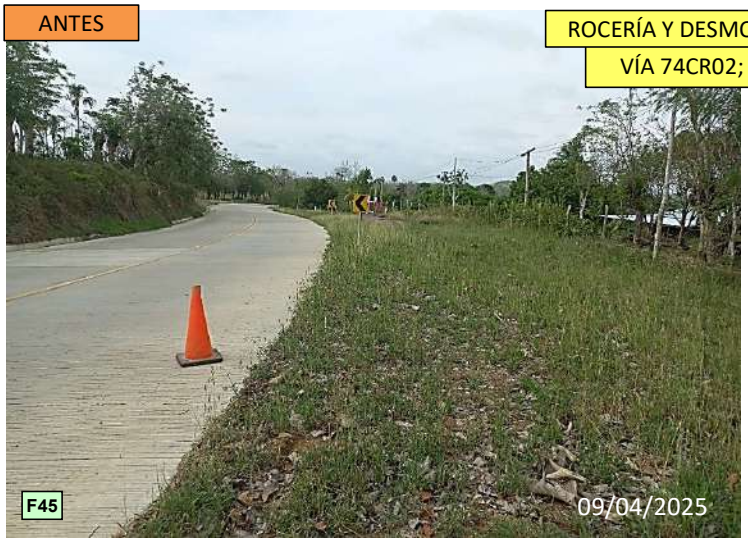

DESPUES



ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL

VÍA 74CR02; PR19+0900

ANTES



DURANTE



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRAFLOR

ADMINISTRADOR VIAL:	COPEBA S.A.S	LOTE	1
CARRETERA:	74CR02: PUERTO REY - MOÑITOS - LORICA	SECTOR:	PUERTO REY - MOÑITOS - LORICA
FECHA:	07 - 13 DE ABRIL DE 2025	PR´s:	VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

VÍA 74CR02; PUERTO REY - MOÑITOS - LORICA

LIMPIEZA DE CUNETAS

VÍA 74CR02; PR51+0100

ANTES



DESPUES



ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

VÍA 74CR02; PR48+0000

ANTES



DESPUES



ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL

VÍA 74CR02; PR27+0550

ANTES



DESPUES



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRAFLOR

ADMINISTRADOR VIAL:	COPEBA S.A.S	LOTE	1
CARRETERA:	74CR02: PUERTO REY - MOÑITOS - LORICA	SECTOR:	PUERTO REY - MOÑITOS - LORICA
FECHA:	14 - 20 DE ABRIL DE 2025	PR´s:	VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

VÍA 74CR02; PUERTO REY - MOÑITOS - LORICA

DESPEJE DE SEÑALES

VÍA 74CR02; PR5+0200

ANTES



DESPUES



LIMPIEZA DE DESCOLE

VÍA 74CR02; PR6+0900

ANTES



DESPUES



ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

VÍA 74CR02; PR6+0800

ANTES



DESPUES



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRAFLOR

ADMINISTRADOR VIAL:	**COPEBA S.A.S**	**LOTE**	**1**
CARRETERA:	**9002: ARBOLETES - PUERTO REY**	**SECTOR:**	**ARBOLETES - PUERTO REY**
FECHA:	**14 - 20 DE ABRIL DE 2025**	**PR´s:**	**VARIOS**

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

VÍA 9002: ARBOLETES - PUERTO REY

LIMPIEZA DE CUNETAS

VÍA 9002; PR84+0000

ANTES



DURANTE



PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ARBOLES

VÍA 9002; PR86+0600

ANTES



DESPUES



ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL

VÍA 9002; PR86+0650

ANTES



DESPUES



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRAFLOR

ADMINISTRADOR VIAL:	COPEBA S.A.S	LOTE	1
CARRETERA:	9002: ARBOLETES - PUERTO REY	SECTOR:	ARBOLETES - PUERTO REY
FECHA:	14 - 20 DE ABRIL DE 2025	PR´s:	VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

VÍA 9002: ARBOLETES - PUERTO REY

ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL

VÍA 9002; PR82+0000

ANTES



DESPUES



PARCHEO

VÍA 9002; PR84+0390

DURANTE



DESPUES



LIMPIEZA DE CUNETA Y DESCOLE

VÍA 9002; PR84+0050

DURANTE



DESPUES



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRAFLOR

ADMINISTRADOR VIAL:	**COPEBA S.A.S**	**LOTE**	**1**
CARRETERA:	**74CR02: PUERTO REY - MOÑITOS - LORICA**	**SECTOR:**	**PUERTO REY - MOÑITOS - LORICA**
FECHA:	**14 - 20 DE ABRIL DE 2025**	**PR´s:**	**VARIOS**

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

VÍA 74CR02; PUERTO REY - MOÑITOS - LORICA

ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL

VÍA 74CR02; PR47+0250

ANTES



DURANTE



DESPEJE ZONA DE CARRETERA

VÍA 74CR02; PR44+0600

ANTES



DESPUES



LIMPIEZA DE CUNETA

VÍA 74CR02; PR47+0500

ANTES



DESPUES



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRAFLOR

ADMINISTRADOR VIAL:	**COPEBA S.A.S**	**LOTE**	**1**
CARRETERA:	**74CR02: PUERTO REY - MOÑITOS - LORICA**	**SECTOR:**	**PUERTO REY - MOÑITOS - LORICA**
FECHA:	**21 - 27 DE ABRIL DE 2025**	**PR´s:**	**VARIOS**

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

VÍA 74CR02; PUERTO REY - MOÑITOS - LORICA

DESPEJE DE SEÑAL VERTICAL

VÍA 74CR02; PR1+0400

ANTES



DESPUES



LIMPIEZA DE CUNETAS

VÍA 74CR02; PR0+0300

ANTES



DESPUES



ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

VÍA 74CR02; PR1+0100

ANTES



DESPUES



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRAFLOR

ADMINISTRADOR VIAL:	COPEBA S.A.S	LOTE	1
CARRETERA:	74CR02: PUERTO REY - MOÑITOS - LORICA	SECTOR:	PUERTO REY - MOÑITOS - LORICA
FECHA:	21 - 27 DE ABRIL DE 2025	PR´s:	VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

VÍA 74CR02; PUERTO REY - MOÑITOS - LORICA

LIMPIEZA DE CUNETAS

VÍA 74CR02; PR4+0730

DURANTE



DESPUES



ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

VÍA 74CR02; PR5+0000

ANTES



DURANTE



ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

VÍA 74CR02; PR7+0650

ANTES



DESPUES



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRAFLOR

ADMINISTRADOR VIAL:	COPEBA S.A.S	LOTE	1
CARRETERA:	74CR02: PUERTO REY - MOÑITOS - LORICA	SECTOR:	PUERTO REY - MOÑITOS - LORICA
FECHA:	21 - 27 DE ABRIL DE 2025	PR´s:	VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

VÍA 74CR02; PUERTO REY - MOÑITOS - LORICA

BACHEO

VÍA 74CR02; PR32+0600





PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ARBOLES

VÍA 74CR02; PR37+0760





ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

VÍA 74CR02; PR37+0850





INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRAFLOR

ADMINISTRADOR VIAL:	COPEBA S.A.S	LOTE	1
CARRETERA:	74CR02: PUERTO REY - MOÑITOS - LORICA	SECTOR:	PUERTO REY - MOÑITOS - LORICA
FECHA:	21 - 27 DE ABRIL DE 2025	PR´s:	VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

VÍA 74CR02; PUERTO REY - MOÑITOS - LORICA

DESPEJE DE SEÑALES

VÍA 74CR02; PR28+0200

ANTES



DESPUES



LIMPIEZA DE CUNETAS

VÍA 74CR02; PR17+0800

ANTES



DESPUES



ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL

VÍA 74CR02; PR17+0900

ANTES



DESPUES



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRAFLOR

ADMINISTRADOR VIAL:	COPEBA S.A.S	LOTE	1
CARRETERA:	74CR02: PUERTO REY - MOÑITOS - LORICA	SECTOR:	PUERTO REY - MOÑITOS - LORICA
FECHA:	21 - 27 DE ABRIL DE 2025	PR´s:	VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

VÍA 74CR02; PUERTO REY - MOÑITOS - LORICA

DESPEJE DE SEÑALES

VÍA 74CR02; PR38+0070

ANTES



DESPUES



LIMPIEZA DE OBRA DE ARTE

VÍA 74CR02; PR38+0700

ANTES



DURANTE



LIMPIEZA DE PUENTE REGINO

VÍA 74CR02; PR34+0452

ANTES



DESPUES



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRAFLOR

ADMINISTRADOR VIAL:	**COPEBA S.A.S**	**LOTE**	**1**
CARRETERA:	**74CR02: PUERTO REY - MOÑITOS - LORICA**	**SECTOR:**	**PUERTO REY - MOÑITOS - LORICA**
FECHA:	**21 - 27 DE ABRIL DE 2025**	**PR´s:**	**VARIOS**

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

VÍA 74CR02; PUERTO REY - MOÑITOS - LORICA

PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ARBOLES

VÍA 74CR02; PR38+0050

ANTES



DESPUES



PODA. CORTE Y/O RETIRO DE ARBOLES

VÍA 74CR02; PR39+0000

ANTES



DESPUES



ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

VÍA 74CR02; PR38+0000

ANTES



DESPUES



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRAFLOR

ADMINISTRADOR VIAL:	COPEBA S.A.S	LOTE	1
CARRETERA:	74CR02: PUERTO REY - MOÑITOS - LORICA	SECTOR:	PUERTO REY - MOÑITOS - LORICA
FECHA:	28 - 30 DE ABRIL DE 2025	PR´s:	VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

VÍA 74CR02; PUERTO REY - MOÑITOS - LORICA

CAPACITACIÓN A LAS COOPERATIVAS

TEMA: SALUD MENTAL

DURANTE



DURANTE



ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

VÍA 74CR02; PR20+0100

ANTES



DESPUES



ELABORACIÓN DE POSTES DE REFERENCIA

VÍA 74CR02; PR35+0000

DURANTE



DESPUES



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRAFLOR

ADMINISTRADOR VIAL:	**COPEBA S.A.S**	**LOTE**	**1**
CARRETERA:	**74CR02: PUERTO REY - MOÑITOS - LORICA**	**SECTOR:**	**PUERTO REY - MOÑITOS - LORICA**
FECHA:	**28 - 30 DE ABRIL DE 2025**	**PR´s:**	**VARIOS**

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

VÍA 74CR02; PUERTO REY - MOÑITOS - LORICA

INSTALACIÓN DE POSTES DE REFERENCIA

VÍA 74CR02; PR36+0000

DURANTE



DESPUES



ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

VÍA 74CR02; PR22+0000

ANTES



DESPUES



DESPEJE DE ZONA DE CARRETERA

VÍA 74CR02; PR43+0350

ANTES



DESPUES



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRAFLOR

ADMINISTRADOR VIAL:	COPEBA S.A.S		1
CARRETERA:	7401: PUERTO REY - MONTERIA	SECTOR:	PUERTO REY - MONTERIA
FECHA:	ABRIL DE 2025	PR´s:	VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

VÍA 7401; PUERTO REY - MONTERIA

PRESENCIA DE PALETEROS - PUENTE ROJAS PINILLA

VÍA 7401; PR63+0450

DURANTE



F127 ABRIL DE 2025

DURANTE



F128 ABRIL DE 2025

PRESENCIA DE PALETEROS - PUENTE ROJAS PINILLA

VÍA 7401; PR63+0450

DURANTE



F129 ABRIL DE 2025

DURANTE



F130 ABRIL DE 2025
