HECTOR MURICIO PAEZ PINILLA
Ingeniero Electrónico
Ing_mauriciopaez@hotmail.com
Cel. 311 4880892

INFORME DE ACTIVIDADES

CONTRATO DE SUMINISTRO N° 094 DEL 18 DE JUNIO DE 2025 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE MARIPI Y UNION TEMPORAL ALUMBRADO MARIPI

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MARIPI - BOYACA NIT: 800.024.789-8
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ALUMBRADO MARIPI NIT: 901.956.309-1 R/L: HECTOR MAURICIO PAEZ PINILLA C.C. 4.158.942 DE MARIPÍ
OBJETO	"MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO CON TECNOLOGIA LED EN EL PERIMETRO URBANO Y CENTROS POBLADOS DE ZULIA Y SANTA ROSA EN EL MUNICIPIO DE MARIPI BOYACÁ"
VALOR INICIAL	OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRECIENTOS DIECIOCHO PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS ($83.781.318,27) M/CTE
PLAZO DE EJECUCION	DOS (02) MESES
FECHA DE INICIO	VEINTICUATRO 824) DE JUNIO DE 2025
FECHA DE TERMINACION	VEINTITRES (23) DE AGOSTO DE 2025

RONALD ARVEY RIVERA MOLINA administrador de la unidad de servicios públicos en calidad de supervisor

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

En el Municipio de Maripi Boyacá y centros poblado Zulia y Santa Rosa se desarrolló el contrato de modernización, ampliación y mantenimiento del alumbrado público con tecnología led.

El Municipio de Maripi Boyacá adolece en sectores de un alumbrado público con calidad, en muchas zonas no existe y en otras se encuentra en malas condiciones técnicas, las salidas hacia sectores y veredas no cuentan con alumbrado público lo que genera inseguridad para los habitantes y personas que transitan por estos lugares

CASCO URBANO MARIPI CENTRO:

AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO

Dentro del perímetro urbano se desarrollaron actividades de ampliación del alumbrado Publico para la salida de la vereda santa rosa donde se instalaron 13 luminarias nuevas de tecnología led. para satisfacer las necesidades mencionadas y de esta forma beneficiar la totalidad de la población del Municipio de Maripi – Boyacá.

HECTOR MURICIO PAEZ PINILLA
Ingeniero Electrónico
Ing_mauriciopaez@hotmail.com
Cel. 311 4880892

AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO SALIDA VEREDA SANTA ROSA



HECTOR MURICIO PAEZ PINILLA
Ingeniero Electrónico
Ing_mauriciopaez@hotmail.com
Cel. 311 4880892

Dentro del perimetro urbano también se cambiaron por luminarias nuevas algunas que se encontraban en mal estado dentro de ellas tenemos:

1. Luminaria frente a la iglesia
2. Luminaria frente a la estación de servicio
3. Luminaria escaleras CIC
4. Luminaria edificio la candelaria
5. Luminaria edificio la candelaria
6. Luminaria patio señora Edilma paez
7. 9 luminarias en la urbanización los naranjos



HECTOR MURICIO PAEZ PINILLA
Ingeniero Electrónico
Ing_mauriciopaez@hotmail.com
Cel. 311 4880892

MANTENIMENTOS ALUMBRADO PUBLICO:

Se realizo un mantenimiento correctivo a unas luminarias que presentaban falla, a las cuales se les cambio la fotocelda, el cableado, el conector.


MANTENIMIENTO 1: ARRANQUE COLISEO




MANTENIMIENTO 2: ENTRA DA AL RINCON



MANTENIMIENTO 3: TRANSFORMADOR ENTRADA AL RINCON

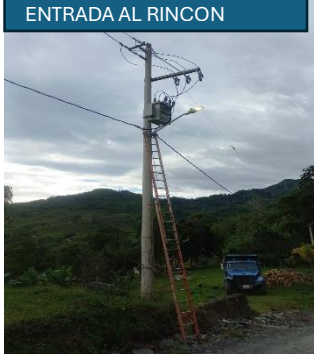


MANTENIMIENTO 4: ARRIBA DE ZAMIR DELGADO

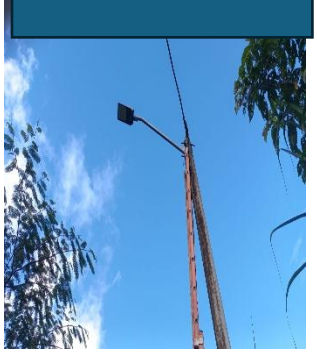

MANTENIMIENTO 5: SEÑORA LUZ DARY



MANTENIMIENTO 6: VIA AL RINCON

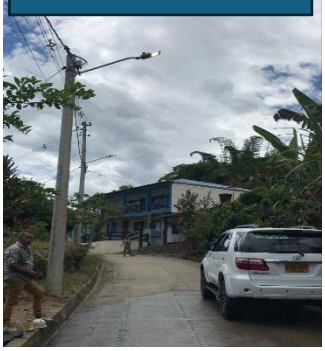

MANTENIMIENTO 7: ENTRADA A LA URBANIZACION



MANTENIMIENTO 8: ABAJO DEL MOTOR



MANTENIMIENTO 9: CASA LUIS RAMIREZ



MANTENIMIENTO 10: PARQUE PRINCIPAL



MANTENIMIENTO 11: PARQUE PRINCIAL BILLAR



MANTENIMIENTO 12: CASA HECTOR PAEZ



HECTOR MURICIO PAEZ PINILLA
Ingeniero Electrónico
Ing_mauriciopaez@hotmail.com
Cel. 311 4880892

CENTRO POBLADO DE ZULIA

En el centro poblado de zulia de realizo una actualización de alumbrado público la cual consta del cambio de 52 luminarias de mercurio a luminarias led, mejorando la calidad del servicio, bajamos costos por el alto consumo de energía y mejorar la calidad de vida de los habitantes y transeúntes



HECTOR MURICIO PAEZ PINILLA
Ingeniero Electrónico
Ing_mauriciopaez@hotmail.com
Cel. 311 4880892

CENTRO POBLADO SANTA ROSA

En este centro poblado Se realizo un mantenimiento correctivo a unas luminarias que presentaban falla, a las cuales se les cambio la fotocelda, el cableado, el conector.

Se realizaron 16 mantenimientos en diferentes sectores del centro poblado.

MANTENIMIENTO 1: CASA JAPONES




MANTENIMIENTO 2: CASA FONTANERO



MANTENIMIENTO 3_ CASA VERDE CON ROJO



MANTENIMIENTO 4: FRENTE DONDE VIRGILIO

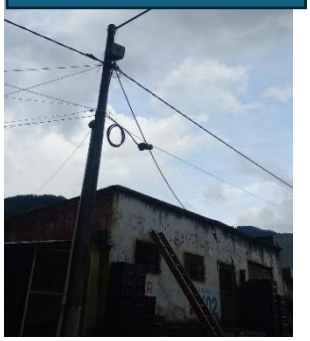

MANTENIMIENTO 5: DEPOSITO DE CERVEZA




MANTENIMIENTO 6: INSPECCION ANTIGUA




MANTENIMIENTO 7: DONDE GURRIONDO



MANTENIMIENTO 8 TRANSFORMADOR

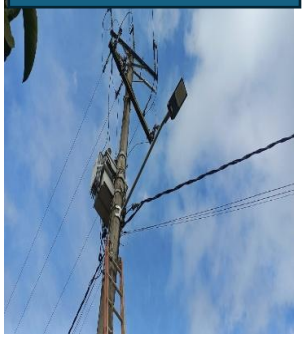

MANTENIMIENTO 9: EUCEBIO PINILLA

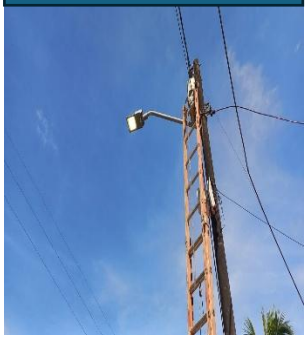


MANTENIMIENTO 10: NELLY PINILLA



MANTENIMIENTO 11. DONDE EL MONO



MANTENIMIENTO 12: TRANFORMADOR

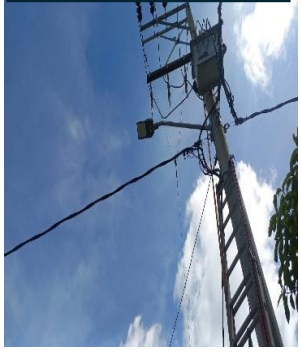

HECTOR MURICIO PAEZ PINILLA
Ingeniero Electrónico
Ing_mauriciopaez@hotmail.com
Cel. 311 4880892

MANTENIMIENTO 13: IGLESIA CRISTIANA




MANTENIMIENTO 14: DONDE HUMBERTO



MANTENIMIENTO 15 FRENTE AL COLEGIO




MANTENIMIENTO 16 COLEGIO

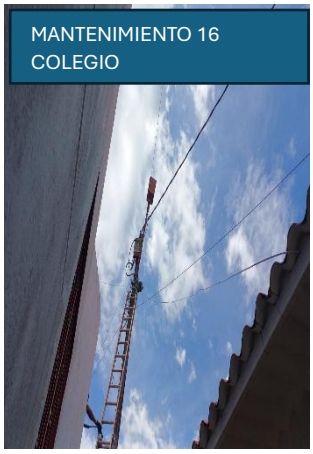

MAS FOTOGRAFIAS DEL PROYECTO.






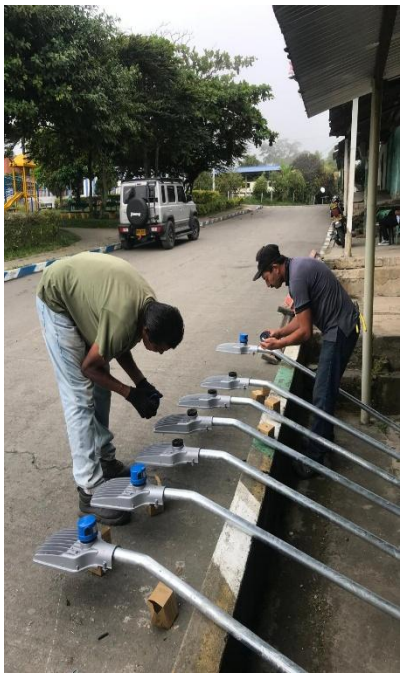

HECTOR MURICIO PAEZ PINILLA
Ingeniero Electrónico
Ing_mauriciopaez@hotmail.com
Cel. 311 4880892





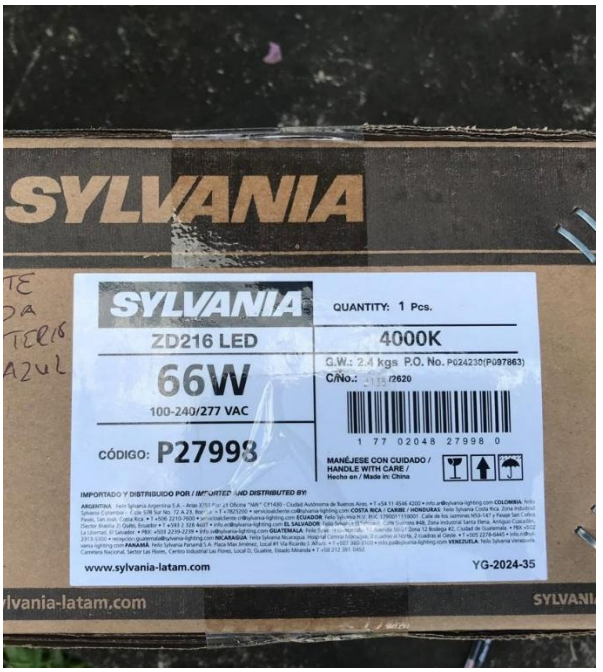

Dirección: CARRERA 5 # 5 10
Teléfono: 3114880892
Ciudad: MARIPI BOYACA

HECTOR MAURICIO PAEZ PINILLA
CEDULA 4.158.942
