ingeplanos
Primeros en Impresión Eco amigable

INGEPLANOS S.A.S
NIT: 900862115-1
Régimen simple
de tributación

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN N° 03
PERIODO DE 01 DE AGOSTO DE 2025 A 31 DE AGOSTO DE 2025

CONTRATO IPVO-011-2025

"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA Y SEÑALIZACIÓN, PARA LA DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"


1. INTRODUCCIÓN

Teniendo en cuenta las actividades contratadas para **"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA Y SEÑALIZACIÓN, PARA LA DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"** a continuación, se presenta informe de ejecución mensual N° 03 con corte del 01 al 31 de agosto de 2025, de las actividades ejecutadas con el fin de poner en su conocimiento las mismas.

1.1 INFORME ADMINISTRATIVO

1.1.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

La ejecución del proyecto para la dotación de la nueva plaza de mercado se desarrolla en el casco urbano.

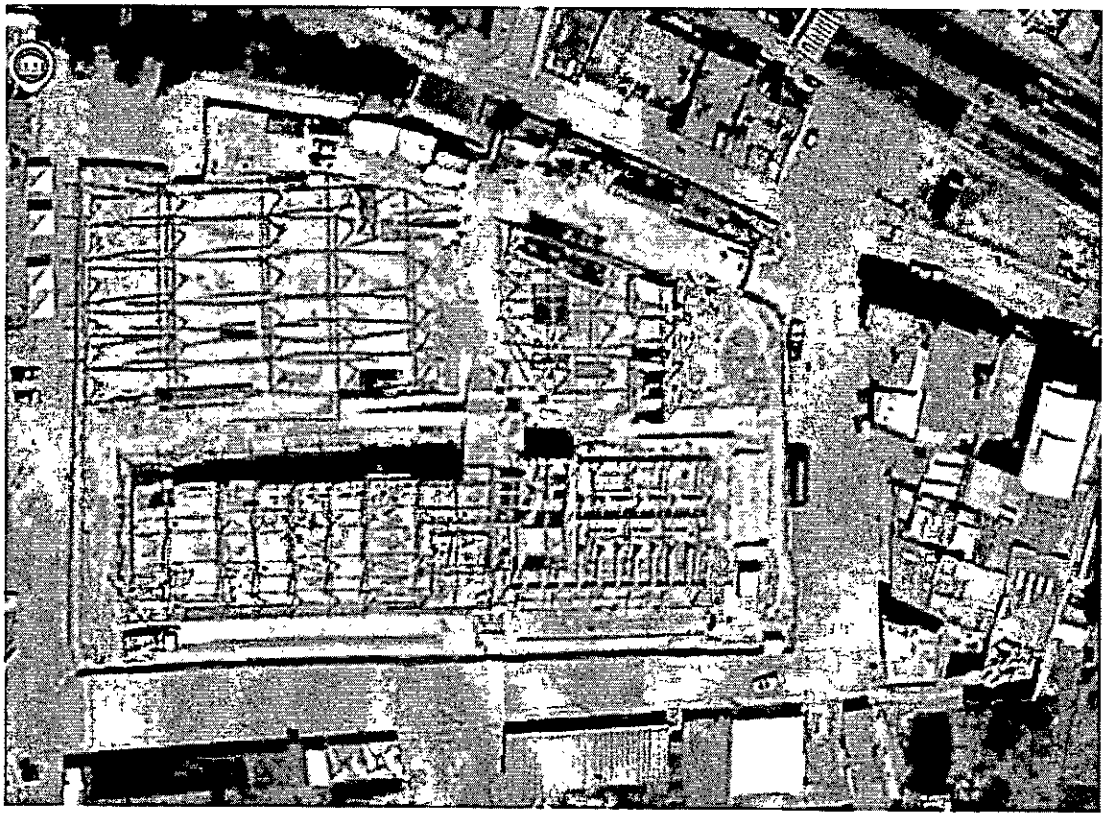

1.2 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO:

CONTRATO	IPVO-011-2025
CONTRATANTE	TIERRASUA S.A.S
CONTRATISTA	INGEPLANOS S.A.S
OBJETO	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA Y SEÑALIZACIÓN, PARA LA DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"
VALOR CONTRATO	DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS ($243.226.480,00)
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	12 DE JUNIO DE 2025
FECHA ACTA DE INICIO	20 DE JUNIO DE 2025
PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DE LA RESPECTIVA ACTA DE INICIO
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	19 DE SEPTIEMBRE DE 2025

1.3 **CONTROL ADMINISTRATIVO:** Relación el personal que intervino en la ejecución del contrato.

NOMBRE	CÉDULA
AGUIRRE LEMUS DEISY KARINA	1118572779
ARIZA RIVERA YURI ANDREA	53081028
DAYANA NICOL GAMEZ SOSA	1002397571
GONZALEZ PEDRAZA PAULA ANDREA	1049652611

1.4 **CONTROL LEGAL** Actas generadas en la ejecución del proyecto, a la fecha se ha suscrito únicamente acta de inicio.

CONTRATO	IPVO-011-2025
CONTRATANTE	TIERRASUA S.A.S
CONTRATISTA	INGEPLANOS S.A.S
OBJETO	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA Y SEÑALIZACIÓN, PARA LA DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"
VALOR CONTRATO	DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS ($243.226.480,00)
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	12 DE JUNIO DE 2025
FECHA ACTA DE INICIO	20 DE JUNIO DE 2025
PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DE LA RESPECTIVA ACTA DE INICIO
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	19 DE SEPTIEMBRE DE 2025

1.5 CONTROL DE GARANTIAS:

GARANTIAS	VALOR	VIGENCIA		PORCENTAJE DE ASEGURAMIENTO
		DESDE	HASTA	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 243.226.480			
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 24.322.648	12/06/2025	20/03/2026	10% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	$ 12.161.324	12/06/2025	20/09/2028	5% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	$ 24.322.648	12/06/2025	20/09/2026	10% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO

1.6 ANEXOS

- Contrato firmado por las partes
- Acta de inicio firmada por las partes
- Póliza de garantías exigidas
- Aprobación de pólizas
- Correspondencia enviada y recibida a la fecha

2. CONTROL TÉCNICO

Para el mes de agosto ya quedaron aclaradas las medidas, diseños y lugares de instalación, por lo tanto, los diseños se encuentran definidos en su totalidad. A continuación, se presenta el avance financiero con corte al 31 de agosto, correspondiente a los ítems totalmente instalados.

AVANCE PARA EL 31 DE AGOSTO							
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR OFERTADO	CANTIDAD ENTREGADA	VALOR TOTAL	% ENTREGA
1.1	Aviso abrigo elaborado en madera laminada con apliques en acrílico 2 mts ancho x 80cm alto	1	$ 2.860.000,00	$ 2.860.000,00	1	$ 2.860.000,00	100%

1,2	Aviso entrada bomberos elaborado acrílico con textura en madera, con relieves en acrílico y luz interior de medida 6x250mts con estructura metálica de soporte en tubo de 4x4 según diseño suministrado instalado a techo con tubo redondo y gaya de seguridad	1	$ 17.925.000,00	$ 17.925.000,00	0	$ -	0%

1,3	Aviso exterior con la frase "plaza de mercado de paipa" elaborado en lámina galvanizada en cantonado con cantonera de 20cm y adosamiento a piso calibre 20 forrada con vinilo adhesivo laminado impreso a full color y recubierto con laca acrílica transparente de medidas 15mtsx1.20	1	$ 12.940.000,00	$ 12.940.000,00	0	$ -	0%

1,4	Aviso informativo en madera laminada 30mm con bordes en acrílico, apliques en acrílico en relieve con luz interior de medidas 250x150, instalados a techo con brazo en tubo redondo de 250cm de alto dividido en 3 cajas	2	$ 7.645.000,00	$ 15.290.000,00	0	$ -	0%
1,5	Aviso informativo en madera laminada con apliques en acrílico en relieve con luz interior de medidas 150x100cm, instalados colgados a techo con	7	$ 2.855.000,00	$ 19.985.000,00	0	$ -	0%

	tubo redondo de 120 cm.						
1,6	Avisos de neón Flex con base en acrílico transparente de medidas 80x50cm con las formas solicitadas	6	$ 695.000,00	$ 4.170.000,00	0	$ -	0%
1,7	Avisos entrada tipo paleta de medidas 2x90cm elaboradas en madera laminada 30mm con apliques en acrílico en relieve con luz interna ancladas a	8	$ 3.529.000,00	$ 28.232.000,00	0	$ -	0%

	pared con dos soportes tipo brazo elaborada con tubo redondo a 30 m de la pared						
1,8	Elaboración de Aviso entrada principal en madera laminada de 30mm con bordes en acrílico con apliques en acrílico con relieve, con luz interna, instalada a techo con brazo en tubo redondo 4" calibre 16 de medidas 5mtsx2.50 (aviso de	1	$ 19.600.000,00	$ 19.600.000,00	0	$ -	0%


	medidas 250x400cm) soporte a techo de medidas 1mts alto y guaya de seguridad						
1,9	Elaboración de arcos en tubo cuadrado 4x4 con medidas de 4,65x3x.40 para soporte de señalización con fomboard impreso en vinilo laminado	11	$ 2.625.000,00	$ 28.875.000,00	0	$ -	0%

2	Fabricación de logo artesanías de Boyacá para mural elaborado en acrílico nacional de 5mm con relieves en el mismo material, instalado en muro con medidas 300x150cm	1	$ 5.910.000,00	$ 5.910.000,00	0	$ -	0%
2,1	Numeración para locales en madera laminada 9mm con incrustaciones en acrílico de medidas, 25x40cm instaladas en pared	100	$ 117.000,00	$ 11.700.000,00	95	$ 11.115.000,00	95%
2,2	Oficina psico Jurica 2x3,9mts fomboard para intervención con formas en	1	$ 5.990.000,00	$ 5.990.000,00	0	$ -	0%


	corte fasci con vinilo adhesivo laminado impreso a full color						
2,3	Punto de información turística elaborado en tubo de4x4"calibre 20 de medidas 2x2mts recubierto con mdf de 9mmy vinilo laminado impreso a full color con mesón y entrepaño,punto de luz y dispensador de publicidad, elaborado en 1sola pieza según diseño suministrado	1	$ 3.275.000,00	$ 3.275.000,00	0	$ -	0%

INGEPLANOS S.A.S
NIT: 900862115-1
Régimen simple
de tributación

2,4	Señalización de pared elaborada en madera 9mm laminada con apliques en acrílico con relieve, instalados a pared de medidas 30x40cm	100	$ 138.500,00	$ 13.850.000,00	0	$ -	0%
2,5	Señalización tipo señal de tránsito elaborado con ángulo en calibre 16 de 3,00 mts con 2 tableros en lámina galvanizada forrada con adhesivo reflectivo en medidas 60x60 cm y de 30x60 cm	4	$ 850.000,00	$ 3.400.000,00	0	$ -	0%




2,6	Señalización tipo señal de tránsito elaborado con ángulo en calibre 16 de 3,00 mts con tablero en lámina galvanizada con dobleces 2x1cm forrada con adhesivo reflectivo en medidas 2x.60m	4	$ 705.000,00	$ 2.820.000,00	1	$ 705.000,00	25%
2,7	Señalización tipo señal de tránsito elaborado con ángulo en calibre 16 de 3,00 mts con tablero en lámina galvanizada forrada con adhesivo reflectivo en medidas 60x60 cm	4	$ 640.000,00	$ 2.560.000,00	0	$ -	0%



2,8	Vinilo adhesivo ludoteca y área administrativa abrigo impreso en vinilo adhesivo a 1440 dpi a full color instalado en pared 150 m2	150	$ 33.400,00	$ 5.010.000,00	114,64	$ 3.826.376,00	58%
SUBTOTAL DEL PRESUPUESTO				$ 204.392.000,00		$ 18.508.376,00	
IVA 19%				$ 38.834.480,00		$ 3.516.705,44	9%
TOTAL				$ 243.226.480,00		$ 22.025.681,44	
PORCENTAJE TOTAL							

2.2 GRAFICO AVANCE FINANCIERO

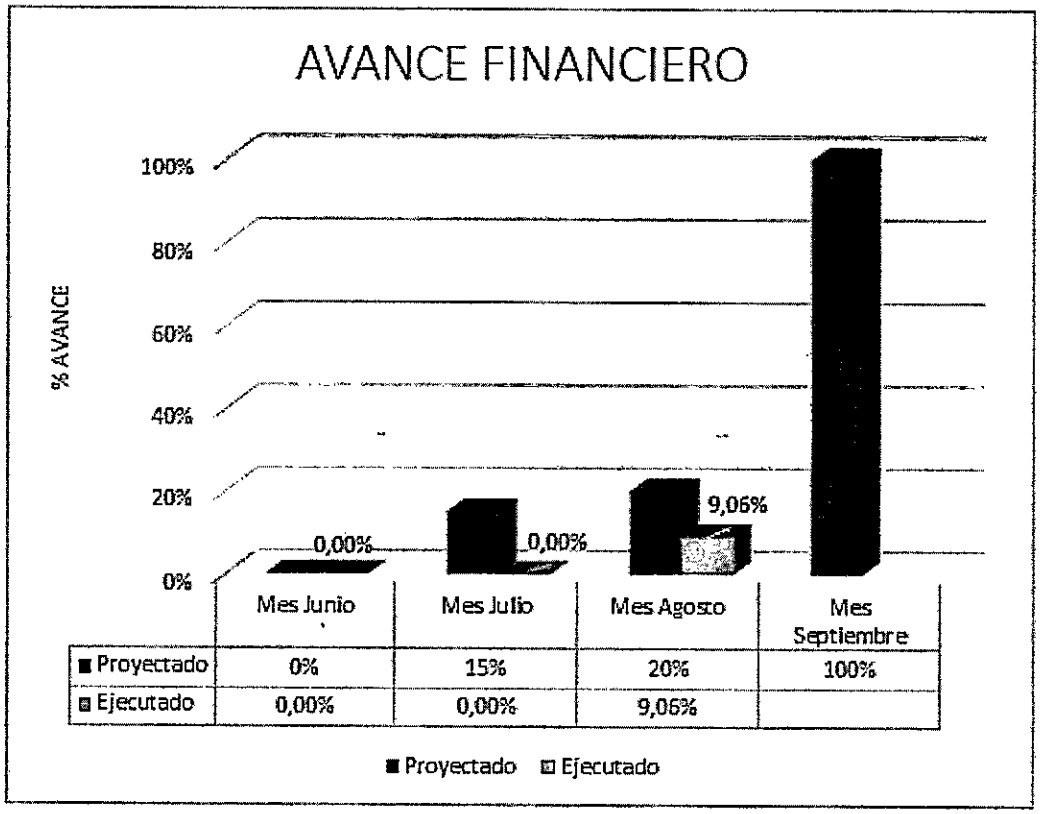


Para el mes de agosto se ejecuto un 9% del valor total del contrato, equivalente a la suma de $22.025.681,44. No obstante, se presenta un atraso del 10.94% respecto a la programación establecida.

Cabe resaltar que en la plaza de mercado de Paipa ya se cuenta con un avance significativo en la disposición de señalizaciones listas para su instalación y, adicionalmente, en el taller se encuentra un porcentaje considerable de producción en proceso.

2.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

ITEM 1.1 AVISO ABRIGO

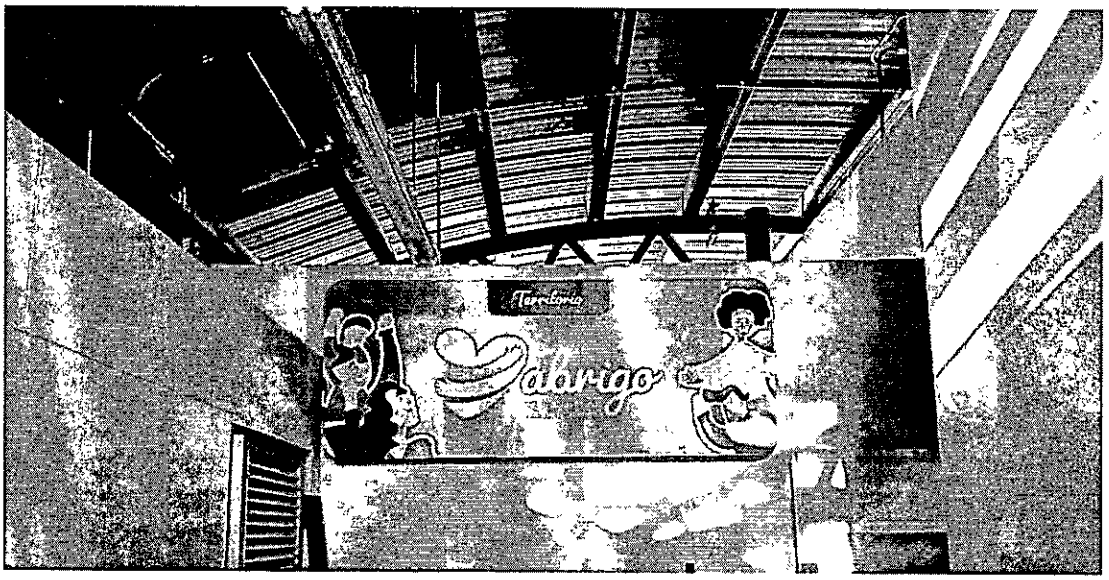



ITEM 2.1 NUMERACIÓN DE LOCALES



ingeplanos
Primeros en Impresión Eco amigable


INGEPLANOS S.A.S
NIT: 900862115-1
Régimen simple
de tributación

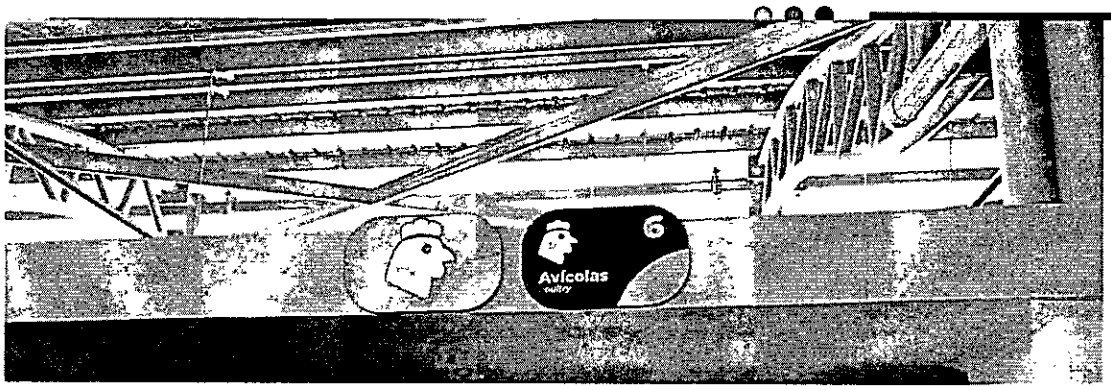

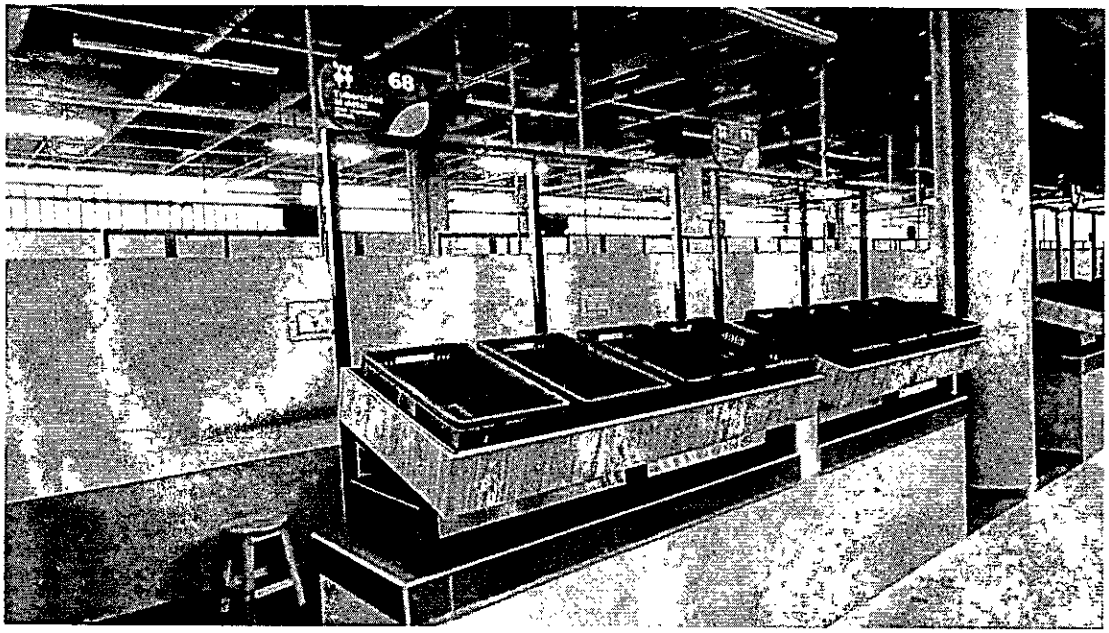


@ingeplanos | 315 423 0114 - 316 753 3949 | ingeplanos@gmail.com | C.c Plaza real Oficina 113 - 114 115

ITEM 2.6 SEÑAL DE TRANSITO 3 METROS DE ALTO DISEÑO GRAFICO DE 2 METROS DE ANCHO X 1 METROS DE ALTO

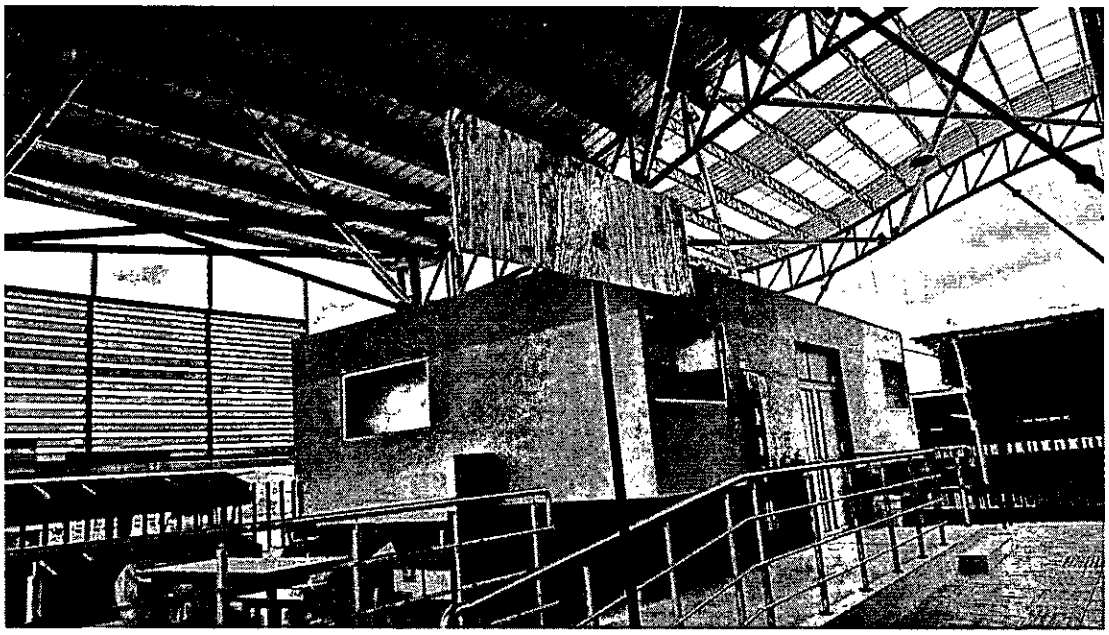



ITEM 2.8 VINILO

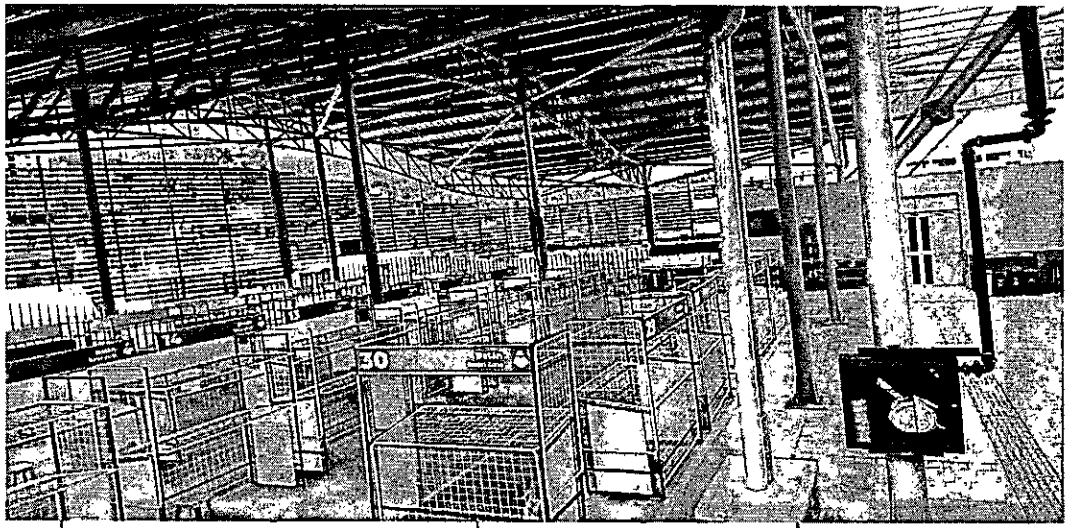

ingeplanos
Primeros en Impresión Eco amigable

INGEPLANOS S.A.S
NIT: 900862115-1
Régimen simple
de tributación

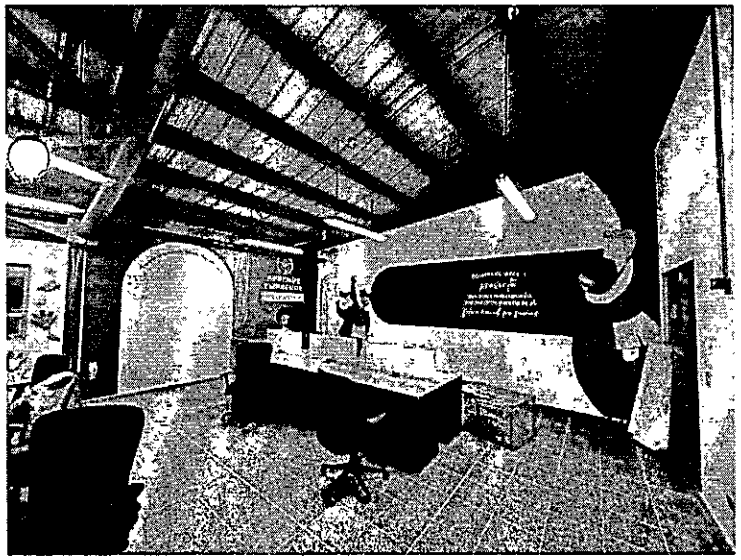


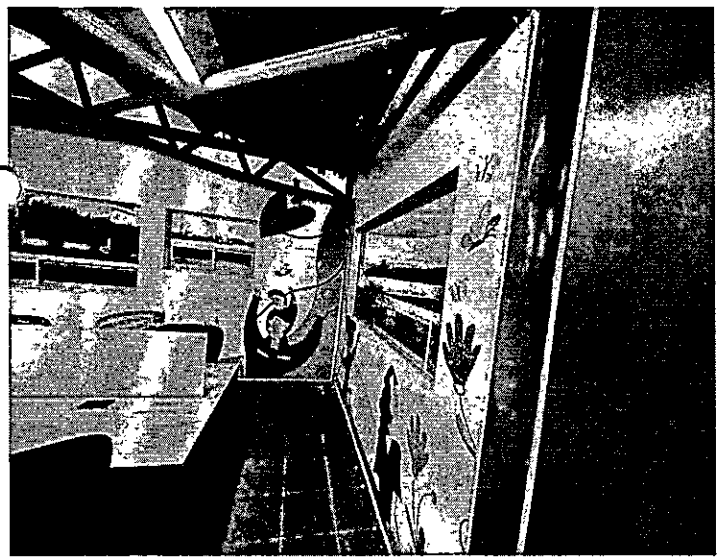



@ingeplanos | 315 423 0114 - 316 753 3949 | ingeplanos@gmail.com | C.c Plaza real Oficina 113 - 114 115

2.4 REGISTRO FOTOGRAFICO DE SEÑALES EN SITIO NO INSTALADAS


ITEM 1.9

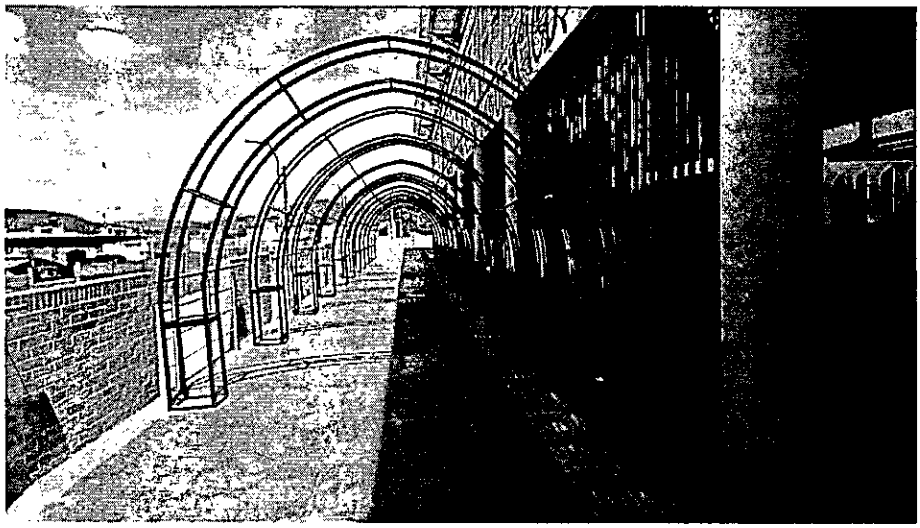

ITEMS 1.15 – 1.16 Y 1.17

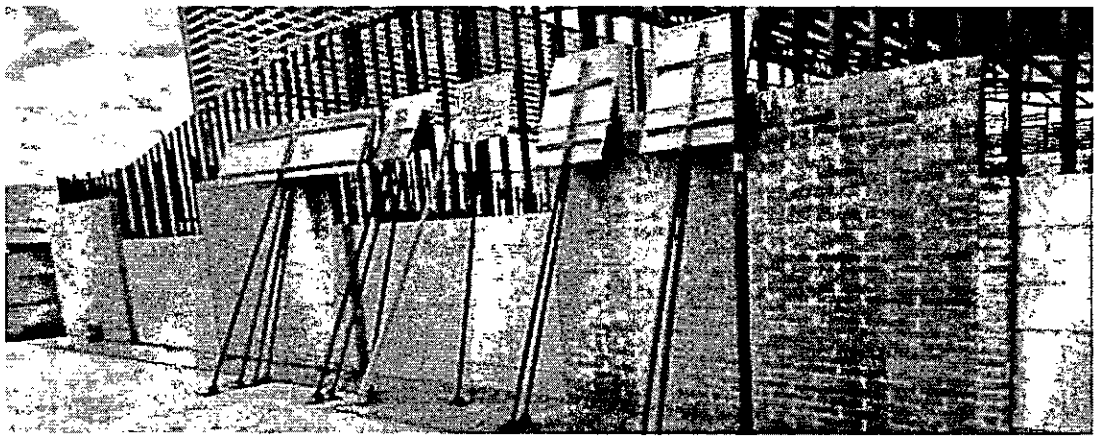

ITEM 1.6

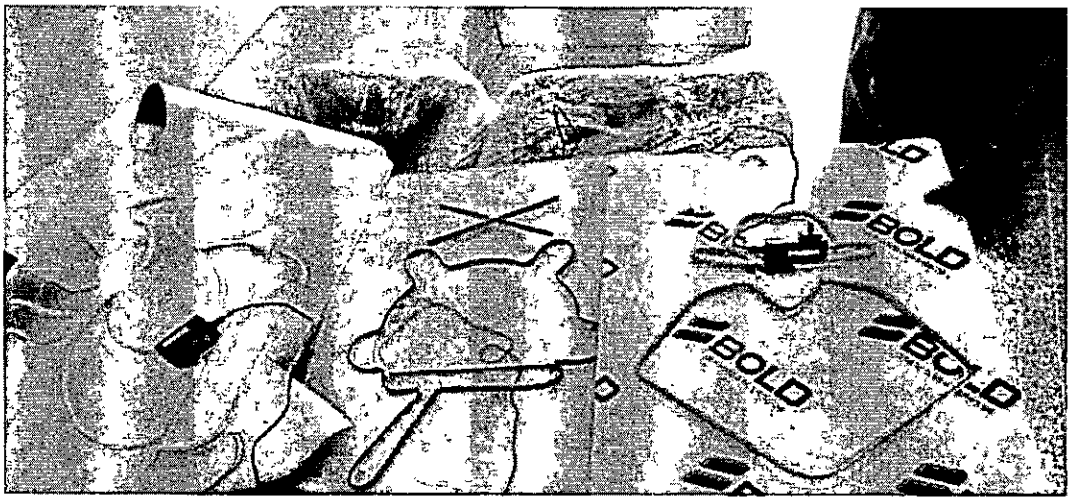



ITEM 1.14




INGEPLANOS S.A.S
NIT: 900862115-1
Régimen simple
de tributación

ITEM 1.5

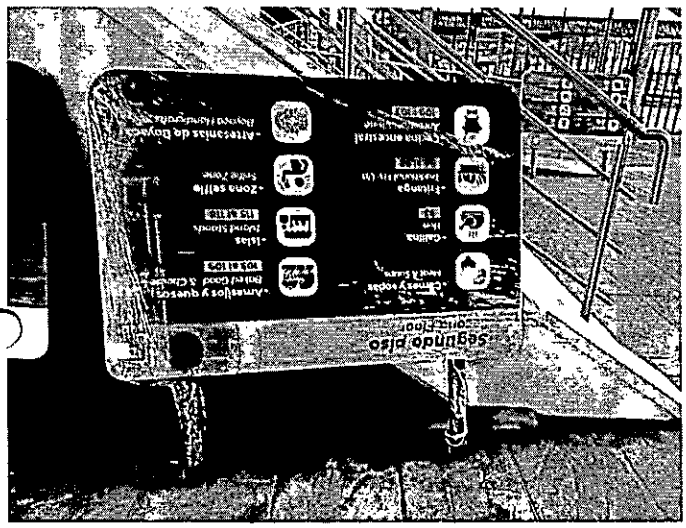

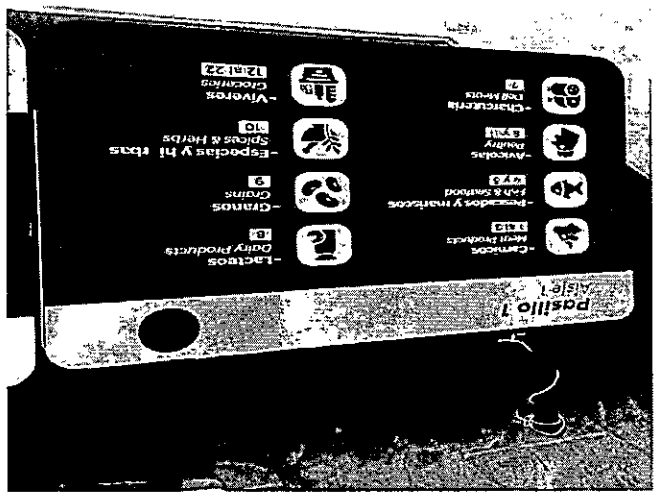

ITEM 1.7

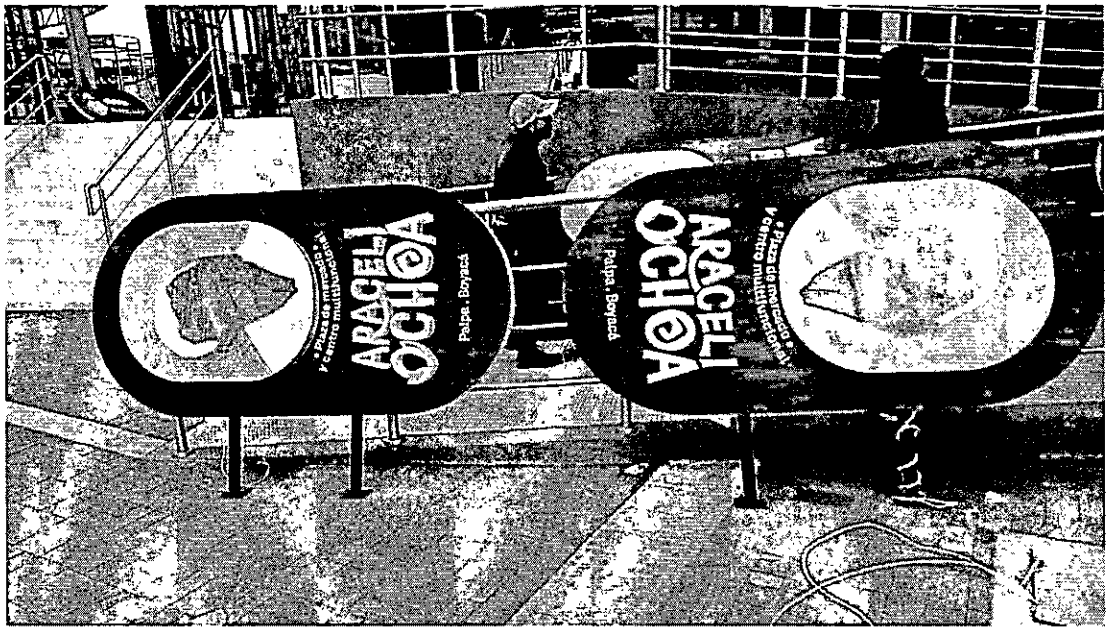

INGEPLANOS S.A.S
NIT: 900862115-1
Régimen simple
de tributación

ITEM 1.13



2.4 ESTADO DE AVANCE POR ITEM

ÍTEM 1.1 - Aviso abrigo elaborado en madera laminada con apliques en acrílico
ESTADO: ENTREGADO - 100%

ÍTEM 1.2 - Aviso entrada bomberos elaborado acrílico con textura en madera
ESTADO: EN ELABORACIÓN 75% - Pendiente definir alturas de instalación para modificar estructura metálica e iniciar montaje

ÍTEM 1.3 - Aviso exterior con la frase "plaza de mercado de paipa"
ESTADO: EN ELABORACIÓN - 70% completado

ÍTEM 1.4 - Aviso informativo en madera laminada 30mm con bordes en acrílico
ESTADO: ENTREGADO EN INSTALACIONES - Pendiente definición de sitio de instalación para colocación de sistema de anclaje

ÍTEM 1.5 - Aviso informativo en madera laminada con apliques en acrílico
ESTADO: ENTREGADO EN INSTALACIONES - Pendiente definición de sitio de instalación para modificación de sistema de anclaje

ÍTEM 1.6 - Avisos de neón flex con base en acrílico transparente
ESTADO: ENTREGADO EN INSTALACIONES - Pendiente validación de sitios de instalación

ÍTEM 1.7 - Avisos entrada tipo paleta elaboradas en madera laminada 30mm
ESTADO: ENTREGADO EN INSTALACIONES - Por reubicación se solicita cambio de anclaje. Se realiza prueba de estructura con abrazaderas de una unidad

ÍTEM 1.8 - Elaboración de Aviso entrada principal en madera laminada de 30mm
ESTADO: AVANCE 75% - Pendiente definir alturas de instalación para modificar estructura metálica e iniciar montaje

ÍTEM 1.9 - Elaboración de arcos en tubo cuadrado 4x4
ESTADO: ESTRUCTURAS METÁLICAS INSTALADAS - Pendiente instalar fomboard y ajuste de diseños para impresión en vinilo por parte de comunicaciones

ÍTEM 1.10 - Fabricación de logo artesanías de Boyacá
ESTADO: TERMINADO EN TALLER - 100%

ÍTEM 1.11 - Numeración para locales en madera laminada 6mm

ESTADO: ENTREGADO E INSTALADO 95%

ÍTEM 1.12 - Oficina psico Jurica 2x3.6mts fomboard
ESTADO: ENTREGADO EN INSTALACIONES - Pendiente instalación

ÍTEM 1.13 - Punto de información turística elaborado en tubo
ESTADO: ENTREGADO EN INSTALACIONES - En proceso de armado 70%

ÍTEM 1.14 - Señalización de pared elaborada en madera 6mm laminada
ESTADO: ENTREGADO - Devuelto a taller para pequeñas modificaciones requeridas

ÍTEM 1.15 - Señalización tipo señal de tránsito elaborado con ángulo en calibre 16
ESTADO: ESTRUCTURAS ENTREGADAS - Sistema de anclaje en proceso

ÍTEM 1.16 - Señalización tipo señal de tránsito elaborado con ángulo en calibre 16
ESTADO: SOLICITAN MODIFICACIONES

ÍTEM 1.17 - Vinilo adhesivo ludoteca y área administrativa
ESTADO: ESTRUCTURAS ENTREGADAS - Sistema de anclaje en proceso

ÍTEM 1.18 - [Descripción específica requerida]
ESTADO: ENTREGADO E INSTALADO - 58%

OBSERVACIONES GENERALES

- Se requiere definición de alturas y sitios específicos de instalación por parte de la supervisión para varios ítems
- Algunos elementos están pendientes de coordinación con el área de comunicaciones para diseños finales
- Se están realizando ajustes menores solicitados por la supervisión del proyecto
- El avance general del proyecto se encuentra en desarrollo normal según cronograma establecido

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900862115	1	INGEPLANOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TUNJA	CC COMERCIAL PLAZA REAL L - 115	TUNJA-BOYACA	7432530	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1768992268	9491693596	E	2025/09/04	2025/09/11	BANCOLOMBIA	7	$1,393,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: TUNJA (4 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (4 Afiliados)																														
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (4 Afiliados)																														
1	CC	1118572779	AGUIRRE LEMUS DEISY KARINA																		25-14	30	EPS017	30	CCF10	30	14-4	30	0.522%	30	SI
2	CC	53081028	ARIZA RIVERA YURI ANDREA																		230301	30	EPS005	30	CCF10	30	14-4	30	0.522%	30	SI
3	CC	1002397571	GAMEZ SOSA DAYANA NICOL																		230301	30	EPS002	30	CCF10	30	14-4	30	0.522%	30	SI
4	CC	1049652611	GONZALEZ PEDRAZA PAULA ANDREA																		230301	30	EPS041	30	CCF10	30	14-4	30	0.522%	30	SI
Total			**Afiliados(4)**																												

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900862115	1	INGEPLANOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TUNJA	CC COMERCIAL PLAZA REAL L - 115	TUNJA-BOYACA	7432530	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1768992268	9491693596	E	2025/09/04	2025/09/11	BANCOLOMBIA	7	$1,393,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$911,200	$4,200	$0	$915,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$1,100	$0	$228,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$683,400	$3,100	$0	$686,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$30,000	$200	$0	$30,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	4	$30,000	$200	$0	$30,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$217,400	$1,000	$0	$218,400
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	4	$217,400	$1,000	$0	$218,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				4	$228,000	$1,200	$0	$229,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$57,000	$300	$0	$57,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$57,000	$300	$0	$57,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$57,000	$300	$0	$57,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$57,000	$300	$0	$57,300
TOTAL				4	$1,386,600	$6,600	$0	$1,393,200

2025/09/11 09:12 AM

TIERRASUA®
¡Conectamos región!
NIT. 901.285.377-2

Tunja, 09 de septiembre de 2025

Señor
JOHN ERNESTO CARRERO VILLAMIL
Supervisor
CIUDAD

Referencia: CONTRATO IPVO-011-2025 "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA Y SEÑALIZACIÓN, PARA LA DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".

Asunto: Solicitud modificatorio.

Por medio del presente, en atención a lo establecido en el contrato de la referencia celebrado con TIERRASUA S.A.S y teniendo en cuenta las vistas en campo realizadas y las actas de supervisión técnica que fueron suscritas, de acuerdo a las razones y/o necesidades me permito solicitar de manera formal la elaboración del documento modificatorio correspondiente, con base en los elementos técnicos que se han identificado en el transcurso de la ejecución del contrato.

En virtud de lo anterior, y con el fin de dar cumplimiento oportuno a los objetivos establecidos en el contrato, se considera procedente la modificación solicitada, en estricto apego a lo previsto en la normativa aplicable y las cláusulas contractuales vigentes.

Adjunto al presente debidamente firmado por las partes:

- Copia de las actas de supervisión técnica que sustentan la solicitud.
- Sabana de cantidades con las condiciones actualizadas
- Demas Documentos técnico con la descripción detallada de la modificación requerida.

Sin otro particular, y agradeciendo de antemano su atención y apoyo, quedo atento(a) a sus comentarios para dar seguimiento a la elaboración del modificatorio correspondiente.

Atentamente,

KAREN DAYANA FLOREZ DIAZ
R.L INCOL INGENIEROS S.A.S
Apoyo a la supervisión –

ERIKA LORENA ALDANA MENDIVELSO
Apoyo a la supervisión – CTO IPUO-088-2025

TIERRASUA S.A.S

Cel: 316 8174458
gerencia@tierrasua.com
Calle 19 N.9-35 Piso 10 Tunja/Boyacá

TIERRASUA	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: TS-PR-004
SÁBANA MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		FECHA: 01/01/2025

DEPENDENCIA: TIERRASUA S.A.S

PROYECTO DE REGALIAS: DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CONTRATO: IPVO-011-2025 "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA Y SEÑALIZACIÓN, PARA LA DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

MODIFICACIÓN No: 001

FECHA DE LA PRESENTE MODIFICACION: 25 de Agosto de 2025

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICATORIO 01			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1.1	Aviso abrigo elaborado en madera laminada con apliques en acrílico 2 mts ancho x 80cm alto	UND	1.00	$ 2,860,000.00	$ 2,860,000.00	-	0.00	$ -	1.00	$ 2,860,000.00
1.2	Aviso entrada bomberos elaborado acrílico con textura en madera, con relieves en acrílico y luz interior de medida 6x250mts con estructura metálica de soporte en tubo de 4x4 según diseño suministrado instalado a techo con tubo redondo y gaya de seguridad	UND	1.00	$ 17,925,000.00	$ 17,925,000.00	-	-1.00	-$ 17,925,000.00	0.00	$ -
1.3	Aviso exterior con la frase "plaza de mercado de paipa" elaborado en lámina galvanizada encantonado con cantonera de 20cm y adosamiento a piso calibre 20 forrada con vinilo adhesivo laminado impreso a full color y recubierto con laca acrílica transparente de medidas 15mtsx1.20	UND	1.00	$ 12,940,000.00	$ 12,940,000.00	-	-1.00	-$ 12,940,000.00	0.00	$ -
1.4	Aviso informativo en madera laminada 30mm con bordes en acrílico, apliques en acrílico en relieve con luz interior de medidas 250x150, instalados a techo con brazo en tubo redondo de 250cm de alto dividido en 3 cajas	UND	2.00	$ 7,645,000.00	$ 15,290,000.00	-	0.00	$ -	2.00	$ 15,290,000.00
1.5	Aviso informativo en madera laminada con apliques en acrilico en relieve con luz interior de medidas 150x100cm, instalados colgados a techo con tubo redondo de 120 cm.	UND	7.00	$ 2,855,000.00	$ 19,985,000.00	-	-7.00	-$ 19,985,000.00	0.00	$ -
1.6	Avisos de neón flex con base en acrílico transparente de medidas 80x50cm con las formas solicitadas	UND	6.00	$ 695,000.00	$ 4,170,000.00	-	0.00	$ -	6.00	$ 4,170,000.00
1.7	Avisos entrada tipo paleta de medidas 2x90cm elaboradas en madera laminada 30mm con apliques en acrílico en relieve con luz interna ancladas a pared con dos soportes tipo brazo elaborada con tubo redondo a 30 m de la pared	UND	8.00	$ 3,529,000.00	$ 28,232,000.00	-	0.00	$ -	8.00	$ 28,232,000.00
1.8	Elaboración de Aviso entrada principal en madera laminada de 30mm con bordes en acrílico con apliques en acrílico con relieve, con luz interna, instalada a techo con brazo en tubo redondo 4" calibre 16 de medidas 5mtsx2.50 (aviso de medidas 250x400cm) soporte a techo de medidas 1mts alto y guaya de seguridad	UND	1.00	$ 19,600,000.00	$ 19,600,000.00	-	0.00	$ -	1.00	$ 19,600,000.00
1.9	Elaboración de arcos en tubo cuadrado 4x4 con medidas de 4,65x3x.40 para soporte de señalización con fomboard impreso en vinilo laminado	UND	11.00	$ 2,625,000.00	$ 28,875,000.00	-	0.00	$ -	11.00	$ 28,875,000.00
1.10	Fabricación de logo artesanías de Boyacá para mural elaborado en acrílico nacional de 5mm con relieves en el mismo material, instalado en muro con medidas 300x150cm	UND	1.00	$ 5,910,000.00	$ 5,910,000.00	-	-1.00	-$ 5,910,000.00	0.00	$ -

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICATORIO 01			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1.11	Numeración para locales en madera laminada 9mm con incrustaciones en acrílico de medidas 25x40cm instaladas en pared	UND	100.00	$ 117,000.00	$ 11,700,000.00	-	0.00	$ -	100.00	$ 11,700,000.00
1.12	Oficina psico Jurica 2x3,9mts fomboard para intervención con formas en corte laser con vinilo adhesivo laminado impreso a full color	UND	1.00	$ 5,990,000.00	$ 5,990,000.00	-	0.00	$ -	1.00	$ 5,990,000.00
1.13	Punto de información turística elaborado en tubo de4x4" calibre 20 de medidas 2x2mts recubierto con mdf de 9mm y vinilo laminado impreso a full color con mesón y entrepaño, punto de luz y dispensador de publicidad, elaborado en 1 sola pieza según diseño suministrado	UND	1.00	$ 3,275,000.00	$ 3,275,000.00	-	0.00	$ -	1.00	$ 3,275,000.00
1.14	Señalización de pared elaborada en madera 9mm laminada con apliques en acrílico con relieve, instalados a pared de medidas 30x40cm	UND	100.00	$ 138,500.00	$ 13,850,000.00	-	0.00	$ -	100.00	$ 13,850,000.00
1.15	Señalización tipo señal de tránsito elaborado con ángulo en calibre 16 de 3,00 mts con 2 tableros en lámina galvanizada forrada con adhesivo reflectivo en medidas 60x60 cm y de 30x60 cm	UND	4.00	$ 850,000.00	$ 3,400,000.00	-	0.00	$ -	4.00	$ 3,400,000.00
1.16	Señalización tipo señal de tránsito elaborado con ángulo en calibre 16 de 3,00 mts con tablero en lámina galvanizada con dobleces 2x1cm forrada con adhesivo reflectivo en medidas 2x.60m	UND	4.00	$ 705,000.00	$ 2,820,000.00	-	0.00	$ -	4.00	$ 2,820,000.00
1.17	Señalización tipo señal de tránsito elaborado con ángulo en calibre 16 de 3,00 mts con tablero en lámina galvanizada forrada con adhesivo reflectivo en medidas 60x60 cm	UND	4.00	$ 640,000.00	$ 2,560,000.00	-	0.00	$ -	4.00	$ 2,560,000.00
1.18	Vinilo adhesivo ludoteca y área administrativa abrigo impreso en vinilo adhesivo a 1440 dpi a full color instalado en pared 150 m2	UND	150.00	$ 33,400.00	$ 5,010,000.00	-	0.00	$ -	150.00	$ 5,010,000.00
N.P-1.19	Aviso informativo elaborado en melamina referencia nogal de 6mm de espesor, con apliques en acrílico en relieve e iluminacion interior. Las dimensiones del aviso son de 7.50 metros x 2.50 metro con estructura de soporte y area grafica, medidas del area grafica son de 5 metros x 2.50 metros, sistema de instalacion mediante doble anclaje (superior e inferior) utilizando tubo redondo de 4" calibre 16 en cada tubo al final debe tener una especie de u para mayor soporte al muro, garantizando estabilidad y resistencia estructural.	UND		$ 17,925,000.00	$ -	+	1.00	$ 17,925,000.00	1.00	$ 17,925,000.00
N.P-1.20	Aviso exterior con la frase "PLAZA DE MERCADO ARACELI OCHOA PAIPA-BOYACÁ" elaborado en lámina galvanizada calibre 18 para los frentes, cantonera de 20 cm en lámina galvanizada calibre la frase PAIPA-BOYACA elaborado en lamina galvanizada calibre 18 para los frentes y cantonera de 5cm, frentes y cantoneras forrados con vinilo adhesivo laminado impreso full color y recubierto con laca acrílica transparente, medidas del aviso de 9.15 metros de longitud x 2.28 metros de alto,muro en concreto 9,15 metros de largo seccion de 0,60m altox0,35m de alto (NO INCLUYE CONSTRUCCION MURO). Base en tubo estructural 4x8 (3 Anclajes embebidos en concreto) segun diseño, para soporte frase PLAZA DE MERCADO.	UND		$ 16,806,722.69	$ -	+	1.00	$ 16,806,722.69	1.00	$ 16,806,722.69

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICATORIO 01			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
N.P-1.21	Aviso informativo en melamina nogal con apliques en acrílico en relieve con luz interior de medidas 1.50x1 metros instalados colgados a techo con dos tubos redondos de 0.40metros. Doble cara	UND		$ 2,855,000.00		+	7.00	$ 19,985,000.00	7.00	$ 19,985,000.00
N.P-1.22	Fabricación de logo artesanías de Boyacá para mural elaborado en acrílico nacional de 5mm con relieves en el mismo material, intalado en muro con medidas 1.32 metros x 1.21 metros. Con estructura en aluminio.	UND		$ 2,043,277.32		+	1.00	$ 2,043,277.32	1.00	$ 2,043,277.32
COSTO DIRECTO					$ 204,392,000.00			$ -		$ 204,392,000.00

TOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 204,392,000.00	$ 204,392,000.00
IVA. 19 %	$ 38,834,480.00	$ 38,834,480.00
COSTO TOTAL	$ 243,226,480.00	$ 243,226,480.00

JOHN ERNESTO CARRERO VILLAMIL
R.L TIERRASUA S.A.S
Supervisor

KAREN DAYANA FLOREZ
R.L. INCOL INGENIEROS S.A.S
Apoyo a la Supervición

NAIRO ADOLFO PRIETO SUAREZ
SUPERVISOR GENERAL DE PROYECTOS
Apoyo a la supervisión INCOL

ANDRES GUERRERO GUIO
SUPERVISOR DE PROYECTOS
Apoyo a la supervisión INCOL

YURI ANDREA ARIZA RIVERA
R.L INGEPLANOS S.A.S
Contratista

Vbno.
JEGR
DIRECTOR TÉCNICO DE PROYECTOS
TIERRASUA S.A.S

Vbno.
ELAM
CONTRATISTA
TIERRASUA S.A.S

* Si se requieren se pueden adicionar mas firmas.

TIERRASUA
¡Conectamos región!

TIERRASUA S.A.S
901.258.377-2

ACTA DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

Fecha de la presente Acta: 25 de Agosto de 2025

CONTRATO No. : IPVO-011-2025

OBJETO : SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA Y SEÑALIZACIÓN, PARA LA DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

CONTRATISTA : INGEPLANOS S.A.S. - R.L YURI ANDREA ARIZA RIVERA
APOYO A LA SUPERVISIÓN : INCOL INGENIEROS SAS - R.L KAREN DAYANA FLOREZ DIAZ
SUPERVISOR GOBERNACIÓN:

REVISIÓN CONTRACTUAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.2	Aviso entrada bomberos elaborado acrilico con textura en madera, con relieves en acrilico y luz interior de medida 6x250mts con estructura metálica de soporte en tubo de 4x4 según diseño suministrado instalado a techo con tubo redondo y gaya de seguridad	1	$ 17,925,000.00	$ 17,925,000.00

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INICIALES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y/O FICHA TÉCNICA SUMINISTRADA CONTRACTUALMENTE

DIMENSIONES:
Largo: 6 metros
Ancho: 250 metros


MATERIALES:
Base en acrilico nacional 3mm con textura en madera
Estructura tubo estructural 4x4
Soporte tubo redondo galvanizado
Segurida guaya en acero galvanizado

SISTEMA ELÉCTRICO:
Iluminacion LED

INSTALACIÓN: Suspendido de techo con estructura metalica y sistema de seguridad
GARANTIA: 18 meses fabricación

DISEÑOS PROPORCIONADOS





PALETA DE COLORES UTILIZADA

FUENTE: Documento técnico del proceso suministrado al contratista.

Observación 1:
Se identifica una inconsistencia en las especificaciones dimensionales del aviso requerido, ya que los documentos contractuales indican unas medidas de 6 m x 250 m, lo cual resulta técnicamente inviable por sus proporciones atípicas y económicamente desproporcionado. Asimismo, dichas dimensiones no guardan coherencia con el valor ofertado, lo que sugiere un posible error en la formulación del requerimiento o en la propuesta económica

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

1. Se advierte una incongruencia en la descripción de las dimensiones del aviso a suministrar, toda vez que en los documentos contractuales se menciona un aviso de 6 m x 250 metros, lo cual resulta técnica y económicamente inviable, y carece de correspondencia lógica entre las dimensiones indicadas y el precio ofertado.

No obstante, al revisar la especificación técnica correspondiente, se evidencia que las dimensiones correctas serían de 6 m x 2.50 m, lo que sugiere la posible existencia de un error material o de digitación, consistente en haber consignado "250" en lugar de "2.50". Esta situación genera la necesidad de aclarar y ajustar dicha información con el fin de garantizar la coherencia técnica y presupuestal del objeto contractual.

2. El contratista llevó a cabo la verificación de la especificación técnica del aviso, la cual resulta clara y precisa en cuanto a la dimensión del módulo gráfico, así como respecto a la longitud y la materialidad del sistema de anclaje del mismo. Dichas especificaciones si bien se cumple con las dimensiones del aviso. Existe la ausencia en la descripción del ítem de realizar claridad a la dimensión del módulo gráfico.

TIERRASUA (¡Conectamos región!)	TIERRASUA S.A.S 901.258.377-2	
	ACTA DE SUPERVISIÓN TÉCNICA	Fecha de la presente Acta: 25 de Agosto de 2025

CONTRATO No. : IPVO-011-2025

Medidas a tomar: Teniendo como premisa la ausencia de claridad de dimensión de modulo gráfico y dimensión de sistema de anclaje como se observa en los demás items que conforman el contrato, se ve necesario dejar la cantidad contratada en cero y crear un ítem no previsto que realice esa nota aclaratoria con respecto a las dimensiones del módulo gráfico.

Según las especificaciones técnicas El aviso está conformado por las siguientes capas gráficas:

- Capa 1: Base del aviso elaborada en material acrílico tipo madera.
- Capa 2: Lámina de acrílico de color verde, que constituye el fondo de la imagen de Araceli Ochoa.
- Capa 3: Imagen de Araceli Ochoa, compuesta en acrílico en tonalidades café, beige y blanco.
- Capa 4: Textos en relieve con sistema de iluminación incorporado.

Una vez revisadas las especificaciones técnicas y evaluadas las condiciones comerciales de adquisición de materiales, así como las condiciones físicas del terreno de instalación, se concluye lo siguiente:

Se recomienda mantener la composición del módulo gráfico en cuatro capas, con las siguientes modificaciones a la Capa 1 y Capa 2:

Capa 1 (Base): La paleta de colores requerida es personalizada y no se encuentra disponible en el comercio en los tonos solicitados. La fabricación de acrílico en colores específicos exige una compra mínima de 10 láminas de 1,20 m x 1,80 m por 20 tonalidades de color. Este requerimiento implica un sobrecosto para el contratista, así como un desperdicio de material considerable. En este sentido, se plantea como alternativa la utilización de madera tratada para la base (Capa 1), Base en melamina referencia nogal de 6mm

Capa 2 y 3 (Fondo gráfico): Se sugiere emplear acrílico transparente, sobre el cual se imprimirá la paleta de colores que constituyen el rostro de Araceli Ochoa, requerido mediante proceso de impresión especializada (impresion en tinta UV sobre vinilo de al adeherencia) . En este caso, el contratista deberá garantizar la resistencia y durabilidad del color impreso, asegurando que la lámina no pierda su tonalidad original con el paso del tiempo o por efecto de la exposición ambiental.

Estas recomendaciones tienen como objetivo asegurar la viabilidad técnica, estética y económica del proyecto, optimizando recursos y garantizando la calidad en la ejecución del contrato.

DECISIÓN PRESUPUESTAL

Se decide realizar la inclusión de un ítem No previsto que responda a la solución de la problemática anteriormente expuesta, el cual se describe a continuación:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FINALES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y/O FICHA TÉCNICA DEFINITIVA


DIMENSIONES:
Largo: 7.20 metros aprox
Ancho: 2.50 metros
DIMENSIONES GRAFICAS:
Largo: 5 metros
Ancho:2.50

MATERIALES:
Melamina referencia nogal de 6mm
Estructura tubo estructural 4x4
4 Soportes tubo redondo 1/2" (aguas negras)

SISTEMA ELÉCTRICO:
Iluminacion LED

INSTALACIÓN: Suspendido a techo y anclaje con platina en U inferior de 0.10m x 0.17m x 0.10
GARANTIA: 18 meses fabricación

DISPOSICIÓN FINAL

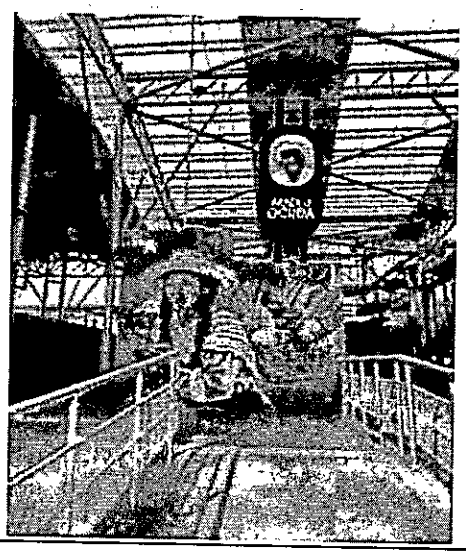

TIERRASUA
¡Conectamos regiones!

TIERRASUA S.A.S
901.258.377-2

ACTA DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

Fecha de la presente Acta: 25 de Agosto de 2025

CONTRATO No. : IPVO-011-2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
N.P-1.19	Aviso informativo elaborado en melamina referencia nogal de 6mm de espesor, con apliques en acrilico en relieve e iluminacion interior. Las dimensiones del aviso son de 7.50 metros x 2.50 metro con estructura de soporte y area grafica, medidas del area grafica son de 5 metros x 2.50 metros, sistema de instalacion mediante doble anclaje (superior e inferior) utilizando tubo redondo de 4" calibre 16 en cada tubo al final debe tener una especie de u para mayor soporte al muro, garantizando estabilidad y resistencia estructural.	1.00	$ 17,925,000.00	$ 17,925,000.00

JOHN ERNESTO CARRERO VILLAMIL
R/L TIERRASUA S.A.S
Supervisor

KAREN DAYANA FLOREZ DIAZ
R/L INCOL INGENIEROS SAS
Apoyo a la Supervisión

YURI ANDREA ARIZA RIVERA
R/L INGEPLANOS S.A.S
Contratista

JUAN PABLO VARGAS CONTRERAS
COMUNICACIONES
Gobernación de Boyacá

TIERRASUA ¡Conectamos regiones!	TIERRASUA S.A.S 901.258.377-2	
	ACTA DE SUPERVISIÓN TÉCNICA	**Fecha de la presente Acta:** 25 de Agosto de 2025

CONTRATO No. : IPVO-011-2025

OBJETO : SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA Y SEÑALIZACIÓN, PARA LA DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

CONTRATISTA : INGEPLANOS S.A.S. - R.L YURI ANDREA ARIZA RIVERA

APOYO A LA SUPERVISIÓN : INCOL INGENIEROS SAS - R.L KAREN DAYANA FLOREZ DIAZ

SUPERVISOR GOBERNACIÓN:

REVISIÓN CONTRACTUAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.3	Aviso exterior con la frase "plaza de mercado de paipa" elaborado en lámina galvanizada encantonado con cantonera de 20cm y adosamiento a piso calibre 20 forrada con vinilo adhesivo laminado impreso a full color y recubierto con laca acrilica transparente de medidas 15mtsx1.20	1	$ 12,940,000.00	$ 12,940,000.00

ESPECIFICACIONES TECNICAS INICIALES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y/O FICHA TÉCNICA SUMINISTRADA CONTRACTUALMENTE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES:
Largo: 15 metros
Alto: 1.20 metros
Calibre lámina: 20
Cantonera: 0.20 metros

MATERIALES:
Base lámina galvanizada calibre 20
cantoneras perfil galvanizado
vinilo adhesivo laminado alta durabilidad
proteccion: laca acrilica transparente UV

IMPRESIÓN:
Tecnologia Impresion digital ecosolvente
Resolucion 1440 DPI

INSTALACIÓN :
Adosado a piso con anclajes mecánicos GARANTÍA: 36 Meses contra decoloración

FUENTE: Documento técnico del proceso suministrado al contatista.

DISEÑO INICIAL



TRASLADO DE MEDIDAS EN SITIO AUTORIZADO

Observación 1:
Conforme a lo observado en el sitio, la implantación de la medida de 15 metros de longitud, según lo estipulado en el ítem correspondiente, ocupa en su totalidad el corredor lateral destinado exclusivamente al tránsito peatonal libre, contraviniendo los principios de accesibilidad y circulación establecidos en la normativa urbanística vigente. Esta disposición no solo desvirtúa la funcionalidad prevista para el área, sino que además constituye una obstrucción directa al acceso principal de la plaza de mercado, afectando el cumplimiento de los fines de uso público definidos para dicho espacio.

Observación 2:
Se precisa que la instalación del presente ítem se había contemplado de manera preliminar por instrucción del equipo de comunicaciones de la Gobernación a lo largo de la cara exterior de uno de los muros perimetrales, sin embargo este no posee ni garantiza las condiciones estructurales de anclaje y optima visualización del mismo, por lo que en conjunto con la supervisión se toma la decisión de trasladarlo frente a la jardinera sobre el espacio de circulación y acceso a la plaza de mercado.



UBICACIÓN PLANTEADA INICIALMENTE

Observación 3:
Por solicitud del equipo de comunicaciones se adicionan nuevas letras al aviso y se pide el correspondeinte ajuste en medidas de modo que no obstaculice el tránsito peatonal y se visualice adecuadamente, lo anterior implica una modificación significativa al ítem inicialmente pactado por lo que surge la necesidad de crear un ítem nuevo ajustado sin que esto represente una valor adicional al contrato.



PREVISUALIZACIÓN DE ITEM AJUSTADO

TIERRASUA ¡Conectamos región!	TIERRASUA S.A.S 901.258.377-2	
	ACTA DE SUPERVISIÓN TÉCNICA	**Fecha de la presente Acta:** 25 de Agosto de 2025

CONTRATO No. : IPVO-011-2025

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Una vez verificado el predio donde se instalará el aviso, se identificó que la longitud inicialmente prevista de 15 metros genera una afectación a las zonas de circulación peatonal dentro del espacio público, lo cual compromete la funcionalidad y la seguridad del entorno. Adicionalmente, dadas las características topográficas del terreno, en particular la inclinación del suelo, y considerando las cargas de viento a las que estará expuesto el aviso, se evidencia un riesgo potencial de volcamiento, incluso en caso de contar con un sistema de anclaje cimentado.

En razón de lo anterior, se considera técnicamente necesario reducir las dimensiones del aviso en longitud, sin que ello implique una disminución del área total (metros cuadrados) a suministrar, garantizando así el cumplimiento del objeto contractual. Cabe resaltar que, si bien la especificación inicial del aviso incluía únicamente la leyenda "Plaza de Mercado de Paipa", el diseño actual incorpora un número mayor de caracteres, a saber: "Plaza de Mercado Araceli Ochoa Paipa - Boyacá", lo cual exige una redistribución del contenido visual y estructural para mantener proporción y legibilidad, sin exceder los límites físicos del predio.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FINALES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y/O FICHA TÉCNICA SUMINISTRADA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


DIMENSIONES:
Largo: 9.15 metros
Alto: 2.28 metros
Calibre lámina: 18 para los frentes
Cantonera: 0.20 metros

MATERIALES:
Base lámina galvanizada calibre 18 y 20
cantoneras perfil galvanizado
vinilo adhesivo laminado alta durabilidad
proteccion: laca acrilica transparente UV

IMPRESIÓN:
Tecnologia Impresion digital UV
Resolucion 1440 DPI

INSTALACIÓN:
Adosado a piso con anclajes mecánicos GARANTÍA: 36 Meses contra decoloración

DISEÑO FINAL



DECISIÓN PRESUPUESTAL

Se decide realizar la inclusión de un item No previsto que responda a la solución de la problemática anteriormente expuesta, el cual se describe a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
N.P - 1.20	Aviso exterior con la frase "PLAZA DE MERCADO ARACELI OCHOA PAIPA-BOYACÁ" elaborado en lámina galvanizada calibre 18 para los frentes, cantonera de 20 cm en lámina galvanizada calibre la frase PAIPA-BOYACA elaborado en lamina galvanizada calibre 18 para los frentes y cantonera de 5cm, frentes y cantoneras forrados con vinilo adhesivo laminado impreso full color y recubierto con laca acrilica transparente, medidas del aviso de 9.15 metros de longitud x 2.28 metros de alto,muro en concreto 9,15 metros de largo seccion de 0,60m altox0,35m de alto (NO INCLUYE CONSTRUCCION MURO). Base en tubo estructural 4x8 (3 Anclajes embebidos en concreto) segun diseño, para soporte frase PLAZA DE MERCADO.	1.00	$ 16,806,722.69	$ 16,806,722.69

JOHN ERNESTO CARRERO VILLAMIL
R/L TIERRASUA S.A.S
Supervisor

KAREN DAYANA FLOREZ DIAZ
R/L INCOL INGENIEROS SAS
Apoyo a la Supervisión

YURI ANDREA ARIZA RIVERA
R/L INGEPLANOS S.A.S
Contratista

JUAN PABLO VARGAS CONTRERAS
COMUNICACIONES
Gobernación de Boyacá

TIERRASUA
¡Conectamos región!

TIERRASUA S.A.S
901.258.377-2

ACTA DE SUPERVISIÓN TÉCNICA | **Fecha de la presente Acta:** 25 de Agosto de 2025

CONTRATO No. : IPVO-011-2025

OBJETO : SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA Y SEÑALIZACIÓN, PARA LA DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

CONTRATISTA : INGEPLANOS S.A.S. - R.L YURI ANDREA ARIZA RIVERA
APOYO A LA SUPERVISIÓN : INCOL INGENIEROS SAS - R.L KAREN DAYANA FLOREZ DIAZ
SUPERVISOR GOBERNACIÓN:

REVISIÓN CONTRACTUAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.5	Aviso informativo en madera laminada con apliques en acrílico en relieve con luz interior de medidas 150x100cm, instalados colgados a techo con tubo redondo de 120 cm.	7	$ 2,855,000.00	$ 19,985,000.00

OBSERVACIONES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y/O FICHA TÉCNICA SUMINISTRADA CONTRACTUALMENTE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES:

- Largo: 1.500 mm
- Alto: 1.000 mm
- Altura suspensión: 1.200 mm


MATERIALES:

- Base: Madera laminada 30mm
- Soporte: Tubo redondo galvanizado
- Colgadores: Sistema de cadena galvanizada

SISTEMA ELÉCTRICO:


- Iluminación: LED
- **INSTALACIÓN:** Colgado de techo
- **GARANTÍA:** 24 meses fabricación


DISEÑO Y/O MODELO PROPORCIONADO

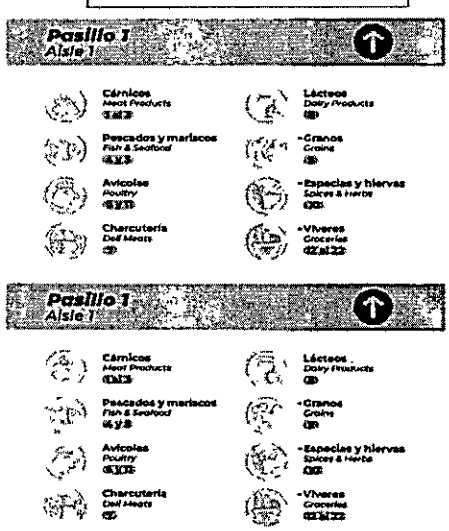

FUENTE: Documento técnico del proceso suministrado al contatista.

Observación 1:
Se precisa que la instalación del presente ítem se contempla por instrucción del equipo de comunicación de la Gobernación, anclado a las viguetas de la placa de entrepiso en algunos puntos de accesos a la plaza de mercado, sin embargo al trasladar las medidas constructivas del aviso se observa que el punto mas bajo del aviso no respeta la altura libre mínima requerida contraviniendo los principios de accesibilidad y circulación establecidos en la normativa urbanística vigente y por consiguiente presenta un gran riesgo de que sufra daños por el ingreso de cargueros y mercancia en este lugar.

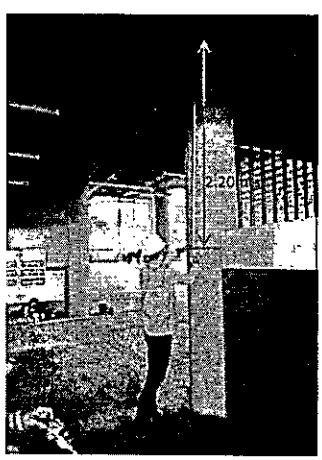

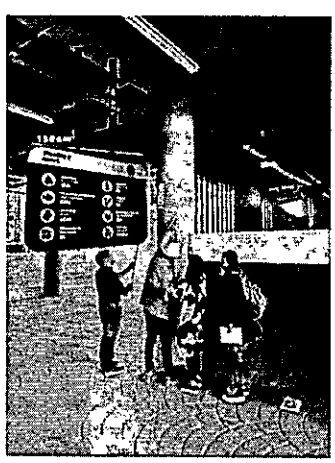

UBICACIÓN PLANTEADA

TIERRASUA ¡Conectamos región!	TIERRASUA S.A.S 901.258.377-2	
	ACTA DE SUPERVISIÓN TÉCNICA	Fecha de la presente Acta: 25 de Agosto de 2025

CONTRATO No. : IPVO-011-2025

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Se realizó visita técnica a la Plaza de Mercado, en el marco de las actividades de seguimiento y verificación del cumplimiento del objeto contractual. Durante dicha visita, se identificaron las siguentes necesidades:

1. Que de acuerdo a las caracteristicas del aviso con respecto al anclaje se solicita la instalación de tubo redondo de longitud 1.20mts y a altura total de dicho aviso corresponde a una longitud total de 2.20mtrs, por lo tanto, tomando en consideración la altura de entrepisos de la plaza de mercado se observa que la altura total no corresponde a la altura necesaria del espacio ya que invade la zona de circulación como se observa en la imagen. Por ende, se ve la necesidad de modificar la altura de los tubos de anclaje del aviso sin que esto implique un desmejoramiento de calidad y estabilidad del diseño.

Esta acción responde al principio de funcionalidad del mobiliario urbano y contribuye al cumplimiento de los fines del contrato en términos de accesibilidad, organización y mejora del entorno comercial.

DECISIÓN PRESUPUESTAL

Se decide realizar la inclusión de un item no previsto que responda a la solución de la problemática anteriormente expuesta, el cual se describe a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
N.P-1.21	Aviso informativo en melamina nogal con apliques en acrílico en relleve con luz interior de medidas 1.50x1 metros instalados colgados a techo con dos tubos redondos de 0.40metros. Doble cara	7.00	$ 2,855,000.00	$ 19,985,000.00

JOHN ERNESTO CARRERO VILLAMIL
R/L TIERRASUA S.A.S
Supervisor

KAREN DAYANA FLOREZ DIAZ
R/L INCOL INGENIEROS SAS
Apoyo a la Supervisión

YURI ANDREA ARIZA RIVERA
R/L INGEPLANOS S.A.S
Contratista

JUAN PABLO VARGAS CONTRERAS
COMUNICACIONES
Gobernación de Boyacá

TIERRASUA ¡Conectamos región!	TIERRASUA S.A.S 901.258.377-2	
	ACTA DE SUPERVISIÓN TÉCNICA	**Fecha de la presente Acta:** 25 de Agosto de 2025

CONTRATO No. : IPVO-011-2025

OBJETO : SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA Y SEÑALIZACIÓN, PARA LA DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

CONTRATISTA : INGEPLANOS S.A.S. - R.L YURI ANDREA ARIZA RIVERA

APOYO A LA SUPERVISIÓN : INCOL INGENIEROS SAS - R.L KAREN DAYANA FLOREZ DIAZ

SUPERVISOR GOBERNACIÓN:

REVISIÓN CONTRACTUAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.10.	Fabricación de logo artesanías de Boyacá para mural elaborado en acrílico nacional de 5mm con relieves en el mismo material, instalado en muro con medidas 300x150cm	1	$ 5,910,000.00	$ 5,910,000.00

OBSERVACIONES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y/O FICHA TÉCNICA SUMINISTRADA CONTRACTUALMENTE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES:

- Ancho: 3.000 mm
- Alto: 1.500 mm
- Espesor base: 5 mm
- Relieve: Hasta 15 mm

MATERIALES:

- Base: Acrílico nacional 5mm
- Relieves: Acrílico 5mm en capas
- Colores: Según identidad Boyacá
- Fijación: Distanciadores metálicos

DISEÑO:

- Logo oficial: Artesanías de Boyacá
- Ensamble: Modular por secciones
- Efecto: Tridimensional


INSTALACIÓN: Montaje en muro con sistema flotante **GARANTÍA:** 24 meses fabricación, 24 meses instalación

DISEÑOS PROPORCIONADOS


Artesanías de Boyacá

FUENTE: Documento técnico del proceso suministrado al contatista.

Observación 1:
Una vez realizada la vista al lugar de instalación con el propósito de verificar las medidas requeridas, se observa que en el espacio destinado para la instalación del aviso plasmaron murales artísticos y con el objetivo de permir su visualización el equipo de comunicaciones de la gobernación en comun acuerdo con la supervisión y el contratista acuerdan realizar reubicación y remidensionamiento del mismo .

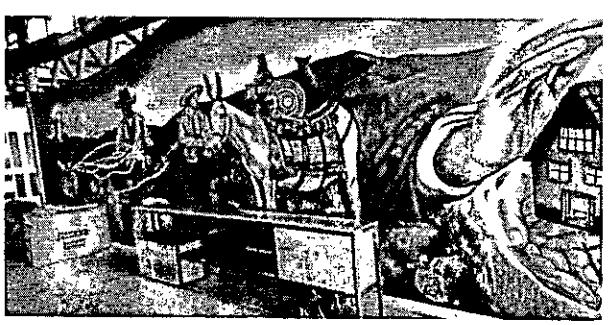

Observación 2:
El aviso será ubicado en la cara externa del módulo de vidrio templado que puede apreciarse en la imagen sin embargo, el redimensionamiento del aviso implica una modificación significativa al item inicialmente pactado por lo que surge la necesidad de crear un item nuevo sin que esto represente una valor adicional al contrato.

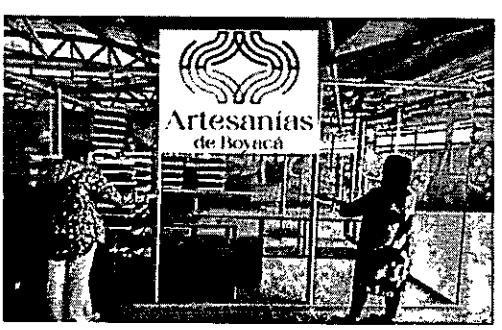

UBICACIÓN PLANTEADA INICIALMENTE

TIERRASUA ¡Conectamos región!	TIERRASUA S.A.S 901.258.377-2	
	ACTA DE SUPERVISIÓN TÉCNICA	Fecha de la presente Acta: 25 de Agosto de 2025

CONTRATO No. : IPVO-011-2025

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Durante la visita técnica al sitio, se evidenció que el muro inicialmente previsto para la instalación ya cuenta con un mural artístico (muralismo), el cual representa un valor estético y cultural que debe preservarse. Por esta razón, se hace necesario modificar la ubicación y dimensiones del aviso, considerando las siguientes alternativas:

•Opción 1 – Instalación sobre módulo en vidrio templado:
Se propone instalar el aviso sobre la estructura de un módulo en vidrio templado, con dimensiones ajustadas para que el mismo no impida la exhibición de artesanías el cual emplearía un mecanismo de soporte tipo riel de sobreponer, que garantice seguridad y no represente ningun riesgo o afectación al módulo de vidrio templado ya instalado.

•Opción 2 – Instalación suspendida desde el techo:

Se propone instalar el aviso en posición colgante desde el techo, utilizando elementos de soporte tipo tubo. Esta alternativa permite conservar la visibilidad del módulo de vidrio, evita interferencias con elementos existentes, y garantiza la visibilidad del logo sin comprometer la integridad del mural artístico existente.

Considerando las alternativas propuestas anteriormente y en común acuerdo entre el equipo de comunicaciones de la gobernación, la supervisión y el contratista, se toma la decisión de reducir el tamaño o dimensión del aviso de modo que permita elanclaje sobre el módulo de vidrio sin afectar visualmente la exposición de artesanías y sin comprometer la estabilidad y/o seguridad de la misma.

DECISIÓN PRESUPUESTAL

Se decide realizar la inclusión de un ítem no previsto que responda a la solución de la problemática anteriormente expuesta, el cual se describe a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
N.P-1.22	Fabricación de logo artesanías de Boyacá para mural elaborado en acrílico nacional de 5mm con relieves en el mismo material, intalado en muro con medidas 1.32 metros x 1.21 metros. Con estructura en aluminio.	1.00	$ 2,043,277.32	$ 2,043,277.32

JOHN ERNESTO CARRERO VILLAMIL
R/L TIERRASUA S.A.S
Supervisor

KAREN DAYANA FLOREZ DIAZ
R/L INCOL INGENIEROS SAS
Apoyo a la Supervisión

YURI ANDREA ARIZA RIVERA
R/L INGEPLANOS S.A.S
Contratista

JUAN PABLO VARGAS CONTRERAS
COMUNICACIONES
Gobernación de Boyacá

TIERRASUA	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO:
	ESTUDIO DE PRECIOS DE MERCADO PROYECTOS	FECHA:

SPVO-011-2025 "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA Y SEÑALIZACIÓN, PARA LA DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

Fecha: AGOSTO 2025	Análisis realizado por:	YURI ANDREA ARIZA RIVERA

1. METODOLOGIA

1.1. DOCUMENTOS SOPORTE

Se anexan, 2 cotizaciones de cada item generado.

2. COMPARATIVO

INSUMOS O BIENES	NUMERO DEL ITEM (S) EN PRESUPUESTO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR 1	EMPRESA VALOR 1	VALOR 2	EMPRESA VALOR 2	VALOR 3	EMPRESA VALOR 3	VALOR PROMEDIO	IVA	TOTAL
Aviso exterior con la frase "PLAZA DE MERCADO ARACELI OCHOA PAIPA-BOYACÁ" elaborado en lámina galvanizada calibre 18 para los frentes, cantonera de 20 cm en lámina galvanizada calibre la frase PAIPA-BOYACA elaborado en lamina galvanizada calibre 18 para los frentes y cantonera de 5cm, frentes y cantoneras forrados con vinilo adhesivo laminado impreso full color y recubierto con laca acrílica transparente, medidas del aviso de 9.15 metros de longitud x 2.28 metros de alto,muro en concreto 9,15 metros de largo seccion de 0,60m altox0,35m de alto (NO INCLUYE CONSTRUCCION MURO). Base en tubo estructural 4x8 (3 Anclajes embebidos en concreto) segun diseño, para soporte frase PLAZA DE MERCADO.	N.P-1.20	UND	$ 17.899.159,66	OSCAR YESID JAIME REYES (BLACK BOX)	$ 15.714.285,71	MIGUEL ANGEL HERRERA FLOREZ (FOUR GRAPHIC)			$ 16.806.722,69	19%	$ 20.000.000,00
Fabricación de logo artesanias de Boyacá para mural elaborado en acrilico nacional de 5mm con relieves en el mismo material, intalado en muro con medidas 1.32 metros x 1.21 metros. Con estructura en aluminio.	N.P-1.22	UND	$ 2.205.000,00	OSCAR YESID JAIME REYES (BLACKBOX)	$ 1.881.554,63	MIGUEL ANGEL HERRERA FLOREZ (FOUR GRAPHIC)			$ 2.043.277,32	19%	$ 2.431.500,01

3. RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES

** EL VALOR DEL PRECIO UNITARIO EN CADA COTIZACION NO INCLUYE EL VALOR DEL IVA, EL VALOR UNITARIO CALCULADO PARA CADA MATERIAL SI INCLUYE EL VALOR DEL IVA*

4. RESPONSABLE

YURI ANDREA ARIZA RIVERA
R.L INGEPLANOS S.A.S
Contratista

Tunja, 15 de agosto de 2025 de 2025

BlackBox
Taller de Diseño

SEÑOR:

COTIZACION

Por medio de la presente la empresa BlackBox Taller de Diseño cotiza a ustedes lo siguiente:

AVISO EXTERIOR EN LÁMINA GALVANIZADA
CARACTERISTICAS: AVISO EXTERIOR EN LÁMINA GALVANIZADA
228x 915 cm con la frase "PLAZA DE MERCADO ARACELI OCHOA PAIPA BOYACÁ"

PLAZA DE MERCADO ARACELI OCHOA
FRENTE: lámina galvanizada de calibre 18.
CANTONERAS: en lámina galvanizada calibre 20 de 20 cm
TAPAS: lámina galvanizada de calibre 18
BASE: Elaborada en tubo metálico 4x8
PAIPA -BOYACA
FRENTE: lámina galvanizada de calibre 18.
CANTONERAS: en lámina galvanizada calibre 20 de 20 cm
TAPAS: lámina galvanizada de calibre 20 de 5cm

Pintura electrostática y forrada con vinilo adhesivo laminado impreso EN TINTAS UV a full color y recubierto con laca acrílica. Instalado sobre muro
NO INCLUYE MURO

PRECIO: ($17.899.159,66) DIECISIETE **MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTAY NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE CON SESENTA Y SEIS PESOS MTC**
FORMA DE PAGO:
60% Al aprobar cotización.
40% A la entrega.

TIEMPO DE ENTREGA:
A CONVENIR
VALIDEZ DE LA OFERTA:
30 DIAS
Nota: Cualquier cambio de diseño luego de comenzar la producción tendrá un sobrecosto para el comprador, de acuerdo a las modificaciones a que hubiere lugar, también cualquier retraso a que hubiere lugar.

Atentamente,

Oscar Yesid Jaime Reyes
NIT: 7178960-6
Cel: 301 736 74 60

Tunja, 20 de Agosto de 2025

SEÑORES: TIERRASUA SAS

BlackBox
Taller de Diseño

COTIZACION

Por medio de la presente la empresa BlackBox Taller de Diseño cotiza a ustedes lo siguiente:

-FABRICACION DE LOGO ARTESANIAS DE BOYACA
CARACTERISTICAS: Aviso de 1,32 x 1,21 mts elaborado de la siguiente manera:
FRENTE: En acrílico blanco 5mm
LOGO: En acrílico 5mm con colores institucionales.
BASE ESTRUCTURA: Aluminio.

PRECIO: $2.205.000 DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL PESOS MTC

FORMA DE PAGO:
60% Al aprobar cotización.
40% A la entrega.

TIEMPO DE ENTREGA:
A CONVENIR

VALIDEZ DE LA OFERTA:
30 DIAS.

Nota: Cualquier cambio de diseño luego de comenzar la producción tendrá un sobrecosto para el comprador, de acuerdo a las modificaciones a que hubiere lugar, también cualquier retraso a que hubiere lugar.

Atentamente,

Oscar Yesid Jaime Reyes
NIT: 7178960-6
Cel: 301 736 74 60
Cra 3 A #44-22, Brr 15 de Mayo, Tunja Boyacá.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14991211332

(415)7707212489984(8020) 000001499121133 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 1 7 8 9 6 0	6	Impuestos y Aduanas de Tunja	2 0

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	7178960	1 9 9 9 0 2 1 8

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Boyacá 1 5	Tunja 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
JAIME	REYES	OSCAR	YESID

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Boyacá 1 5	Tunja 0 0 1

41. Dirección principal: CR 3 A 44 22 BRR QUINCE DE MAYO

42. Correo electrónico: blackboxtddcnc@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 1 7 3 6 7 4 6 0	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 3 1 0	2 0 1 7 0 3 1 4	7 4 9 0	2 0 2 4 0 3 1 4			1 3 1 4	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 4	2	4	9																						

42- Obligado a llevar contabilidad

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2024 - 03 - 14 / 09 : 41: 59

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: PEREZ ROJAS DIEGO ARMANDO

985. Cargo: Analista IV

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 15-03-2024 11:51:56AM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14991211332

(415)7707212489984(8020) 000001499121133 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 1 7 8 9 6 0	6	Impuestos y Aduanas de Tunja	2 0

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o Institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 9	
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 7 0 3 1 4	
77. No. Matrícula mercantil	1 4 7 6 4 1	
78. Departamento	1 5	
79. Ciudad/Municipio	3 8	

Vigencia

80. Desde	
81. Hasta	

Composición del Capital

82. Nacional	%
83. Nacional público	%
84. Nacional privado	%
85. Extranjero	%
86. Extranjero público	%
87. Extranjero privado	%

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 7 0 3 1 4		
2	8 1	2 0 1 7 0 3 1 4		
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 3 de 3 **Hoja 6**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14991211332

(415)7707212489984(8020) 000001499121133 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Tunja | 14. Buzón electrónico

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento: Establecimiento de comerci 0 2
161. Actividad económica: Comercio al por menor de libros, periodicos, materiales y articulos de papele 5 2 4 4
162. Nombre del establecimiento: MUNDO DETALLE SAN MATEO
163. Departamento: Boyacá 1 5
164. Ciudad/Municipio: San Mateo 6 7 3
165. Dirección: CL 3 3 17
166. Número de matrícula mercantil: 5 4 0 6 2
167. Fecha de la matrícula mercantil: 2 0 0 8 0 2 2 2
168. Teléfono: 3 1 2 4 6 5 7 0 2 8
169. Fecha de cierre: 2 0 1 2 1 0 1 8

2

160. Tipo de establecimiento: Establecimiento de comerci 0 2
161. Actividad económica: Publicidad 7 3 1 0
162. Nombre del establecimiento: BLACK BOX TALLER DE DISEÑO
163. Departamento: Boyacá 1 5
164. Ciudad/Municipio: Tunja 0 0 1
165. Dirección: CR 3 A 44 22 BRR QUINCE DE MAYO
166. Número de matrícula mercantil: 1 2 4 9 5 8
167. Fecha de la matrícula mercantil: 2 0 1 3 0 9 0 9
168. Teléfono: 3 0 1 7 3 6 7 4 6 0
169. Fecha de cierre:

3

160. Tipo de establecimiento:
161. Actividad económica:
162. Nombre del establecimiento:
163. Departamento:
164. Ciudad/Municipio:
165. Dirección:
166. Número de matrícula mercantil:
167. Fecha de la matrícula mercantil:
168. Teléfono:
169. Fecha de cierre:

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

FOUR GRAPHIC
Diseño & Publicidad

27 de agosto del 2025 **Tunja - Boyacá**

COTIZACIÓN

Sr(s).

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

De ante mano reciban un cordial saludo de nuestra parte.

Teniendo en cuenta la solicitud realizada por ustedes, muy amablemente presentamos la siguiente cotización comercial, teniendo una validez de ocho (8) días a partir de la misma.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNI	VALOR TOTAL
1	Aviso exterior con la frase "PLAZA DE MERCADO ARACELI OCHOA PAIPA-BOYACÁ" elaborado en lámina galvanizada calibre 18 para los frentes, cantonera de 20 cm en lámina galvanizada calibre la frase PAIPA-BOYACA elaborado en lamina galvanizada calibre 18 para los frentes y cantonera de 5cm, frentes y cantoneras forrados con vinilo adhesivo laminado impreso full color y recubierto con laca acrílica transparente, medidas del aviso de 9.15 metros de longitud x 2.28 metros de alto muro en concreto 9,15 metros de largo seccion de 0,60m altox0,35m de alto (NO INCLUYE CONSTRUCCION MURO) Base en tubo estructural 4x8 (3 Anclajes embebidos en concreto) segun diseño, para soporte frase PLAZA DE MERCADO	1	$15.714.286,71	$15.714.286,71
1	Fabricación de logo artesanías de Boyacá para mural elaborado en acrílico nacional de 5mm con relieves en el mismo material, intalado en muro con medidas 1.32 metros x 1.21 metros. Con estructura en aluminio.	1	$1.881.554,63	$1.881.554,63

Agradecemos su pronta respuesta.

Cordialmente,

Tiempos de entrega: a convenir según prioridad y conveniencia para el cliente.

Miguel Ángel Herrera

MIGUEL ÁNGEL HERRERA
Four Graphic - Publicidad & Diseño
Celular: 313 822 6494 - 323 250 6578

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141195527933

(415)7707212489984(8020) 000014119552793 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 1 0 1 0 2 1 7 3 1 0 | 6. DV 9

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Tunja

14. Buzón electrónico 2 0

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 1 0 2 1 7 3 1 0

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
HERRERA	FLOREZ	MIGUEL	ANGEL

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Boyacá 1 5	Tunja 0 0 1

41. Dirección principal: CR 14 20 73 ESQ

42. Correo electrónico: 4graphictunja@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1: 3 2 3 2 5 0 6 5 7 8 | 45. Teléfono 2: 3 1 3 8 2 2 6 4 9 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 3 1 0	2 0 1 3 0 1 1 4	8 2 1 9	2 0 2 3 0 3 2 3				1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53. Código 5 4 2 4 9 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
42- Obligado a llevar contabilidad
49 - No responsable de IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI ☐ NO ☐ 60. No. de Folios:

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre

985. Cargo

DOCUMENTO SIN COSTO
IMPRESO POR EL USUARIO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141195527933

(415)7707212489984(8020) 000014119552793 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 1 0 2 1 7 3 1 0	9	Impuestos y Aduanas de Tunja	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 9	
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 0 0 2 2 6	
77. No. Matrícula mercantil	1 7 9 1 4 9	
78. Departamento	1 5	
79. Ciudad/Municipio	3 8	

Composición del Capital

82. Nacional ____ %

83. Nacional público ____ %

84. Nacional privado ____ %

85. Extranjero ____ %

86. Extranjero público ____ %

87. Extranjero privado ____ %

Vigencia

80. Desde

81. Hasta

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 3 0 3 2 3		
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

BORRADOR DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 3 de 3 **Hoja 6**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141195527933

(415)7707212489984(8020) 000014119552793 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 1 0 2 1 7 3 1 0	9	Impuestos y Aduanas de Tunja	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comercl 0 2	Publicidad 7 3 1 0

162. Nombre del establecimiento: 4GRAPHIC

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Boyacá 1 5	Tunja 0 0 1

165. Dirección: CR 14 20 73 ESQ

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
1 7 9 1 5 0	2 0 2 0 0 2 2 6
168. Teléfono: 3 2 3 2 5 0 6 5 7 8	169. Fecha de cierre

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

BORRADOR DOCUMENTO SIN COSTO

MODIFICATORIO NO.01 AL CONTRATO – No. IPVO 011-2025

Entre los suscritos **JOHN ERNESTO CARRERO VILLAMIL,** identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.160.233 de Tunja-Boyacá, debidamente facultado y quien actúa en calidad de Representante legal de **TIERRASUA S.A.S** antes denominada ALIANZA SOCIETARIA Y DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE BOYACÁ – "ASDETBOY S.A.S", identificada con NIT Nó. 901.285.377-2, Sociedad de economía mixta debidamente constituida mediante documento privado del 15 de enero de 2019, inscrita ante la cámara de comercio de Tunja el día 17 de mayo de 2019, bajo el número de matrícula 171657, ente de carácter mixto con participación accionaria mayoritaria del INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACÁ – INFIBOY hoy INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACÁ – IDEBOY, según consta en el certificado de composición accionaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 461 del Código de Comercio; quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATANTE,** por una parte y por la otra **INGEPLANOS S.A.S.,** identificada con NIT No.900.862.115-1, representada legalmente por **YURI ANDREA ARIZA RIVERA**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 53.081.028 expedida en Bogotá, quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido en celebrar el presente modificatorio No. 01 al contrato – No. **IPVO 011-2025** teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que entre **TIERRASUA S.A.S** e **INGEPLANOS S.A.S** se celebró el **CONTRATO – No. IPVO 011-2025** cuyo objeto es el **"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA Y SEÑALIZACIÓN, PARA LA DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"**, por la suma de **DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($243.226.480,00)** y un plazo de ejecución de TRES (03) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio y a través de la plataforma SECOP II.

2. Que con fecha veinte (20) de junio de 2025, se suscribió el acta de inicio del referido contrato, por lo que el mismo se encuentra vigente y en ejecución.

3. Que en desarrollo del contrato se hizo necesario modificar algunas especificaciones técnicas iniciales establecidas para la ejecución de los ítems: **a.** *Item 1.2 Aviso entrada bomberos elaborado acrílico con textura en madera, con relieves en acrílico y luz interior de medida 6x250mts con estructura metálica de soporte en tubo de 4x4 según diseño suministrado instalado a techo con tubo redondo y gaya de seguridad.* Lo anterior teniendo en cuenta que *Se advierte una incongruencia en la descripción de las dimensiones del aviso a suministrar, toda vez que en los documentos contractuales se menciona un aviso de 6 m x 250 metros, lo cual resulta técnica y económicamente inviable, y carece de correspondencia lógica entre las dimensiones indicadas y el precio ofertado. No obstante, al revisar la especificación técnica correspondiente, se evidencia que las dimensiones correctas serían de 6 m x 2.50 m, lo que sugiere la posible existencia de un error material o de digitación, consistente en haber consignado "250" en lugar de "2.50". Esta situación genera la necesidad de aclarar y ajustar dicha información con el fin de garantizar la coherencia técnica y presupuestal del objeto contractual. El*

contratista llevó a cabo la verificación de la especificación técnica del aviso, la cual resulta clara y precisa en cuanto a la dimensión del módulo gráfico, así como respecto a la longitud y la materialidad del sistema de anclaje del mismo. Dichas especificaciones si bien se cumple con las dimensiones del aviso. Existe la ausencia en la descripción del ítem de realizar claridad a la dimensión del módulo gráfico.

b. *Ítem 1.3: Aviso exterior con la frase "plaza de mercado de paipa" elaborado en lámina galvanizada encantonado con cantonera de 20cm y adosamiento a piso calibre 20 forrada con vinilo adhesivo laminado impreso a full color y recubierto con laca acrílica transparente de medidas 15mtsx1.20,* lo anterior teniendo en cuenta que *una vez verificado el predio donde se instalará el aviso, se identificó que la longitud inicialmente prevista de 15 metros genera una afectación a las zonas de circulación peatonal dentro del espacio público, lo cual compromete la funcionalidad y la seguridad del entorno. Adicionalmente, dadas las características topográficas del terreno, en particular la inclinación del suelo, y considerando las cargas de viento a las que estará expuesto el aviso, se evidencia un riesgo potencial de volcamiento, incluso en caso de contar con un sistema de anclaje cimentado. En razón de lo anterior, se considera técnicamente necesario reducir las dimensiones del aviso en longitud, sin que ello implique una disminución del área total (metros cuadrados) a suministrar, garantizando así el cumplimiento del objeto contractual. Cabe resaltar que, si bien la especificación inicial del aviso incluía únicamente la leyenda "Plaza de Mercado de Paipa", el diseño actual incorpora un número mayor de caracteres, a saber: "Plaza de Mercado Araceli Ochoa Paipa - Boyacá", lo cual exige una redistribución del contenido visual y estructural para mantener proporción y legibilidad, sin exceder los límites físicos del predio*

c. *Ítem 1.5. Aviso informativo en madera laminada con apliques en acrílico en relieve con luz interior de medidas 150x100cm, instalados colgados a techo con tubo redondo de 120 cm.* Lo anterior teniendo en cuenta que *Se realizó visita técnica a la Plaza de Mercado, en el marco de las actividades de seguimiento y verificación del cumplimiento del objeto contractual. Durante dicha visita, se identificaron las siguientes necesidades: 1. Que de acuerdo a las características del aviso con respecto al anclaje se solicita la instalación de tubo redondo de longitud 1.20mts y a altura total de dicho aviso corresponde a una longitud total de 2.20mtrs, por lo tanto, tomando en consideración la altura de entrepisos de la plaza de mercado se observa que la altura total no corresponde a la altura necesaria del espacio ya que invade la zona de circulación como se observa en la imagen. Por ende, se ve la necesidad de modificar la altura de los tubos de anclaje del aviso sin que esto implique un desmejoramiento de calidad y estabilidad del diseño. Esta acción responde al principio de funcionalidad del mobiliario urbano y contribuye al cumplimiento de los fines del contrato en términos de accesibilidad, organización y mejora del entorno comercial.*

d. *Item 1.10. Fabricación de logo artesanías de Boyacá para mural elaborado en acrílico nacional de 5mm con relieves en el mismo material, instalado en muro con medidas 300x150cm,* lo anterior teniendo en cuenta que, *Durante la visita técnica al sitio, se evidenció que el muro inicialmente previsto para la instalación ya cuenta con un mural artístico (muralismo), el cual representa un valor estético y cultural que*

debe preservarse. Por esta razón, se hace necesario modificar la ubicación y dimensiones del aviso, considerando las siguientes alternativas: Opción 1 – Instalación sobre módulo en vidrio templado: Se propone instalar el aviso sobre la estructura de un módulo en vidrio templado, con dimensiones ajustadas para que el mismo no impida la exhibición de artesanías el cual emplearía un mecanismo de soporte tipo riel de sobreponer, que garantice seguridad y no represente ningún riesgo o afectación al módulo de vidrio templado ya instalado. Opción 2 – Instalación suspendida desde el techo: Se propone instalar el aviso en posición colgante desde el techo, utilizando elementos de soporte tipo tubo. Esta alternativa permite conservar la visibilidad del módulo de vidrio, evita interferencias con elementos existentes, y garantiza la visibilidad del logo sin comprometer la integridad del mural artístico existente. Considerando las alternativas propuestas anteriormente y en común acuerdo entre el equipo de comunicaciones de la gobernación, la supervisión y el contratista, se toma la decisión de reducir el tamaño o dimensión del aviso de modo que permita el anclaje sobre el módulo de vidrio sin afectar visualmente la exposición de artesanías y sin comprometer la estabilidad y/o seguridad de la misma.

4. Que de acuerdo con lo anterior, se hizo necesaria la creación de los siguientes ítems:

A. ítem N.P-1.19 Aviso informativo elaborado en melamina referencia nogal de 6mm de espesor, con apliques en acrílico en relieve e iluminación interior. Las dimensiones del aviso son de 7.50 metros x 2.50 metro con estructura de soporte y área gráfica, medidas del área grafica son de 5 metros x 2.50 metros, sistema de instalación mediante doble anclaje (superior e inferior) utilizando tubo redondo de 4" calibre 16 en cada tubo al final debe tener una especie de u para mayor soporte al muro, garantizando estabilidad y resistencia estructural.

B. Ítem N.P-1.20 Aviso exterior con la frase "PLAZA DE MERCADO ARACELI OCHOA PAIPA-BOYACÁ" elaborado en lámina galvanizada calibre 18 para los frentes, cantonera de 20 cm en lámina galvanizada calibre la frase PAIPA-BOYACA elaborado en lamina galvanizada calibre 18 para los frentes y cantonera de 5cm, frentes y cantoneras forrados con vinilo adhesivo laminado impreso full color y recubierto con laca acrílica transparente, medidas del aviso de 9.15 metros de longitud x 2.28 metros de alto,muro en concreto 9,15 metros de largo seccion de 0,60m altox0,35m de alto (NO INCLUYE CONSTRUCCION MURO). Base en tubo estructural 4x8 (3 Anclajes embebidos en concreto) segun diseño, para soporte frase PLAZA DE MERCADO.

C. Item N.P-1.21. Aviso informativo en melamina nogal con apliques en acrílico en relieve con luz interior de medidas 1.50x1 metros instalados colgados a techo con dos tubos redondos de 0.40metros. Doble cara

D. Item N.P-1.22. Fabricación de logo artesanías de Boyacá para mural elaborado en acrílico nacional de 5mm con relieves en el mismo material, instalado en muro con medidas 1.32 metros x 1.21 metros. Con estructura en aluminio.

5. Teniendo en cuenta lo anterior se realizó el respectivo estudio de mercado mediante cotizaciones, las cuales fueron promediadas y se fijó el precio de los ítems N.P-1.20 y N.P-1.22, con las modificaciones atrás señaladas.

6. Que el contratista y la supervisión del contrato, así como el apoyo a la supervisión suscribieron la respectiva acta técnica modificatoria de fecha 25 de agosto de 2025 y sábana de modificación de cantidades, que además contó con el visto bueno del profesional designado por la oficina de comunicaciones de la Gobernación de Boyacá, documentos que forma parte integral del presente modificatorio, y mediante oficio de fecha 09 de septiembre de 2025, solicitaron la realización del presente modificatorio.

7. se deja constancia que el presente ajuste no modifica objeto ni el alcance del contrato, por lo que resulta procedente su suscripción. Por lo anterior las partes obrando bajo el principio de autonomía de la voluntad negocial, acuerdan suscribir el presente modificatorio al **contrato No. IPVO 011-2025** el cual se regirá además por las siguientes

CLÁUSULAS:

PRIMERA.- MODIFICAR la CLAUSULA SEGUNDA del contrato **No. IPVO 011-2025,** en cuanto a la modificación de los ítems N.P-1.19, Ítem N.P-1.20, Ítem N.P-1.21, Ítem N.P-1.22, los cuales quedarán así:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CAT	V/R UNITARIO	V/R TOTAL
N.P-1.19	Aviso informativo elaborado en melamina referencia nogal de 6mm de espesor, con apliques en acrílico en relieve e iluminación interior. Las dimensiones del aviso son de 7.50 metros x 2.50 metro con estructura de soporte y área grafica, medidas del área grafica son de 5 metros x 2.50 metros, sistema de instalación mediante doble anclaje (superior e inferior) utilizando tubo redondo de 4" calibre 16 en cada tubo al final debe tener una especie de u para mayor soporte al muro, garantizando estabilidad y resistencia estructural.	UNID	1	$ 17.925.000,00	$ 17.925.000,00
N.P-1.20	Aviso exterior con la frase "PLAZA DE MERCADO ARACELI OCHOA PAIPA-BOYACÁ" elaborado en lámina galvanizada calibre 18 para los frentes,				

	cantonera de 20 cm en lámina galvanizada calibre la frase PAIPA-BOYACA elaborado en lámina galvanizada calibre 18 para los frentes y cantonera de 5cm, frentes y cantoneras forrados con vinilo adhesivo laminado impreso full color y recubierto con laca acrílica transparente, medidas del aviso de 9.15 metros de longitud x 2.28 metros de alto, muro en concreto 9,15 metros de largo sección de 0,60m altox0,35m de alto (NO INCLUYE CONSTRUCCION MURO). Base en tubo estructural 4x8 (3 Anclajes embebidos en concreto) según diseño, para soporte frase PLAZA DE MERCADO.	UNID	1	**$16.806.722,69**	**$16.806.722,69**
N.P-1.21	Aviso informativo en melamina nogal con apliques en acrílico en relieve con luz interior de medidas 1.50x1 metros instalados colgados a techo con dos tubos redondos de 0.40metros. Doble cara	UNID	7	**$2.855.000,00**	$19.985.000,00
N.P-1.22	Fabricación de logo artesanías de Boyacá para mural elaborado en acrílico nacional de 5mm con relieves en el mismo material, instalado en muro con medidas 1.32 metros x 1.21 metros. Con estructura en aluminio.	UNID	1	**$2.043.277,32**	**$2.043.277,32**

PARAGRAFO: las especificaciones técnicas y precios pactados para los demás ítems objeto del contrato se mantienen como se pactaron inicialmente.

SEGUNDA- EL CONTRATISTA se obliga a informar la presente modificación a la compañía aseguradora garante del contrato atrás citado.

TERCERA.- Hacen parte integral del presente modificatorio: **a.** el Acta técnica modificatoria, **b.** la sabana modificatoria de cantidades. **c.** el oficio de fecha 09 de septiembre de 2025, **d.** estudio del mercado y cotizaciones.

CUARTA.- Las demás cláusulas pactadas en el contrato se mantienen vigentes, exigibles y sin modificación alguna.

En constancia se firma en Tunja a los Diez (10) días del mes de septiembre de 2025.

R.L. JOHN ERNESTO CARRERO VILLAMIL
TIERRASUA S.A.S.
CONTRATANTE

R.L. YURI ANDREA ARIZA RIVERA
INGEPLANOS S.A.S
CONTRATISTA

Nombres y Apellidos		Cargo	Firma
Revisó	Laura Catherine Rivera Echenique	Dep. Jurídico y Contratación	
Revisó	Yanyd Pinilla Pinilla	Asesora Externa	
Elaboró	Dana Catalina Suesca Rodriguez	Contratista	

ingeplanos
Primeros en Impresión Eco amigable

INGEPLANOS S.A.S
NIT: 900862115-1
Régimen simple
de tributación

SOLICITUD DE PRÓRROGA CONTRACTUAL

Para: INCOL INGENIEROS SAS
NIT: 901.847.609-9
Supervisión del Contrato No. IPVO-011-2025

De: INGEPLANOS S.A.S.
NIT: 900.862.115-1
Representante Legal: YURI ANDREA ARIZA RIVERA
C.C.: 53.081.028

Asunto: SOLICITUD DE PRÓRROGA - CONTRATO No. IPVO-011-2025

Fecha: Tunja, 19 de septiembre de 2025

Respetados señores,

Por medio de la presente y en mi calidad de Representante Legal de INGEPLANOS S.A.S., contratista del proceso IPVO-011-2025 cuyo objeto es "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA Y SEÑALIZACIÓN, PARA LA DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ", me dirijo respetuosamente a ustedes con el fin de **SOLICITAR UNA PRÓRROGA DE OCHO (8) DÍAS CALENDARIO** para la ejecución del mencionado contrato.

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

La presente solicitud se fundamenta en las siguientes consideraciones técnicas:

MOTIVO: Finalización de los ítems 1.2 y 1.8 correspondientes a los avisos, debido al *cambio de localización* que se presentó durante el desarrollo del proyecto.

SITUACIÓN ACTUAL: Durante la ejecución del contrato, se presentaron modificaciones en la ubicación específica de ciertos elementos de señalización, lo cual requiere ajustes técnicos en la instalación de los avisos contemplados en los ítems mencionados.

IMPACTO: Esta modificación de localización implica reajustes en el cronograma de instalación que requieren tiempo adicional para garantizar el cumplimiento adecuado de las especificaciones técnicas del contrato.

TÉRMINOS DE LA PRÓRROGA SOLICITADA

- **Tiempo solicitado:** Ocho (8) días calendario
- **Ítems afectados:** 1.2 y 1.8 (Avisos)
- **Justificación técnica:** Cambio de localización
- **Fecha propuesta de terminación:** [20 DE SEPTIEMBRE DE 2025+ 8 días]

COMPROMISOS DEL CONTRATISTA

INGEPLANOS S.A.S. se compromete a:

1. Finalizar la instalación de los ítems 1.2 y 1.8 en las nuevas localizaciones definidas
2. Mantener la calidad y especificaciones técnicas establecidas en el contrato original
3. No generar sobrecostos adicionales por esta modificación
4. Cumplir con todas las demás obligaciones contractuales durante el período de prórroga

Solicitamos comedidamente su concepto técnico favorable y la tramitación correspondiente ante TIERRASUA S.A.S. para la formalización de esta prórroga, la cual consideramos necesaria para el adecuado cumplimiento del objeto contractual.

Quedamos atentos a sus observaciones y a los procedimientos que consideren pertinentes para la aprobación de esta solicitud.

Cordialmente,

YURI ANDREA ARIZA RIVERA
Representante Legal
INGEPLANOS S.A.S.
C.C. 53.081.028
Teléfono: 3187946169
Correo: ingeplanospolitica@gmail.com

Copia: TIERRASUA S.A.S. - Área Jurídica y de Contratación

Tunja 19 de septiembre de 2025

Señores:

TIERRASUA
Atn. Dr. JOHN ERNESTO CARRERO VILLAMIL

IPUO-088-2025-OF-083

REFERENCIA: IPUO-088 DE 2025, CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN "DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA".

ASUNTO: SOLICITUD DE PRORROGA PARA EL CONTRATO IPVO-011-2025

Cordial saludo,

Por medio del presente documento yo **KAREN DAYANA FLOREZ DIAZ** identificada con CC.1.052.410.270 de Duitama, en calidad de representante legal de la empresa **INCOL INGENIEROS SAS**, en mi condición de apoyo a la supervisión del proyecto cuyo objeto es la "Dotación de la Plaza de Mercado del Municipio de Paipa, en el Departamento de Boyacá".

En cumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas del Contrato IPUO-088-2025 y en ejercicio de las funciones de apoyo a la supervisión de los contratos a mi cargo, Por medio del presente, me permito informar que, debido a que el contratista manifiesta que no ha podido entregar los avisos contratados para la finalización del Contrato IPVO-011-2025, se solicitar realizar la suscripción de acta de prorroga en tiempo N°1 con un plazo de 8 días calendario.

Esta prórroga tiene como objetivo permitir la correcta y completa ejecución de las actividades de suministro pendientes, garantizando la finalización exitosa del proyecto. Se solicita a el contratista tomar las medidas necesarias para cumplir con este nuevo plazo.

Sin otro particular, agradezco la atención prestada y quedo atento a la respectiva respuesta.

Cordialmente,

IPUO-088-2025-OF-083

KAREN DAYANA FLOREZ DIAZ
RL INCOL INGENIEROS SAS
NIT 901.847.609-9
SUPERVISOR IPUO-088 DE 2025
