	FORMATO		CÓDIGO	ES-MC-FR-06
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA		VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN		FECHA	23/02/2025

FECHA DE REUNIÓN :	1505/2025	**ACTA No.**	**22**
HORA DE INICIO:	2:00 p. m.	**HORA FINALIZACIÓN:**	4:30 p. m.
LUGAR DE REUNIÓN:	Presencial		
DEPENDENCIA:	Técnica - Interventoría - Contratista -		

OBJETO DE LA REUNIÓN

Contrato de obra ICCU-139 de 2025 - Metodologia Inventarios

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El día 15 de mayo de 2025 se llevó a cabo una reunión entre el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCU), la interventoría y el contratista, con el fin de revisar aspectos técnicos, ambientales y sociales relacionados con el avance del contrato de obra.

Durante el encuentro se presentó formalmente la ingeniera ambiental designada por el ICCU, quien tendrá a cargo la verificación del Plan de Gestión Ambiental (PAGA). Se abordaron temas relacionados con la socialización del proyecto en la provincia de Río Negro, quedando definida la jornada para el día 19 de mayo a las 10:00 a.m. en el salón comunal local. El material de socialización fue aprobado por las partes.

Adicionalmente, se presentaron los resultados de las visitas técnicas recientes realizadas en varios frentes del proyecto, donde se identificaron puntos críticos relacionados con el manejo de aguas superficiales. Se propuso iniciar la fase de caracterización hidráulica, sujeta a revisión y aprobación por parte del ICCU.

También se discutieron aspectos técnicos relacionados con la topografía y verificación de estructuras de drenaje. En cuanto al componente ambiental, se reiteró que el PAGA es un documento en desarrollo, sujeto a ajustes conforme avanza la ejecución del proyecto. Se recomendó articular el trabajo técnico con la gestión social, a través de encuestas comunitarias que permitan fortalecer el relacionamiento con las comunidades y apoyar el seguimiento ambiental.

En relación con la planificación, se revisaron temas asociados a la metodología de ejecución y programación. Se acordó realizar una reunión específica para su definición, con el fin de evitar retrasos y facilitar los procesos de aprobación y seguimiento.

Finalmente, se trataron observaciones relacionadas con tramos que no requerirán intervención por contar con estructuras existentes. Se propuso elaborar una comunicación oficial conjunta entre las partes (ICCU – Interventoría – Contratista – Alcaldías) para dejar claridad sobre la situación de dichos tramos, incluyendo los soportes técnicos y cartográficos respectivos. 1.
Participación y temas ambientales
Se presenta la ingeniera ambiental María Paula Escobar (ICCU), encargada de la verificación del PAGA ambiental.

Se aprueba el póster para socialización del proyecto, que se realizará el 19 de mayo en la provincia de Río Negro, a las 10:00 a.m. en el salón comunal.

2. Recorridos técnicos
Se realizaron visitas técnicas en La Palma, Yacopí (2 tramos), Simijacá, Almeidas y Manta, identificando puntos críticos relacionados con manejo de aguas.

Se propone iniciar caracterización hidráulica en los sitios identificados como críticos. Se está a la espera de respuesta por parte del ICCU.

3. Topografía y revisión del PAGA
Se revisan cunetas, pendientes y canales.

El contratista solicita apoyo del ingeniero ambiental para verificar el PAGA, el cual es considerado preliminar y sujeto a ajustes conforme avanza la obra.

Se propone establecer mesas de trabajo técnicas para definir metodología y programación.

4. Gestión social
Se solicita a los profesionales sociales realizar encuestas comunitarias que sirvan tanto para la ejecución del proyecto como para fortalecer el PAGA ambiental.

5. Metodología y avances
Se acuerda una próxima reunión (16/05/2025) para definir la metodología de trabajo.

El contratista atribuye el retraso al no haber aprobación de la metodología, mientras que la interventoría señala que el inventario vial y la aprobación de tramos es más relevante y debe priorizarse.

6. Observaciones al contratista
Se solicita que el contratista cuente con:

Personal mínimo en campo.

Oficina operativa en algún tramo del proyecto (no desde Bogotá).

Se evidencia baja presencia del contratista en obra, lo que genera inquietud en comunidades y alcaldías.

7. Tramos no intervenidos
Se presentan observaciones sobre tramos que no requieren intervención (por contar con placas huella existentes).

Se debe elaborar un comunicado conjunto (interventoría–contratista–ICCU–alcaldías) aclarando los tramos no ejecutables.

Se solicita enviar carta al ICCU, adjuntando acta de localización, kilómetros no intervenidos y archivo KMZ.

8. Compromisos
Socializar el póster aprobado con las comunidades.

Aplicar encuestas sociales para evaluación del PAGA.

Subsanar y aprobar metodología de trabajo.

Elaborar y enviar comunicado oficial sobre tramos no intervenidos.


Presentar plan de contingencia para visitas e inventarios.

Entregar informes técnicos actualizados por parte del contratista

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Socialización del póster aprobado con la comunidad	19-may-25
Aplicación de encuestas sociales para evaluación del PAGA.	
Subsanación de la metodología y su aprobación inmediata.	16-may-25
Elaboración de carta al ICCU sobre tramos no ejecutables.	25-may-25
Presentación de plan de contingencia para visitas e inventarios.	pendiente por contratista
Entrega de informes actualizados por parte del contratista.	pendiente por contratista

ASISTENTES: Se adjunta lista de asistencia diligenciada por cada uno de los participantes.

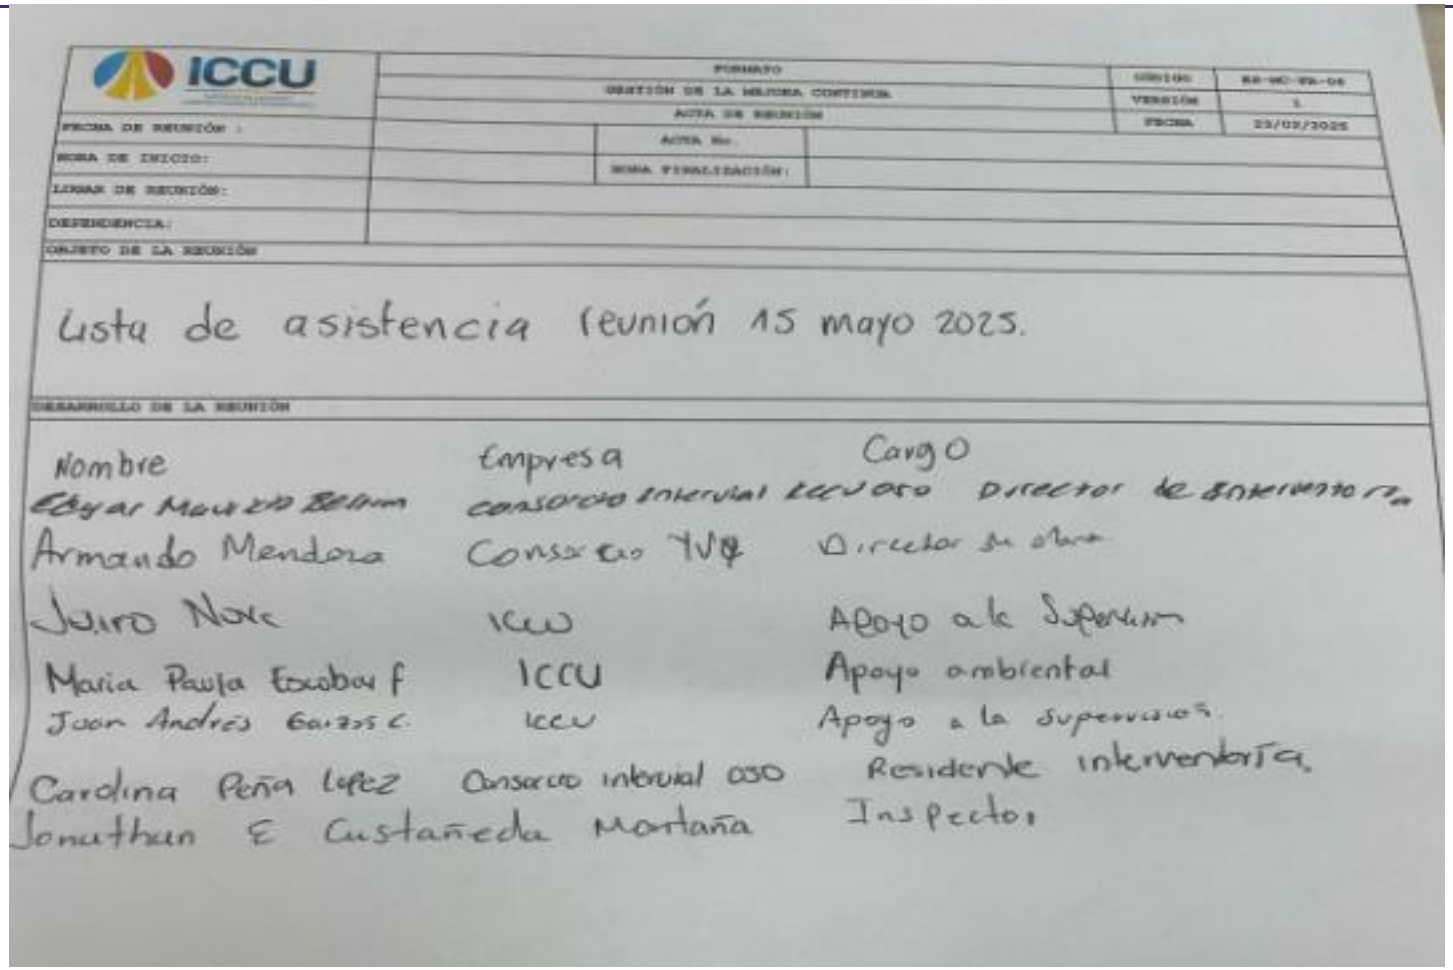

ICCU

FORMATO	CÓDIGO	SS-MC-PR-06
GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	1
ACTA DE REUNIÓN	FECHA	23/09/2025

FECHA DE REUNIÓN: | ACTA No.:

HORA DE INICIO: | HORA FINALIZACIÓN:

LUGAR DE REUNIÓN:

DEPENDENCIA:

OBJETO DE LA REUNIÓN

Lista de asistencia reunión 15 mayo 2025.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Nombre	Empresa	Cargo
Edgar Mauricio Beltran	consorcio intervial iccu oso	Director de interventoría
Armando Mendoza	Consorcio YVA	Director de obra
Julio Nole	ICCU	Apoyo a la Supervisión
Maria Paula Escobar F	ICCU	Apoyo ambiental
Juan Andres Gaitan C	ICCU	Apoyo a la supervisión
Cardina Peña Lopez	Consorcio intervial oso	Residente interventoría
Jonathan E Castañeda Montaña		Inspector
