GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

FRENTE DE TRABAJO

ORTEGA

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

MAYO-JUNIO DEL 2025

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

MAYO-JUNIO DEL 2025

OBJETO
CONTRATO NO.4155 DE 2024

"CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA".

FRENTE DE TRABAJO ORTEGA

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

MAYO-JUNIO DEL 2025

INTEGRANTES

SUPERVISOR DE CAMPO	ING. DIANA GALLEGO
MOTONIVELADORA NUEVA #3	DIEGO OVALLE
RETROEXCAVADORA #39	WILDER MUÑOZ
VOLQUETA #8	DAVID OSPINA
VOLQUETA #16	EMIR DIAZ

FRENTE DE TRABAJO ORTEGA

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

MAYO-JUNIO DEL 2025

VIA INTERVENIDA

ORTEGA: GUAYAQUIL, PALOMA

EMERGENCIAS: SAN ANTONIO

FRENTE DE TRABAJO ORTEGA

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

MAYO-JUNIO DEL 2025

MAQUINARIA EN OPERACIÓN









FRENTE DE TRABAJO ORTEGA

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

MAYO-JUNIO DEL 2025

TOTAL, ACTIVIDADES REALIZADAS MEJORAMIENTO DE LA VÍA ORTEGA: GUAYAQUIL-PALOMA

FECHA	ABSCISA		VOLQUETA No.	VOL. VIAJE	No. VIAJES	VOLUMEN
	DE	A				
26/05/2025	K0+000	K0+304	16	7	5	35
27/05/2025	K0+304	K0+608	8, 16	7	8	56
28/05/2025	K0+608	K0+912	8, 16	7	8	56
29/05/2025	K0+912	K1+216	8, 16	7	8	56
30/05/2025	K1+216	K1+520	8, 16	7	8	56
31/05/2025	K1+520	K1+824	8	7	5	35
01/06/2025	K1+824	K2+128	8, 16	7	8	56
02/06/2025	K2+128	K2+432	8, 16	7	8	56
03/06/2025	K2+432	K2+736	8, 16	7	8	56
04/06/2025	K2+736	K3+040	8, 16	7	8	56
09/06/2025	K3+040	K3+344	8, 16	7	8	56
10/06/2025	K3+344	K3+648	8, 16	7	8	56
11/06/2025	K3+648	K3+952	8, 16	7	8	56
12/06/2025	K3+952	K4+256	8	7	5	35
18/06/2025	K4+256	K4+560	8, 16	7	8	56
19/06/2025	K4+560	K4+864	8	7	5	35
24/06/2025	K4+864	K5+168	8	7	5	35
25/06/2025	K5+168	K5+472	8, 16	7	8	56
26/06/2025	K5+472	K5+776	8, 16	7	8	56
27/06/2025	K5+776	K6+080	8, 16	7	8	56
28/06/2025	K6+080	K6+384	8, 16	7	8	56
29/06/2025	K6+384	K6+688	8	7	5	35
30/06/2025	K6+688	K7+000	8	7	5	35
TOTAL, MEJORAMIENTO DE LA VIA						1.141

FRENTE DE TRABAJO ORTEGA

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

MAYO-JUNIO DEL 2025

TOTAL, ACTIVIDADES REALIZADAS ORTEGA: GUAYAQUIL-PALOMA CONFORMACIÓN DE LA VÍA

FECHA	ABSCISA		LONGITUD	ANCHO	AREA
	DE	A			
26/05/2025	K0+000	K0+304	304	5	1.520
27/05/2025	K0+304	K0+608	304	5	1.520
28/05/2025	K0+608	K0+912	304	5	1.520
29/05/2025	K0+912	K1+216	304	5	1.520
30/05/2025	K1+216	K1+520	304	5	1.520
31/05/2025	K1+520	K1+824	304	5	1.520
01/06/2025	K1+824	K2+128	304	5	1.520
02/06/2025	K2+128	K2+432	304	5	1.520
03/06/2025	K2+432	K2+736	304	5	1.520
04/06/2025	K2+736	K3+040	304	5	1.520
09/06/2025	K3+040	K3+344	304	5	1.520
10/06/2025	K3+344	K3+648	304	5	1.520
11/06/2025	K3+648	K3+952	304	5	1.520
12/06/2025	K3+952	K4+256	304	5	1.520
18/06/2025	K4+256	K4+560	304	5	1.520
19/06/2025	K4+560	K4+864	304	5	1.520
24/06/2025	K4+864	K5+168	304	5	1.520
25/06/2025	K5+168	K5+472	304	5	1.520
26/06/2025	K5+472	K5+776	304	5	1.520
27/06/2025	K5+776	K6+080	304	5	1.520
28/06/2025	K6+080	K6+384	304	5	1.520
29/06/2025	K6+384	K6+688	304	5	1.520
30/06/2025	K6+688	K7+000	312	5	1.560
TOTAL, CONFORMACION DE LA VIA					35.000

FRENTE DE TRABAJO ORTEGA

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

MAYO-JUNIO DEL 2025

TOTAL, ACTIVIDADES REALIZADAS ORTEGA: GUAYAQUIL-PALOMA CONFORMACIÓN DE CUNETAS

FECHA	ABSCISA		LONGITUD	N° CARRILES	LONGITUD TOTAL
	DE	A			
26/05/2025	K0+000	K0+304	304	1	304
27/05/2025	K0+304	K0+608	304	1	304
28/05/2025	K0+608	K0+912	304	1	304
29/05/2025	K0+912	K1+216	304	1	304
30/05/2025	K1+216	K1+520	304	1	304
31/05/2025	K1+520	K1+824	304	1	304
01/06/2025	K1+824	K2+128	304	1	304
02/06/2025	K2+128	K2+432	304	1	304
03/06/2025	K2+432	K2+736	304	1	304
04/06/2025	K2+736	K3+040	304	1	304
09/06/2025	K3+040	K3+344	304	1	304
10/06/2025	K3+344	K3+648	304	1	304
11/06/2025	K3+648	K3+952	304	1	304
12/06/2025	K3+952	K4+256	304	1	304
18/06/2025	K4+256	K4+560	304	1	304
19/06/2025	K4+560	K4+864	304	1	304
24/06/2025	K4+864	K5+168	304	1	304
25/06/2025	K5+168	K5+472	304	1	304
26/06/2025	K5+472	K5+776	304	1	304
27/06/2025	K5+776	K6+080	304	1	304
28/06/2025	K6+080	K6+384	304	1	304
29/06/2025	K6+384	K6+688	304	1	304
30/06/2025	K6+688	K7+000	312	1	312
TOTAL CUNETA					7.000

FRENTE DE TRABAJO ORTEGA

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

MAYO-JUNIO DEL 2025

TOTAL, ACTIVIDADES REALIZADAS

TOTAL, MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA, COMPACTADO AL TRAFICO	KM
GUAYAQUIL-PALOMA	7
TOTAL, MEJORAMIENTO	**7 KM**

FRENTE DE TRABAJO ORTEGA

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

MAYO-JUNIO DEL 2025

GUAYAQUIL-PALOMA MEJORAMIENTO SOBRE LA VÍA

FECHA	ABSCISA		VOLQUETA No.	VOL. VIAJE	No. VIAJES	VOLUMEN
	DE	A				
13/06/2025	GUAYAQUIL-PALOMA		16	7	5	35
14/06/2025			16	7	5	35
15/06/2025			16	7	5	35
16/06/2025			16	7	5	35
17/06/2025			16	7	5	35
TOTAL, MEJORAMIENTO DE LA VIA						175

FRENTE DE TRABAJO ORTEGA

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

MAYO-JUNIO DEL 2025

EMERGENCIA SAN ANTONIO REMOCIÓN DE MATERIAL SOBRE LA VÍA

FECHA	ABSCISA		LONG	ANCHO	ALTO	VOLUMEN
	DE	A				
13/06/2025	SAN ANTONIO-CHAPARRAL		100	4	1	400
14/06/2025			100	4	1	400
15/06/2025			100	4	1	400
16/06/2025			100	4	1	400
17/06/2025			100	4	1	400
REMOCIÓN DE MATERIAL SOBRE LA VIA						2.000

FRENTE DE TRABAJO ORTEGA

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 5

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

RESGISTRO FOTOGRAFICOS

FRENTE DE TRABAJO ORTEGA

MAYO - JUNIO DE 2025

UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO.2241 DE 2025	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRÍTICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

MUNICIPIO DE ORTEGA

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26 DE MAYO DEL 2025 AL 30 DE JUNIO DEL 2025

INFORME MENSUAL

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO.2241 DE 2025	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 3
3. LOCALIZACIÓN 4
4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 5
5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES 5
   5.1 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN 5
6. PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO 6
   6.1 PERSONAL UTILIZADO 6
   6.2 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA 7
7. REGISTRO FOTOGRÁFICO 8
   7.1 ACTIVIDADES EN ORTEGA: GUAYAQUIL-PALOMA 8
   7.2 EMERGENCIAS: SAN ANTONIO 13

UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO.2241 DE 2025	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como objetivo dar a conocer los aspectos relevantes de la gestión de la maquinaria pesada y volquetas de la Gobernación del Tolima y la maquinaria de la unión nacional de gestión de riesgo de desastres, en la realización y atención de emergencias viales, puntos críticos y mantenimiento de la red vial del Municipio de Ortega – Tolima.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto a realizar consta del mantenimiento de puntos críticos de la red vial en la zona del Municipio de Ortega, con el kit de la maquinaria de la Gobernación del Tolima.

Se realizará el mantenimiento al tramo a intervenir y así proveer una superficie de rodamiento adecuada, con el fin de facilitar el diario vivir a la comunidad.


Esta es una obra que representa un gran aporte para la comunidad en los diferentes sectores, adicionalmente, en este caso no sólo se benefician los que actualmente residen cerca, sino que se favorece la capacidad para todos los propietarios de los municipios, teniendo en cuenta que es una zona de desarrollo agrícola y de crecimiento turístico.

3. LOCALIZACIÓN

El proyecto principalmente se encuentra ubicado en el país de Colombia oficialmente República de Colombia, es un país soberano situado en la región noroccidental de América del Sur que se encuentra constituido en un estado unitario, social y democrático de derecho cuya forma de gobierno es presidencialista. Es una república que está organizada políticamente en 32 departamentos descentralizados y el Distrito capital de Bogotá, sede del gobierno nacional.

En Colombia, exactamente en el departamento del Tolima que es uno de los treinta y dos departamentos que, junto con Bogotá, Distrito Capital, forman la República de Colombia. Su capital es Ibagué. Está ubicado en el centro-oeste del país, en la región andina, limitando al norte con Caldas, al este con Cundinamarca, al sur con Huila y Cauca, y al oeste con Valle del Cauca, Quindío y Risaralda. El río Magdalena atraviesa Tolima de sur a norte.

Ortega, un pintoresco municipio del departamento del Tolima, está ubicado en el suroeste de Colombia. Es parte de la región Andina del país y se encuentra a una distancia de aproximadamente 2 horas de Ibagué, la capital del Tolima, y a unos 45 minutos de Espinal.

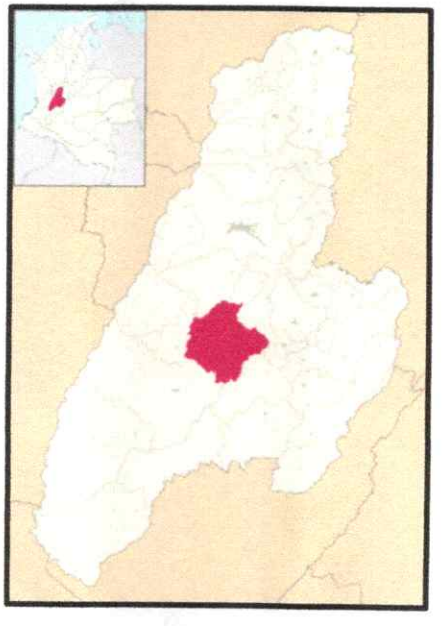

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

MANTEMINIENTO VIAL
Conformación de la red vía.

5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES

Durante el periodo comprendido se atendieron puntos críticos específicamente en la vía Ortega, donde se han presentado erosión de derrumbes y pérdida de banca por la presencia de lluvias sobre la zona.

También se realizó la actividad de mantenimiento, destinados primordialmente a la recuperación de la banca, conformación y limpieza mecánica de la vía; estas actividades se realizaron con el apoyo de maquinaria por parte de la Alcaldía del municipio, una retroexcavadora, una motoniveladora y 2 volquetas por parte de la Gobernación.

Se atendió emergencia en la vía de San Antonio, logrando remover gran cantidad de tierra, dando solución y rehabilitación del corredor vial.

Cabe mencionar que todas las actividades mencionadas anteriormente son se suma importancia para restablecer el tránsito vehicular, beneficio que se brinda tanto a la comunidad y el poder transportar sus productos.

Para finalizar, en el periodo transcurrido del mes se conformaron 7 km en el municipio y a su vez se realizó la limpieza de la vía; el estado del tiempo y las condiciones climáticas fueron favorables y se registraron lluvias equivalentes a un total de 12 horas en el mes.

5.1 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

De conformidad con las actividades realizadas se conformó 7 km correspondiente al municipio de Ortega:

FECHA	MUNICIPIO	KILOMETROS INTERVENIDOS (KM)
Del 26/05/2025 al 30/06/2025	ORTEGA: GUAYAQUIL-PALOMA	7
TOTAL, KILOMETROS INTERVENIDOS		7 KM

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		
FECHA	MUNICIPIO	VOLUMEN (M3)
Del 13/06/2025 al 17/06/2025	SAN ANTONIO	2000
TOTAL, REMOCIÓN SOBRE LA VÍA		2000

6. PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO

6.1 PERSONAL UTILIZADO

CARGO	PROFESIÓN	NOMBRE
SUPERVISOR	INGENIERO CIVIL	DIANA GALLEGO
OPERARIO DE RETROEXCAVADORA	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	WILDER MUÑOZ
CONDUCTOR DE VOLQUETA	CONDUCTOR DE MAQUINARIA PESADA	DAVID OSPINA
CONDUCTOR DE VOLQUETA	CONDUCTOR DE MAQUINARIA PESADA	EMIR DIAZ
OPERARIO DE MOTONIVELADORA	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	DIEGO OVALLE

6.2 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

Para realizar las labores durante este periodo se empleó el kit de maquinaria pesada como:

MAQUINARIA	NÚMERO	CANTIDAD
RETROEXCAVADORA	#39	1
VOLQUETA	8, 16	2
MOTONIVELADORA	NUEVA #3	1

UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO.2241 DE 2025	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO

7.1 ACTIVIDADES EN ORTEGA: GUAYAQUIL-PALOMA






VEREDA GUAYAQUIL-PALOMA






VEREDA GUAYAQUIL-PALOMA

UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO.2241 DE 2025	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

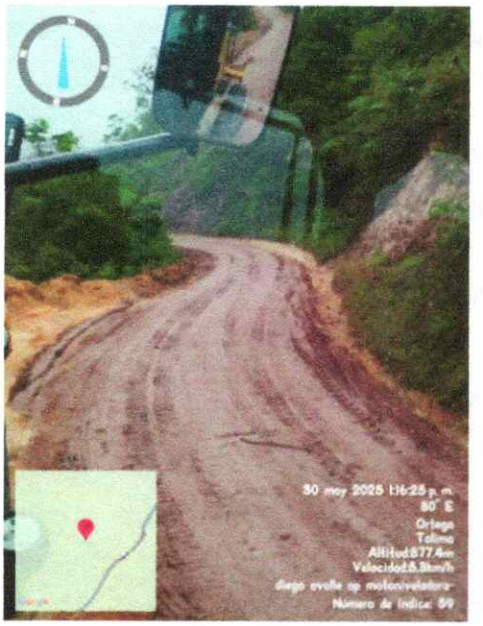


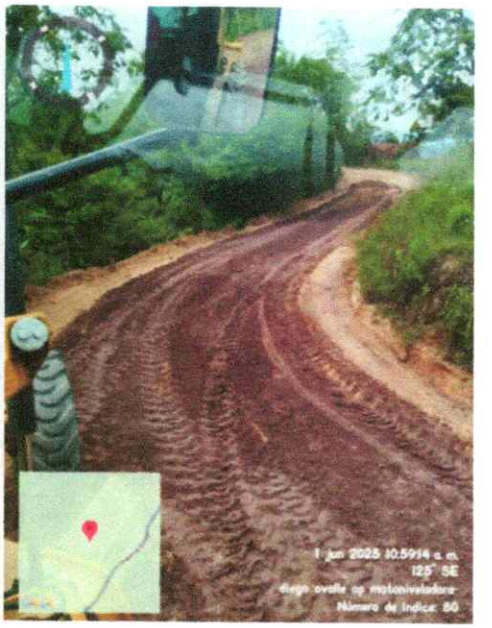

VEREDA GUAYAQUIL-PALOMA







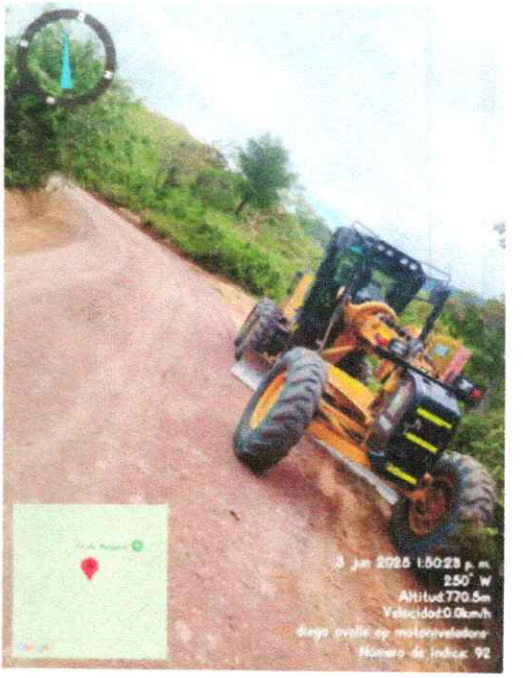


VEREDA GUAYAQUIL-PALOMA

UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO.2241 DE 2025	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

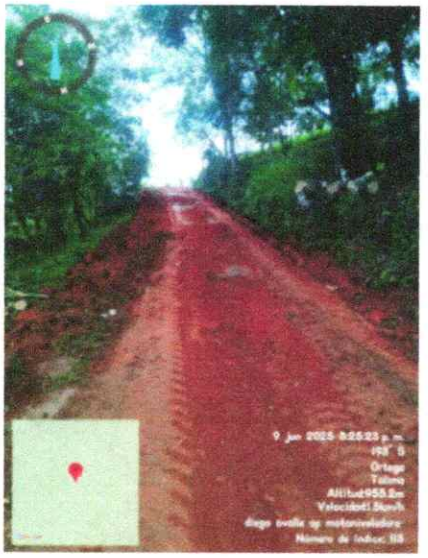

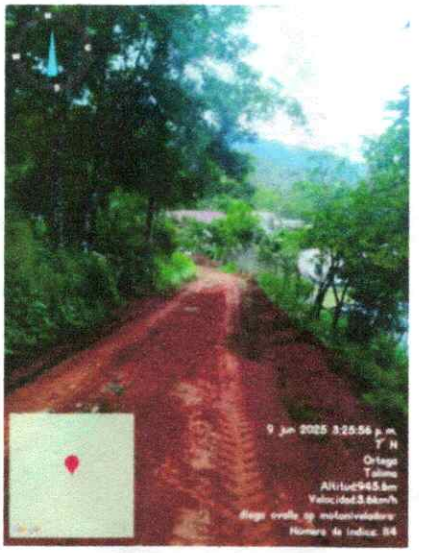

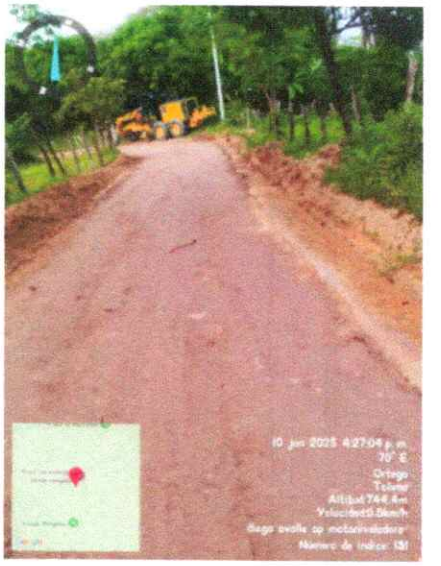

VEREDA GUAYAQUIL-PALOMA








VEREDA GUAYAQUIL-PALOMA


UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO.2241 DE 2025	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA





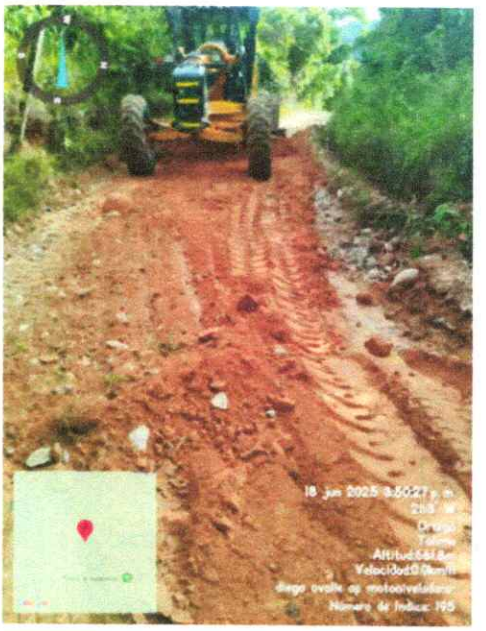

VEREDA GUAYAQUIL-PALOMA

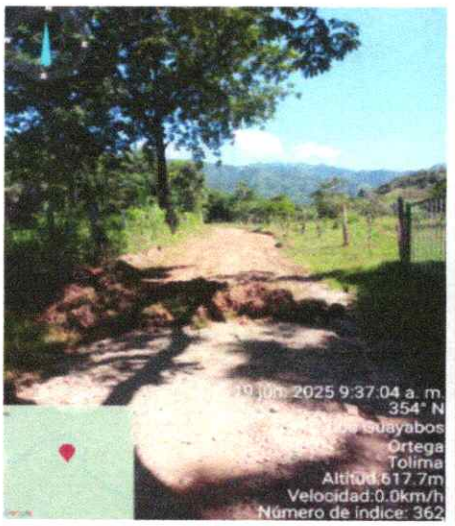





VEREDA GUAYAQUIL-PALOMA

UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO.2241 DE 2025	GOBERNACION DEL TOLIMA







VEREDA GUAYAQUIL-PALOMA





VEREDA GUAYAQUIL-PALOMA


UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO.2241 DE 2025	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

7.2 EMERGENCIAS: SAN ANTONIO






SAN ANTONIO

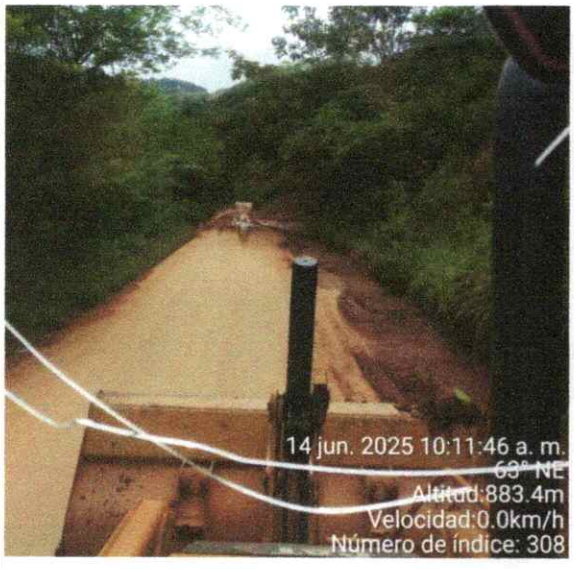




SAN ANTONIO

UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO.2241 DE 2025	GOBERNACION DEL TOLIMA

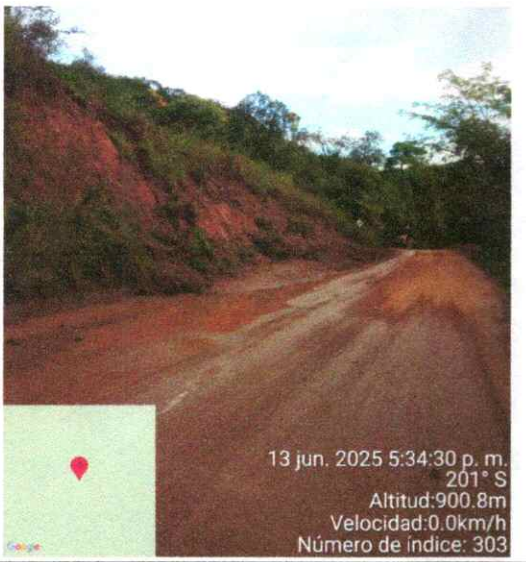

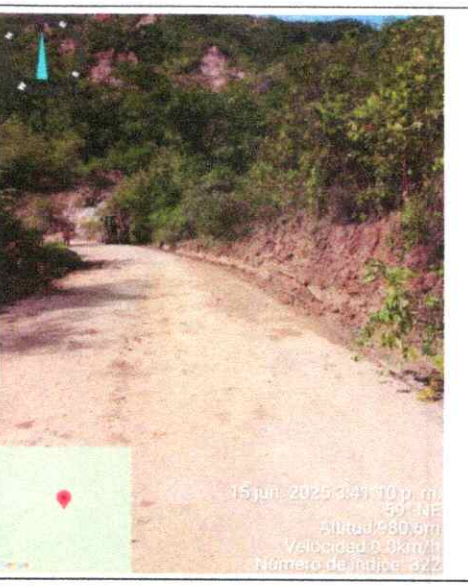



SAN ANTONIO



SAN ANTONIO


UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO.2241 DE 2025	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

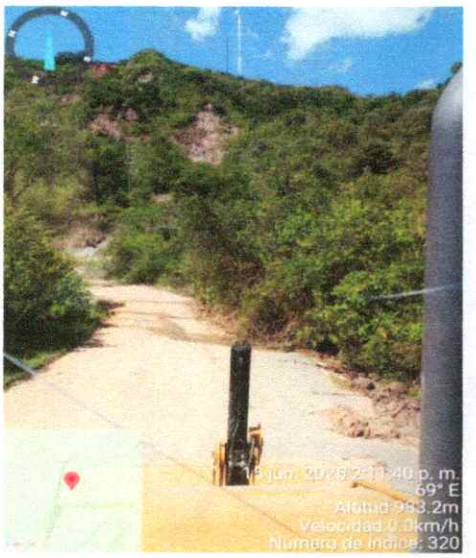

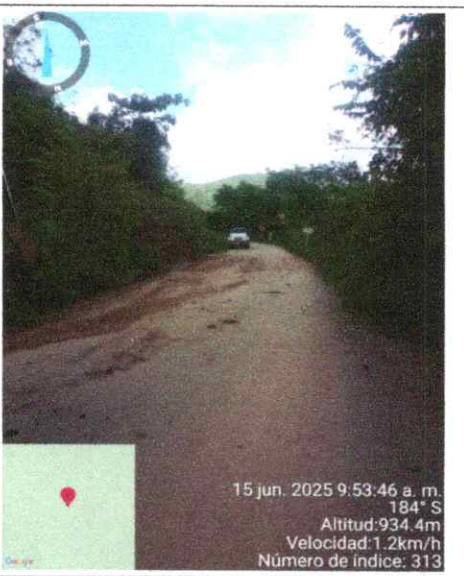

SAN ANTONIO



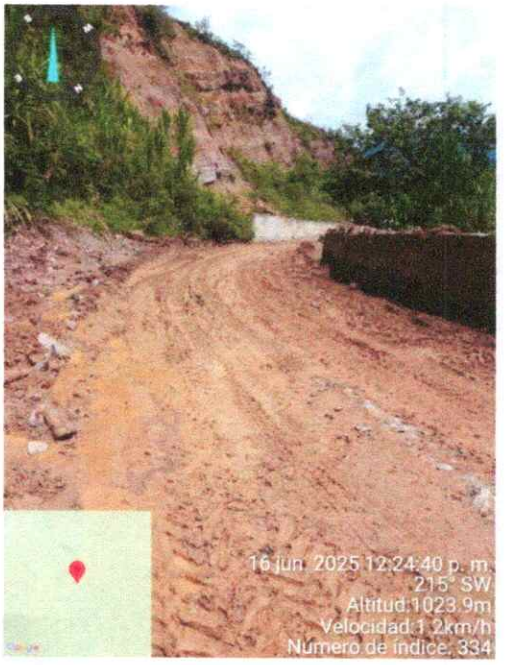

SAN ANTONIO

UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO.2241 DE 2025	GOBERNACION DEL TOLIMA





SAN ANTONIO



SAN ANTONIO

UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO.2241 DE 2025	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA





SAN ANTONIO





SAN ANTONIO

Diana Cortés

VERSION 1	GOB-M-009	
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO. 2241 DE 2025	GOBERNACION DEL TOLIMA
	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA	
	INFORME DIARIO-TURNO	

CARRETERA: GUAYAQUIL-PALOMA					MUNICIPIO: ORTEGA		
MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA, COMPACTADO AL TRAFICO					UNIDAD: M3		1.141
FECHA	ABSCISA		VOLQUETA No.	VOL. VIAJE	No. VIAJES	VOLUMEN	OBSERVACIONES
	DE	A					
26/05/2025	K0+000	K0+304	16	7	5	35	Se laboro Normalmente.
27/05/2025	K0+304	K0+608	8, 16	7	8	56	Se laboro Normalmente.
28/05/2025	K0+608	K0+912	8, 16	7	8	56	Se laboro Normalmente.
29/05/2025	K0+912	K1+216	8, 16	7	8	56	Se laboro Normalmente.
30/05/2025	K1+216	K1+520	8, 16	7	8	56	Se laboro Normalmente.
31/05/2025	K1+520	K1+824	8	7	5	35	Se laboro Normalmente.
01/06/2025	K1+824	K2+128	8, 16	7	8	56	Se laboro Normalmente.
02/06/2025	K2+128	K2+432	8, 16	7	8	56	Se laboro Normalmente.
03/06/2025	K2+432	K2+736	8, 16	7	8	56	Se laboro Normalmente.
04/06/2025	K2+736	K3+040	8, 16	7	8	56	Se laboro Normalmente.
09/06/2025	K3+040	K3+344	8, 16	7	8	56	Se laboro Normalmente.
10/06/2025	K3+344	K3+648	8, 16	7	8	56	Se laboro Normalmente.
11/06/2025	K3+648	K3+952	8, 16	7	8	56	Se laboro Normalmente.
12/06/2025	K3+952	K4+256	8	7	5	35	Se laboro Normalmente.
18/06/2025	K4+256	K4+560	8, 16	7	8	56	Se laboro Normalmente.
19/06/2025	K4+560	K4+864	8	7	5	35	Se laboro Normalmente.
24/06/2025	K4+864	K5+168	8	7	5	35	Se laboro Normalmente.
25/06/2025	K5+168	K5+472	8, 16	7	8	56	Se laboro Normalmente.
26/06/2025	K5+472	K5+776	8, 16	7	8	56	Se laboro Normalmente.
27/06/2025	K5+776	K6+080	8, 16	7	8	56	Se laboro Normalmente.
28/06/2025	K6+080	K6+384	8, 16	7	8	56	Se laboro Normalmente.
29/06/2025	K6+384	K6+688	8	7	5	35	Se laboro Normalmente.
30/06/2025	K6+688	K7+000	8	7	5	35	Se laboro Normalmente.
TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA						1.141	
TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA, COMPACTADO AL TRAFICO						1.141	

Vo.Bo. Supervisora contrato 2241 DE 2025

Firma: Diana Gallego

Nombre: Diana Gallego

c.c. 38.210.237

Vo.Bo. Coordinador contrato 2241 DE 2025

Firma:

Nombre: Jeison Giovanni Alvis Lozano

c.c. 1.110.512.907

VERSION 1	GOB-M-009	
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO.2241 DE 2025 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA INFORME DIARIO-TURNO	GOBERNACION DEL TOLIMA

CARRETERA: GUAYAQUIL-PALOMA | **MUNICIPIO: ORTEGA**

CONFORMACION DE LA VIA SIN COMPACTAR | **UNIDAD: M2** | **35.000**

FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	LONGITUD	ANCHO	AREA	OBSERVACIONES
26/05/2025	K0+000	K0+304	304	5	1.520	Se laboro Normalmente.
27/05/2025	K0+304	K0+608	304	5	1.520	Se laboro Normalmente.
28/05/2025	K0+608	K0+912	304	5	1.520	Se laboro Normalmente.
29/05/2025	K0+912	K1+216	304	5	1.520	Se laboro Normalmente.
30/05/2025	K1+216	K1+520	304	5	1.520	Se laboro Normalmente.
31/05/2025	K1+520	K1+824	304	5	1.520	Se laboro Normalmente.
01/06/2025	K1+824	K2+128	304	5	1.520	Se laboro Normalmente.
02/06/2025	K2+128	K2+432	304	5	1.520	Se laboro Normalmente.
03/06/2025	K2+432	K2+736	304	5	1.520	Se laboro Normalmente.
04/06/2025	K2+736	K3+040	304	5	1.520	Se laboro Normalmente.
09/06/2025	K3+040	K3+344	304	5	1.520	Se laboro Normalmente.
10/06/2025	K3+344	K3+648	304	5	1.520	Se laboro Normalmente.
11/06/2025	K3+648	K3+952	304	5	1.520	Se laboro Normalmente.
12/06/2025	K3+952	K4+256	304	5	1.520	Se laboro Normalmente.
18/06/2025	K4+256	K4+560	304	5	1.520	Se laboro Normalmente.
19/06/2025	K4+560	K4+864	304	5	1.520	Se laboro Normalmente.
24/06/2025	K4+864	K5+168	304	5	1.520	Se laboro Normalmente.
25/06/2025	K5+168	K5+472	304	5	1.520	Se laboro Normalmente.
26/06/2025	K5+472	K5+776	304	5	1.520	Se laboro Normalmente.
27/06/2025	K5+776	K6+080	304	5	1.520	Se laboro Normalmente.
28/06/2025	K6+080	K6+384	304	5	1.520	Se laboro Normalmente.
29/06/2025	K6+384	K6+688	304	5	1.520	Se laboro Normalmente.
30/06/2025	K6+688	K7+000	312	5	1.560	Se laboro Normalmente.
TOTAL CONFORMACION DE LA VIA					**35.000**	
TOTAL CONFORMACION DE LA VIA SIN COMPACTAR					**35.000**	

Vo.Bo. Supervisora contrato 2241 DE 2025

Firma: Diana Gallego

Nombre: Diana Gallego

c.c. 38.210.237

Vo.Bo. Coordinador contrato 2241 DE 2025

Firma:

Nombre: Jeison Giovanni Alvis Lozano

c.c. 1.110.512.907

VERSION 1	GOB-M-009	
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO.2241 DE 2025 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA INFORME DIARIO-TURNO	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CARRETERA: GUAYAQUIL-PALOMA — **MUNICIPIO: ORTEGA**

CONFORMACION DE CUNETAS — **UNIDAD: ML** — **7.000**

FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	LONGITUD	N° CARRILES	LONGITUD TOTAL	OBSERVACIONES
26/05/2025	K0+000	K0+304	304	1	304	Se laboro Normalmente.
27/05/2025	K0+304	K0+608	304	1	304	Se laboro Normalmente.
28/05/2025	K0+608	K0+912	304	1	304	Se laboro Normalmente.
29/05/2025	K0+912	K1+216	304	1	304	Se laboro Normalmente.
30/05/2025	K1+216	K1+520	304	1	304	Se laboro Normalmente.
31/05/2025	K1+520	K1+824	304	1	304	Se laboro Normalmente.
01/06/2025	K1+824	K2+128	304	1	304	Se laboro Normalmente.
02/06/2025	K2+128	K2+432	304	1	304	Se laboro Normalmente.
03/06/2025	K2+432	K2+736	304	1	304	Se laboro Normalmente.
04/06/2025	K2+736	K3+040	304	1	304	Se laboro Normalmente.
09/06/2025	K3+040	K3+344	304	1	304	Se laboro Normalmente.
10/06/2025	K3+344	K3+648	304	1	304	Se laboro Normalmente.
11/06/2025	K3+648	K3+952	304	1	304	Se laboro Normalmente.
12/06/2025	K3+952	K4+256	304	1	304	Se laboro Normalmente.
18/06/2025	K4+256	K4+560	304	1	304	Se laboro Normalmente.
19/06/2025	K4+560	K4+864	304	1	304	Se laboro Normalmente.
24/06/2025	K4+864	K5+168	304	1	304	Se laboro Normalmente.
25/06/2025	K5+168	K5+472	304	1	304	Se laboro Normalmente.
26/06/2025	K5+472	K5+776	304	1	304	Se laboro Normalmente.
27/06/2025	K5+776	K6+080	304	1	304	Se laboro Normalmente.
28/06/2025	K6+080	K6+384	304	1	304	Se laboro Normalmente.
29/06/2025	K6+384	K6+688	304	1	304	Se laboro Normalmente.
30/06/2025	K6+688	K7+000	312	1	312	Se laboro Normalmente.
TOTAL CUNETA					**7.000**	
TOTAL CONFORMACION DE CUNETAS					**7.000**	

Vo.Bo. Supervisora contrato 2241 DE 2025
Firma: Diana Gallego
Nombre: Diana Gallego
c.c. 38.210.237

Vo.Bo. Coordinador contrato 2241 DE 2025
Firma:
Nombre: Jeison Giovanni Alvis Lozano
c.c. 1.110.512.907

VERSION 1	GOB-M-009	
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO.2241 DE 2025 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA INFORME DIARIO-TURNO	GOBERNACION DEL TOLIMA

CARRETERA: SAN ANTONIO — **MUNICIPIO: ORTEGA**

REMOCIÓN DE MATERIAL EN LA VÍA	UNIDAD: M3	2.000

FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	LONG	ANCHO	ALTO	VOLUMEN	OBSERVACIONES
13/06/2025	SAN ANTONIO-CHAPARRAL		100	4	1	400	Se laboro Normalmente.
14/06/2025			100	4	1	400	Se laboro Normalmente.
15/06/2025			100	4	1	400	Se laboro Normalmente.
16/06/2025			100	4	1	400	Se laboro Normalmente.
17/06/2025			100	4	1	400	Se laboro Normalmente.
REMOCIÓN DE MATERIAL SOBRE LA VIA						2.000	
TOTAL DE REMOCIÓN DE MATERIAL SOBRE LA VÍA						2.000	

Vo.Bo. Supervisora contrato 2241 DE 2025

Firma: Diana Gallego

Nombre: Diana Gallego

c.c. 38.210.237

Vo.Bo. Coordinador contrato 2241 DE 2025

Firma:

Nombre: Jeison Giovanni Alvis Lozano

c.c. 1.110.512.907

VERSION 1	GOB-M-009	
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO. 2241 DE 2025 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA INFORME DIARIO-TURNO	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CARRETERA: GUAYAQUIL-PALOMA — MUNICIPIO: ORTEGA

MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA, COMPACTADO AL TRAFICO — UNIDAD: M3 — 175

FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	VOLQUETA No.	VOL. VIAJE	No. VIAJES	VOLUMEN	OBSERVACIONES
13/06/2025	GUAYAQUIL-PALOMA		16	7	5	35	Se laboro Normalmente.
14/06/2025			16	7	5	35	Se laboro Normalmente.
15/06/2025			16	7	5	35	Se laboro Normalmente.
16/06/2025			16	7	5	35	Se laboro Normalmente.
17/06/2025			16	7	5	35	Se laboro Normalmente.
TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA						175	
TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA, COMPACTADO AL TRAFICO						175	

Vo.Bo. Supervisora contrato 2241 DE 2025

Firma: Diana Gallego

Nombre: Diana Gallego

c.c. 38.210.237

Vo.Bo. Coordinador contrato 2241 DE 2025

Firma:

Nombre: Jeison Giovanni Alvis Lozano

c.c. 1.110.512.907

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 5

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

ACTAS DE LA COMUNIDAD

FRENTE DE TRABAJO ORTEGA

MAYO - JUNIO DE 2025

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOB-M-007
CONTRATO 2241 DE 2025

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

ACTA DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO

CONTRATO No. : 2241 DE MAYO DE 2025

OBJETO: ***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA.***

MUNICIPIO: Ortega
VEREDA: Garabatal Tres esquinas

A los día(s) 30 del mes de Junio de 2025, se reunieron el Sr (a) Juan Eduardo Alvarez Lozano como Inspector vial, en representación de **MARV 5** Y el señor (a) María Neba Ramos. en representación de la(s) Comunidad(es) beneficiada(s), con el objeto de informar a los beneficiarios los mantenimientos viales a ejecutar con los aportes asignados por parte de La Gobernación del Tolima.

En constancia de lo anterior se firma por quienes en ella intervinieron:

mariaNebaRamirez
Representante de la(s) Comunidad(es).
C.C.No. 28866646

Inspector Contrato 2241 de 2025
MARV 5
C.C.No. 1110512907 IBAGUE

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOB-M-007C
CONTRATO 2241 DE 2025

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

AUTORIZACIÓN PARA RESGUARDO DE LA MAQUINARIA

Yo, María Melba Ramírez, con Cédula de Ciudadanía N° 28.866.676, Por medio del presente documento, y en calidad de Propietaria, del predio El Espejo de la vereda Guayabal, del municipio Ortega autorizo al Ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvarez Lozano quien en representación del contrato 2241 de Mayo de 2025 la (UNIÓN TEMPORAL MARV 5), cuyo objeto es "CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA". Para estacionar y resguardar la maquinaria del mantenimiento de las vías como son:

Volqueta 8, 16,
Retroexcavadora 39,
Motoniveladora Komatsu,
Cargador,
Vibrocompactador,
Excavadora,

Con el compromiso de velar por el buen estado y la seguridad de los mismos durante la permanencia en el predio y no permitir el acceso o manipulación de la maquinaria a personal ajeno y/o sin autorización únicamente del Ingeniero Supervisor.

Esta autorización se expide para la Ejecución del contrato 2241 de 2025 y así mismo declaro la posesión del predio para emitir la presente autorización.

maría melba Ramírez

Firma Administrador o Propietario
C.C. No. 28866676

Pdte. Junta de acción Comunal (testigo)
C.C. No.

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOB-M-007B
CONTRATO 2241 DE 2025

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE OBRA A LA COMUNIDAD

CONTRATO No. : 2241 DE MAYO DE 2025

Objeto: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA.

MUNICIPIO: Ortega

VEREDA: Garagoa

A los 29 Días del mes de Junio de 2025, se reunieron María Belba Remicio. como representante (s) de la(s) Junta(s) de Acción Comunal de la(s) Vereda(s) Garagoa Municipio(s) de _____ y el Sr Jesus Gonzalo Alvarado como Inspector vial designado por **MARV 5,** con el fin de entregar a la comunidad de la(s) vereda(s) antes indicada(s), el mantenimiento vial ejecutado por el Contratista **"MARV 5"** mediante el Contrato No. **2241 DEL 2025.** La intervención realizada fue:

_____

_____

_____

_____

_____

La comunidad a través del (los) presidente(s) de la(s) Junta(s) de Acción Comunal, como representante(s) legal(es), recibe(n) a satisfacción, el mantenimiento de la vía ya descrita(s), comprometiéndose a conservarla(s) en buen estado y realizar su mantenimiento, quedando la empresa MARV 5, exonerada de cualquier tipo de responsabilidad posterior.

En constancia de lo anterior firman:

maria melba flemicio

REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD
C.C. No. 28866676

Inspector MARV 5
C.C. No. 1105[illegible]902.

_____

REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD
C.C. No

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOB-M-007A

CONTRATO 2241 DE 2025

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

ACTA UNICA DE VERIFICACION Y RECIBO DE OBRA

CONTRATO No. : 2241 DE MAYO DE 2025

OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA.

MUNICIPIO: Ortega

VEREDA: Carlaguil

En el Municipio de Ortega, en la vereda Carlaguil a los 29 días del mes de JUNIO del año 2025 se reunieron el ingeniero (a) Jesus Giovanni Alvarado como Supervisor de Campo, en representación de **MARV 5** Y el señor (a) Maria Nelba Remicio en calidad de Presidente, en representación de la(s) Comunidad(es) beneficiada(s), con el objeto de efectuar la presente acta única de verificación y recibo a conformidad de la obra ejecutada.

VIA	KMS INTERVENIDOS
Cuayaguil	7 KMS

En constancia de lo anterior se firma por quienes en ella intervinieron:

maria nelba Remicio

Representante de la(s) Comunidad(es)

C.C.No. 28866676

Inspector Contrato 2241 de 2025

MARV 5

C.C. No 1110512004

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOB-M-007
CONTRATO 2241 DE 2025

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

ACTA DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO

CONTRATO No. : 2241 DE MAYO DE 2025

OBJETO: ***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA.***

MUNICIPIO: Ortega
VEREDA: Potrera

A los día(s) 08 del mes de MAYO de 20 25, se reunieron el Sr (a) Juan Guillermo Alvarez Lozano como Inspector vial, en representación de **MARV 5** Y el señor (a) Norma Constanza Caballero G. en representación de la(s) Comunidad(es) beneficiada(s), con el objeto de informar a los beneficiarios los mantenimientos viales a ejecutar con los aportes asignados por parte de La Gobernación del Tolima.

En constancia de lo anterior se firma por quienes en ella intervinieron:

Representante de la(s) Comunidad(es).
C.C.No. 28860349. Ortega

Inspector Contrato 2241 de 2025
MARV 5
C.C.No. 1110512407. Ibagué

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOB-M-007D
CONTRATO 2241 DE
2025

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

AUTORIZACIÓN PARA EXTRACCIÓN DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO E INTERVENCIÓN DE VIAS

Yo, Bladimir Vaquiro Alape, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1.110.175.960, Por medio del presente documento, en calidad de propietario y/o administrador del predio _____, ubicado en la vereda Playa Verde, del municipio ORTEGA. autorizo al Ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano quien en representación de la Empresa UNIÓN TEMPORAL MARV 5, mediante la ejecución del contrato 2241 de Mayo de 2025 cuyo objeto es CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA, para que explote y extraiga el material necesario del predio a modo de donación, para la conformación de la (s) vía (s) a intervenir.

Esta autorización se expide para la Ejecución del contrato 2241 de Mayo de 2025.
Así mismo declaro la posesión del predio para emitir la presente autorización.

_____

Firma Administrador o Propietario
C.C. No.

Bladimir Vaquiro Alape

Pdte. Junta de acción Comunal(testigo)
C.C. No. 1110175960

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOB-M-007
CONTRATO 2241 DE 2025

GOBERNACION DEL TOLIMA

ACTA DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO

CONTRATO No. : 2241 DE MAYO DE 2025

OBJETO: ***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA.***

MUNICIPIO: ORTEGA.
VEREDA: RAYA VERDE.

A los día(s) 09 del mes de MAYO. de 20 25, se reunieron el Sr (a) Jerson Giovanni Alvis Lozano como Inspector vial, en representación de **MARV 5** Y el señor (a) Bladimir Vanegas Alape en representación de la(s) Comunidad(es) beneficiada(s), con el objeto de informar a los beneficiarios los mantenimientos viales a ejecutar con los aportes asignados por parte de La Gobernación del Tolima.

En constancia de lo anterior se firma por quienes en ella intervinieron:

Bladimir Vanegas Alape
Representante de la(s) Comunidad(es).
C.C.No., 1110175960

Inspector Contrato 2241 de 2025
MARV 5
C.C.No. 1110512907.

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 5

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

PREOPERACIONALES DE EQUIPOS

FRENTE DE TRABAJO ORTEGA

MAYO - JUNIO DE 2025

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5

VERSION	1
PAGINA	1 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)		27/05/2025	28/05/2025	29/05/2025	30/05/2025	31/05/2025	1/06/2025
	HOROMETRO		242,9	251,6	258,7	266,4	273	279,5
Cada 10 horas o diariamente	Daños, desgaste, holguras o grietas en cilindros, mangueras o conexiones - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Suciedad y residuos en radiador - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fugas de refrigerante o aceite - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Estado de la bateria - Revisar (Limpiar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fugas de combustible - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fugas de aceite hidraulico y de transmisión - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fugas de liquido de frenos - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Estado de las ruedas - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Estado de pasamanos y escaleras - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Espejos, reflectores y pernos - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Terminales de la bateria - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cinturon de seguridad y abrazaderas - Revisar (Ajustar de ser necesa		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Ventana de la cabina - Revisar (Limpiar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Estado de rines - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Camara y monitor retrovisor - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de refrigerante - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de combustible - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Drenar agua y sedimento del tanque de combustible		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de aceite de motor - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Indicador de polvo - Revisar (Limpiar o cambiar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Volante de dirección - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filtro separador de agua - Revisar (Drenar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cableado electrico - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Bocina - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5

VERSION	1
PAGINA	2 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)		27/05/2025	28/05/2025	29/05/2025	30/05/2025	31/05/2025	1/06/2025
	HOROMETRO		242,9	251,6	258,7	266,4	273	279,5
Cada 10 horas o diariamente	Seguros - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de aceite hidraulico - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Funcion de desempañado - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Puntos de lubricación - Revisar (Lubricar)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Sistema de frenos - Revisar		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Sistema de refrigeración - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filtro de aire - Revisar (Limpiar o cambiar)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Valvula de evacuación - Revisar (Cambiar)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Drenar agua del prefiltro de combustible		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Calentador electrico de aire de admision - Revisar		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Borde de la cuchilla - Revisar		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Desgaste de la cuchilla - Revisar		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pedal de avance lento - Revisar		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Condensador de aire acondicionado - Limpiar		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Presion en ruedas - Revisar		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Funcionamiento del acumulador - Revisar		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Respiradero del tanque hidraulico - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pedales - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Correa del compresor de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Alarma de reversa - Revisar		✓	✓	✓	✓	✓	✓

OBSERVACIONES:

Diego O

FIRMA DE OPERADOR
Nombre DIEGO OVALLE

Diana Gallego

FIRMA SUPERVISOR
Nombre: DIANA MARCELA GALLEGO CAMPOS

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5

VERSION	1
PAGINA	1 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	2/06/2025	3/06/2025	4/06/2025				
	HOROMETRO	284,5	291,3	298,4				
Cada 10 horas o diariamente	Daños, desgaste, holguras o grietas en cilindros, mangueras o conexiones - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Suciedad y residuos en radiador - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓				
	Fugas de refrigerante o aceite - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Estado de la bateria - Revisar (Limpiar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Fugas de combustible - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Fugas de aceite hidraulico y de transmisión - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Fugas de liquido de frenos - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Estado de las ruedas - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Estado de pasamanos y escaleras - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar	✓	✓	✓				
	Espejos, reflectores y pernos - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Terminales de la bateria - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Cinturon de seguridad y abrazaderas - Revisar (Ajustar de ser necesa	✓	✓	✓				
	Ventana de la cabina - Revisar (Limpiar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Estado de rines - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Camara y monitor retrovisor - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Nivel de refrigerante - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Nivel de combustible - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Drenar agua y sedimento del tanque de combustible	✓	✓	✓				
	Nivel de aceite de motor - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Indicador de polvo - Revisar (Limpiar o cambiar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Volante de dirección - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Filtro separador de agua - Revisar (Drenar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Cableado electrico - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Bocina - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓				

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5

VERSION	1
PAGINA	2 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	2/06/2025	3/06/2025	4/06/2025				
	HOROMETRO	284,5	291,3	298,4				
Cada 10 horas o diariamente	Seguros - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Nivel de aceite hidraulico - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Funcion de desempañado - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓				
	Puntos de lubricación - Revisar (Lubricar)	✓	✓	✓				
	Sistema de frenos - Revisar	✓	✓	✓				
	Sistema de refrigeración - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓				
	Filtro de aire - Revisar (Limpiar o cambiar)	✓	✓	✓				
	Valvula de evacuación - Revisar (Cambiar)	✓	✓	✓				
	Drenar agua del prefiltro de combustible	✓	✓	✓				
	Calentador electrico de aire de admision - Revisar	✓	✓	✓				
	Borde de la cuchilla - Revisar	✓	✓	✓				
	Desgaste de la cuchilla - Revisar	✓	✓	✓				
	Pedal de avance lento - Revisar	✓	✓	✓				
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓				
	Condensador de aire acondicionado - Limpiar	✓	✓	✓				
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓				
	Presion en ruedas - Revisar	✓	✓	✓				
	Funcionamiento del acumulador - Revisar	✓	✓	✓				
	Respiradero del tanque hidraulico - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓				
	Pedales - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓				
	Correa del compresor de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓				
	Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓				
	Alarma de reversa - Revisar	✓	✓	✓				

OBSERVACIONES:

Diego O

FIRMA DE OPERADOR
Nombre DIEGO OVALLE

Diana Gallego

FIRMA SUPERVISOR
Nombre: DIANA MARCELA GALLEGO CAMPOS

1599

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5

VERSION	1
PAGINA	1 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	9/06/2025	10/06/2025	11/06/2025	12/06/2025			
	HOROMETRO	302,1	304,4	311,8	319			
Cada 10 horas o diariamente	Daños, desgaste, holguras o grietas en cilindros, mangueras o conexiones - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Suciedad y residuos en radiador - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓			
	Fugas de refrigerante o aceite - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Estado de la bateria - Revisar (Limpiar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Fugas de combustible - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Fugas de aceite hidraulico y de transmisión - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Fugas de liquido de frenos - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Estado de las ruedas - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Estado de pasamanos y escaleras - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Espejos, reflectores y pernos - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Terminales de la bateria - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Cinturon de seguridad y abrazaderas - Revisar (Ajustar de ser necesa	✓	✓	✓	✓			
	Ventana de la cabina - Revisar (Limpiar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Estado de rines - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Camara y monitor retrovisor - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Nivel de refrigerante - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Nivel de combustible - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Drenar agua y sedimento del tanque de combustible	✓	✓	✓	✓			
	Nivel de aceite de motor - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Indicador de polvo - Revisar (Limpiar o cambiar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Volante de dirección - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Filtro separador de agua - Revisar (Drenar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Cableado electrico - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Bocina - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5

VERSION	1
PAGINA	2 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	9/06/2025	10/06/2025	11/06/2025	12/06/2025			
	HOROMETRO	302,1	304,4	311,8	319			
Cada 10 horas o diariamente	Seguros - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Nivel de aceite hidraulico - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Funcion de desempañado - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Puntos de lubricación - Revisar (Lubricar)	✓	✓	✓	✓			
	Sistema de frenos - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Sistema de refrigeración - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓			
	Filtro de aire - Revisar (Limpiar o cambiar)	✓	✓	✓	✓			
	Valvula de evacuación - Revisar (Cambiar)	✓	✓	✓	✓			
	Drenar agua del prefiltro de combustible	✓	✓	✓	✓			
	Calentador electrico de aire de admision - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Borde de la cuchilla - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Desgaste de la cuchilla - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Pedal de avance lento - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓			
	Condensador de aire acondicionado - Limpiar	✓	✓	✓	✓			
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓			
	Presion en ruedas - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Funcionamiento del acumulador - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Respiradero del tanque hidraulico - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓			
	Pedales - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓			
	Correa del compresor de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓	✓			
	Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓			
	Alarma de reversa - Revisar	✓	✓	✓	✓			

OBSERVACIONES:

FIRMA DE OPERADOR
Nombre DIEGO OVALLE

FIRMA SUPERVISOR
Nombre: DIANA MARCELA GALLEGO CAMPOS

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5

VERSION	1
PAGINA	1 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	16/06/2025	17/06/2025	18/06/2025	19/06/2025			
	HOROMETRO	325,8	332,4	340,3	347,2			
Cada 10 horas o diariamente	Daños, desgaste, holguras o grietas en cilindros, mangueras o conexiones - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Suciedad y residuos en radiador - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓			
	Fugas de refrigerante o aceite - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Estado de la bateria - Revisar (Limpiar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Fugas de combustible - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Fugas de aceite hidraulico y de transmisión - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Fugas de liquido de frenos - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Estado de las ruedas - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Estado de pasamanos y escaleras - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Espejos, reflectores y pernos - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Terminales de la bateria - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Cinturon de seguridad y abrazaderas - Revisar (Ajustar de ser necesa	✓	✓	✓	✓			
	Ventana de la cabina - Revisar (Limpiar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Estado de rines - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Camara y monitor retrovisor - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Nivel de refrigerante - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Nivel de combustible - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Drenar agua y sedimento del tanque de combustible	✓	✓	✓	✓			
	Nivel de aceite de motor - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Indicador de polvo - Revisar (Limpiar o cambiar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Volante de dirección - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Filtro separador de agua - Revisar (Drenar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Cableado electrico - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Bocina - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5

VERSION	1
PAGINA	2 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	16/06/2025	17/06/2025	18/06/2025	19/06/2025			
	HOROMETRO	325,8	332,4	340,3	347,2			
Cada 10 horas o diariamente	Seguros - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Nivel de aceite hidraulico - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Funcion de desempañado - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Puntos de lubricación - Revisar (Lubricar)	✓	✓	✓	✓			
	Sistema de frenos - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Sistema de refrigeración - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓			
	Filtro de aire - Revisar (Limpiar o cambiar)	✓	✓	✓	✓			
	Valvula de evacuación - Revisar (Cambiar)	✓	✓	✓	✓			
	Drenar agua del prefiltro de combustible	✓	✓	✓	✓			
	Calentador electrico de aire de admision - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Borde de la cuchilla - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Desgaste de la cuchilla - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Pedal de avance lento - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓			
	Condensador de aire acondicionado - Limpiar	✓	✓	✓	✓			
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓			
	Presion en ruedas - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Funcionamiento del acumulador - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Respiradero del tanque hidraulico - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓			
	Pedales - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓			
	Correa del compresor de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓	✓			
	Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓			
	Alarma de reversa - Revisar	✓	✓	✓	✓			

OBSERVACIONES:

Diego O.

FIRMA DE OPERADOR
Nombre DIEGO OVALLE

Diana Gallego

FIRMA SUPERVISOR
Nombre: DIANA MARCELA GALLEGO CAMPOS

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5

VERSION	1
PAGINA	1 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)		24/06/2025	25/06/2025	26/06/2025	27/06/2025	28/06/2025	29/06/2025
	HOROMETRO		351,4	355,2	363,4	371,3	379,8	386,9
Cada 10 horas o diariamente	Daños, desgaste, holguras o grietas en cilindros, mangueras o conexiones - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Suciedad y residuos en radiador - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fugas de refrigerante o aceite - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Estado de la bateria - Revisar (Limpiar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fugas de combustible - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fugas de aceite hidraulico y de transmisión - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fugas de liquido de frenos - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Estado de las ruedas - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Estado de pasamanos y escaleras - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Espejos, reflectores y pernos - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Terminales de la bateria - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cinturon de seguridad y abrazaderas - Revisar (Ajustar de ser necesa		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Ventana de la cabina - Revisar (Limpiar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Estado de rines - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Camara y monitor retrovisor - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de refrigerante - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de combustible - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Drenar agua y sedimento del tanque de combustible		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de aceite de motor - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Indicador de polvo - Revisar (Limpiar o cambiar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Volante de dirección - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filtro separador de agua - Revisar (Drenar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cableado electrico - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Bocina - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓

1604

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5

VERSION	1
PAGINA	2 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)		24/06/2025	25/06/2025	26/06/2025	27/06/2025	28/06/2025	29/06/2025
	HOROMETRO		351,4	355,2	363,4	371,3	379,8	386,9
Cada 10 horas o diariamente	Seguros - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de aceite hidraulico - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Funcion de desempañado - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Puntos de lubricación - Revisar (Lubricar)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Sistema de frenos - Revisar		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Sistema de refrigeración - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filtro de aire - Revisar (Limpiar o cambiar)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Valvula de evacuación - Revisar (Cambiar)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Drenar agua del prefiltro de combustible		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Calentador electrico de aire de admision - Revisar		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Borde de la cuchilla - Revisar		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Desgaste de la cuchilla - Revisar		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pedal de avance lento - Revisar		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Condensador de aire acondicionado - Limpiar		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Presion en ruedas - Revisar		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Funcionamiento del acumulador - Revisar		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Respiradero del tanque hidraulico - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pedales - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Correa del compresor de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Alarma de reversa - Revisar		✓	✓	✓	✓	✓	✓

OBSERVACIONES:

FIRMA DE OPERADOR
Nombre DIEGO OVALLE

FIRMA SUPERVISOR
Nombre: DIANA MARCELA GALLEGO CAMPOS

1605

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5

VERSION	1
PAGINA	1 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	30/06/2025						
	HOROMETRO	392,9						
Cada 10 horas o diariamente	Daños, desgaste, holguras o grietas en cilindros, mangueras o conexiones - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓						
	Suciedad y residuos en radiador - Revisar (Limpiar)	✓						
	Fugas de refrigerante o aceite - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓						
	Estado de la bateria - Revisar (Limpiar de ser necesario)	✓						
	Fugas de combustible - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓						
	Fugas de aceite hidraulico y de transmisión - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓						
	Fugas de liquido de frenos - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓						
	Estado de las ruedas - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓						
	Estado de pasamanos y escaleras - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓						
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar	✓						
	Espejos, reflectores y pernos - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓						
	Terminales de la bateria - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓						
	Cinturon de seguridad y abrazaderas - Revisar (Ajustar de ser necesa	✓						
	Ventana de la cabina - Revisar (Limpiar de ser necesario)	✓						
	Estado de rines - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓						
	Camara y monitor retrovisor - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓						
	Nivel de refrigerante - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓						
	Nivel de combustible - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓						
	Drenar agua y sedimento del tanque de combustible	✓						
	Nivel de aceite de motor - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓						
	Indicador de polvo - Revisar (Limpiar o cambiar de ser necesario)	✓						
	Volante de dirección - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓						
	Filtro separador de agua - Revisar (Drenar de ser necesario)	✓						
	Cableado electrico - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓						
	Bocina - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓						

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5

VERSION	1
PAGINA	2 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	30/06/2025						
	HOROMETRO	392,9						
Cada 10 horas o diariamente	Seguros - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓						
	Limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓						
	Nivel de aceite hidraulico - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓						
	Funcion de desempañado - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓						
	Puntos de lubricación - Revisar (Lubricar)	✓						
	Sistema de frenos - Revisar	✓						
	Sistema de refrigeración - Revisar (Limpiar)	✓						
	Filtro de aire - Revisar (Limpiar o cambiar)	✓						
	Valvula de evacuación - Revisar (Cambiar)	✓						
	Drenar agua del prefiltro de combustible	✓						
	Calentador electrico de aire de admision - Revisar	✓						
	Borde de la cuchilla - Revisar	✓						
	Desgaste de la cuchilla - Revisar	✓						
	Pedal de avance lento - Revisar	✓						
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)	✓						
	Condensador de aire acondicionado - Limpiar	✓						
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)	✓						
	Presion en ruedas - Revisar	✓						
	Funcionamiento del acumulador - Revisar	✓						
	Respiradero del tanque hidraulico - Revisar (Limpiar)	✓						
	Pedales - Revisar (Limpiar)	✓						
	Correa del compresor de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)	✓						
	Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)	✓						
	Alarma de reversa - Revisar	✓						

OBSERVACIONES:

FIRMA DE OPERADOR
Nombre DIEGO OVALLE

FIRMA SUPERVISOR
Nombre: DIANA MARCELA GALLEGO CAMPOS

VERSION 1 | GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025 | **MODELO:** RETRO 39 | **MARCA:** CAT

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO | **LOCALIZACION:** VEREDA GUAYAQUIL | **FRENTE DE TRABAJO:** ORTEGA

PERIODO: 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2025 | **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	4152		4154		4162		4169		4177		4183		4190	
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X		X		X	
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Pedales	Todos	X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X		X		X	
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X		X		X	
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X		X		X		X	
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X		X		X		X	
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		4154		4162		4169		4177		4183		4190		4196	
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES: Del 17 al 20 de febrero no se pudo realizar actividades por lluvias.

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1 | GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025 | MODELO: RETRO 39 | MARCA: CAT

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO | LOCALIZACION: VEREDA GUAYAQUIL | FRENTE DE TRABAJO: ORTEGA

PERIODO: 02 DE JUNIO AL 04 DE JUNIO 2025 | FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	4196		4203		4212									
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X									
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X									
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X									
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X									
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X									
	* De trabajo traseras	2	X		X		X									
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X									
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X									
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X									
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X									
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X									
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X									
	Alarma de retroceso	1	X		X		X									
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X									
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X									
	Palancas de mando	2	X		X		X									
	Pedales	Todos	X		X		X									
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X									
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X									
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X									
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X									
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X									
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X									
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X									
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X									
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X									
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X									
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X									
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X									
	Sistema de Dirección	1	X		X		X									
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X									
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X									
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		4203		4212		4215									
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES: Del 17 al 20 de febrero no se pudo realizar actividades por lluvias.

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1 | GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025 | **MODELO:** RETRO 39 | **MARCA:** CAT

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO | **LOCALIZACION:** VEREDA GUAYAQUIL | **FRENTE DE TRABAJO:** ORTEGA

PERIODO: 09 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO 2025 | **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	4215		4218		4224		4231		4236		4244		4251	
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X		X		X	
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Pedales	Todos	X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X		X		X	
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X		X		X	
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X		X		X		X	
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X		X		X		X	
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		4218		4224		4231		4236		4244		4251		4257	
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES: Del 17 al 20 de febrero no se pudo realizar actividades por lluvias.

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1 | GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025 | MODELO: RETRO 39 | MARCA: CAT

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO | LOCALIZACION: VEREDA GUAYAQUIL | FRENTE DE TRABAJO: ORTEGA

PERIODO: 16 DE JUNIO AL 19 DE JUNIO 2025 | FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	4257		4265		4270		4278							
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X							
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X							
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X							
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X							
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X							
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X							
CABINA	* Protección antivueico (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X							
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X							
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X							
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X							
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X							
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X							
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X							
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X							
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X							
	Palancas de mando	2	X		X		X		X							
	Pedales	Todos	X		X		X		X							
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X							
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X							
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X		X							
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X							
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X		X							
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X							
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X							
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X							
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X		X							
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X		X							
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X							
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X							
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X							
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X							
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X							
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		4265		4270		4278		4283							
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES: Del 17 al 20 de febrero no se pudo realizar actividades por lluvias.

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1 | GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025 **MODELO:** RETRO 39 **MARCA:** CAT

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO **LOCALIZACION:** VEREDA PALOMA **FRENTE DE TRABAJO:** ORTEGA

PERIODO: 24 DE JUNIO AL 29 DE JUNIO 2025 **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL			4283		4287		4295		4300		4308		4316	
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2			X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo delanteras	2			X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2			X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2			X		X		X		X		X		X	
	* De stop y señal trasera	2			X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo traseras	2			X		X		X		X		X		X	
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1			X		X		X		X		X		X	
	* Cinturón de seguridad	1			X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1			X		X		X		X		X		X	
	Asiento (dispositivo de giro)	1			X		X		X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos			X		X		X		X		X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1			X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso	1			X		X		X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	2			X		X		X		X		X		X	
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1			X		X		X		X		X		X	
	Palancas de mando	2			X		X		X		X		X		X	
	Pedales	Todos			X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo			X		X		X		X		X		X	
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos			X		X		X		X		X		X	
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos			X		X		X		X		X		X	
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2			X		X		X		X		X		X	
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1			X		X		X		X		X		X	
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas			X		X		X		X		X		X	
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas			X		X		X		X		X		X	
	* Freno de emergencia en buen estado	1			X		X		X		X		X		X	
	Estado general (desgarrador/balde)	2			X		X		X		X		X		X	
	Mandos de levante del brazo	2			X		X		X		X		X		X	
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos			X		X		X		X		X		X	
	Compartimiento del motor aseado	Completo			X		X		X		X		X		X	
	Sistema de Dirección	1			X		X		X		X		X		X	
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas				X		X		X		X		X		X	
	* Huellas en buen estado	4			X		X		X		X		X		X	
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL				4287		4295		4300		4308		4316		4324	
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:				Diana		Diana		Diana		Diana		Diana		Diana	
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES: Del 17 al 20 de febrero no se pudo realizar actividades por lluvias.

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1 | GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025 **MODELO:** RETRO 39 **MARCA:** CAT

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO **LOCALIZACION:** VEREDA PALOMA **FRENTE DE TRABAJO:** ORTEGA

PERIODO: 30 DE JUNIO 2025 **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	4324													
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X													
	* De trabajo delanteras	2	X													
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X													
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X													
	* De stop y señal trasera	2	X													
	* De trabajo traseras	2	X													
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X													
	* Cinturón de seguridad	1	X													
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X													
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X													
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X													
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X													
	Alarma de retroceso	1	X													
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X													
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X													
	Palancas de mando	2	X													
	Pedales	Todos	X													
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X													
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X													
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X													
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X													
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X													
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X													
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X													
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X													
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X													
	Mandos de levante del brazo	2	X													
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X													
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X													
	Sistema de Dirección	1	X													
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X													
	* Huellas en buen estado	4	X													
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		4333													
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES: Del 17 al 20 de febrero no se pudo realizar actividades por lluvias.

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1	GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025 **MODELO:** **MOTO NUEVA #3** **MARCA:** KOMATSU

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO **LOCALIZACION:** VEREDA GUAYAQUIL **FRENTE DE TRABAJO:** ORTEGA

PERIODO: 27 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2025 **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL			242,9		251,6		258,7		266,4		273		279,5	
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2			X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo delanteras	2			X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2			X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2			X		X		X		X		X		X	
	* De stop y señal trasera	2			X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo traseras	2			X		X		X		X		X		X	
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1			X		X		X		X		X		X	
	* Cinturón de seguridad	1			X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1			X		X		X		X		X		X	
	Asiento (dispositivo de giro)	1			X		X		X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos			X		X		X		X		X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1			X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso	1			X		X		X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	2			X		X		X		X		X		X	
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1			X		X		X		X		X		X	
	Palancas de mando	2			X		X		X		X		X		X	
	Pedales	Todos			X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo			X		X		X		X		X		X	
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos			X		X		X		X		X		X	
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos				X		X		X		X		X		X
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2			X		X		X		X		X		X	
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1				X		X		X		X		X		X
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas			X		X		X		X		X		X	
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas			X		X		X		X		X		X	
	* Freno de emergencia en buen estado	1			X		X		X		X		X		X	
	Estado general (desgarrador/balde)	2				X		X		X		X		X		X
	Mandos de levante del brazo	2				X		X		X		X		X		X
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos			X		X		X		X		X		X	
	Compartimiento del motor aseado	Completo			X		X		X		X		X		X	
	Sistema de Dirección	1			X		X		X		X		X		X	
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas				X		X		X		X		X		X	
	* Huellas en buen estado	4			X		X		X		X		X		X	
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL				251,6		258,7		266,4		273		279,5		284,5	
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:				Diego O.		Diego O.		Diego O.		Diego O.		Diego O.		Diego O.	
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:				Diana		Diana		Diana		Diana		Diana		Diana	
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES: Del 17 al 20 de febrero no se pudo realizar actividades por lluvias.

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1	GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025 **MODELO:** **MOTO NUEVA #3** **MARCA:** KOMAT'SU

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO **LOCALIZACION:** VEREDA GUAYAQUIL **FRENTE DE TRABAJO:** ORTEGA

PERIODO: 02 DE JUNIO AL DE 04 JUNIO 2025 **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	284,5		291,3		298,4									
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X									
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X									
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X									
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X									
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X									
	* De trabajo traseras	2	X		X		X									
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X									
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X									
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X									
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X									
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite-motor)	Completos	X		X		X									
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X									
	Alarma de retroceso	1	X		X		X									
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X									
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X									
	Palancas de mando	2	X		X		X									
	Pedales	Todos	X		X		X									
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X									
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X									
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos		X		X		X								
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X									
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1		X		X		X								
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X									
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X									
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X									
	Estado general (desgarrador/balde)	2		X		X		X								
	Mandos de levante del brazo	2		X		X		X								
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X									
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X									
	Sistema de Dirección	1	X		X		X									
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X									
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X									
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		291,3		298,4		302,1									
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:		Diego O.		Diego O.		Diego O.									
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:		Diana.		Diana.		Diana.									
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1 | GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025 **MODELO:** **MOTO NUEVA #3** **MARCA:** KOMAT'SU

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO **LOCALIZACION:** VEREDA GUAYAQUIL **FRENTE DE TRABAJO:** ORTEGA

PERIODO: 09 DE JUNIO AL DE 12 JUNIO 2025 **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	302,1		304,4		311,8		319,0							
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X							
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X							
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X							
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X							
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X							
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X							
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X							
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X							
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X							
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X							
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X							
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X							
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X							
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X							
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X							
	Palancas de mando	2	X		X		X		X							
	Pedales	Todos	X		X		X		X							
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X							
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X							
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos		X		X		X		X						
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X							
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1		X		X		X		X						
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X							
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X							
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X							
	Estado general (desgarrador/balde)	2		X		X		X		X						
	Mandos de levante del brazo	2		X		X		X		X						
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X							
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X							
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X							
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X							
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X							
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		304,4		311,8		319,0		325,8							
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:		Diego O.		Diego O.		Diego O.		Diego O.							
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:		Diana		Diana		Diana		Diana							
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1	GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025 **MODELO:** **MOTO NUEVA #3** **MARCA:** KOMAT'SU

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO **LOCALIZACION:** VEREDA SAMARIA **FRENTE DE TRABAJO:** ORTEGA

PERIODO: 16 DE JUNIO AL DE 19 JUNIO 2025 **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	325,8		332,2		340,3		347,2							
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X							
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X							
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X							
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X							
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X							
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X							
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X							
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X							
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X							
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X							
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X							
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X							
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X							
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X							
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X							
	Palancas de mando	2	X		X		X		X							
	Pedales	Todos	X		X		X		X							
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X							
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X							
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos		X		X		X		X						
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X							
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1		X		X		X		X						
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X							
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X							
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X							
	Estado general (desgarrador/balde)	2		X		X		X		X						
	Mandos de levante del brazo	2		X		X		X		X						
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X							
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X							
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X							
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X							
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X							
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		332,2		340,3		347,2		351,4							
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR		Diego O.		Diego O.		Diego O.		Diego O.							
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:		Diana G.		Diana G.		Diana G.		Diana G.							
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1 | GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025 **MODELO:** **MOTO NUEVA #3** **MARCA:** KOMAT'SU

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO **LOCALIZACION:** VEREDA PALOMA **FRENTE DE TRABAJO:** ORTEGA

PERIODO: 24 DE JUNIO AL DE 29 JUNIO 2025 **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL			351,4		355,2		363,4		371,3		379,8		386,9	
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2			X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo delanteras	2			X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2			X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2			X		X		X		X		X		X	
	* De stop y señal trasera	2			X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo traseras	2			X		X		X		X		X		X	
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1			X		X		X		X		X		X	
	* Cinturón de seguridad	1			X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1			X		X		X		X		X		X	
	Asiento (dispositivo de giro)	1			X		X		X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos			X		X		X		X		X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1			X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso	1			X		X		X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	2			X		X		X		X		X		X	
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1			X		X		X		X		X		X	
	Palancas de mando	2			X		X		X		X		X		X	
	Pedales	Todos			X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo			X		X		X		X		X		X	
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos			X		X		X		X		X		X	
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos				X		X		X		X		X		X
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2			X		X		X		X		X		X	
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1				X		X		X		X		X		X
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas			X		X		X		X		X		X	
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas			X		X		X		X		X		X	
	* Freno de emergencia en buen estado	1			X		X		X		X		X		X	
	Estado general (desgarrador/balde)	2				X		X		X		X		X		X
	Mandos de levante del brazo	2				X		X		X		X		X		X
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos			X		X		X		X		X		X	
	Compartimiento del motor aseado	Completo			X		X		X		X		X		X	
	Sistema de Dirección	1			X		X		X		X		X		X	
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas				X		X		X		X		X		X	
	* Huellas en buen estado	4			X		X		X		X		X		X	
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL				355,2		363,4		371,3		379,8		386,9		392,9	
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:				Diego		Diego		Diego		Diego		Diego		Diego	
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:				Diana		Diana		Diana		Diana		Diana		Diana	
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1 | GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025 | MODELO: | MOTO NUEVA #3 | MARCA: KOMAT'SU

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO | LOCALIZACION: VEREDA PALOMA | FRENTE DE TRABAJO: ORTEGA

PERIODO:30 JUNIO 2025 | FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	392,9															
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.			
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M		
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X															
	* De trabajo delanteras	2	X															
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X															
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X															
	* De stop y señal trasera	2	X															
	* De trabajo traseras	2	X															
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X															
	* Cinturón de seguridad	1	X															
	Extintor de incendio (10 ibs PQS)	1	X															
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X															
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X															
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X															
	Alarma de retroceso	1	X															
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X															
	Espejos laterales	2																
	* Espejo central convexo	1	X															
	Palancas de mando	2	X															
	Pedales	Todos	X															
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X															
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X															
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos		X														
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X															
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1		X														
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X															
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X															
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X															
	Estado general (desgarrador/balde)	2		X														
	Mandos de levante del brazo	2		X														
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X															
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X															
	Sistema de Dirección	1	X															
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X															
	* Huellas en buen estado	4	X															
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		400,9															
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:		Diego O.															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:		Diana G.															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1

GOB-M-001

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

PERIODO: 27 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	PLACA: OTI 696	MARCA: CHEVROLET KODIAK
EQUIPO No.	8	MODELO: 2009	FRENTE DE TRABAJO: ORTEGA
INSPECCIONADO POR:	ING. DIANA GALLEGO		LOCALIZACION: VEREDA GUAYAQUIL
Licencia de conduccion:			Póliza de Responsabilidad Civil:
Licencia de transito No.	C2	Última Revisión Tecnicomecanica:	

	HORA INICIO OPERACIÓN			7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		
				1810289		1810579		1810883		#######		1812162		1813087		
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		OBSERVACIONES
ÍTEM	ELEMENTOS A CONTROLAR	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín				X		X		X		X		X		X	
	Kit de contingencia según listado adjunto				X		X		X		X		X		X	
	Caja de Herramienta				X		X		X		X		X		X	
	Tacos				X		X		X		X		X		X	
	Gato				X		X		X		X		X		X	
	Lintema recargable				X		X		X		X		X		X	
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina				X		X		X		X		X		X	
ESTADO GENERAL	Estado del motor			X		X		X		X		X		X		
	Estado del Tanque de combustible			X		X		X		X		X		X		
	Nivel del aceite			X		X		X		X		X		X		
	Soportes motor			X		X		X		X		X		X		
	Estado del exhosto			X		X		X		X		X		X		
	Estado del switche de encendido			X		X		X		X		X		X		
LUCES	De Trabajo delanteras			X		X		X		X		X		X		
	De trabajo traseras			X		X		X		X		X		X		
	Direccionales Delanteras Y Traseras			X		X		X		X		X		X		
	Stop Traseros			X		X		X		X		X		X		
CABINA	Espejo Retrovisor			X		X		X		X		X		X		
	Espejos laterales			X		X		X		X		X		X		
	Alarma (o pito) de Retroceso			X		X		X		X		X		X		
	Pito Normal			X		X		X		X		X		X		
	Frenos de Servicio			X		X		X		X		X		X		
	Freno de emergencia			X		X		X		X		X		X		
	Dirección/suspensión(Terminales).			X		X		X		X		X		X		
	Cinturones de Seguridad			X		X		X		X		X		X		
	Estado de la puertas			X		X		X		X		X		X		
	Vidrio frontal en buen estado.			X		X		X		X		X		X		
	Limpia brisas			X		X		X		X		X		X		
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco			X		X		X		X		X		X		
	Estado de los asientos			X		X		X		X		X		X		
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).			X		X		X		X		X		X		
	Velocímetro			X		X		X		X		X		X		
	Batería y cables			X		X		X		X		X		X		
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos			X		X		X		X		X		X		
	Repuesto			X		X		X		X		X		X		
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas			X		X		X		X		X		X		
	Estado de correas			X		X		X		X		X		X		
	Caja de cambios en buen estado.			X		X		X		X		X		X		
	Radiador			X		X		X		X		X		X		
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)			X		X		X		X		X		X		
	Mangueras			X		X		X		X		X		X		
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)			X		X		X		X		X		X		
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco			X		X		X		X		X		X		
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco			X		X		X		X		X		X		
	tornillos de seguridad para el cierre del volco			X		X		X		X		X		X		
	Estado de empaques del volco			X		X		X		X		X		X		
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN			5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		
	KILOMETRAJE FINAL			1810579		1810883		1811504		#######		1813087		1813167		

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		Firma Verificación Inspector: Diana Gallego
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma: David O.	El Equipo esta apto para Trabajar:	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1

GOB-M-001

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

PERIODO: 02 DE JUNIO AL 04 DE JUNIO 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	**PLACA: OTI 696**	**MARCA:** CHEVROLET KODIAK
EQUIPO No.	8	**MODELO: 2009**	**FRENTE DE TRABAJO: ORTEGA**
INSPECCIONADO POR:	ING. DIANA GALLEGO		**LOCALIZACION: VEREDA GUAYAQUIL**
Licencia de conduccion:			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

		LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		
	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00										
		1813167		1814007		1815099										
	DIA															
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	**OBSERVACIONES**
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín		X		X		X									
	Kit de contingencia según listado adjunto		X		X		X									
	Caja de Herramienta		X		X		X									
	Tacos		X		X		X									
	Gato		X		X		X									
	Linterna recargable		X		X		X									
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina		X		X		X									
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X										
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X										
	Nivel del aceite	X		X		X										
	Soportes motor	X		X		X										
	Estado del exhosto	X		X		X										
	Estado del switche de encendido	X		X		X										
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X										
	De trabajo traseras	X		X		X										
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X										
	Stop Traseros	X		X		X										
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X										
	Espejos laterales	X		X		X										
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X										
	Pito Normal	X		X		X										
	Frenos de Servicio	X		X		X										
	Freno de emergencia	X		X		X										
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X										
	Cinturones de Seguridad	X		X		X										
	Estado de la puertas	X		X		X										
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X										
	Limpia brisas	X		X		X										
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X										
	Estado de los asientos	X		X		X										
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X										
	Velocímetro	X		X		X										
	Bateria y cables	X		X		X										
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X										
	Repuesto	X		X		X										
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X										
	Estado de correas	X		X		X										
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X										
	Radiador	X		X		X										
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X										
	Mangueras	X		X		X										
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X										
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X										
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X										
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X										
	Estado de empaques del volco	X		X		X										
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00										
	KILOMETRAJE FINAL	1814007		1815099		1815557										

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:** Diana Gallego
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma: David O.	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO (X)

FIRMA COORDINADOR

1627

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

PERIODO: 09 DE JUNIO AL 14 DE JUNIO 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	**PLACA:** OTI 696	**MARCA:** CHEVROLET KODIAK
EQUIPO No.	8	**MODELO:** 2009	**FRENTE DE TRABAJO:** ORTEGA
INSPECCIONADO POR:	ING. DIANA GALLEGO		**LOCALIZACION:** VEREDA GUAYAQUIL
Licencia de conduccion:			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		
		1815557		181589		181697		181823		181942		182059		182104		
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		OBSERVACIONES
ÍTEM	ELEMENTOS A CONTROLAR	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín		X		X		X		X		X		X		X	
	Kit de contingencia según listado adjunto		X		X		X		X		X		X		X	
	Caja de Herramienta		X		X		X		X		X		X		X	
	Tacos		X		X		X		X		X		X		X	
	Gato		X		X		X		X		X		X		X	
	Linterna recargable		X		X		X		X		X		X		X	
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina		X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X		X		X		X		
	Nivel del aceite	X		X		X		X		X		X		X		
	Soportes motor	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado del exhosto	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X		X		X		X		
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X		X		X		
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X		X		X		
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X		X		X		X		
	Stop Traseros	X		X		X		X		X		X		X		
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X		X		X		X		
	Espejos laterales	X		X		X		X		X		X		X		
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X		X		X		X		
	Pito Normal	X		X		X		X		X		X		X		
	Frenos de Servicio	X		X		X		X		X		X		X		
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X		X		X		
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X		X		X		
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de la puertas	X		X		X		X		X		X		X		
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X		
	Limpia brisas	X		X		X		X		X		X		X		
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de los asientos	X		X		X		X		X		X		X		
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X		X		X		X		
	Velocímetro	X		X		X		X		X		X		X		
	Batería y cables	X		X		X		X		X		X		X		
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X		X		X		
	Repuesto	X		X		X		X		X		X		X		
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de correas	X		X		X		X		X		X		X		
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X		
	Radiador	X		X		X		X		X		X		X		
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X		X		X		
	Mangueras	X		X		X		X		X		X		X		
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X		X		X		X		
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		
	KILOMETRAJE FINAL	181589		181697		181823		181942		182059		182104		1821455		

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:** Diana Gallego
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma: David O.	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	

PERIODO: 16 DE JUNIO AL 19 DE JUNIO 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	**PLACA: OTI 696**	**MARCA:** CHEVROLET KODIAK
EQUIPO No.	8	**MODELO: 2009**	**FRENTE DE TRABAJO: ORTEGA**
INSPECCIONADO POR:	ING. DIANA GALLEGO		**LOCALIZACION: VEREDA GUAYAQUIL**
Licencia de conduccion:			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**								
		1821455		1821860		1823021		1823986								
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**		**OBSERVACIONES**
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquin		X		X		X		X							
	Kit de contingencia según listado adjunto		X		X		X		X							
	Caja de Herramienta		X		X		X		X							
	Tacos		X		X		X		X							
	Gato		X		X		X		X							
	Linterna recargable		X		X		X		X							
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina		X		X		X		X							
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X								
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X								
	Nivel del aceite	X		X		X		X								
	Soportes motor	X		X		X		X								
	Estado del exhosto	X		X		X		X								
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X								
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X								
	De trabajo traseras	X		X		X		X								
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X								
	Stop Traseros	X		X		X		X								
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X								
	Espejos laterales	X		X		X		X								
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X								
	Pito Normal	X		X		X		X								
	Frenos de Servicio	X		X		X		X								
	Freno de emergencia	X		X		X		X								
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X								
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X								
	Estado de la puertas	X		X		X		X								
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X								
	Limpia brisas	X		X		X		X								
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X								
	Estado de los asientos	X		X		X		X								
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X								
	Velocímetro	X		X		X		X								
	Batería y cables	X		X		X		X								
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X								
	Repuesto	X		X		X		X								
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X								
	Estado de correas	X		X		X		X								
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X								
	Radiador	X		X		X		X								
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X								
	Mangueras	X		X		X		X								
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X								
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X								
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X								
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X								
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X								
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**								
	KILOMETRAJE FINAL	1821860		1823021		1823986		1824411								

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:** Diana Gallego
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )
			FIRMA COORDINADOR

VERSION 1

GOB-M-001

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

PERIODO: 24 DE JUNIO AL 29 DE JUNIO 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	**PLACA: OTI 696**	**MARCA:** CHEVROLET KODIAK
EQUIPO No.	8	**MODELO: 2009**	**FRENTE DE TRABAJO: ORTEGA**
INSPECCIONADO POR:	ING. DIANA GALLEGO		**LOCALIZACION: VEREDA PALOMA**
Licencia de conduccion:			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN			7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		
				1824411		1826475		1827070		#######		1828249		1828837		
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		OBSERVACIONES
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquin				X		X		X		X		X		X	
	Kit de contingencia según listado adjunto				X		X		X		X		X		X	
	Caja de Herramienta				X		X		X		X		X		X	
	Tacos				X		X		X		X		X		X	
	Gato				X		X		X		X		X		X	
	Linterna recargable				X		X		X		X		X		X	
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina				X		X		X		X		X		X	
ESTADO GENERAL	Estado del motor			X		X		X		X		X		X		
	Estado del Tanque de combustible			X		X		X		X		X		X		
	Nivel del aceite			X		X		X		X		X		X		
	Soportes motor			X		X		X		X		X		X		
	Estado del exhosto			X		X		X		X		X		X		
	Estado del switche de encendido			X		X		X		X		X		X		
LUCES	De Trabajo delanteras			X		X		X		X		X		X		
	De trabajo traseras			X		X		X		X		X		X		
	Direccionales Delanteras Y Traseras			X		X		X		X		X		X		
	Stop Traseros			X		X		X		X		X		X		
CABINA	Espejo Retrovisor			X		X		X		X		X		X		
	Espejos laterales			X		X		X		X		X		X		
	Alarma (o pito) de Retroceso			X		X		X		X		X		X		
	Pito Normal			X		X		X		X		X		X		
	Frenos de Servicio			X		X		X		X		X		X		
	Freno de emergencia			X		X		X		X		X		X		
	Dirección/suspensión(Terminales).			X		X		X		X		X		X		
	Cinturones de Seguridad			X		X		X		X		X		X		
	Estado de la puertas			X		X		X		X		X		X		
	Vidrio frontal en buen estado.			X		X		X		X		X		X		
	Limpia brisas			X		X		X		X		X		X		
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco			X		X		X		X		X		X		
	Estado de los asientos			X		X		X		X		X		X		
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).			X		X		X		X		X		X		
	Velocímetro			X		X		X		X		X		X		
	Batería y cables			X		X		X		X		X		X		
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos			X		X		X		X		X		X		
	Repuesto			X		X		X		X		X		X		
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas			X		X		X		X		X		X		
	Estado de correas			X		X		X		X		X		X		
	Caja de cambios en buen estado.			X		X		X		X		X		X		
	Radiador			X		X		X		X		X		X		
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)			X		X		X		X		X		X		
	Mangueras			X		X		X		X		X		X		
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)			X		X		X		X		X		X		
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco			X		X		X		X		X		X		
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco			X		X		X		X		X		X		
	tornillos de seguridad para el cierre del volco			X		X		X		X		X		X		
	Estado de empaques del volco			X		X		X		X		X		X		
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN			5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		
	KILOMETRAJE FINAL			1826475		1827070		1827655		#######		1828837		1829162		

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	**Firma Verificación Inspector:**	Diana Gallego
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

1629

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	

PERIODO: 30 DE JUNIO 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	PLACA: OTI 696	MARCA: CHEVROLET KODIAK
EQUIPO No.	8	MODELO: 2009	FRENTE DE TRABAJO: ORTEGA
INSPECCIONADO POR:	ING. DIANA GALLEGO		LOCALIZACION: VEREDA PALOMA
Licencia de conduccion:			Póliza de Responsabilidad Civil:
Licencia de transito No.	C2	Última Revisión Tecnicomecanica:	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00														
		1829162														
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		OBSERVACIONES
ÍTEM	ELEMENTOS A CONTROLAR	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín		X													
	Kit de contingencia según listado adjunto		X													
	Caja de Herramienta		X													
	Tacos		X													
	Gato		X													
	Linterna recargable		X													
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina		X													
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X														
	Estado del Tanque de combustible	X														
	Nivel del aceite	X														
	Soportes motor	X														
	Estado del exhosto	X														
	Estado del switche de encendido	X														
LUCES	De Trabajo delanteras	X														
	De trabajo traseras	X														
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X														
	Stop Traseros	X														
CABINA	Espejo Retrovisor	X														
	Espejos laterales	X														
	Alarma (o pito) de Retroceso	X														
	Pito Normal	X														
	Frenos de Servicio	X														
	Freno de emergencia	X														
	Dirección/suspensión(Terminales).	X														
	Cinturones de Seguridad	X														
	Estado de la puertas	X														
	Vidrio frontal en buen estado.	X														
	Limpia brisas	X														
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X														
	Estado de los asientos	X														
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X														
	Velocímetro	X														
	Batería y cables	X														
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X														
	Repuesto	X														
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X														
	Estado de correas	X														
	Caja de cambios en buen estado.	X														
	Radiador	X														
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X														
	Mangueras	X														
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X														
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X														
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X														
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X														
	Estado de empaques del volco	X														
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00														
	KILOMETRAJE FINAL	1829539														

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		Firma Verificación Inspector: Diana Gallego
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma: David O.	El Equipo esta apto para Trabajar:	SI ( ) NO ( )
			FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

PERIODO: 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	**PLACA: OTI 692**	**MARCA:** CHEVROLET KODIAK
EQUIPO No.	16	**MODELO: 2009**	**FRENTE DE TRABAJO: ORTEGA**
INSPECCIONADO POR:	ING. DIANA GALLEGO		**LOCALIZACION: VEREDA GUAYAQUIL**
Licencia de conduccion:			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		
		1305856		1306953		1307235		1307567		#######		1309485		1309506		
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		OBSERVACIONES
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquin		X		X		X		X		X		X		X	
	Kit de contingencia según listado adjunto		X		X		X		X		X		X		X	
	Caja de Herramienta		X		X		X		X		X		X		X	
	Tacos		X		X		X		X		X		X		X	
	Gato		X		X		X		X		X		X		X	
	Linterna recargable		X		X		X		X		X		X		X	
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina		X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X		X		X		X		
	Nivel del aceite	X		X		X		X		X		X		X		
	Soportes motor	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado del exhosto	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X		X		X		X		
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X		X		X		
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X		X		X		
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X		X		X		X		
	Stop Traseros	X		X		X		X		X		X		X		
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X		X		X		X		
	Espejos laterales	X		X		X		X		X		X		X		
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X		X		X		X		
	Pito Normal	X		X		X		X		X		X		X		
	Frenos de Servicio	X		X		X		X		X		X		X		
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X		X		X		
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X		X		X		
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de la puertas	X		X		X		X		X		X		X		
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X		
	Limpia brisas	X		X		X		X		X		X		X		
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de los asientos	X		X		X		X		X		X		X		
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X		X		X		X		
	Velocímetro	X		X		X		X		X		X		X		
	Batería y cables	X		X		X		X		X		X		X		
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X		X		X		
	Repuesto	X		X		X		X		X		X		X		
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de correas	X		X		X		X		X		X		X		
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X		
	Radiador	X		X		X		X		X		X		X		
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X		X		X		
	Mangueras	X		X		X		X		X		X		X		
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X		X		X		X		
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		
	KILOMETRAJE FINAL	1306953		1307235		1307567		1308204		#######		1309506		1310602		

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector** Diana Gallego
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )
			FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	

PERIODO: 02 DE JUNIO AL 04 DE JUNIO 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	**PLACA: OTI 692**	**MARCA:** CHEVROLET KODIAK
EQUIPO No.	16	**MODELO: 2009**	**FRENTE DE TRABAJO: ORTEGA**
INSPECCIONADO POR:	ING. DIANA GALLEGO		**LOCALIZACION: VEREDA GUAYAQUIL**
Licencia de conduccion:			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	**7:00**		**7:00**		**7:00**										
		1310602		1311873		1313373										
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**		**OBSERVACIONES**
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquin		X		X		X									
	Kit de contingencia según listado adjunto		X		X		X									
	Caja de Herramienta		X		X		X									
	Tacos		X		X		X									
	Gato		X		X		X									
	Lintema recargable		X		X		X									
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina		X		X		X									
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X										
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X										
	Nivel del aceite	X		X		X										
	Soportes motor	X		X		X										
	Estado del exhosto	X		X		X										
	Estado del switche de encendido	X		X		X										
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X										
	De trabajo traseras	X		X		X										
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X										
	Stop Traseros	X		X		X										
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X										
	Espejos laterales	X		X		X										
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X										
	Pito Normal	X		X		X										
	Frenos de Servicio	X		X		X										
	Freno de emergencia	X		X		X										
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X										
	Cinturones de Seguridad	X		X		X										
	Estado de la puertas	X		X		X										
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X										
	Limpia brisas	X		X		X										
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X										
	Estado de los asientos	X		X		X										
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X										
	Velocímetro	X		X		X										
	Batería y cables	X		X		X										
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X										
	Repuesto	X		X		X										
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X										
	Estado de correas	X		X		X										
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X										
	Radiador	X		X		X										
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X										
	Mangueras	X		X		X										
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X										
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X										
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X										
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X										
	Estado de empaques del volco	X		X		X										
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	**5:00**		**5:00**		**5:00**										
	KILOMETRAJE FINAL	1311873		1313373		1314118										

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	**Firma Verificación Inspector:**	Diana Gallego
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )
			FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

PERIODO: 09 DE JUNIO AL 14 DE JUNIO 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	**PLACA: OTI 692**	**MARCA:** CHEVROLET KODIAK
EQUIPO No.	16	**MODELO: 2009**	**FRENTE DE TRABAJO: ORTEGA**
INSPECCIONADO POR:	ING. DIANA GALLEGO		**LOCALIZACION: VEREDA GUAYAQUIL**
Licencia de conduccion:			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		
		1314118		1315172		1316186		1317305		#######		1318177		1318328		
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		OBSERVACIONES
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín		X		X		X		X		X		X		X	
	Kit de contingencia según listado adjunto		X		X		X		X		X		X		X	
	Caja de Herramienta		X		X		X		X		X		X		X	
	Tacos		X		X		X		X		X		X		X	
	Gato		X		X		X		X		X		X		X	
	Linterna recargable		X		X		X		X		X		X		X	
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina		X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X		X		X		X		
	Nivel del aceite	X		X		X		X		X		X		X		
	Soportes motor	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado del exhosto	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X		X		X		X		
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X		X		X		
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X		X		X		
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X		X		X		X		
	Stop Traseros	X		X		X		X		X		X		X		
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X		X		X		X		
	Espejos laterales	X		X		X		X		X		X		X		
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X		X		X		X		
	Pito Normal	X		X		X		X		X		X		X		
	Frenos de Servicio	X		X		X		X		X		X		X		
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X		X		X		
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X		X		X		
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de la puertas	X		X		X		X		X		X		X		
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X		
	Limpia brisas	X		X		X		X		X		X		X		
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de los asientos	X		X		X		X		X		X		X		
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X		X		X		X		
	Velocímetro	X		X		X		X		X		X		X		
	Batería y cables	X		X		X		X		X		X		X		
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X		X		X		
	Repuesto	X		X		X		X		X		X		X		
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de correas	X		X		X		X		X		X		X		
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X		
	Radiador	X		X		X		X		X		X		X		
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X		X		X		
	Mangueras	X		X		X		X		X		X		X		
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X		X		X		X		
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		
	KILOMETRAJE FINAL	1315172		1316186		1317305		1317305		#######		1318328		1318547		

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:** Diana Gallego
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

PERIODO: 16 DE JUNIO AL 18 DE JUNIO 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	**PLACA: OTI 692**	**MARCA:** CHEVROLET KODIAK
EQUIPO No.	16	**MODELO: 2009**	**FRENTE DE TRABAJO: ORTEGA**
INSPECCIONADO POR:	ING. DIANA GALLEGO		**LOCALIZACION: VEREDA GUAYAQUIL**
Licencia de conduccion:			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	**7:00**		**7:00**		**7:00**										
		1318547		1319409		1319770										
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**		**OBSERVACIONES**
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín		X		X		X									
	Kit de contingencia según listado adjunto		X		X		X									
	Caja de Herramienta		X		X		X									
	Tacos		X		X		X									
	Gato		X		X		X									
	Linterna recargable		X		X		X									
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina		X		X		X									
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X										
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X										
	Nivel del aceite	X		X		X										
	Soportes motor	X		X		X										
	Estado del exhosto	X		X		X										
	Estado del switche de encendido	X		X		X										
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X										
	De trabajo traseras	X		X		X										
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X										
	Stop Traseros	X		X		X										
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X										
	Espejos laterales	X		X		X										
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X										
	Pito Normal	X		X		X										
	Frenos de Servicio	X		X		X										
	Freno de emergencia	X		X		X										
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X										
	Cinturones de Seguridad	X		X		X										
	Estado de la puertas	X		X		X										
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X										
	Limpia brisas	X		X		X										
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X										
	Estado de los asientos	X		X		X										
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X										
	Velocímetro	X		X		X										
	Batería y cables	X		X		X										
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X										
	Repuesto	X		X		X										
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X										
	Estado de correas	X		X		X										
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X										
	Radiador	X		X		X										
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X										
	Mangueras	X		X		X										
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X										
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X										
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X										
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X										
	Estado de empaques del volco	X		X		X										
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	**5:00**		**5:00**		**5:00**										
	KILOMETRAJE FINAL	1319409		1319770		1320245										

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:** Diana Gallego
	Afiliación ARP		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )
			FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

PERIODO: 25 DE JUNIO AL 28 DE JUNIO 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	**PLACA: OTI 692**	**MARCA:** CHEVROLET KODIAK
EQUIPO No.	16	**MODELO: 2009**	**FRENTE DE TRABAJO: ORTEGA**
INSPECCIONADO POR:	ING. DIANA GALLEGO		**LOCALIZACION: VEREDA PALOMA**
Licencia de conduccion:			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN					7:00		7:00		7:00		7:00					
						1320245		1322438		#######		1323613					
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**		**OBSERVACIONES**	
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**		
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín						X		X		X		X				
	Kit de contingencia según listado adjunto						X		X		X		X				
	Caja de Herramienta						X		X		X		X				
	Tacos						X		X		X		X				
	Gato						X		X		X		X				
	Linterna recargable						X		X		X		X				
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina						X		X		X		X				
ESTADO GENERAL	Estado del motor					X		X		X		X					
	Estado del Tanque de combustible					X		X		X		X					
	Nivel del aceite					X		X		X		X					
	Soportes motor					X		X		X		X					
	Estado del exhosto					X		X		X		X					
	Estado del switche de encendido					X		X		X		X					
LUCES	De Trabajo delanteras					X		X		X		X					
	De trabajo traseras					X		X		X		X					
	Direccionales Delanteras Y Traseras					X		X		X		X					
	Stop Traseros					X		X		X		X					
CABINA	Espejo Retrovisor					X		X		X		X					
	Espejos laterales					X		X		X		X					
	Alarma (o pito) de Retroceso					X		X		X		X					
	Pito Normal					X		X		X		X					
	Frenos de Servicio					X		X		X		X					
	Freno de emergencia					X		X		X		X					
	Dirección/suspensión(Terminales).					X		X		X		X					
	Cinturones de Seguridad					X		X		X		X					
	Estado de la puertas					X		X		X		X					
	Vidrio frontal en buen estado.					X		X		X		X					
	Limpia brisas					X		X		X		X					
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco					X		X		X		X					
	Estado de los asientos					X		X		X		X					
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).					X		X		X		X					
	Velocímetro					X		X		X		X					
	Batería y cables					X		X		X		X					
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos					X		X		X		X					
	Repuesto					X		X		X		X					
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas					X		X		X		X					
	Estado de correas					X		X		X		X					
	Caja de cambios en buen estado.					X		X		X		X					
	Radiador					X		X		X		X					
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)					X		X		X		X					
	Mangueras					X		X		X		X					
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)					X		X		X		X					
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco					X		X		X		X					
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco					X		X		X		X					
	tornillos de seguridad para el cierre del volco					X		X		X		X					
	Estado de empaques del volco					X		X		X		X					
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN					5:00		5:00		5:00		5:00					
	KILOMETRAJE FINAL					1322438		1322815		#######		1324412					

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	**Firma Verificación Inspector:**	Diana Gallego
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI NO
			FIRMA COORDINADOR

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 5

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

FRENTE DE TRABAJO ORTEGA

MAYO- JUNIO DE 2025

Carrera 3#10-25, Oficina 202 A, Centro – Teléfono (8) 2596201
Ibagué – Tolima. Colombia

FRENTE ORTEGA								
#.ORDEN	DIA	HORA	RECIBO	GLS	TOTAL	ESTACION SERVICIO	OBSERVACIONES	FRENTE
4	26-may-25	8:54:37	107649	**40,000**	$ 423.200,00	ESTACION DISTRACOM	Emir Diaz V#16	FRENTE ORTEGA
8	31-may-25	10:02:09	107902	**40,000**	$ 423.200,00	ESTACION DISTRACOM	Emir Diaz V#16	FRENTE ORTEGA
9	31-may-25	10:34:43	107908	**93,573**	$ 900.002,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE ORTEGA
10	31-may-25	10:47:59	107913	**92,531**	$ 978.978,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE ORTEGA
11	31-may-25	11:02:06	107916	**29,118**	$ 308.068,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador V#16	FRENTE ORTEGA

TOTAL MES	295,222
REMANENTE CONTRATO ANTERIOR	228,017
TOTAL ACPM	523,239

CONSUMO MES	230,239
REMANENTE JUNIO	293,000

VERSION 1	GOB-M-014	
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO. 2241 DE 2025 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIARIO EN TURNO

TURNO: DIURNO DEL 26 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

MUNICIPIO: ORTEGA VEREDA : ORTEGA COORDINADOR: JEISON ALVIS

VIA: ORTEGA

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE DEL OPERADOR	LUNES(26)		MARTES (27)		MIERCOLES (28)		JUEVES(29)		VIERNES(30)		SABADO(31)		DOMINGO ()		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	RETRO EXCAVADORA	39	WILDER MUÑOZ			27	Diego O.					33,239	Diego O.					60,239
2	MOTONIVELADORA	KMT2112	DIEGO OVALLE			40	Diego O.					50	Diego O.					90,000
3	VOLQUETA	16	EMIR DIAZ	40										40				80,000
4																		
5																		
6																		
7																		

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES ( )		MARTES ( )		MIERCOLES ( )		JUEVES( )		VIERNES ( )		SABADO( )		DOMINGO ( )		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	RETRO EXCAVADORA	39	WILDER MUÑOZ															0,000
2	MOTONIVELADORA	KMT2112	DIEGO OVALLE															0,000
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		

230,239

OBSERVACIONES: Viene del contrato anterior 228,017 gl. Se trasladan 293 gl para el mes de Junio.

VoBo SUPERVISOR (A): Dana Gallego

VoBo COORDINADOR:

FRENTE ORTEGA								
#.ORDEN	DIA	HORA	RECIBO	GLS	TOTAL	ESTACION SERVICIO	OBSERVACIONES	FRENTE
57	6-jun-25	14:57:27	108306	**93,661**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE ORTEGA
58	6-jun-25	15:10:10	108308	**93,661**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE ORTEGA
59	6-jun-25	15:24:42	108310	**53,884**	$ 569.554,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE ORTEGA
60	6-jun-25	15:34:50	108313	**40,000**	$ 422.800,00	ESTACION DISTRACOM	Emir Diaz V#16	FRENTE ORTEGA
61	6-jun-25	15:43:14	108315	**21,575**	$ 228.048,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador V	FRENTE ORTEGA
93	14-jun-25	12:10:44	108782	**44,283**	$ 468.071,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE ORTEGA
94	14-jun-25	12:08:21	108783	**73,265**	$ 774.411,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE ORTEGA
112	20-jun-25	11:31:17	109139	**27,227**	$ 288.878,00	ESTACION DISTRACOM	David Ospina V#8	FRENTE ORTEGA
113	20-jun-25	13:08:19	109150	**93,308**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE ORTEGA
114	20-jun-25	13:19:45	109153	**57,132**	$ 606.171,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE ORTEGA
115	20-jun-25	13:44:47	109160	**46,423**	$ 492.548,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE ORTEGA
184	28-jun-25	9:25:38	109618	**71,445**	$ 758.031,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE ORTEGA
185	28-jun-25	9:30:38	109619	**52,522**	$ 557.258,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE ORTEGA
186	28-jun-25	9:39:11	109620	**23,629**	$ 250.704,00	ESTACION DISTRACOM	Emir Diaz V#16	FRENTE ORTEGA
187	28-jun-25	9:14:00	109614	**40,000**	$ 424.400,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador V	FRENTE ORTEGA

TOTAL MES	832,015
REMANENTE MES ANTERIOR	293,000
TOTAL ACPM	1125,015

CONSUMO MES	941,048
TRASPASO A IBAGUÉ-ORUGA	123,967
REMANENTE JULIO	60,000

VERSION 1	GOB-M-014
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO. 2241 DE 2025
	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

INFORME SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIARIO EN TURNO

TURNO: DIURNO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

MUNICIPIO: ORTEGA VEREDA : GUAYAQUIL-PALOMA COORDINADOR: JEISON GIOVANNI ALVIS LOZANO

VIA: GUAYAQUIL-PALOMA

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE DEL OPERADOR	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO (1)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	RETROEXCAVADORA	39	WILDER MUÑOZ																	0,000
2	VOLQUETA	8	DAVID OSPINA																	0,000
3	VOLQUETA	16	EMIR DIAZ																	0,000
4	MOTONIVELADORA	NUEVA #3	DIEGO OVALLE																	0,000
5																				0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (2)		MARTES (3)		MIERCOLES (4)		JUEVES (5)		VIERNES (6)		SABADO (7)		DOMINGO (8)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	RETROEXCAVADORA	39	WILDER MUÑOZ					25												25,000
2	VOLQUETA	8	DAVID OSPINA					30												30,000
3	VOLQUETA	16	EMIR DIAZ									40								40,000
4	MOTONIVELADORA	NUEVA #3	DIEGO OVALLE	60																60,000
																				0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (9)		MARTES (10)		MIERCOLES (11)		JUEVES (12)		VIERNES (13)		SABADO (14)		DOMINGO (15)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	RETROEXCAVADORA	39	WILDER MUÑOZ	15		15				25				25						80,000
2	VOLQUETA	8	DAVID OSPINA			10						20								30,000
3	VOLQUETA	16	EMIR DIAZ	20								20								40,000
4	MOTONIVELADORA	NUEVA #3	DIEGO OVALLE	45						60										105,000
																				0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (16)		MARTES (17)		MIERCOLES (18)		JUEVES (19)		VIERNES (20)		SABADO (21)		DOMINGO (22)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	RETROEXCAVADORA	39	WILDER MUÑOZ							35										35,000
2	VOLQUETA	8	DAVID OSPINA	30,000						32,000										62,000
3	VOLQUETA	16	EMIR DIAZ					24,000												24,000
4	MOTONIVELADORA	NUEVA #3	DIEGO OVALLE	60,000				29,419												89,419
																				0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (23)		MARTES (24)		MIERCOLES (25)		JUEVES (26)		VIERNES (27)		SABADO (28)		DOMINGO (29)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	RETROEXCAVADORA	39	WILDER MUÑOZ							24						30				54,000
2	VOLQUETA	8	DAVID OSPINA					33												33,000
3	VOLQUETA	16	EMIR DIAZ											23,629						23,629
4	MOTONIVELADORA	NUEVA #3	DIEGO OVALLE			60				30						60				150,000
																				0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (30)		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	RETROEXCAVADORA	39	WILDER MUÑOZ																	0,000
2	VOLQUETA	8	DAVID OSPINA	30																30,000
3	VOLQUETA	16	EMIR DIAZ																	0,000
4	MOTONIVELADORA	NUEVA #3	DIEGO OVALLE	30																30,000
																				0,000

941,048

OBSERVACIONES: Viene 293,000 gls del mes de mayo. Se trasnlada 123,967 gl para el frente de Ibagus Oruga .Remanente para julio 80,000 gls.

VoBo SUPERVISOR (A): Diego Ovalle

VoBo COORDINADOR:

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOB-M-012A
CONTRATO 2241 DE 2025

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Ortega
FECHA : 26/05/2025

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 0947 del 07 de Marzo del 2024 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Supervisor del contrato 2241 del 21 de Mayo de 2025 cuyo objeto es ***¨CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA¨*** y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Ortega la cantidad de 40,000 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 26 de Mayo del 2025.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Supervisor Contrato 2241 de 2025.
MARV 5

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

Ortega

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta

No. REFK 10649

Distribucion y Transporte de C

NIT: 811.009.788-8

distracomeltriunfo

@distracom.com.co

Cod. Act. 4731

Somos Grandes Contribuyentes

Segun Res. No 000200

de 27 DIC 2024

DISTRACOM EL TRIUNFO

CRA 1 #18 A 01

Ibague

TEL:3137434826

Fecha remision: 2025/05/26

Vencimiento: 2025/06/25

Naturaleza: Credito

Cliente:GOBERNACION DEL TOL

Contrato: OC 125653

Nit: 800113672

Direccion:CR 3 CL 11 ED GO

Telefono: 2611616

Placa: OTI692

Kilometros: 130587

Cedula: 800113672

Hora Ini: 08:54:37

Hora Fin: 09:02:40

Combustible: DIESEL

Volumen: 40.0000

Precio: $10580

Total: $423200

Panel: MFC499

Lad/Pan/Pos: 1/1/1

Dispositivo: CBHAND283-02

Empleado: DEVIA BUSTOS LEON

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi: OTI692

#16

Ortega

Nombre:

#16

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOB-M-012A
CONTRATO 2241 DE 2025

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Ortega
FECHA : 31/05/2025

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 0947 del 07 de Marzo del 2024 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Supervisor del contrato 2241 del 21 de Mayo de 2025 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Ortega la cantidad de 255,222 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 31 de Mayo del 2025.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Supervisor Contrato 2241 de 2025.
MARV 5

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 107902
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/05/31
Vencimiento:	2025/06/30
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	OTT692
Kilometros:	130950
Cedula:	800113672
Hora Ini:	10:02:09
Hora Fin:	10:08:32
Combustible:	DIESEL
Volumen:	40.0000
Precio:	$10580
Total:	$423200
Panel:	MFC499
Lad/Man/Pos:	1/1/1
Dispositivo:	CBHAND283-01
Empleado:	BRYAN ALEXANDER M
Validado:	ID Electronico

Entrego:
Recibi: OTT692 #16 Ortega
Nombre:

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 107908
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/05/31
Vencimiento:	2025/06/30
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	ORTEGA
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora Ini:	10:34:43
Hora Fin:	10:47:41
Combustible:	DIESEL
Volumen:	93.5730
Precio:	$10580
Total:	$990002
Panel:	MFC499
Lad/Man/Pos:	1/1/1
Dispositivo:	IMP-ADMIN
Empleado:	BRYAN ALEXANDER M
Validado:	ID Electronico

Entrego: Ortegu
Recibi:
Nombre:

distracom

*COPIA(2)
Remision de Venta
No. REFK 107913
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/05/31
Vencimiento:	2025/06/30
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	ORTEGA
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora Ini:	10:47:59
Hora Fin:	10:59:13
Combustible:	DIESEL
Volumen:	92.5310
Precio:	$10580
Total:	$978978
Panel:	MFC499
Lad/Man/Pos:	1/1/1
Dispositivo:	CBHAND283-01
Empleado:	BRYAN ALEXANDER M
Validado:	ID Electronico

Entrego:
Recibi:
Nombre: Ortega

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 107916
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/05/31
Vencimiento:	2025/06/30
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	OTT692
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora Ini:	11:02:06
Hora Fin:	11:07:16
Combustible:	DIESEL
Volumen:	29.1180
Precio:	$10580
Total:	$308068
Panel:	MFC499
Lad/Man/Pos:	1/1/1
Dispositivo:	CBHAND283-02
Empleado:	BRYAN ALEXANDER M
Validado:	ID Electronico

Entrego: Ortega
Recibi:
Nombre: Notificada 16

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOB-M-012A
CONTRATO 2241 DE 2025

GOBERNACION DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Ortega
FECHA : 06/06/2025

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 0947 del 07 de Marzo del 2024 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Supervisor del contrato 2241 del 21 de Mayo de 2025 cuyo objeto es ***¨CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA¨*** y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Ortega la cantidad de 302,781 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 06 de Junio del 2025.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Supervisor Contrato 2241 de 2025.
MARV 5

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 108306
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distraconeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/06/06
Vencimiento:	2025/07/06
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	ORTEGA
Kilometros:	0
Hora Ini:	14:57:27
Hora Fin:	15:10:01
Combustible:	DIESEL
Volumen:	93.6610
Precio:	$10570
Total:	$990000
Panel:	MFC501
Lad/Man/Pos:	1/1/5
Dispositivo:	CBHAND283-03
Empleado:	LUISA FERNANDA GA
Validado:	ID Electronico

Entrego: Ortega
Recibi:
Nombre:

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 108308
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distraconeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/06/06
Vencimiento:	2025/07/06
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	ORTEGA
Kilometros:	0
Hora Ini:	15:10:10
Hora Fin:	15:23:57
Combustible:	DIESEL
Volumen:	93.6610
Precio:	$10570
Total:	$990000
Panel:	MFC501
Lad/Man/Pos:	1/1/5
Dispositivo:	CBHAND283-03
Empleado:	LUISA FERNANDA GA
Validado:	ID Electronico

Entrego: Ortega
Recibi:
Nombre:

distracom

Remision de Venta
No. REFK 108310
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distraconeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/06/06
Vencimiento:	2025/07/06
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	ORTEGA
Kilometros:	0
Hora Ini:	15:24:42
Hora Fin:	15:31:38
Combustible:	DIESEL
Volumen:	53.8840
Precio:	$10570
Total:	$569554
Panel:	MFC501
Lad/Man/Pos:	1/1/5
Dispositivo:	CBHAND283-03
Empleado:	LUISA FERNANDA GA
Validado:	ID Electronico

Entrego: Ortega
Recibi:
Nombre:

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 108313
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distraconeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/06/06
Vencimiento:	2025/07/06
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	OTT692
Kilometros:	131414
Hora Ini:	15:34:50
Hora Fin:	15.42:28
Combustible:	DIESEL
Volumen:	40.0000
Precio:	$10570
Total:	$422800
Panel:	MFC501
Lad/Man/Pos:	1/1/5
Dispositivo:	CBHAND283-03
Empleado:	LUISA FERNANDA GA
Validado:	ID Electronico

Entrego: Juan
Recibi: Ott 692 #16 Ortega
Nombre:

1641

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 108315
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision: 2025/06/06
Vencimiento: 2025/07/06
Naturaleza: Credito

Cliente:GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 125653
Nit: 800113672
Direccion:CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: ORTEGA
Kilometros: 0

Hora Ini: 15:43:14
Hora Fin: 15:47:51

Combustible: DIESEL
Volumen: 21.5750
Precio: $10570
Total: $228048

Panel: MFC501
Lad/Man/Pos: 1/1/5
Dispositivo: CBHAND283-04
Empleado: LUISA FERNANDA GA

Validado: ID Electronico

Entrego:

ortega

Recibi:

Nombre:

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOB-M-012A
CONTRATO 2241 DE 2025

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Ortega
FECHA : 14/06/2025

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 0947 del 07 de Marzo del 2024 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Supervisor del contrato 2241 del 21 de Mayo de 2025 cuyo objeto es ***¨CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA¨*** y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Ortega la cantidad de 117,548 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 14 de Junio del 2025.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Supervisor Contrato 2241 de 2025.
MARV 5

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta

No. REFK 108782

Distribucion y Transporte de C

NIT: 811.009.788-8

distracomeltriunfo

@distracom.com.co

Cod. Act. 4731

Somos Grandes Contribuyentes

Segun Res. No 000200

de 27 DIC 2024

DISTRACOM EL TRIUNFO

CRA 1 #18 A 01

Ibague

TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/06/14
Vencimiento:	2025/07/14
Naturaleza:	Credito

Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	ORTEGA
Kilometros:	0
Cedula:	800113672

Hora Ini:	12:10:44
Hora Fin:	12:17:46

Combustible:	DIESEL
Volumen:	44.2830
Precio:	$10570
Total:	$468071

Panel:	MFC500
Lad/Man/Pus:	1/1/3
Dispositivo:	CBHAND283-04
Empleado:	LUISA FERNANDA GA

Ortega

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

Remision de Venta

No. REFK 108783

Distribucion y Transporte de C

NIT: 811.009.788-8

distracomeltriunfo

@distracom.com.co

Cod. Act. 4731

Somos Grandes Contribuyentes

Segun Res. No 000200

de 27 DIC 2024

DISTRACOM EL TRIUNFO

CRA 1 #18 A 01

Ibague

TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/06/14
Vencimiento:	2025/07/14
Naturaleza:	Credito

Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	ORTEGA
Kilometros:	0
Cedula:	800113672

Hora Ini:	12:08:21
Hora Fin:	12:18:02

Combustible:	DIESEL
Volumen:	73.2650
Precio:	$10570
Total:	$774411

Panel:	MFC501
Lad/Man/Pus:	1/1/5
Dispositivo:	CBHAND283-04
Empleado:	LUISA FERNANDA GA

Ortega

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOB-M-012A
CONTRATO 2241 DE 2025

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Ortega
FECHA : 20/06/2025

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 0947 del 07 de Marzo del 2024 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Supervisor del contrato 2241 del 21 de Mayo de 2025 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Ortega la cantidad de 224,090 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 20 de Junio del 2025.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Supervisor Contrato 2241 de 2025.
MARV 5

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 109139
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res No [illegible]200
de 27 DIC 20[illegible]
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL 3137434826

Fecha remision:	2025/06/20
Vencimiento:	2025/07/20
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	OTI696
Kilometros:	182525
Cedula:	23443992
Hora Ini:	11:31:17
Hora Fin:	11:37:45
Combustible:	DIESEL
Volumen:	27.2270
Precio:	$10610
Total:	$288878
Panel:	MFC499
Lad/Man/Pos	1/1/1
Dispositivo:	CBHAND283-04
Empleado:	BRYAN ALEXANDER M

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:
David Ospina
93.413.992

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 109150
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/06/20
Vencimiento:	2025/07/20
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	ORTEGA
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora Ini:	13:08:19
Hora Fin:	13:19:12
Combustible:	DIESEL
Volumen:	93.3080
Precio:	$10610
Total:	$990000
Panel:	MFC499
Lad/Man/Pos:	1/1/1
Dispositivo:	CBHAND283-04
Empleado:	BRYAN ALEXANDER M

Validado: ID Electronico

Entrego:
Ortega

Recibi:

Nombre:

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 109153
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	20[illegible]/06/20
Vencimiento:	2025/07/20
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	ORTEGA
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora Ini:	13:19:45
Hora Fin:	13:27:11
Combustible:	DIESEL
Volumen:	57.1320
Precio:	$10610
Total:	$606171
Panel:	MFC499
Lad/Man/Pos:	1/1/1
Dispositivo:	CBHAND283-01
Empleado:	BRYAN ALEXANDER M

Validado: ID Electronico

Entrego:
Ortega

Recibi:

Nombre:

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 109160
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/06/20
Vencimiento:	2025/07/20
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	ORTEGA
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora Ini:	13:44:47
Hora Fin:	13:49:57
Combustible:	DIESEL
Volumen:	46.4230
Precio:	$10610
Total:	$492548
Panel:	MFC499
Lad/Man/Pos:	1/1/1
Dispositivo:	CBHAND283-01
Empleado:	BRYAN ALEXANDER M

Validado: ID Electronico

Entrego:
Ortega

Recibi:

Nombre:

'ERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOB-M-012A
CONTRATO 2241 DE 2025

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Ortega
FECHA : 28/06/2025

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 0947 del 07 de Marzo del 2024 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Supervisor del contrato 2241 del 21 de Mayo de 2025 cuyo objeto es ***¨CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA¨*** y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Ortega la cantidad de 187,596 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 28 de Junio del 2025.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Supervisor Contrato 2241 de 2025.
MARV 5

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta
No. REFK 109618
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision: 2025/06/28
Vencimiento: 2025/07/28
Naturaleza: Credito

Cliente: GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 125653
Nit: 800113672
Direccion: CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: IBAGUE
Control: Ibague
Kilometros: 0

Hora Ini: 09:25:38
Hora Fin: 09:36:51

Combustible: DIESEL
Volumen: 71.4450
Precio: $10610
Total: $758031

Panel: MFC500
Lad/Man/Pos: 1/1/3
Dispositivo: CBHAND283-03
Empleado: LUISA FERNANDA GA

Validado ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta
No. REFK 109619
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision: 2025/06/28
Vencimiento: 2025/07/28
Naturaleza: Credito

Cliente: GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 125653
Nit: 800113672
Direccion: CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: IBAGUE
Control: Ibague
Kilometros: 0
Cedula: 800113672

Hora Ini: 09:30:38
Hora Fin: 09:37:04

Combustible: DIESEL
Volumen: 52.5220
Precio: $10610
Total: $557258

Panel: MFC501
Lad/Man/Pos: 1/1/5
Dispositivo: CBHAND283-04
Empleado: DEVIA BUSTOS LEON

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta
No. REFK 109620
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision: 2025/06/28
Vencimiento: 2025/07/28
Naturaleza: Credito

Cliente: GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 125653
Nit: 800113672
Direccion: CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: ORTEGA
Kilometros: 0
Cedula: 800113672

Hora Ini: 09:39:11
Hora Fin: 09:44:43

Combustible: DIESEL
Volumen: 23.6290
Precio: $10610
Total: $250704

Panel: MFC501
Lad/Man/Pos: 1/1/5
Dispositivo: CBHAND283-04
Empleado: DEVIA BUSTOS LEON

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta
No. REFK 109614
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision: 2025/06/28
Vencimiento: 2025/07/28
Naturaleza: Credito

Cliente: GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 125653
Nit: 800113672
Direccion: CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: 132449
Kilometros: 93363796
Cedula:

Hora Ini: 09:14:00
Hora Fin: 09:22:55

Combustible: DIESEL
Volumen: 48.0000
Precio: $10610
Total: $509280

Panel: MFC500
Lad/Man/Pos: 1/1/3
Dispositivo: CBHAND283-03
Empleado: LUISA FERNANDA GA

Validado ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:
