
5. INFORME ACTA DE COBRO N°02

ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA, VOLQUETAS Y VEHÍCULOS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA RED VIAL RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER

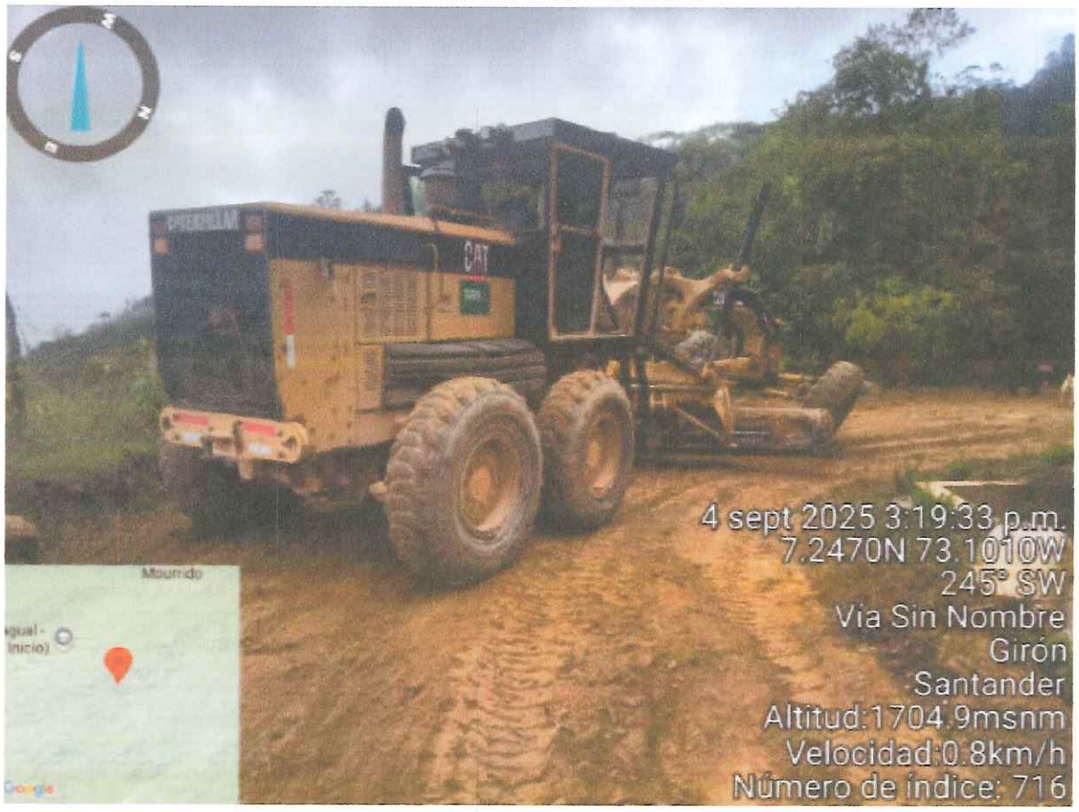

INFORME PARCIAL N°2
17 DE AGOSTO AL 18 DE OCTUBRE DE 2025

CONTRATISTA: HCL SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS

CONTRATO N°114 – 16/06/2025

INTRODUCCIÓN

El proyecto Alquiler de maquinaria amarilla y vehículos para el mantenimiento periódico de la red vial rural del municipio de Bucaramanga Santander El objetivo principal del proyecto, consiste en realizar la rehabilitación de los corregimientos 1 ,2 y 3, los cuales hacen parte de las diferentes veredas que conforman el municipio de Bucaramanga. Los cuales se harán mediante una programación previamente establecida por la Alcaldía Municipal de Bucaramanga, garantizando así el buen estado de las vías, asegurando el acceso y distribución de los diferentes productos del campo. También se atenderá todas las emergencias viales que se puedan presentar durante la ejecución del contrato.

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.:				114 – 16/06/2025			
OBJETO:				"ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PARA EL MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA RED VIAL RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER"			
VALOR INICIAL:				$2.818.077.627,00			
VALOR ADICIONAL:				N/A			
PLAZO INICIAL:				HASTA 30 DE DICIEMBRE DE 2025 O HASTA AGOTAR EL MONTO			
PLAZO ADICIONAL:				N/A			
CONTRATISTA:				HCL SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS R.L. EDGAR CUADROS LAGUADO			
SUPERVISOR:				CARLOS JAVIER MENDEZ SUAREZ			
ORDENADOR DEL GASTO				Ing. MARÍA DEL ROSARIO TORRES VARGAS			
ANTICIPO (%)				N/A			
FECHA DE INICIACION:				24/06/2025			
ACTA DE SUSPENSION	0	0					
ACTA DE REINICIACION	0	0					
FECHA DE TERMINACION:				30/12//2025			
MUNICIPIO:				Bucaramanga, Santander			
OFICINA GESTORA:				Secretaria de Infraestructura			

2. RELACION DE ACTAS DEL CONTRATISTA

ACTA	FECHA	OBSERVACIONES
ACTA DE INCIO	24-06-2025	NA
ACTA DE COBRO N°1	19-09-2025	NA

3. CAMBIOS TECNICOS Y/O MODIFICACIONES DEL CONTRAO Y/O PROYECTO

Para el periodo del presente informe no se presentaron modificaciones en el contrato.

4. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA

a. ACTIVIDADES DE ALQUILER Y OPERACIÓN DE MAQUINARIA

Se ejecuta las labores programadas con el banco de maquinaria conformado de la siguiente manera:

FRENTE DE TRABAJO CORREGIMIENTO UNO (1)

Durante el periodo del 17 de agosto al 18 de octubre se utilizó la siguiente maquinaria y vehículos en el corregimiento N°01:

Motoniveladora - potencia 140kw
Retroexcavadora cargadora de llantas 420-potencia 70kw
Vibro compactador autopropulsado de rodillo sencillo 6,6 tn
minicargador 242 potencia 55,4kw-con martillo hidráulico compatible
Retroexcavadora 320-potencia 117kw
volqueta de 6m3
camioneta pick up4x4 doble cabina

FRENTE DE TRABAJO CORREGIMIENTO DOS (2)

Durante el periodo del 17 de agosto al 18 de octubre se utilizó la siguiente maquinaria y vehículos en el corregimiento N°02:

Motoniveladora - potencia 140kw
Retroexcavadora cargadora de llantas 420-potencia 70kw
Vibro compactador autopropulsado de rodillo sencillo 6,6 tn
Retroexcavadora 320-potencia 117kw
volqueta de 6m3
camioneta pick up4x4 doble cabina

FRENTE DE TRABAJO CORREGIMIENTO TRES (03)

Durante el periodo del 17 de agosto al 18 de Octubre se utilizó la siguiente maquinaria y vehículos en el corregimiento N°03:

Retroexcavadora cargadora de llantas 420-potencia 70kw
Vibro compactador autopropulsado de rodillo sencillo 6,6 tn
minicargador 242 potencia 55,4kw-con martillo hidráulico compatible
Retroexcavadora 320-potencia 117kw
volqueta de 6m3
camioneta pick up4x4 doble cabina

RELACION DE PERSONAL UTILIZADO EN EL PERIODO

NOMBRE	CEDULA	CARGO
JHON EDWAR CHAPARRO ORTIZ	1.095.925.282	Operador
ALDEMAR HERRERA ALVAREZ	12.457.115	Operador
PABLO HELI SALAZAR CORTES	91.477.338	Operador
NESTOR FABIAN PINZON RIVERA	1.098.687.774	Operador
JEAN CALOS PEREZ	1.005.157.138	Operador
HERNANDO GUARIN	13.847.409	Operador
JOSE ANGEL RUEDA RUEDA	13.742.037	Operador

JOSE MANUEL DIAZ	1.095.912.321	Operador
EDUIN MIGUEL COLMENARES HERNANDEZ	1.099.546.664	Operador
RICARDO CADENA RAMIREZ	91.208.157	Operador
JHON FREDY CARMARGO JIMENEZ	1.098.634.809	Operador
CARLOS RODRIGUEZ	91.346.215	Operador
OMAR LAGUADO OSMA	91.003.050	Operador
JEAN CARLOS GARCIA GOMEZ	1.098.737.465	Operador
BLAS ANTONIO SALINA TAPIAS	1.051.358.683	Operador
CAMPOS ELIAS SOTO MORENO	5.692.109	Conductor
JORGE ELIECER GARCIA HERNANDEZ	91.344.155	Conductor
ORLANDO JAIMES BASTO	91.288.107	Conductor
NELSON MUÑOZ RODRIGUEZ	91.441.102	Conductor
JORGE NARVAEZ	1.098.645.507	Operador
PEDRO AYALA RUEDA	91.506.651	Conductor
EUDES MARTINEZ GOMEZ	91.260.175	Operador
VICTOR GOMEZ	1.095.926.367	Conductor
ANTONIO QUINTERO	13.716.955	Conductor
JUAN DE JESUS SANTOS	91.224.885	Conductor
EDWUIN REYNALDO CHAPARRO	1.0958.113.16	Conductor
UBALDO LUNA	91.042.539	Operador
OSCAR CUADROS	91.518.246	Inspector
EDGAR CUADROS LAGUADO	91.487.138	Contratista

EJECUCION FINANCIERA ALQUILER Y OPERACION:

Durante el presente periodo, se realizó la siguiente ejecución de horas de alquiler y operación de maquinaria, las cuales se relacionan en los siguientes cuadros por frente y presupuesto del contrato con las cantidades ejecutadas.

EJECUCION FINANCIERA CORREGIMIENTO 1

CONDICIONES GENEREALES						CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA N°_02 (PERIODO: DEL 17/08/2025 AL 18/10/2025)	
						CORREGIMIENTO 1	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL
A	ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA Y VEHICULOS						
1	Motoniveladora - potencia 140kw	Tarifa-Hora	1	$ 269.087,00	$ 269.087,00	484,10	$ 130.265.016,70
2	Retroexcavadora cargadora de llantas 420-potencia 70kw	Tarifa-Hora	1	$ 204.788,00	$ 204.788,00	515,20	$ 105.506.777,60
3	Vibro compactador autopropulsado de rodillo sencillo 6,6 tn	Tarifa-Hora	1	$ 204.045,00	$ 204.045,00	425,90	$ 86.902.765,50
4	Vibro compactador autropulsado de rodillo de 10 t	Tarifa-Hora	1	$ 215.938,00	$ 215.938,00		$ -
5	Vibrocpmactador autropulsado de rodillo de3tn	Tarifa-Hora	1	$ 133.428,00	$ 133.428,00		$ -
6	minicargador 242 potencia 55,4kw-con martillo hidráulico compatible	Tarifa-Hora	1	133.632,00	$ 133.632,00	64,10	$ 8.565.811,20
7	Retroexcavadora 320-potencia 117kw	Tarifa-Hora	1	$ 276.892,00	$ 276.892,00		$ -
8	volqueta de 6m3	Dia	1	936.000,00	$ 936.000,00	53,00	$ 49.608.000,00
9	camioneta pick up4x4 doble cabina	Dia	1	$ 357.172,00	$ 357.172,00	4,00	$ 1.428.688,00
10	cama baja transporte de maquinaria amarilla-capacidad mínima de 25 ton	Dia	1	$ 2.445.567,00	$ 2.445.567,00		$ -
11	Planchón transporte maquinaria amarilla-capacidad mínima 12ton	Dia	1	$ 1.776.567,00	$ 1.776.567,00		$ -
TOTAL, COSTO DIRECTO					**$ 6.953.116,00**		**$ 382.277.059,00**
IVA 19%					$ 1.321.092,04		$ 72.632.641,21
VALOR TOTAL CONTRATO					**$ 8.274.208,04**		**$ 454.909.700,21**

EJECUCION FINANCIERA CORREGIMIENTO 2

CONDICIONES GENERALES						CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA N°_02 (PERIODO: DEL 17/08/2025 AL 18/10/2025)	
						CORREGIMIENTO 2	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL
A	ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA Y VEHICULOS						
1	Motoniveladora - potencia 140kw	Tarifa-Hora	1	$ 269.087,00	$ 269.087,00	296,40	$ 79.757.386,80
2	Retroexcavadora cargadora de llantas 420-potencia 70kw	Tarifa-Hora	1	$ 204.788,00	$ 204.788,00	278,70	$ 57.074.415,60
3	Vibro compactador autopropulsado de rodillo sencillo 6,6 tn	Tarifa-Hora	1	$ 204.045,00	$ 204.045,00	301,50	$ 61.519.567,50
4	Vibro compactador autropulsado de rodillo de 10 t	Tarifa-Hora	1	$ 215.938,00	$ 215.938,00		$ -
5	Vibrocpmactador autropulsado de rodillo de3tn	Tarifa-Hora	1	$ 133.428,00	$ 133.428,00		$ -
6	minicargador 242 potencia 55,4kw-con martillo hidráulico compatible	Tarifa-Hora	1	133.632,00	$ 133.632,00		$ -
7	Retroexcavadora 320-potencia 117kw	Tarifa-Hora	1	$ 276.892,00	$ 276.892,00		$ -
8	volqueta de 6m3	Dia	1	936.000,00	$ 936.000,00	28,00	$ 26.208.000,00
9	camioneta pick u4xp doble cabina	Dia	1	$ 357.172,00	$ 357.172,00	1,00	$ 357.172,00
10	cama baja transporte de maquinaria amarilla-capacidad mínima de 25 ton	Dia	1	$ 2.445.567,00	$ 2.445.567,00		$ -
11	Planchón transporte maquinaria amarilla-capacidad mínima 12ton	Dia	1	$ 1.776.567,00	$ 1.776.567,00		$ -
TOTAL, COSTO DIRECTO					**$ 6.953.116,00**		**$ 224.916.541,90**
IVA 19%					$ 1.321.092,04		$ 42.734.142,96
VALOR TOTAL CONTRATO					**$ 8.274.208,04**		**$ 267.650.684,86**

EJECUCION FINANCIERA CORREGIMIENTO 3

CONDICIONES GENERALES						CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA N°_02 (PERIODO: DEL 17/08/2025 AL 18/10/2025)	
						CORREGIMIENTO 3	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL
A	**ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA Y VEHICULOS**						
1	Motoniveladora - potencia 140kw	Tarifa-Hora	1	$ 269.087,00	$ 269.087,00	162,30	$ 43.672.820,10
2	Retroexcavadora cargadora de llantas 420-potencia 70kw	Tarifa-Hora	1	$ 204.788,00	$ 204.788,00	234,10	$ 47.940.870,80
3	Vibro compactador autopropulsado de rodillo sencillo 6,6 tn	Tarifa-Hora	1	$ 204.045,00	$ 204.045,00	198,10	$ 40.421.314,50
4	Vibro compactador autropulsado de rodillo de 10 t	Tarifa-Hora	1	$ 215.938,00	$ 215.938,00		$ -
5	Vibrocpmactador autropulsado de rodillo de3tn	Tarifa-Hora	1	$ 133.428,00	$ 133.428,00		$ -
6	minicargador 242 potencia 55,4kw-con martillo hidráulico compatible	Tarifa-Hora	1	133.632,00	$ 133.632,00	271,50	$ 36.281.088,00
7	Retroexcavadora 320-potencia 117kw	Tarifa-Hora	1	$ 276.892,00	$ 276.892,00	8,40	$ 2.325.892,80
8	volqueta de 6m3	Dia	1	936.000,00	$ 936.000,00	68,00	$ 63.648.000,00
9	camioneta pick up4x4 doble cabina	Dia	1	$ 357.172,00	$ 357.172,00	3,00	$ 1.071.516,00
10	cama baja transporte de maquinaria amarilla-capacidad mínima de 25 ton	Dia	1	$ 2.445.567,00	$ 2.445.567,00		$ -
11	Planchón transporte maquinaria amarilla-capacidad mínima 12ton	Dia	1	$ 1.776.567,00	$ 1.776.567,00		$ -
TOTAL, COSTO DIRECTO					**$ 6.953.116,00**		**$ 235.361.502,20**
IVA 19%					$ 1.321.092,04		$ 44.718.685,42
VALOR TOTAL CONTRATO					**$ 8.274.208,04**		**$ 280.080.187,62**

EJECUCION FINANCIERA CORREGIMIENTO 1, 2 Y 3

CONDICIONES GENERALES						CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA N°_02 (PERIODO: DEL 17/08/2025 AL 18/10/2025)	
						CANT ACUMULADAS CORREGIMIENTO 1,2 Y 3	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL
A	**ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA Y VEHICULOS**						
1	Motoniveladora - potencia 140kw	Tarifa-Hora	1	$ 269.087,00	$ 269.087,00	942,80	$ 253.695.223,60
2	Retroexcavadora cargadora de llantas 420-potencia 70kw	Tarifa-Hora	1	$ 204.788,00	$ 204.788,00	1028,00	$ 210.522.064,00
3	Vibro compactador autopropulsado de rodillo sencillo 6,6 tn	Tarifa-Hora	1	$ 204.045,00	$ 204.045,00	925,50	$ 188.843.647,50
4	Vibro compactador autropulsado de rodillo de 10 t	Tarifa-Hora	1	$ 215.938,00	$ 215.938,00	0,00	$ -
5	Vibrocpmactador autropulsado de rodillo de3tn	Tarifa-Hora	1	$ 133.428,00	$ 133.428,00	0,00	$ -
6	minicargador 242 potencia 55,4kw-con martillo hidráulico compatible	Tarifa-Hora	1	133.632,00	$ 133.632,00	335,60	$ 44.846.899,20
7	Retroexcavadora 320-potencia 117kw	Tarifa-Hora	1	$ 276.892,00	$ 276.892,00	8,40	$ 2.325.892,80
8	volqueta de 6m3	Dia	1	936.000,00	$ 936.000,00	149,00	$ 139.464.000,00
9	camioneta pick up4x4 doble cabina	Dia	1	$ 357.172,00	$ 357.172,00	8,00	$ 2.857.376,00
10	cama baja transporte de maquinaria amarilla-capacidad mínima de 25 ton	Dia	1	$ 2.445.567,00	$ 2.445.567,00	0,00	$ -
11	Planchón transporte maquinaria amarilla-capacidad mínima 12ton	Dia	1	$ 1.776.567,00	$ 1.776.567,00	0,00	$ -
TOTAL, COSTO DIRECTO					**$ 6.953.116,00**		**$ 842.555.103,10**
IVA 19%					$ 1.321.092,04		$ 160.085.469,59
VALOR TOTAL CONTRATO					**$ 8.274.208,04**		**$1.002.640.572,69**

SEGUIMIENTO DE GPS

Durante el presente periodo se realizó el debido seguimiento del GPS de cada uno de los equipos utilizados, con el fin de poder contar en tiempo real de las actividades realizadas, como se muestra a continuación:

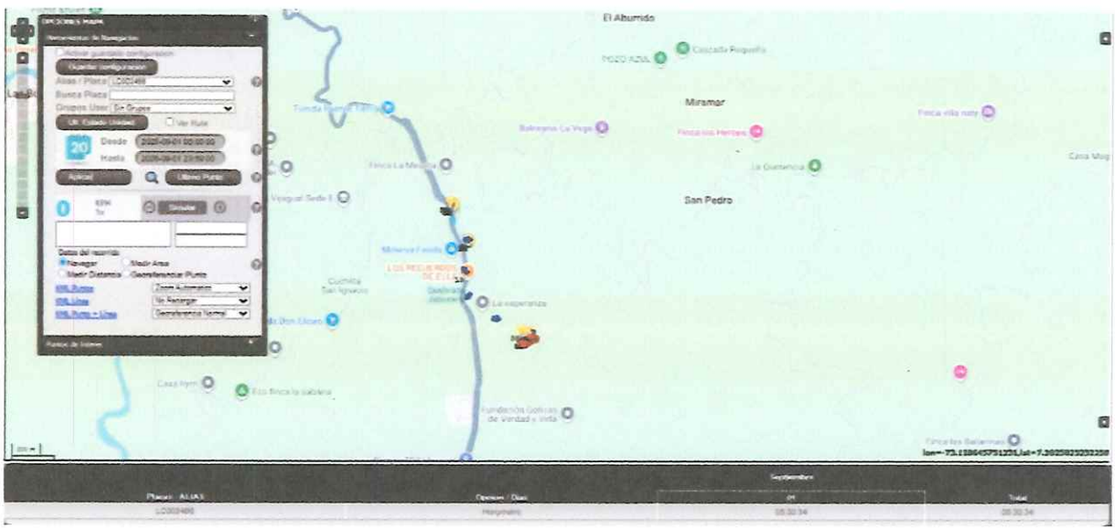


Ilustración 1 SEGUIMIENTO GPS 310 L-EL ABURRIDO

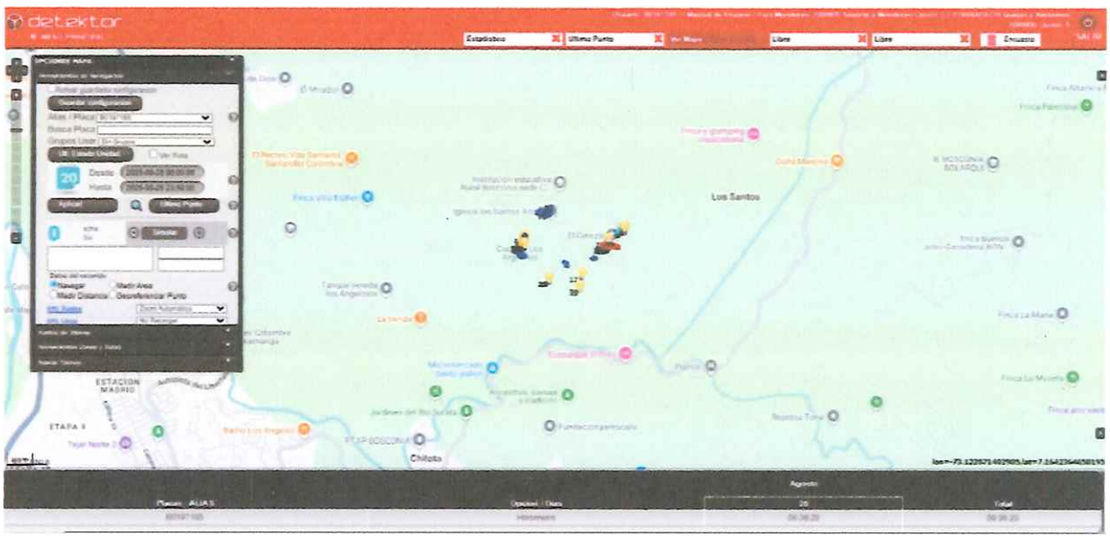


Ilustración 2SEGUIMIENTO 310SJ-LOS SANTOS ALTOS



Ilustración 3-SEGUIMIENTO GPS MOTONIVELADORA LOS SANTOS

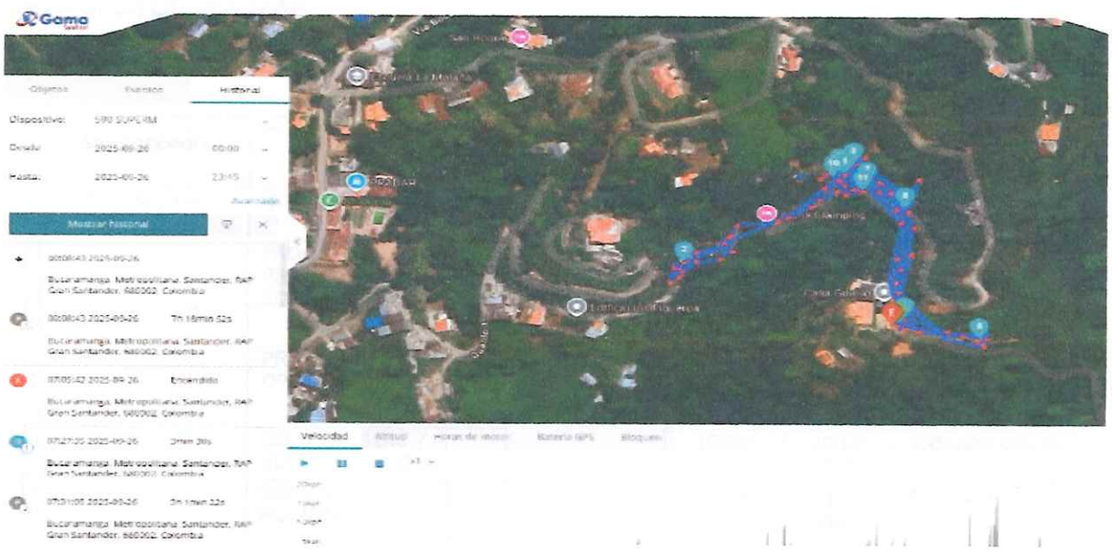


Ilustración 4 SEGUIMIENTO GPS 420 D-PEDREGAL

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

- De acuerdo con los trabajos ejecutados de las actividades ya nombradas, se evidencia que se ha llevado a cabo la ejecución de actividades siguiendo el cronograma y a los tiempos presentados por el contratista de obra.

- De acuerdo con el seguimiento llevado por parte de la SUPERVISION de obra a la ejecución de las diferentes actividades, se evidencia que el contratista ha avanzado físicamente en un 66,67% respecto al avance en tiempo a la fecha representa un 60.96%, encontrándose en un avance positivo con respecto a la programación del 5.71%.

- El contratista de obra ha avanzado en las actividades designadas por el supervisor con el fin de dar optimo cumplimiento a las solicitudes presentadas.

- Durante el presente periodo se llevó a cabo la elaboración de informes diarios, semanales, comités y demás documentos en los cuales se encuentra detalla mente lo ejecutado por cada uno de los ítems del contrato.

- Se le ha acatado las solicitudes de tener presente la correcta afiliación del personal a seguridad social y usar correctamente los elementos de protección personal.

El contratista mediante este informe pone en total conocimiento a la entidad contratante.

Cordialmente,

EDGAR CUADROS LAGUADO
HCL SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS
NIT 900.423.249
