CONSORCIO VIAS NACIONALES
NIT 901838197-8
INFORME MES DE SEPTIEMBRE DE 2025
ADMINISTRACION VIAL GRUPO 04
RUTA NACIONAL 6604 EL AMARILLON – SARAVENA

INFORME MENSUAL

PERIODO: 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

CONTRATO No. 2017 DE 2024

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓNTERRITORIAL NORTE DE SANTANDER GRUPO AMV 4 LOTE 2

CONSORCIO VÍAS NACIONALES

CUBARA – BOYACA

SEPTIEMBRE 2025

Tabla de Contenido

1. INTRODUCCIÓN 4

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 5

2.1 Localización 5

2.1.1 Ruta 6604 Sector LA LEJÍA - SARAVENA, PR 31+0000 (EL AMARILLÓN) – PR 61+0000 (ALTO SANTA INÉS). LOTE 6. 5

2.1.1.1 Criterio Técnico 5

2.1.2 Ruta 6604 Sector PR 61+0000 (ALTO SANTA INÉS) – PR 91+0000 (ALTO LA LAGUNA). LOTE 4 6

2.1.2.1 Criterio Técnico 6

2.1.3 Ruta 6604 Sector PR 91+0000 (ALTO LA LAGUNA) – PR 121+0000 (PUENTE COBARIA) LOTE 5 6

2.1.3.1 Criterio Técnico 6

2.1.4 Ruta 6604 Sector PR121+0000 (PUENTE COBARIA) - PR150+0000 (SARAVENA). LOTE 7 6

2.1.4.1 Criterio Técnico 7

3. NECESIDADES DE LA VÍA 8

4. PUNTOS CRITICOS DE LA VIA 9

5. NECESIDADES DE LOS PUENTES 12

6. ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 04 14

7. COOPERATIVAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER SECTORES 6604 LA LEJÍA – SARAVENA 15

7.1. COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y SERVICIOS MULTIPLES PAMPLONESES EN ACCION - COOTRASERMULPAC 15

7.2 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE LA MEZA – COOPTRAMEZA 16

7.3 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y SERVICIOS MULTIPLES DE GIBRALTAR – COOTRASERMULGIB 17

7.4. COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CUBARA BOYACA – COOTRASCUB 18

8.0 ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN VIAL 19

9.0 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 23

9.1 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y SERVICIOS MULTIPLES PAMPLONESES EN ACCION – COOTRASERMULPAC 23

9.2 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE LA MEZA – COOPTRAMEZA 25

9.3 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y SERVICIOS MULTIPLES DE GIBRALTAR – COOTRASERMULGIB 27

9.4. COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CUBARA BOYACA – COOTRASCUB 29

10. APOYO A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS 31

10. CAPACITACIONES A COOPERATIVAS 32

11. EMERGENCIAS 33

12. REGISTRO FOTOGRÁFICO ADMINISTRACIÓN VIAL 34

13. REGISTRO FOTOGRÁFICO COOPERATIVAS 35

1. INTRODUCCIÓN

El Instituto Nacional de Vías, mediante concurso de méritos No. CMA-DEO-SGI139-2023, del cual se deriva el Contrato No. 2017 de 2024 y cuyo objeto es: "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER GRUPO AMV 2 LOTE 2. Con orden de inicio del cuatro (04) de julio 2024 y fecha de terminación de veintinueve meses y no podrá exceder el 31 de Julio de 2026; contrato que se regirá por las estipulaciones de la Leyes 80 de 1993, 1150 del 2007, 1474 del 2011, 1882 del 2018, Decreto Ley No. 019 del 2012 y el Decreto No. 1082 del 2015, el Código Civil y de Comercio y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la materia.

Mediante proceso licitatorio cuyo objeto es MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER se establece para las vía 6604, sector El Amarillón PR 31+0000 al PR 61+0000 (Alto de Santa Inés), PR 61+0000 (Alto de Santa Inés) al PR 91+0000 (Alto La Laguna), PR 91+0000 (Alto La Laguna) al PR 121+0000 (Puente Cobaria), PR 121+0000 (Puente Cobaria) al PR 150+0000 (Saravena); por lo cual se suscriben los contratos N.º 3858 DE 2024, 3817 DE 2024, 3838 DE 2024, y 3851 DE 2024 respectivamente.

En el presente Informe, se describen las actividades ejecutadas durante el período comprendido entre el 1 al 30 de septiembre de 2025, evidenciando el cumplimiento de los compromisos contractuales de la Administración Vial Grupo 4, establecidas mediante el Contrato 2017 DE 2024.

Asimismo, se evidencia el cumplimiento de las actividades correspondientes a las Cooperativas de Mantenimiento rutinario que se encuentran sobre el corredor vial 6604 La Lejía – Saravena PR 31+0000 al PR 150+0000, y que se encuentran a cargo de esta Administración Vial.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 Localización

El proyecto se desarrolla en los Departamentos de Norte de Santander, Boyacá y Arauca, de la siguiente manera:



2.1.1 Ruta 6604 Sector LA LEJÍA - SARAVENA, PR 31+0000 (EL AMARILLÓN) – PR 61+0000 (ALTO SANTA INÉS). LOTE 6.

Este tramo de la vía inicia desde el sector El Amarillón corregimiento de San Bernardo de Bata desde el PR 31+0000 hasta el Alto de Santa Inés PR 61+0000 jurisdicción del Municipio de Toledo, Norte de Santander.

2.1.1.1 Criterio Técnico

Este tramo es de una calzada bidireccional compuesta de 29,43 km en afirmado y 0,34 en pavimento rígido, inicia en el PR 31+0000, sector de El Amarillón jurisdicción del municipio de Toledo hasta el PR 61+0000 Alto de Santa Inés, el estado de la vía es regular y malo, presenta varios puntos críticos. Presenta ondulaciones, baches, cabeza dura y perdidas de agregados finos, ahuellamiento, surcos transversales producidos por las aguas lluvias lo que dificulta el tránsito vehicular.

2.1.2 Ruta 6604 Sector PR 61+0000 (ALTO SANTA INÉS) – PR 91+0000 (ALTO LA LAGUNA). LOTE 4

Este tramo de la vía inicia desde el sector Alto de Santa Inés PR 61+0000 hasta el Alto La Laguna PR 91+0000 jurisdicción del Municipio de Toledo, Norte de Santander.

2.1.2.1 Criterio Técnico

Este tramo es de una calzada bidireccional compuesta en su totalidad 30,66 km en afirmado, inicia en el PR 61+0000, sector Alto de Santa Inés hasta el PR 91+0000 Alto La Laguna, el estado de la vía es regular y malo, presenta varios puntos críticos. Presenta ondulaciones, baches, cabeza dura y perdidas de agregados finos, ahuellamiento, surcos transversales producidos por las aguas lluvias lo que dificulta el tránsito vehicular.

2.1.3 Ruta 6604 Sector PR 91+0000 (ALTO LA LAGUNA) – PR 121+0000 (PUENTE COBARIA) LOTE 5

Este tramo de la vía inicia desde el sector Alto La Laguna PR 91+0000 hasta el Puente Cobaría PR 121+0000, jurisdicción del Municipio de Toledo, Norte de Santander.

2.1.3.1 Criterio Técnico

Este tramo es de una calzada bidireccional compuesta de 25,07 km en afirmado y 5,02 km en pavimento flexible, inicia en el PR 91+0000, Alto La Laguna hasta el PR 121+0000 Puente Cobaría, el estado de la vía es bueno, regular y malo, presenta varios puntos críticos. Presenta ondulaciones, baches, cabeza dura y perdidas de agregados finos, ahuellamiento, surcos transversales producidos por las aguas lluvias lo que dificulta el tránsito vehicular.

2.1.4 Ruta 6604 Sector PR121+0000 (PUENTE COBARIA) - PR150+0000 (SARAVENA). LOTE 7

Este tramo de la vía inicia desde el sector Puente Cobaría PR 121+0000 hasta el PR 150+0000 Saravena, jurisdicción de los municipios de Cubara, Boyacá y Saravena, Arauca.

2.1.4.1 Criterio Técnico

Este tramo es de una calzada bidireccional compuesta de 28,76 km pavimento flexible y 0,78 en afirmado, inicia en el PR 121+0000, Puente Cobaría hasta el PR 150+0000 Saravena, el estado de la vía en su gran mayoría es bueno con un tramo en estado malo.

3. NECESIDADES DE LA VÍA

- PR 31+0000 al PR 86+0000: Construcción de alcantarillas, aliviaderos y obras complementarias
- PR 31+0000 al PR 102+0000: Conformación y colocación de afirmado
- PR 37+0970 al PR 38+0070: Mejoramiento de la variante de 120 m y obras complementarias
- PR 34+0800 al PR 35+0800: Construcción de aliviaderos
- PR 85+0000 al PR 86+0000: Rectificación del cauce y protección de orillas
- PR 115+0800 al PR 139+0976: Mejoramiento y mantenimiento de tramos pavimentados y sin pavimentar
- PR 31+0000 al PR 121+0000: Retiro de derrumbes y rocas

4. PUNTOS CRITICOS DE LA VIA

- PR 32+0449 al PR 32+0456: Construcción de muro de contención L= 7m H= 3,5m
- PR 34+0915 al PR 35+0100: Construcción de variante y estabilización de deslizamiento en masa
- PR 36+0248 al PR 36+0298: Construcción de muro de contención H=5 m y L=50 m y filtros
- PR 38+0400 al PR 38+0800: Ampliación de la banca y obras complementarias
- PR 39+0550 al PR 39+0630: Ampliación de vía, construcción de muro reforzado y obras de arte en una longitud aprox. de 80 m
- PR 41+0245 al PR 41+0450: Ampliación de la banca y obras complementarias barranco blanco
- PR 41+0900 al PR 41+0955: Estabilización mediante muro en gaviones, trincheras drenantes, filtros y cunetas
- PR 44+0970 al PR 45+0030: Estabilización mediante variante, muro en gaviones, trincheras drenantes, filtros y cunetas
- PR 45+0420 al PR 45+0445: Construcción de muro reforzado l=25.00 y h=4.00 m, filtros
- PR 45+0600 al PR 45+0625: Construcción de muro reforzado l=25.00 y h=4.00 m
- PR 47+0400 al PR 47+0410: Construcción de muro reforzado l=10.00 y h=4.00 m
- PR 47+0500 al PR 47+0540: Construcción de muro reforzado l=40.00 y h=4.00 m
- PR 47+0930 al PR 47+0940: Construcción de muro reforzado l=10,0 y h=4.00 m y ampliación
- PR 51+0000 al PR 51+0010: Construcción de muro reforzado l=10.00 y h=4.00 m
- PR 53+0280 al PR 53+0300: Construcción de muro h=3,50 y l=20,00
- PR 54+0063 al PR 54+0113: Construcción de muro H=4 Y L=50,00 m y ampliación
- PR 59+0500 al PR 59+0530: Construcción de muro H=4,00 Y L=30,00 - Sector Santa Inés
- PR 61+0230 al PR 61+0240: Construcción de muro H=3,00 Y L=10,00 y aliviadero
- PR 62+0600 al PR 62+0612: Construcción de muro en concreto H=3,00 Mts Y L=12,00 M
- PR 63+0379 al PR 63+0388: Construcción de muro de H=3,00 m Y L=9,00 y alcantarilla.
- PR 64+0740 al PR 64+0953: Construcción de Box Coulvert De 3 X 2 m
- PR 66+0448 al PR 66+0468: Construcción muro L=20,0 m H=4,0 y obra de arte
- PR 67+0630 al PR 67+0670: Construcción de muro de contención H=4,00 m y L=40,00m

- PR 71+0100 al PR 71+0115: Construcción de muro de concreto H=3,50 Y L=15,00 m y alcantarilla, Sector La Virgen
- PR 73+0260 al PR 73+0275: Construcción de muro de concreto H=3,50 Y L=15,00 m, Sector La Virgen
- PR 77+0500 al PR 77+0510: Construcción de muro reforzado L=10.00 y H=4.00 m
- PR 83+0197 al PR 83+0203: Construcción muro de contención l=6 mts. h=5 mts
- PR 83+0500 al PR 83+0510: Construcción de muro de concreto H=4 m y L=10 m y gaviones
- PR 84+0136 al PR 84+0156: Construcción de muro de concreto H=5 m Y L=20 m, construcción de cabezote
- PR 84+0160 al PR 84+0200: Construcción de muros de concreto reforzado H= 5 m
- PR 84+0600 al PR 84+0637: Construcción de muro de contención L= 37 mts, H= 6mts
- PR 85+0128 al PR 85+0133: Construcción de Box Coulvert de 3 X 2 m., Sector Rio Negro
- PR 85+0900 al PR 85+0970: Construcción de muro de contención sobre Caisson H=8,00 m y L=70,00 - Sector Rio Negro
- PR 86+0242 al PR 86+0250: Construcción de Box Coulvert 1,5x1,5 Mts
- PR 86+0600 al PR 86+0650: Construcción de muro de contención sobre Caisson H=8,00 m Y L=50,00 - Sector Rio Negro
- PR 87+0700 al PR 87+0800: Construcción de muro de contención H=2,5 m Y L=15 m Filtros y cuneta canal
- PR 87+0830 al PR 87+0833: Construcción de Box Coulvert De 3 X 2 m y retiro de derrumbe
- PR 88+0060 al PR 88+0070: Construcción de muro de contención H=5 m Y L=10 m y obras complementarias
- PR 89+0250 al PR 89+0272: Construcción de muro sobre Caisson L=22 Mts H= 10 Mts
- PR 89+0500 al PR 89+0550: Construcción de muro de contención H=3 m Y L=50 m y obras complementarias
- PR 90+0750 al PR 90+0795: Construcción de muros de concreto reforzado H= 4 m L=45 m
- PR 90+0825 al PR 90+0875: Construcción de muros de concreto reforzado H= 4 m L=50 m
- PR 92+0900 al PR 92+0925: Construcción de muro de contención H=4 m y L=25 m
- PR 92+0940 al 92+0950: Construcción de muro de contención H=3,5 m Y L=10 m. Prolongación aleta salida
- PR 93+0000 al PR 93+0010: Construcción de muro de contención H=3,5 m y L=10 m Prolongación aleta de salida

- PR 93+0075 al 93+0125: Daño en obras de contención, construcción de muro en concreto reforzado con pilotes
- PR 94+0060 al PR 94+0081: Construcción de muro de contención H= 8mts y L=21mts alcantarilla 36"
- PR 95+0999 al PR 96+0024: Construcción de muro de contención L= 25 Mts, H= 8mts
- PR 96+0060 al PR 96+0076: Construcción de muro de contención L=16 Mts, H=4,50 Mts y alcantarilla 36"
- PR 96+0175 al PR 96+0255: Construcción de muro de contención H=8 m Y L=80 m Ampliación de calzada
- PR 97+0150 al PR 97+0170: Construcción de muro de contención de pata H=8,0 m Y L=20 m
- PR 98+0026 al PR 98+0072: Construcción de muro de contención L=46 Mts, H=3,50 Mts
- PR 104+0850 al PR 105+0450: Construcción de variante y estabilización de deslizamiento en masa
- PR 107+0200 al PR 107+0300: Ampliación, construcción de muro sobre pilotes H=3m y L=100 m
- PR 112+0010 al PR 112+0016: Construcción de muro de contención H=2.5 Mts L= 6 Mts
- PR 113+0600 al PR 113+0763: Construcción de muro de contención sobre pilotes L=163 Mts
- PR 114+0300 al PR 114+0305: Recalce De Box Coulvert, aliviadero y prolongación de aletas de salida
- PR 114+0550 al PR 114+0585: Recuperación banca mediante muro de concreto reforzado L=35 m H=3 m
- PR 114+0890 al PR 114+0916: Muro de contención sobre Caisson H=4.0 Mts L=26.0 Mts
- PR 115+0080 al PR 115+0105: Recuperación banca mediante muro de gaviones L=25 m. H=4 m
- PR 115+0300 al PR 115+0480: Recuperación banca mediante muro de concreto reforzado L=40 m H=6 m, Sector Canoas

5. NECESIDADES DE LOS PUENTES

- **Puente Zambrano PR 34+0150 – PR 34+0223**: Laminas del tablero inestables (sueltas) y presencia de fisuras en elementos estructurales (vigas transversales).
  Es necesario realizar un reforzamiento de elementos estructurales como vigas transversales y realizar el cambio de láminas, tornillos y/o pernos.
- **Puente La Honda PR 50+0910 - 50+0927:** Afectación en elementos estructurales como vigas, exposición del acero de refuerzo, socavación de estribos, barandas en mal estado y ausencia de las mismas en la margen derecha.
  Recalce de estribos, reposición y/o mantenimiento de barandas del puente,
- **Puente Las Palmas PR 84+0874 - 84+0893:** Presenta socavación en una de las aletas y evidencia afectación en la placa.
  Requiere recalce en la aleta y reconstrucción de la placa. Estudio para determinar estado global de la estructura.
- **Puente Rio Negro PR 86+0855 – PR 86+0898:** Deterioro de la losa y de las juntas de expansión, presenta exposición del acero de refuerzo y daños en la baranda de concreto margen derecho.
  Requiere protección de estribos, reposición y/o mantenimiento de juntas de expansión, reparación de losa de concreto.
- **Puente Tamarota PR 98+0110 – PR 98+0128:** Gran fisura en aleta ALI1 y parte del estribo de entrada. Socavación del lecho del afluente cerca a los estribos.
  Requiere reconstrucción de aleta y reforzamiento de estribo. Estudio para determinar condición real de toda la estructura.
- **Puente Ucacias PR 103+0572 - 103+0589:** Presenta socavación en uno de los estribos y se evidencia exposición del acero en la parte inferior de la losa.
  Protección de estribo E2 de salida
- **Puente La China PR 104+0506 – PR 104+0542:** Presenta socavación en uno de los estribos Recalce de estribo y obras complementarias.
- **Puente Cubugón PR 108+0058 – PR 108+0137:** Presenta inestabilidad en el tablero por láminas sueltas y deterioro de las mismas.
  Requiere reposición de láminas y cambio de tornillería y/o pernos
- **Puente Cedeño PR 112+0202 – PR 112+0221:** Presenta daño en la losa perdida de sección y exposición del acero de refuerzo.
  Requiere intervención en la losa de concreto y construcción de aliviaderos en concreto
- **Puente Canoas PR 115+0620 – PR 115+0641:** Presenta socavación en uno de los estribos Requiere recalce estribo y construcción de aliviaderos en concreto reforzado

- **Puente Cobaría PR 121+0182 – PR 121+0313:** Inestabilidad del cauce.
  Requiere protección de las márgenes del rio, sand blasting y pintura metálica.
- **Puente La Balastrera PR 123+0179 – PR 123+0190:** Ausencia de barandas de protección.
  Requiere instalación de barandas de protección.
- **Puente Caño Seco PR 123+0800 – PR 123+0811:** Ausencia de barandas de protección. Requiere instalación de barandas de protección
- **Puente Royota PR 134+0400 – PR 134+0459:** Presenta afectación en épocas de lluvia debido a crecimiento del caudal del rio generando arrastre de material ocasionando desbordamiento del rio. Ausencia de barandas de protección.
  Requiere placas de acceso y encausamiento del rio.
- **Puente Bojaba 1 PR 139+0011 – PR 139+0738:** Presenta erosión en la rivera aguas arriba Construcción de la sección de salida obra definitiva
- **Puente Bojaba 2 PR 139+0976 – PR 139+1056:** Presenta erosión en la rivera aguas arriba Construcción de protección en muro en gaviones
- **Puente Caño Negro PR 139+1360 – PR 139+1400:** Puente metálico provisional instalado por parte del Ejercito Nacional.
  Requiere construcción de puente de aproximadamente 35 metros
- **Puente Caño Picho PR 143+0483 – PR 143+0496:** Ausencia de barandas de protección Requiere instalación de barandas de protección
- **Puente La Pava PR 149+0952 – PR 149+0990:** Presenta erosión.
  Requiere protección de estribos y encauzamiento de quebrada

6. ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 04

CONTRATO N°: 2017 DE 2024

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER GRUPO AMV 2 LOTE 2.

NIT: 901.838.197-8

VALOR: TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS ($3.985.036.419) MONEDA CORRIENTE. INCLUIDO IVA.

PLAZO: VEINTINUEVE (29) MESES, EN TODO CASO NO PODRÁ EXCEDER EL 31 DE JULIO DE 2026.

REPRESENTANTE LEGAL: PAULA VANESA FLOREZ SANZON

Nombre
Juan Manuel Rojas Carrillo – Ingeniero Residente
Gersón Javier Buitrago Paéz – Ingeniero Auxiliar I
Sandra Carolina Moreno Carvajal – Ingeniero Auxiliar II
Ana Xiomara Fuentes Arteaga - Inspector SISO
Mireya Silva Martínez - Auxiliar Administrativo
Franklin Erik Martínez Ortiz - Conductor I
Luis David Aponte Silva - Conductor II

7. COOPERATIVAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER SECTORES 6604 LA LEJÍA – SARAVENA

7.1. COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y SERVICIOS MULTIPLES PAMPLONESES EN ACCION - COOTRASERMULPAC

CONTRATO N°: 3858 DE 2024

OBJETO: SERVICO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER SECTORES 6604 LA LEJÍA - SARAVENA, PR 31+0000 (EL AMARILLÓN) – PR 61+0000 (ALTO SANTA INÉS). LOTE 6.

NIT: 807.007.087-1

VALOR: MIL CIENTO QUINCE MILLONES TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($1.115.032.636) MONEDA CORRIENTE. INCLUIDO IVA.

PLAZO: VEINTITRES (23) MESES, EN TODO CASO NO PODRÁ EXCEDER EL 31 DE JULIO DE 2026.

REPRESENTANTE LEGAL: Humberto Rivero Gutiérrez

Nombre
HUMBERTO RIVERO GUTIERREZ
JESUS GELVEZ CONTRERAS
JUAN ANTONIO GRANADOS SANTAFE
JOSE ARNULFO BECERRA GONZALEZ
YEISON BAUNEY DURAN BARAJAS
OSMAN RENE CONTRERAS
HUGO ALIRIO RAMON
YAMID ALBEIRO RAMIREZ RAMIREZ
ARNULFO ORTIZ CAICEDO
VICTOR MANUEL CACERES GONZALEZ
HUGO CELSO JIMENEZ CAMARGO

7.2 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE LA MEZA – COOPTRAMEZA

CONTRATO N°: 3817 DE 2024

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER SECTORES 6604 LA LEJÍA - SARAVENA, PR61+0000 (ALTO SANTA INÉS) - PR91+0000 (ALTO LA LAGUNA). LOTE 4

NIT: 807.008.112-0

VALOR: MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS ($1.144.279.227) MONEDA CORRIENTE. INCLUIDO IVA.

PLAZO: VEINTITRES (23) MESES, EN TODO CASO NO PODRÁ EXCEDER EL 31 DE JULIO DE 2026.

REPRESENTANTE LEGAL: Ángel Rubiel Rincón Jaimes

Nombre
SANTOS RINCON CACERES
CIPRIANO VARGAS RANGEL
GABRIEL JAIMES SUAREZ
MANUEL BUSTOS SANTOS
ARMANDO AGUILLON JAIMES
LUIS FRANCISCO AGUILLON RINCON
JOSE RAFAEL CADENA
JOSE ALEXANDER SANTAFE PARADA
EYBAR ARLEY AGUILLON
GENRY RAMON VALENCIA
ANGEL RUBIEL RINCON JAIMES

7.3 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y SERVICIOS MULTIPLES DE GIBRALTAR – COOTRASERMULGIB

CONTRATO N°: 3838 DE 2024

OBJETO: SERVICO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER SECTORES 6604 LA LEJÍA - SARAVENA, PR91+0000 (ALTO LA LAGUNA) - PR121+0000 (PUENTE COBARIA) LOTE 5

NIT: 807.008.392-6

VALOR: MIL CIENTO DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 1.118.745.682) IVA incluido

PLAZO: VEINTITRES (23) MESES, EN TODO CASO NO PODRÁ EXCEDER EL 31 DE JULIO DE 2026.

REPRESENTANTE LEGAL: José Ananías Santos Contreras

Nombre
JOSE ANANIAS SANTOS CONTRERAS
CARLOS JULIO ANGARITA CHIVATA
OSCAR PEREZ VALENCIA
LUIS AMANDO GONZALEZ COBARIA
JORMAN ELADIO SANTOS CONTRERAS
PEDRO RAFAEL LOPEZ VILLAMIZAR
RUBEN DARIO GONZALEZ ALBARRACIN
EDWIN ALBEIRO MENDEZ ANGARITA
FERNANDO CADENA MONTAÑEZ
CARLOS FABIAN ESTUPIÑAN ALBARRACIN
SILVINO BECERRA MONCADA

7.4. COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CUBARA BOYACA – COOTRASCUB

CONTRATO N°: 3851 DE 2024

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER SECTORES 6604 LA LEJÍA - SARAVENA, PR121+0000 (PUENTE COBARIA) - PR150+0000 (SARAVENA). LOTE 7

NIT: 826.003.402-8

VALOR: MIL NOVENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE ($ 1.091.808.300) IVA INCLUIDO

PLAZO: VEINTITRES (23) MESES, EN TODO CASO NO PODRÁ EXCEDER EL 31 DE JULIO DE 2026

REPRESENTANTE LEGAL: Elgar Gamboa Jaimes

Nombre
ELGAR GAMBOA JAIMES
ALFREDO BECERRA MONTERREY
ELKIN MICHEL SANTAMARIA CHIVATA
JESUS MARIA CASTRO BOTIA
ALVARO BARROSO DUARTE
JESUS ANTONIO CRUZ VARGAS
MISAEL REINA GODOY
REINALDO ANGARITA
RAUL GUTIERREZ RODRIGUEZ
GEISSON ALEXANDER LASSO CHAVEZ
CARMEN JANNET RIVERO MALDONADO

8.0 ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN VIAL

- **Semana: 01 al 07 de septiembre de 2025**

1. Se realiza revisión, seguimiento y control de los trabajos ejecutados por parte de las Cooperativas de Mantenimiento Rutinario, para cumplimiento de indicadores y tareas programadas.
2. Se realiza trabajo administrativo dando cumplimiento a lo requerido contractualmente:
3. Recopilación de información y elaboración del informe semanal con período del 01 de septiembre al 07 de septiembre de 2025.
4. Se realiza el envío de información relacionada con el Seguimiento Semanal de los Puntos Críticos que se encuentran sobre el Corredor vial La Lejía - Saravena.
5. Se radicó oficio AMV4-VNC2017-195-25, con asunto: Solicitud de información de accidentalidad del mes de agosto 2025; corregimiento de San Bernardo de Batá, Toledo, Norte de Santander.
6. Se radicó oficio AMV4-VNC2017-196-25, con asunto: Solicitud de información de accidentalidad del mes de agosto 2025; corregimiento de Gibraltar, Toledo, Norte de Santander.
7. Se radicó oficio AMV4-VNC2017-197-25, con asunto: Solicitud de información de accidentalidad del mes de agosto 2025; corregimiento de Samoré, Toledo, Norte de Santander.
8. Se radicó oficio AMV4-VNC2017-198-25, con asunto: Solicitud de información de accidentalidad del mes de agosto 2025; municipio de Cubará, Boyacá.
9. Se radicó oficio AMV4-VNC2017-199-25, con asunto: Solicitud de información de accidentalidad del mes de agosto 2025; municipio de Saravena, Arauca.
10. Se radicó ante la Territorial Norte de Santander Actas de Cobro No. 11, correspondiente al mes de agosto de 2025 de las Cooperativas de Trabajo Asociado del Grupo 04 La Lejía - Saravena, para su revisión y trámite.
11. Se radicó oficio AMV4-VNC2017-201-25, con asunto: Entrega de Informe de Rendimientos de las Actividades de Servicio de Mantenimiento Rutinario del mes de agosto de 2025.
12. Se radicó oficio AMV4-VNC2017-202-25, con asunto: Entrega de Informe Mensual de Avance de Trabajo Administración Vial 04 mes de agosto de 2025.

13. Se radicó ante la Territorial Norte de Santander Acta de Cobro No. 14, correspondiente al mes de agosto de 2025 de la Administración Vial No. 4, para su revisión y trámite.
14. Se participa en mesa técnica – Observaciones e inquietudes metodología iRAP - ANSV.

- **Semana: 08 al 14 de septiembre de 2025**

1. Se realiza revisión, seguimiento y control de los trabajos ejecutados por parte de las Cooperativas de Mantenimiento Rutinario, para cumplimiento de indicadores y tareas programadas.
2. Se realiza trabajo administrativo dando cumplimiento a lo requerido contractualmente:
3. Recopilación de información y elaboración del informe semanal con período del 08 de septiembre al 14 de septiembre de 2025.
4. Se realiza el envío de información relacionada con el Seguimiento Semanal de los Puntos Críticos que se encuentran sobre el Corredor vial La Lejía - Saravena.
5. Se realiza recorrido e inspección de obras de drenaje transversal que se encuentran en mal estado PR 50+0900 Vía 6604 La Lejía - Saravena
6. Se realiza recorrido e inspección de Puentes Las Palmas PR 84+0874, La Honda PR 50+0910, Caño Picho PR 143+0500 Vía 6604 La Lejía - Saravena
7. Se realiza seguimiento a obras de cimentación ejecutadas en el Puente Bojaba PR 139+0976, por parte del Contratista Vías Colombia 066 - Vía 6604 La Lejía - Saravena
8. Se realiza recorrido e inspección de Puntos Críticos que requieren intervención inmediata PR 89+0300 Vía 6604 La Lejía - Saravena
9. Se atiende solicitud de Mantenimiento de la vía de la soberanía en el PR 119+0277 frente a la Institución Educativa de Gibraltar

- **Semana: 15 al 21 de septiembre de 2025**

1. Se realiza revisión, seguimiento y control de los trabajos ejecutados por parte de las Cooperativas de Mantenimiento Rutinario, para cumplimiento de indicadores y tareas programadas.
2. Se realiza trabajo administrativo dando cumplimiento a lo requerido contractualmente:
3. Recopilación de información y elaboración del informe semanal con período del 15 de septiembre al 21 de septiembre de 2025.

4. Se realiza el envío de información relacionada con el Seguimiento Semanal de los Puntos Críticos que se encuentran sobre el Corredor vial La Lejía - Saravena.
5. Se realiza seguimiento de Puntos Críticos que requieren intervención inmediata PR 89+0300 Vía 6604 La Lejía - Saravena
6. Se radica oficio AMV4-VNC2017-204-25, con asunto: PUNTO CRÍTICO DE ATENCIÓN INMEDIATA PR 89+0300 RUTA NACIONAL 6604 EL AMARILLON PR 31+0000 – SARAVENA PR 150+0000 VÍA LA LEJÍA – SARAVENA

- **Semana: 22 al 28 de septiembre de 2025**

1. Se realiza revisión, seguimiento y control de los trabajos ejecutados por parte de las Cooperativas de Mantenimiento Rutinario, para cumplimiento de indicadores y tareas programadas.
2. Se realiza trabajo administrativo dando cumplimiento a lo requerido contractualmente:
3. Recopilación de información y elaboración del informe semanal con período del 22 de septiembre al 28 de septiembre de 2025.
4. Se realiza el envío de información relacionada con el Seguimiento Semanal de los Puntos Críticos que se encuentran sobre el Corredor vial La Lejía - Saravena.
5. Se realiza seguimiento de Puntos Críticos 114+0800 que requieren intervención sobre la vía 6604 La Lejía – Saravena
6. Se radica oficio AMV4-VNC2017-206-25, con asunto: Programación de capacitación al personal de la microempresa de servicio de mantenimiento vial mes de septiembre
7. Se realiza recorrido e inspección a Puente Cubugón que presentan afectaciones en las láminas PR 108+0058 - Vía 6604 La Lejía – Saravena
8. Se realiza solicitud de aprobación de insumos para el PR 34+0130, 119+0277 vía 6604 La Lejía – Saravena
9. Se envía ficha actualizada PMO mes de septiembre de 2025 correspondiente a los Contratos de Mantenimiento Rutinario y Administración Vial 04.
10. Se radica oficio AMV4-VNC2017-208-25, e Informe de Accidentalidad correspondiente al mes de agosto de 2025
11. Se realiza capacitación a las Cooperativas de Mantenimiento Rutinario de la Vía 6604 La Lejía - Saravena PR 31+0000 al PR 150+0000

CONSORCIO VIAS NACIONALES
NIT 901838197-8
INFORME MES DE SEPTIEMBRE DE 2025
ADMINISTRACION VIAL GRUPO 04
RUTA NACIONAL 6604 EL AMARILLON – SARAVENA

- **Semana: 29 al 30 de septiembre de 2025**

1. Se realiza revisión, seguimiento y control de los trabajos ejecutados por parte de las Cooperativas de Mantenimiento Rutinario, para cumplimiento de indicadores y tareas programadas.
2. Se realiza trabajo administrativo dando cumplimiento a lo requerido contractualmente:
3. Se envía a la Dirección Territorial Formatos de Directorio de Emergencias Maquinaria y Equipo Consolidado de las cinco Administraciones viales.
4. Se radica oficio AMV4-VNC2017-210-25, con asunto: Evidencia Capacitaciones – Cooperativas de Mantenimiento rutinario del mes de septiembre de 2025

9.0 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

9.1 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y SERVICIOS MULTIPLES PAMPLONESES EN ACCION – COOTRASERMULPAC

- **Semana: 01 al 07 de septiembre de 2025**

1. Se realizan actividades de tapahuecos con material de excavación entre el PR 45+0400 al PR 57+0500
2. Se realizan actividades de limpieza de cunetas entre el PR 55+0400 al PR 57+0000
3. Se realizan actividades de despeje de derrumbe entre el PR 54+0000 al PR 57+0500
4. Se realizan actividades de poda, corte y retiro de árboles entre el PR 54+0900 al PR 55+0400
5. Se realiza vigilancia y control del corredor vial entre el PR 31+0000 (EL AMARILLON) - PR 61+0000 (ALTO SANTA INÉS).

- **Semana: 08 al 14 de septiembre de 2025**

1. Se realizan actividades de tapahuecos con material de excavación entre el PR 50+0100 al PR 50+0300
2. Se realizan actividades de limpieza de cunetas entre el PR 45+0000 al PR 50+0300
3. Se realizan actividades de rocería entre el PR 31+0000 al PR 34+0000
4. Se realizan actividades de limpieza de encoles y descoles entre el PR 31+0000 al PR 32+0600
5. Se realizan actividades de limpieza de obras de drenaje transversal entre el PR 31+0000 al PR 32+0600
6. Se realizan actividades de señalización con cinta de seguridad entre el PR 33+0850 al PR 35+0000
7. Se realiza vigilancia y control del corredor vial entre el PR 31+0000 (EL AMARILLON) - PR 61+0000 (ALTO SANTA INÉS).

CONSORCIO VIAS NACIONALES
NIT 901838197-8
INFORME MES DE SEPTIEMBRE DE 2025
ADMINISTRACION VIAL GRUPO 04
RUTA NACIONAL 6604 EL AMARILLON – SARAVENA

- **Semana: 15 al 21 de septiembre de 2025**

1. Se realizan actividades de limpieza de puentes entre el PR 33+0100 al PR 35+0300
2. Se realizan actividades de limpieza de cunetas entre el PR 33+0100 al PR 35+0300
3. Se realizan actividades de rocería entre el PR 33+0100 al PR 35+0200
4. Se realizan actividades de limpieza de encoles y descoles entre el PR 33+0100 al PR 35+0300
5. Se realizan actividades de limpieza de obras de drenaje transversal entre el PR 33+0100 al PR 35+0300
6. Se realizan actividades de poda, corte y retiro de árboles en el PR 44+0800
7. Se realiza vigilancia y control del corredor vial entre el PR 31+0000 (EL AMARILLON) - PR 61+0000 (ALTO SANTA INÉS).

- **Semana: 22 al 28 de septiembre de 2025**

1. Se realizan actividades de tapahuecos con material de excavación entre el PR 50+0800 al PR 60+0300
2. Se realizan actividades de limpieza de cunetas entre el PR 32+0500 al PR 35+0200
3. Se realizan actividades de rocería entre el PR 38+0600 al PR 40+0800
4. Se realizan actividades de limpieza de encoles y descoles entre el PR 32+0500 al PR 35+0200
5. Se realizan actividades de limpieza de obras de drenaje transversal entre el PR 33+0400 al PR 39+0300
6. Se realizan actividades de poda, corte y retiro de árboles entre el PR 38+0600 al PR 39+0400
7. Se realiza vigilancia y control del corredor vial entre el PR 31+0000 (EL AMARILLON) - PR 61+0000 (ALTO SANTA INÉS).

- **Semana: 29 al 30 de septiembre de 2025**

1. Se realizan actividades de limpieza de cunetas entre el PR 40+0000 al PR 41+0000
2. Se realizan actividades de limpieza de obras de drenaje transversal entre el PR 40+0000 al PR 41+0000
3. Se realizan actividades de rocería entre el PR 40+0000 al PR 41+0000
4. Se realizan actividades de vigilancia y control entre el PR 61+0000 (ALTO SANTA INÉS) - PR 91+0000 (ALTO LA LAGUNA)

9.2 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE LA MEZA – COOPTRAMEZA

- **Semana: 01 al 07 de septiembre de 2025**

1. Se realizan actividades de limpieza de cunetas entre el PR 64+0100 al PR 66+0550
2. Se realizan actividades de despeje de derrumbes entre el PR 66+0550 al PR 67+0200
3. Se realizan actividades de limpieza de obras de drenaje transversal entre el PR 61+0000 al PR 66+0550
4. Se realizan actividades de tapahuecos con material de excavación entre el PR 61+0000 al PR 76+0350
5. Se realizan actividades de limpieza de calzada entre el PR 65+0000 al PR 70+0000
6. Se realizan actividades de señalización con cinta de seguridad entre el PR 66+0000 al PR 67+0000
7. Se realizan actividades de vigilancia y control entre el PR 61+0000 (ALTO SANTA INÉS) - PR 91+0000 (ALTO LA LAGUNA)

- **Semana: 08 al 14 de septiembre de 2025**

1. Se realizan actividades de limpieza de cunetas entre el PR 80+0000 al PR 90+0850
2. Se realizan actividades de poda, corte y retiro de árboles entre el PR 90+0000 al PR 90+0850
3. Se realizan actividades de limpieza de obras de drenaje transversal entre el PR 68+0000 al PR 90+0850
4. Se realizan actividades de tapahuecos con material de excavación entre el PR 68+0000 al PR 87+0300
5. Se realizan actividades de vigilancia y control entre el PR 61+0000 (ALTO SANTA INÉS) - PR 91+0000 (ALTO LA LAGUNA)

- **Semana: 15 al 21 de septiembre de 2025**

1. Se realizan actividades de limpieza de cunetas entre el PR 76+0000 al PR 89+0300
2. Se realiza atención de emergencias entre el PR 89+0000 al PR 89+0300
3. Se realizan actividades de rocería entre el PR 82+0000 al PR 84+0400

4. Se realizan actividades de limpieza de obras de drenaje transversal entre el PR 84+0000 al PR 84+0100
5. Se realizan actividades de limpieza señales verticales y mojones entre el PR 82+0000 al PR 82+0200
6. Se realizan actividades de vigilancia y control entre el PR 61+0000 (ALTO SANTA INÉS) - PR 91+0000 (ALTO LA LAGUNA)

- **Semana: 22 al 28 de septiembre de 2025**

1. Se realizan actividades de limpieza de cunetas entre el PR 63+0000 al PR 87+0700
2. Se realiza actividades de tapahuecos con material de excavación entre el PR 83+0000 al PR 88+0100
3. Se realizan actividades de rocería entre el PR 87+0000 al PR 87+0700
4. Se realizan actividades de limpieza de obras de drenaje transversal entre el PR 83+0000 al PR 88+0270
5. Se realizan actividades de señalización con cinta de seguridad entre el PR 85+0400 al PR 87+0000
6. Se realizan actividades de vigilancia y control entre el PR 61+0000 (ALTO SANTA INÉS) - PR 91+0000 (ALTO LA LAGUNA)

- **Semana: 29 al 30 de septiembre de 2025**

1. Se realizan actividades de limpieza de cunetas entre el PR 67+0850 al PR 81+0200
2. Se realizan actividades de limpieza de obras de drenaje transversal entre el PR 87+0000 al PR 88+0000
3. Se realiza actividades de tapahuecos con material de excavación entre el PR 79+0900 al PR 84+0200
4. Se realizan actividades de vigilancia y control entre el PR 61+0000 (ALTO SANTA INÉS) - PR 91+0000 (ALTO LA LAGUNA)

9.3 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y SERVICIOS MULTIPLES DE GIBRALTAR – COOTRASERMULGIB

- **Semana: 01 al 07 de septiembre de 2025**

1. Se realizan actividades de limpieza de encoles y descoles entre el PR 91+0250 al PR 104+0630
2. Se realizan actividades de limpieza de obras de drenaje transversal entre el PR 92+0850 al PR 104+0630
3. Se realizan actividades de tapahuecos con material de excavación entre el PR 92+0850 al PR 104+0630
4. Se realizan actividades de limpieza de cunetas entre el PR 91+0250 al PR 104+0630
5. Se realizan actividades de limpieza de señales verticales y mojones entre el PR 94+0900 al PR 97+0000
6. Se realizan actividades de señalización con cinta de seguridad entre el PR 92+0000 al PR 93+0000
7. Se realizan actividades de vigilancia y control entre el PR 91+0000 (ALTO LA LAGUNA) - PR 121+0000 (PUENTE COBARIA)

- **Semana: 08 al 14 de septiembre de 2025**

1. Se realizan actividades de limpieza de encoles y descoles entre el PR 97+0000 al PR 102+0300
2. Se realizan actividades de limpieza de obras de drenaje transversal entre el PR 97+0000 al PR 102+0300
3. Se realizan actividades de limpieza de cunetas entre el PR 97+0000 al PR 102+0300
4. Se realizan actividades de limpieza de señales verticales y mojones entre el PR 97+0000 al PR 102+0300
5. Se realizan actividades de limpieza de defensa metálica entre el PR 104+0500 al PR 106+0000
6. Se realizan actividades de vigilancia y control entre el PR 91+0000 (ALTO LA LAGUNA) - PR 121+0000 (PUENTE COBARIA)

CONSORCIO VIAS NACIONALES
NIT 901838197-8
INFORME MES DE SEPTIEMBRE DE 2025
ADMINISTRACION VIAL GRUPO 04
RUTA NACIONAL 6604 EL AMARILLON – SARAVENA

- **Semana: 15 al 21 de septiembre de 2025**

1. Se realizan actividades de tapahuecos con material de excavación entre el PR 104+0230 al PR 110+0650
2. Se realizan actividades de limpieza de barandas en el PR 119+0277
3. Se realizan actividades de limpieza de cunetas entre el PR 108+0262 al PR 119+0277
4. Se realizan actividades de limpieza de señales verticales y mojones entre el PR 108+0262 al PR 109+0020
5. Se realizan actividades de demarcación de marcas viales en el PR 119+0241
6. Se realizan actividades de vigilancia y control entre el PR 91+0000 (ALTO LA LAGUNA) - PR 121+0000 (PUENTE COBARIA)

- **Semana: 22 al 28 de septiembre de 2025**

1. Se realizan actividades de tapahuecos con material de excavación entre el PR 112+0900 al PR 119+0600
2. Se realizan actividades de limpieza de encoles y descoles entre el PR 113+0850 al PR 114+0800
3. Se realizan actividades de limpieza de defensa metálica entre el PR 114+0700 al PR 121+0000
4. Se realizan actividades de limpieza de cunetas entre el PR 112+0900 al PR 117+0150
5. Se realizan actividades de limpieza de señales verticales y mojones entre el PR 115+0200 al PR 121+0000
6. Se realizan actividades de atención de emergencias en el PR 114+0800
7. Se realizan actividades de señalización con cinta de seguridad entre el PR 115+0000 al PR 0115+0800
8. Se realizan actividades de vigilancia y control entre el PR 91+0000 (ALTO LA LAGUNA) - PR 121+0000 (PUENTE COBARIA)

- **Semana: 29 al 30 de septiembre de 2025**

1. Se realizan actividades de despeje de derrumbes en el PR 93+0080
2. Se realizan actividades de rocería entre el PR 92+0570 al PR 94+0000
3. Se realizan actividades de vigilancia y control entre el PR 91+0000 (ALTO LA LAGUNA) - PR 121+0000 (PUENTE COBARIA)

9.4. COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CUBARA BOYACA – COOTRASCUB

- **Semana: 01 al 07 de septiembre de 2025**

1. Se realizan actividades de limpieza de cunetas entre el PR 135+0481 al PR 139+0000
2. Se realizan actividades de limpieza de obras de drenaje transversal entre el PR 130+0646 al PR 141+0000
3. Se realizan actividades de limpieza de señales y mojones entre el PR 128+0000 al PR 141+0000
4. Se realizan actividades de limpieza de defensas metálicas entre el 135+0781 al PR 140+0000
5. Se realizan actividades de limpieza de barandas entre el PR 129+0330 al PR 129+0360
6. Se realizan actividades de vigilancia y control entre el PR 121+0000 (PUENTE COBARIA) - PR 150+0000 (SARAVENA)

- **Semana: 08 al 14 de septiembre de 2025**

1. Se realizan actividades de limpieza de cunetas entre el PR 140+0561 al PR 141+0600
2. Se realizan actividades de limpieza de obras de drenaje transversal entre el PR 140+0900 al PR 143+0500
3. Se realizan actividades de limpieza de señales y mojones entre el PR 140+0672 al PR 150+0000
4. Se realizan actividades de limpieza de defensas metálicas entre el 140+0405 al PR 142+0000
5. Se realizan actividades de vigilancia y control entre el PR 121+0000 (PUENTE COBARIA) - PR 150+0000 (SARAVENA)

- **Semana: 15 al 21 de septiembre de 2025**

1. Se realizan actividades de limpieza de cunetas entre el PR 121+0100 al PR 123+0000
2. Se realizan actividades de tapahuecos con material de excavación en el PR 135+0100
3. Se realizan actividades de limpieza de obras de drenaje transversal en el PR 143+0500

4. Se realizan actividades de poda, corte y retiro de árboles entre el PR 121+0100 al PR 121+0340
5. Se realizan actividades de limpieza de puentes y pontones en el PR 121+0180 al PR 122+0870
6. Se realizan actividades de limpieza de calzada entre el PR 120+00000 al PR 121+0100
7. Se realizan actividades de vigilancia y control entre el PR 121+0000 (PUENTE COBARIA) - PR 150+0000 (SARAVENA)

- **Semana: 22 al 28 de septiembre de 2025**

1. Se realizan actividades de limpieza de cunetas entre el PR 123+0160 al PR 125+0000
2. Se realizan actividades de limpieza de encoles y descoles entre el PR124+0750 al PR 127+0000
3. Se realizan actividades de limpieza de obras de drenaje transversal en el PR 123+0008 al PR 125+0620
4. Se realizan actividades de poda, corte y retiro de árboles entre el PR 126+0750 al PR 128+0000
5. Se realizan actividades de limpieza de puentes y pontones en el PR 123+0160 al PR 123+0750
6. Se realizan actividades de vigilancia y control entre el PR 121+0000 (PUENTE COBARIA) - PR 150+0000 (SARAVENA)

- **Semana: 29 al 30 de septiembre de 2025**

1. Se realizan actividades de limpieza de cunetas entre el PR 128+0510 al PR 129+0000
2. Se realizan actividades de limpieza de obras de drenaje transversal en el PR 128+0510 al PR 129+0000
3. Se realiza pintura de cabezotes en el PR 125+0305 al PR 128+0510
4. Se realizan actividades de vigilancia y control entre el PR 121+0000 (PUENTE COBARIA) - PR 150+0000 (SARAVENA)

10. APOYO A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

Contrato No: 981 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DE LA SOBERANÍA (LA LEJÍA – SARAVENA), EN LOS DEPARTAMENTOS DE NORTE DE SANTANDER, BOYACÁ Y ARAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030.

CONTRATISTA: Consorcio Vías Colombia 063

PLAZO: 09 AÑOS

FECHA DE INICIO: 1 de julio de 2021

FECHA DE FINALIZACIÓN: 31 de agosto de 2030

VALOR DEL CONTRATO: 3.891.745.634,14

10. CAPACITACIONES A COOPERATIVAS

VIAS NACIONALES
CONSORCIO

Cubará, 29 de septiembre de 2025

AMV4-VNC2017-210-25

Ingeniero
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS "INVIAS"
Dirección Territorial Norte de Santander
Atn. Ing LEONEL VALERO ESCALANTE
Director Territorial Norte de Santander
Avenida Demetrio Mendoza No.21-105 Piso 2
San José de Cúcuta

REFERENCIA:	CONTRATO NÚMERO 2017 DE 2024. Cuyo objeto es "ADMINISTRACIÓNVIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓNTERRITORIAL NORTE DE SANTANDER GRUPO AMV 4 LOTE 2."
ASUNTO:	Evidencia Capacitaciones – Cooperativas de Mantenimiento rutinario.

Cordial Saludo:

Por medio de la presente, me permito efectuar la entrega de los registros de ejecución de las capacitaciones No.12, realizadas a las Cooperativas de Trabajo Asociado, registros que se describen a continuación:

- Invitación a la capacitación.
- Asistencia.
- Registro fotográfico de la reunión.
- Temas tratados

VIAS NACIONALES
CONSORCIO

Sin otro particular,

Atentamente,



JUAN MANUEL ROJAS CARRILLO
Ingeniero Residente AM G4
Consorcio Vías Nacionales

Anexos. (23 FOLIOS)
C.C

- Archivo

Elaboró: MSM Revisó: JMRC Aprobó: JMRC

VIAS NACIONALES
CONSORCIO

INVITACION

Oficina Principal Mz 2 lote 4, Barrio el Jardín, sector Villa Alonso, Municipio de Cubará - Boyacá.
Oficina Alterna Cra 7 11A-37 San Francisco Pamplona, Norte de Santander
Correo: admonvial04viasnacionales@gmail.com
Celular 311 293 55 68 - 321 4556968

VIAS NACIONALES
CONSORCIO

Cubará - Boyacá.

Señores:
COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO

R.L – HUMBERTO RIVERO GUTIERREZ – COOTRASERMULPAC
R.L – ANGEL RUBIEL RINCON JAIMES – COOTRAMEZA
R.L – JOSE ANANIAS SANTOS CONTRERAS – COOTRASERMULGIB
R.L – ELGAR GAMBOA JAIMES – COOTRASCUB

REFERENCIA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIL NORTE DE SANTANDER

ASUNTO: Invitación capacitación No 12

Cordial saludo Señores.

Como uno de los compromisos del Instituto Nacional de Vías y en desarrollo del contrato de Administración vial, nuestra meta para la ejecución de los contratos de Mantenimiento rutinario relacionados en esta comunicación, es el mejoramiento continuo en la formación de cada uno de los integrantes, invitamos a cada uno de los Cooperados a participar a la siguiente capacitación.

Temas a tratar


- SALUD MENTAL
- BIENESTAR EMOCIONAL
- REGLA DE LOS 333

VIAS NACIONALES
CONSORCIO

ASISTENCIA

Oficina Principal Mz 2 lote 4, Barrio el Jardín, sector Villa Alonso, Municipio de Cubará - Boyacá.
Oficina Alterna Cra 7 11A-37 San Francisco Pamplona, Norte de Santander
Correo: admonvial04viasnacionales@gmail.com
Celular 311 293 55 68 - 321 4556968

VIAS NACIONALES
CONSORCIO

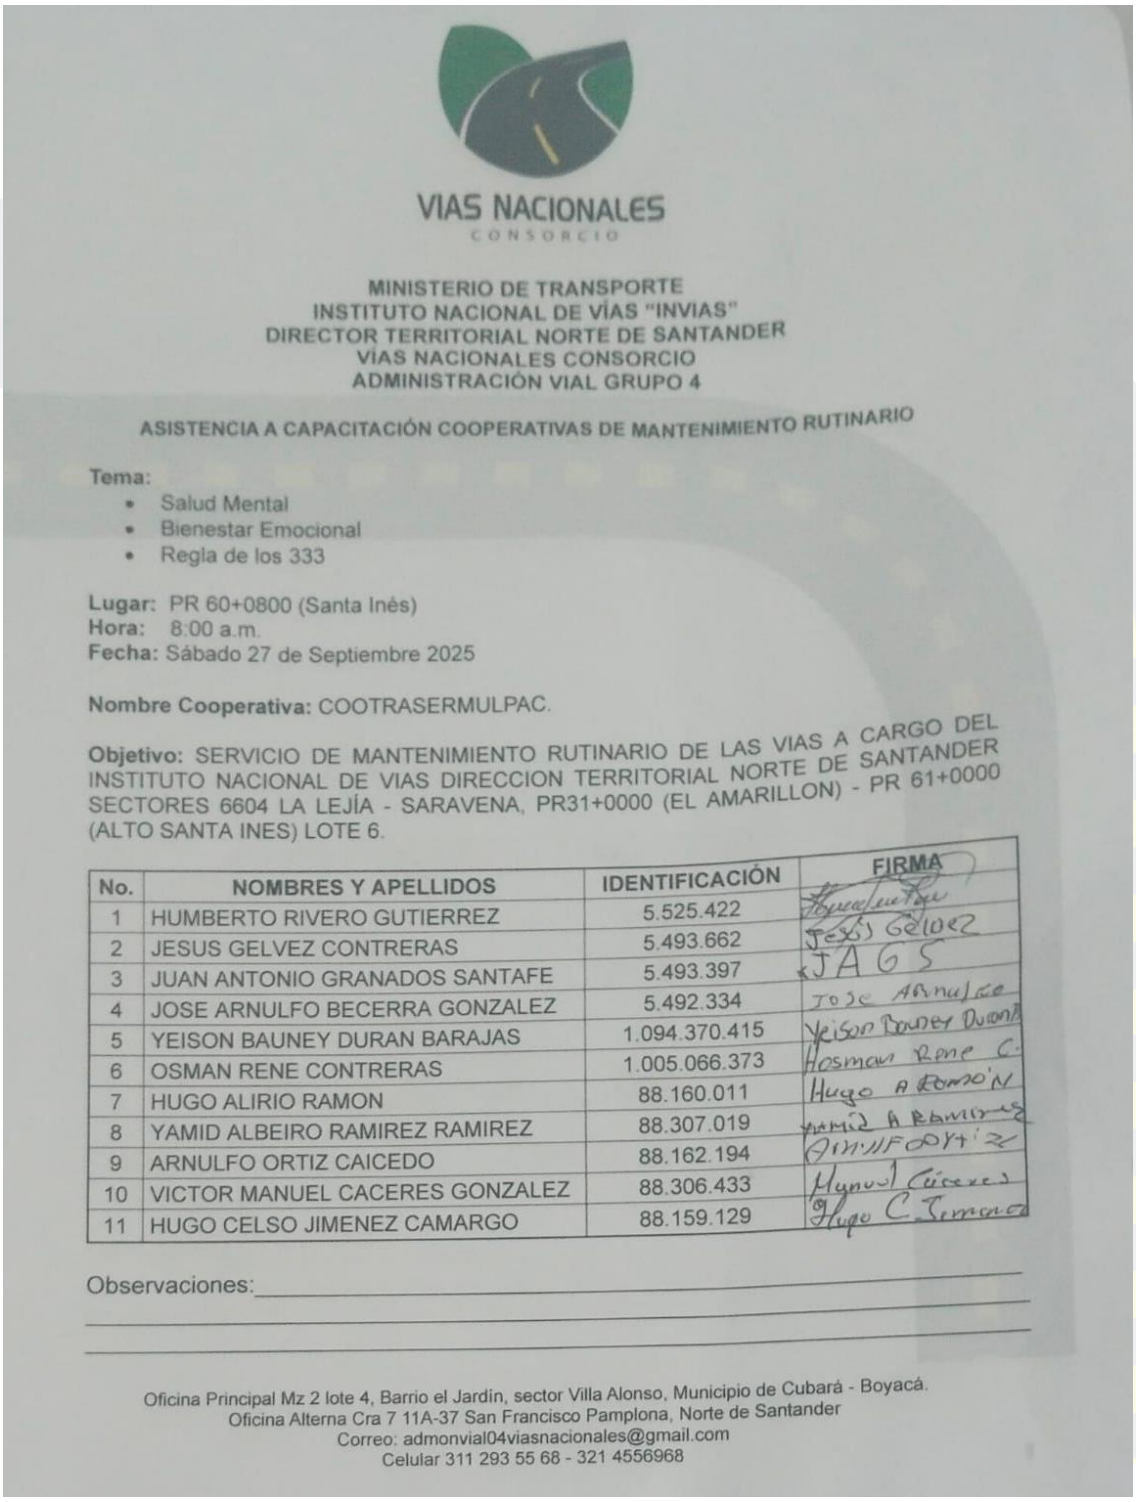

VIAS NACIONALES
CONSORCIO

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS "INVIAS"
DIRECTOR TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER
VIAS NACIONALES CONSORCIO
ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 4

ASISTENCIA A CAPACITACIÓN COOPERATIVAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

Tema:

- Salud Mental
- Bienestar Emocional
- Regla de los 333

Lugar: PR 60+0800 (Santa Inés)
Hora: 8:00 a.m.
Fecha: Sábado 27 de Septiembre 2025

Nombre Cooperativa: COOTRASERMULPAC.

Objetivo: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER SECTORES 6604 LA LEJÍA - SARAVENA, PR31+0000 (EL AMARILLON) - PR 61+0000 (ALTO SANTA INES) LOTE 6.


No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	FIRMA
1	HUMBERTO RIVERO GUTIERREZ	5.525.422	
2	JESUS GELVEZ CONTRERAS	5.493.662	
3	JUAN ANTONIO GRANADOS SANTAFE	5.493.397	
4	JOSE ARNULFO BECERRA GONZALEZ	5.492.334	
5	YEISON BAUNEY DURAN BARAJAS	1.094.370.415	
6	OSMAN RENE CONTRERAS	1.005.066.373	
7	HUGO ALIRIO RAMON	88.160.011	
8	YAMID ALBEIRO RAMIREZ RAMIREZ	88.307.019	
9	ARNULFO ORTIZ CAICEDO	88.162.194	
10	VICTOR MANUEL CACERES GONZALEZ	88.306.433	
11	HUGO CELSO JIMENEZ CAMARGO	88.159.129	

Observaciones:_____

Oficina Principal Mz 2 lote 4, Barrio el Jardín, sector Villa Alonso, Municipio de Cubará - Boyacá.
Oficina Alterna Cra 7 11A-37 San Francisco Pamplona, Norte de Santander
Correo: admonvial04viasnacionales@gmail.com
Celular 311 293 55 68 - 321 4556968

Oficina Principal Mz 2 lote 4, Barrio el Jardín, sector Villa Alonso, Municipio de Cubará - Boyacá.
Oficina Alterna Cra 7 11A-37 San Francisco Pamplona, Norte de Santander
Correo: admonvial04viasnacionales@gmail.com
Celular 311 293 55 68 - 321 4556968

VIAS NACIONALES
CONSORCIO

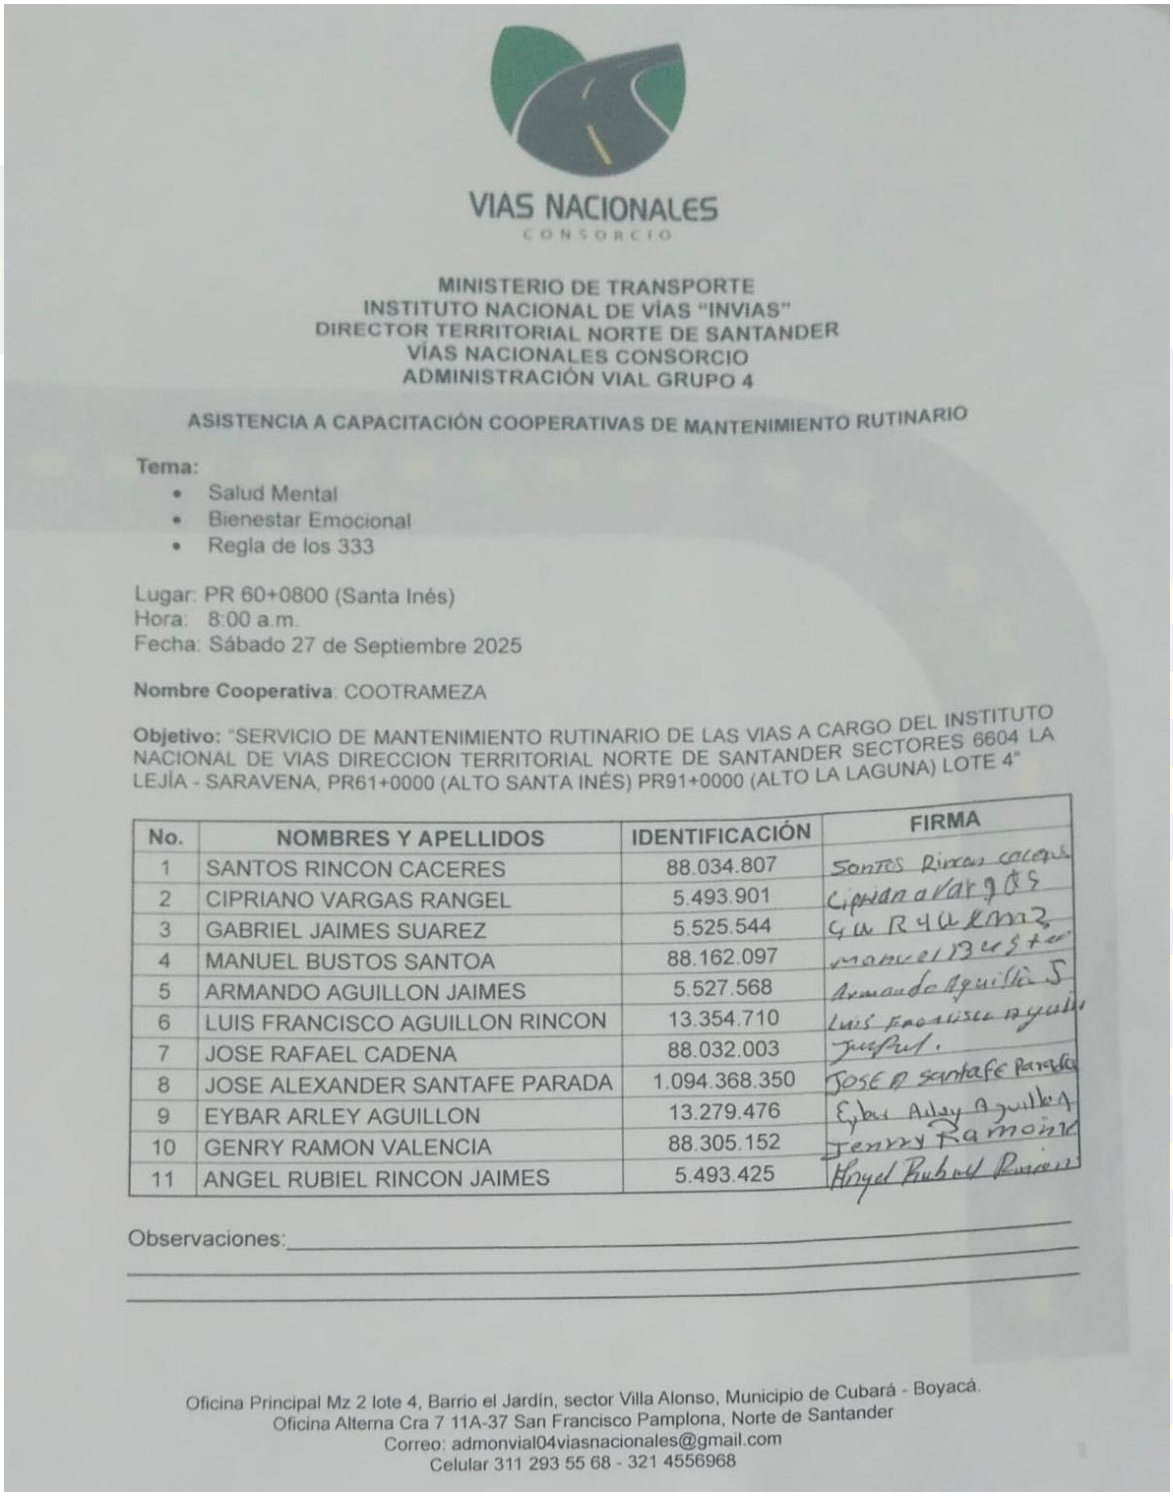

VIAS NACIONALES
CONSORCIO

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS "INVIAS"
DIRECTOR TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER
VÍAS NACIONALES CONSORCIO
ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 4

ASISTENCIA A CAPACITACIÓN COOPERATIVAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

Tema:

- Salud Mental
- Bienestar Emocional
- Regla de los 333

Lugar: PR 60+0800 (Santa Inés)
Hora: 8:00 a.m.
Fecha: Sábado 27 de Septiembre 2025

Nombre Cooperativa: COOTRAMEZA

Objetivo: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER SECTORES 6604 LA LEJÍA - SARAVENA, PR61+0000 (ALTO SANTA INÉS) PR91+0000 (ALTO LA LAGUNA) LOTE 4"

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	FIRMA
1	SANTOS RINCON CACERES	88.034.807	Santos Rincon Caceres
2	CIPRIANO VARGAS RANGEL	5.493.901	Cipriano Vargas
3	GABRIEL JAIMES SUAREZ	5.525.544	Gabriel Jaimes Suarez
4	MANUEL BUSTOS SANTOA	88.162.097	Manuel Bustos
5	ARMANDO AGUILLON JAIMES	5.527.568	Armando Aguillon J.
6	LUIS FRANCISCO AGUILLON RINCON	13.354.710	Luis Francisco Aguill
7	JOSE RAFAEL CADENA	88.032.003	Jose Rafael.
8	JOSE ALEXANDER SANTAFE PARADA	1.094.368.350	Jose A. Santafe Parada
9	EYBAR ARLEY AGUILLON	13.279.476	Eybar Arley Aguillon
10	GENRY RAMON VALENCIA	88.305.152	Genry Ramon
11	ANGEL RUBIEL RINCON JAIMES	5.493.425	Angel Rubiel Rincon

Observaciones:_____

Oficina Principal Mz 2 lote 4, Barrio el Jardín, sector Villa Alonso, Municipio de Cubará - Boyacá.
Oficina Alterna Cra 7 11A-37 San Francisco Pamplona, Norte de Santander
Correo: admonvial04viasnacionales@gmail.com
Celular 311 293 55 68 - 321 4556968

Oficina Principal Mz 2 lote 4, Barrio el Jardín, sector Villa Alonso, Municipio de Cubará - Boyacá.
Oficina Alterna Cra 7 11A-37 San Francisco Pamplona, Norte de Santander
Correo: admonvial04viasnacionales@gmail.com
Celular 311 293 55 68 - 321 4556968

VIAS NACIONALES
CONSORCIO

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS "INVIAS"
DIRECTOR TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER
VÍAS NACIONALES CONSORCIO
ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 4

ASISTENCIA A CAPACITACIÓN COOPERATIVAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

Tema:

- Salud Mental
- Bienestar Emocional
- Regla de los 333

Lugar: Salón Comunal Cubará
Hora: 09:30 a.m.
Fecha: Sábado 27 de Septiembre 2025

Nombre Cooperativa: COOTRASERMULGIB

Objetivo: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER SECTORES 6604 LA LEJÍA - SARAVENA, PR91+0000 (ALTO LA LAGUNA) PR 121+0000 (PUENTE COBARIA) LOTE 5"

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	FIRMA
1	JOSE A. SANTOS CONTRERAS	1.094.368.327	José Antonio S.
2	CARLOS JULIO ANGARITA CHIVATA	9.465.592	Carlos J. Angarita
3	OSCAR PEREZ VALENCIA	5.478.212	Oscar Perez
4	LUIS AMANDO GONZALEZ COBARIA	5.463.189	Luis Amando G.
5	JORMAN ELADIO SANTOS C.	1.094.369.603	Jorman S.
6	PEDRO RAFAEL LOPEZ VILLAMIZAR	88.164.661	Pedro R. Lopez.
7	RUBEN DARIO GONZALEZ A.	1.094.274.016	Ruben G.
8	EDWIN ALBEIRO MENDEZ ANGARITA	1.098.150.563	
9	FERNANDO CADENA MONTAÑEZ	1.094.265.379	Fernando Cadena Montañez
10	CARLOS F. ESTUPIÑAN ALBARRACIN	1.157.452.418	Carlos Fabian C.
11	SILVINO BECERRA MONCADA	9.466.521	

Observaciones:_____

Oficina Principal Mz 2 lote 4, Barrio el Jardín, sector Villa Alonso, Municipio de Cubará - Boyacá.
Oficina Alterna Cra 7 11A-37 San Francisco Pamplona, Norte de Santander
Correo: admonvial04viasnacionales@gmail.com
Celular 311 293 55 68 - 321 4556968

VIAS NACIONALES
CONSORCIO

VIAS NACIONALES
CONSORCIO

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS "INVIAS"
DIRECTOR TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER
VÍAS NACIONALES CONSORCIO
ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 4

ASISTENCIA A CAPACITACIÓN COOPERATIVAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

Tema:

- Salud Mental
- Bienestar Emocional
- Regla de los 333

Lugar: Salón Comunal Cubará
Hora: 09:30 a.m.
Fecha: Sábado 27 de Septiembre 2025

Nombre Cooperativa: COOTRASCUB

Objetivo: SERVICIO DEMANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER SECTORES 6604 LA LEJÍA - SARAVENA, PR121+0000 (PUENTE COBARIA) - PR150+0000 (SARAVENA) LOTE 7".

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	FIRMA
1	ELGAR GAMBOA JAIMES	96.188.919	
2	ALFREDO BECERRA MONTERREY	96.187.840	
3	ELKIN MICHEL SANTAMARIA CHIVATA	1.014.201.445	
4	JESUS MARIA CASTRO BOTIA	17.527.905	
5	ALVARO BARROSO DUARTE	9.466.380	
6	JESUS ANTONIO CRUZ VARGAS	5.492.070	
7	MISAEL REINA GODOY	96.185.847	
8	REINALDO ANGARITA	5.526.335	
9	RAUL GUTIERREZ RODRIGUEZ	9.466.800	
10	GEISSON A. LASSO CHAVEZ	1.115734.417	
11	CARMEN J. RIVERO MALDONADO	1.049.393.808	CARMEN JANNETH R

Observaciones:_____

Oficina Principal Mz 2 lote 4, Barrio el Jardín, sector Villa Alonso, Municipio de Cubará - Boyacá.
Oficina Alterna Cra 7 11A-37 San Francisco Pamplona, Norte de Santander
Correo: admonvial04viasnacionales@gmail.com
Celular 311 293 55 68 - 321 4556968

Oficina Principal Mz 2 lote 4, Barrio el Jardín, sector Villa Alonso, Municipio de Cubará - Boyacá.
Oficina Alterna Cra 7 11A-37 San Francisco Pamplona, Norte de Santander
Correo: admonvial04viasnacionales@gmail.com
Celular 311 293 55 68 - 321 4556968

VIAS NACIONALES
CONSORCIO

REGISTRO FOTOGRAFICO

Oficina Principal Mz 2 lote 4, Barrio el Jardín, sector Villa Alonso, Municipio de Cubará - Boyacá.
Oficina Alterna Cra 7 11A-37 San Francisco Pamplona, Norte de Santander
Correo: admonvial04viasnacionales@gmail.com
Celular 311 293 55 68 - 321 4556968

VIAS NACIONALES
CONSORCIO

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Ministerio de Transporte INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER REGISTRO FOTOGRAFICO	VIAS NACIONALES CONSORCIO HOJA No. 1 DE 1 CONTRATO No 2017 DE 2024

27 de septiembre 2025

















Oficina Principal Mz 2 lote 4, Barrio el Jardín, sector Villa Alonso, Municipio de Cubará - Boyacá.
Oficina Alterna Cra 7 11A-37 San Francisco Pamplona, Norte de Santander
Correo: admonvial04viasnacionales@gmail.com
Celular 311 293 55 68 - 321 4556968

VIAS NACIONALES
CONSORCIO

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Ministerio de Transporte INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER REGISTRO FOTOGRAFICO	VIAS NACIONALES CONSORCIO HOJA No. 1 DE 1 CONTRATO No 2017 DE 2024

27 de septiembre 2025











Oficina Principal Mz 2 lote 4, Barrio el Jardín, sector Villa Alonso, Municipio de Cubará - Boyacá.
Oficina Alterna Cra 7 11A-37 San Francisco Pamplona, Norte de Santander
Correo: admonvial04viasnacionales@gmail.com
Celular 311 293 55 68 - 321 4556968

VIAS NACIONALES
CONSORCIO

TEMAS

- SALUD MENTAL
- BIENESTAR EMOCIONAL
- REGLA DE LOS 333

Oficina Principal Mz 2 lote 4, Barrio el Jardín, sector Villa Alonso, Municipio de Cubará - Boyacá.
Oficina Alterna Cra 7 11A-37 San Francisco Pamplona, Norte de Santander
Correo: admonvial04viasnacionales@gmail.com
Celular 311 293 55 68 - 321 4556968

VIAS NACIONALES
CONSORCIO

SEPTIEMBRE 2025

CAPACITACION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



Oficina Principal Mz 2 lote 4, Barrio el Jardín, sector Villa Alonso, Municipio de Cubará - Boyacá.
Oficina Alterna Cra 7 11A-37 San Francisco Pamplona, Norte de Santander
Correo: admonvial04viasnacionales@gmail.com
Celular 311 293 55 68 - 321 4556968

VIAS NACIONALES
CONSORCIO

Dinámica de reflexión

1. ¿Cómo me estoy sintiendo frente a las diversas tareas que vengo desarrollando?
2. ¿Qué estrategias estoy realizando para mantener mi equilibrio emocional en el ámbito familiar, social y laboral?
3. ¿Qué tipo de ayuda estoy brindando o recibiendo para afrontar diversos momentos de tensión?

INVIAS

Observemos las siguientes imágenes



INVIAS

Oficina Principal Mz 2 lote 4, Barrio el Jardín, sector Villa Alonso, Municipio de Cubará - Boyacá.
Oficina Alterna Cra 7 11A-37 San Francisco Pamplona, Norte de Santander
Correo: admonvial04viasnacionales@gmail.com
Celular 311 293 55 68 - 321 4556968

VIAS NACIONALES
CONSORCIO

Muchas veces nos encontramos en situaciones de tensión



También en el ámbito familiar…



Oficina Principal Mz 2 lote 4, Barrio el Jardín, sector Villa Alonso, Municipio de Cubará - Boyacá.
Oficina Alterna Cra 7 11A-37 San Francisco Pamplona, Norte de Santander
Correo: admonvial04viasnacionales@gmail.com
Celular 311 293 55 68 - 321 4556968

VIAS NACIONALES
CONSORCIO

O en el campo laboral...



Así como en el ámbito social...



Oficina Principal Mz 2 lote 4, Barrio el Jardín, sector Villa Alonso, Municipio de Cubará - Boyacá.
Oficina Alterna Cra 7 11A-37 San Francisco Pamplona, Norte de Santander
Correo: admonvial04viasnacionales@gmail.com
Celular 311 293 55 68 - 321 4556968

VIAS NACIONALES
CONSORCIO

Y quizás afectando también nuestra salud...



Por ello cabe la pregunta...

¿Cómo venimos afrontando las diversas situaciones de conflicto o tensión por las que atravesamos?



Oficina Principal Mz 2 lote 4, Barrio el Jardín, sector Villa Alonso, Municipio de Cubará - Boyacá.
Oficina Alterna Cra 7 11A-37 San Francisco Pamplona, Norte de Santander
Correo: admonvial04viasnacionales@gmail.com
Celular 311 293 55 68 - 321 4556968

VIAS NACIONALES
CONSORCIO

Primeros Auxilios Psicológicos



Primeros Auxilios Psicológicos



¿Qué es la Salud Mental?


- De conformidad con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud "es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades".
- La salud mental la define como un estado de **bienestar** en el cual el individuo es **consciente** de sus propias capacidades, puede **afrontar** las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una **contribución** a su comunidad.



Oficina Principal Mz 2 lote 4, Barrio el Jardín, sector Villa Alonso, Municipio de Cubará - Boyacá.
Oficina Alterna Cra 7 11A-37 San Francisco Pamplona, Norte de Santander
Correo: admonvial04viasnacionales@gmail.com
Celular 311 293 55 68 - 321 4556968

VIAS NACIONALES
CONSORCIO

Enfoque integral en la prevención de la Salud Mental

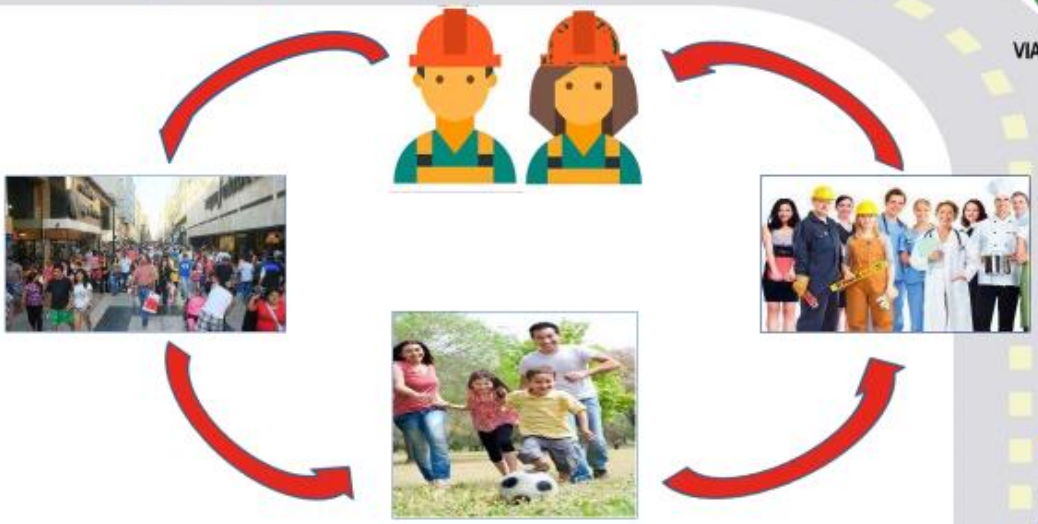

Primeros Auxilios Psicológicos - Reacciones



- Dificultad para pensar.
- Falta de concentración.
- Déficit atencional. Dificultad para tomar decisiones.
- Dificultad para focalizar (tendencia a la dispersión).
- Déficit de memoria.
- Amnesia disociativa.



- Angustia.
- Tristeza.
- Rabia.
- Miedo.
- Impotencia.
- Aplanamiento afectivo.
- Desconexión emocional.



- Impulsividad.
- Llanto.
- Agresividad.
- Negación o minimización.
- Evitación.
- Huida.
- Parálización.

Oficina Principal Mz 2 lote 4, Barrio el Jardín, sector Villa Alonso, Municipio de Cubará - Boyacá.
Oficina Alterna Cra 7 11A-37 San Francisco Pamplona, Norte de Santander
Correo: admonvial04viasnacionales@gmail.com
Celular 311 293 55 68 - 321 4556968

VIAS NACIONALES
CONSORCIO

Gestión de la Salud Mental - Consecuencias



- Violencia social e intrafamiliar
- Abuso de sustancias
- Afectación al rendimiento educativo
- Limitaciones de accesos sociales, educativos y laborales
- Ausentismo y bajas laborales
- Suicidio

Gestión de la Salud Mental Laboral - Objetivos





Afrontar dificultades



Conciencia de nuestras capacidades



Podemos trabajar productivamente



Somos capaces de contribuir a la mejora social

Oficina Principal Mz 2 lote 4, Barrio el Jardín, sector Villa Alonso, Municipio de Cubará - Boyacá.
Oficina Alterna Cra 7 11A-37 San Francisco Pamplona, Norte de Santander
Correo: admonvial04viasnacionales@gmail.com
Celular 311 293 55 68 - 321 4556968

VIAS NACIONALES
CONSORCIO

Desarrollo y cuidado de nuestra salud mental

Elementos claves para el autocuidado en nuestra vida diaria








Evitar permanentemente...








Oficina Principal Mz 2 lote 4, Barrio el Jardín, sector Villa Alonso, Municipio de Cubará - Boyacá.
Oficina Alterna Cra 7 11A-37 San Francisco Pamplona, Norte de Santander
Correo: admonvial04viasnacionales@gmail.com
Celular 311 293 55 68 - 321 4556968

VIAS NACIONALES
CONSORCIO

Cuidados para la Salud Mental en el trabajo

- ESTABLECE VÍNCULOS POSITIVOS
- MANTENERSE ACTIVO FÍSICAMENTE
- NO LIMITAR NUESTRA VIDA A LO LABORAL
- CUIDA TU SALUD FÍSICA
- HABLAR ACERCA DE NUESTRAS EMOCIONES
- APRENDER A PEDIR AYUDA





El **cuidado de la salud mental** es una de las manifestaciones de una **autoestima sana**.

La persona que lo practica no toma decisiones que van contra su bienestar y actúa con **un alto sentido de responsabilidad hacia sí mismo y hacia los suyos.**

Oficina Principal Mz 2 lote 4, Barrio el Jardín, sector Villa Alonso, Municipio de Cubará - Boyacá.
Oficina Alterna Cra 7 11A-37 San Francisco Pamplona, Norte de Santander
Correo: admonvial04viasnacionales@gmail.com
Celular 311 293 55 68 - 321 4556968

VIAS NACIONALES
CONSORCIO

REFLEXIONEMOS:

¿Es importante para ti cuidar a tu familia?

¿Crees que eres valioso para los miembros de tu familia?

¿Te cuidas lo suficiente pensando en quienes te esperan en casa?



REGLA 333 PARA LA ANSIEDAD

La regla 3-3-3 es una técnica de conexión a tierra que ayuda a calmar la ansiedad al centrar tu mente en el momento presente. Es un ejercicio de atención plena que desvía la atención de los pensamientos negativos y acelerados que suelen acompañar a un episodio de ansiedad.

¿Cuándo usar la regla 3-3-3?

Puedes practicar esta técnica cada vez que sientas que la ansiedad aumenta, como una forma rápida de recuperar la calma y evitar que los pensamientos negativos escalen a un ataque de pánico. Si bien es una herramienta útil, es importante recordar que no sustituye a la ayuda profesional de un terapeuta para tratar la ansiedad a largo plazo.

Oficina Principal Mz 2 lote 4, Barrio el Jardín, sector Villa Alonso, Municipio de Cubará - Boyacá.
Oficina Alterna Cra 7 11A-37 San Francisco Pamplona, Norte de Santander
Correo: admonvial04viasnacionales@gmail.com
Celular 311 293 55 68 - 321 4556968

VIAS NACIONALES
CONSORCIO

¿En qué consiste la regla 3-3-3?

La técnica se basa en tres pasos sencillos:

- **Identifica 3 cosas que puedas ver.**

Tómate un momento para mirar a tu alrededor y nombrar tres objetos que veas. Puede ser un lápiz sobre la mesa, un cuadro en la pared o una planta en la ventana. La clave es prestarles atención de manera deliberada.

- **Identifica 3 sonidos que puedas oír.**

Escucha con atención los sonidos de tu entorno y nombra tres. Pueden ser el zumbido de un computador, el canto de un pájaro o el sonido de los coches en la calle.

- **Mueve 3 partes de tu cuerpo.**

Elige tres partes de tu cuerpo y muévelas conscientemente. Puedes mover los dedos de las manos, los pies, el cuello o los hombros. El objetivo es volver a sentirte conectado con tu cuerpo físico.

VIAS NACIONALES
CONSORCIO

INVIAS



VIAS NACIONALES
CONSORCIO

INVIAS

Gracias ☺

Oficina Principal Mz 2 lote 4, Barrio el Jardín, sector Villa Alonso, Municipio de Cubará - Boyacá.
Oficina Alterna Cra 7 11A-37 San Francisco Pamplona, Norte de Santander
Correo: admonvial04viasnacionales@gmail.com
Celular 311 293 55 68 - 321 4556968

CONSORCIO VIAS NACIONALES
NIT 901838197-8
INFORME MES DE SEPTIEMBRE DE 2025
ADMINISTRACION VIAL GRUPO 04
RUTA NACIONAL 6604 EL AMARILLON – SARAVENA

11. EMERGENCIAS

Durante el periodo comprendido desde el 01 al 30 de septiembre de 2025 se presentaron emergencias dentro del corredor vial La Lejía – Saravena PR 31+0000 al PR 150+0000:

1. **Fecha:** jueves 25 de septiembre 2025
   PR 114+0800
   Descripción: Caída de material del talud superior a causa de fuertes lluvias que causan cierre total de la vía
   Atendido por la Cooperativa: COOTRASERMULGIB





PR 114+0800 Caída de material del talud superior a causa de fuertes lluvias que causan cierre total de la vía






PR 114+0800 Caída de material del talud superior a causa de fuertes lluvias que causan cierre total de la vía


12. REGISTRO FOTOGRÁFICO ADMINISTRACIÓN VIAL

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Ministerio de Transporte INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER INFORME SEMANAL DE AMV G4	VIAS NACIONALES CONSORCIO HOJA No. 1 DE 1 FECHA: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025 INFORME No. 61 CONTRATO No. 2017 DE 2024

RESEÑA FOTOGRÁFICA - PERIODO: 01/09/2025 AL 07/09/2025

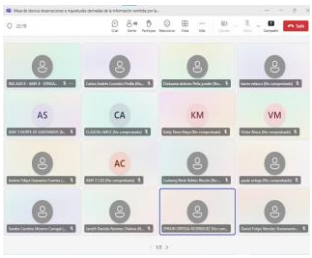





Mesa técnica – Observaciones e inquietudes metodología iRAP - ANSV. - Vía 6604 La Lejía - Saravena

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Ministerio de Transporte INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER **INFORME SEMANAL DE AMV G4**	VIAS NACIONALES CONSORCIO HOJA No. 1 DE 2 FECHA: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 INFORME No. 62 CONTRATO No. 2017 DE 2024

RESEÑA FOTOGRÁFICA - PERIODO: 08/09/2025 AL 15/09/2025







Recorrido e Inspección a Cooperativas de Mantenimiento Rutinario Vía 6604 La Lejía - Saravena







Recorrido e Inspección a Cooperativas de Mantenimiento Rutinario Vía 6604 La Lejía - Saravena







Recorrido e Inspección a Cooperativas de Mantenimiento Rutinario Vía 6604 La Lejía - Saravena







Recorrido e Inspección a Cooperativas de Mantenimiento Rutinario Vía 6604 La Lejía - Saravena







Inspección de obras de drenaje PR 50+0900 Vía 6604 La Lejía - Saravena

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Ministerio de Transporte** **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS** **SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA** **TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER** **INFORME SEMANAL DE AMV G4**	VIAS NACIONALES CONVENIO **HOJA No. 2 DE 2** **FECHA: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025** **INFORME No. 62** **CONTRATO No. 2017 DE 2024**


RESEÑA FOTOGRÁFICA - PERIODO: 08/09/2025 AL 15/09/2025







Inspección de Puente Las Palmas PR 84+0874 Vía 6604 La Lejía - Saravena







Seguimiento a obras de cimentación ejecutadas Puente Bojaba PR 139+0976 Vía 6604 La Lejía - Saravena







Inspección de Puntos Críticos PR 89+0300 Vía 6604 La Lejía - Saravena







Atención a requerimiento de la Institución Educativa de Gibraltar, Toledo, Norte de Santander Vía 6604 La Lejía - Saravena







Inspección Puente Caño Picho PR 143+0500 Vía 6604 La Lejía - Saravena

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Ministerio de Transporte** **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS** **SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA** **TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER** **INFORME SEMANAL DE AMV G4**	VIAS NACIONALES CONSORCIO **HOJA No. 1 DE 1** **FECHA: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025** **INFORME No. 64** **CONTRATO No. 2017 DE 2024**

RESEÑA FOTOGRÁFICA - PERIODO: 22/09/2025 AL 28/09/2025







Capacitación a Cooperativas de Mantenimiento Rutinario mes de septiembre Vía 6604 La Lejía - Saravena







Recorrido e Inspección a emergencias PR 114+0800 Vía 6604 La Lejía - Saravena







Recorrido e Inspección a Puente Cubugón PR 108+0058 Vía 6604 La Lejía - Saravena

13. REGISTRO FOTOGRÁFICO COOPERATIVAS

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y SERVICIOS MÚLTIPLES PAMPLONESES EN ACCIÓN "COOTRASERMULPAC".
PR31+0000 (EL AMARILLÓN) - PR61+0000 (ALTO SANTA INÉS) LOTE 6

RESEÑA FOTOGRÁFICA - PERIODO: 01/09/2025 AL 07/09/2025






Actividades de tapahuecos con material de excavación entre el PR 45+0400 al PR 57+0500





Actividades de poda, corte y retiro de árboles entre el PR 54+0900 al PR 55+0400





Actividades de limpieza de cunetas entre el PR 55+0400 al PR 57+0000






Actividades de despeje de derrumbe entre el PR 54+0000 al PR 57+0500





Actividades de tapahuecos con material de excavación entre el PR 45+0400 al PR 57+0500

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Ministerio de Transporte INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER INFORME SEMANAL DE AMV G4	VIAS NACIONALES CONSTRUCCIÓN HOJA No. 1 DE 1 FECHA: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025 INFORME No. 61 CONTRATO No. 2017 DE 2024

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE LA MEZA "COOPTRAMEZA". PR61+0000 (ALTO SANTA INÉS) -PR91+0000 (ALTO LA LAGUNA)

RESEÑA FOTOGRÁFICA - PERIODO: 01/09/2025 AL 07/09/2025





Actividades de señalización con cinta de seguridad entre el PR 66+0000 al PR 67+0000





Actividades de limpieza de obras de drenaje transversal entre el PR 61+0000 al PR 66+0550





Actividades de limpieza de calzada entre el PR 65+0000 al PR 70+0000





Actividades de limpieza de cunetas entre el PR 64+0100 al PR 66+0550





Actividades de despeje de derrumbes entre el PR 66+0550 al PR 67+0200

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Ministerio de Transporte INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER INFORME SEMANAL DE AMV G4	VIAS NACIONALES HOJA No. 1 DE 1 FECHA: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025 INFORME No. 61 CONTRATO No. 2017 DE 2024

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y SERVICIOS MÚLTIPLES DE GIBRALTAR - "COOTRASERMULGIB" PR91+0000 (ALTO LA LAGUNA) -PR121+0000 (PUENTE COBARIA) LOTE 5

RESEÑA FOTOGRÁFICA - PERIODO: 01/09/2025 AL 07/09/2025





Actividades de tapahuecos con material de excavación entre el PR 92+0850 al PR 104+0630





Actividades de limpieza de cunetas entre el PR 91+0250 al PR 104+0630





Actividades de limpieza de encoles y descoles entre el PR 91+0250 al PR 104+0630





Actividades de limpieza de señales verticales y mojones entre el PR 94+0900 al PR 97+0000





Actividades de limpieza de señales verticales y mojones entre el PR 94+0900 al PR 97+0000

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Ministerio de Transporte INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER INFORME SEMANAL DE AMV G4	VIAS NACIONALES HOJA No. 1 DE 1 FECHA: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025 INFORME No. 61 CONTRATO No. 2017 DE 2024

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CUBARA BOYACÁ - "COOTRASCUB" PR 121+0000 (PUENTE COBARIA) -PR 150+0000 (SARAVENA) LOTE 7

RESEÑA FOTOGRÁFICA - PERIODO: 01/09/2025 AL 07/09/2025





Actividades de limpieza de defensas metálicas entre el 135+0781 al PR 140+0000





Actividades de limpieza de señales y mojones entre el PR 128+0000 al PR 141+0000





Actividades de limpieza de barandas entre el PR 129+0330 al PR 129+0360





Actividades de limpieza de cunetas entre el PR 135+0481 al PR 139+0000





Actividades de limpieza de obras de drenaje transversal entre el PR 130+0646 al PR 141+0000

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y SERVICIOS MÚLTIPLES PAMPLONESES EN ACCIÓN "COOTRASERMULPAC".
PR31+0000 (EL AMARILLÓN) - PR61+0000 (ALTO SANTA INÉS) LOTE 6

RESEÑA FOTOGRÁFICA - PERIODO: 08/09/2025 AL 14/09/2025







Actividades de limpieza de obras de drenaje transversal entre el PR 31+0000 al PR 32+0600







Actividades de limpieza de obras de drenaje transversal entre el PR 31+0000 al PR 32+0600







Actividades de limpieza de cunetas entre el PR 31+0000 al PR 50+0300







Actividades de rocería entre el PR 31+0000 al PR 34+0000







Actividades de tapahuecos con material de excavación entre el PR 50+0100 al PR 50+0300

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Ministerio de Transporte INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER INFORME SEMANAL DE AMV G4	VIAS NACIONALES CONSTRUCCIÓN HOJA No. 1 DE 1 FECHA: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 INFORME No. 62 CONTRATO No. 2017 DE 2024

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE LA MEZA "COOPTRAMEZA". PR61+0000 (ALTO SANTA INÉS) -PR91+0000 (ALTO LA LAGUNA)

RESEÑA FOTOGRÁFICA - PERIODO: 08/09/2025 AL 14/09/2025







Actividades de tapahuecos con material de excavación entre el PR 68+0000 al PR 87+0300







Actividades de limpieza de obras de drenaje transversal entre el PR 68+0000 al PR 90+0850







Actividades de limpieza de cunetas entre el PR 80+0000 al PR 90+0850







Actividades de limpieza de cunetas entre el PR 80+0000 al PR 90+0850







Actividades de poda, corte y retiro de árboles entre el PR 90+0000 al PR 90+0850

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Ministerio de Transporte INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER INFORME SEMANAL DE AMV G4	VIAS NACIONALES HOJA No. 1 DE 1 FECHA: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 INFORME No. 62 CONTRATO No. 2017 DE 2024

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y SERVICIOS MÚLTIPLES DE GIBRALTAR - "COOTRASERMULGIB" PR91+0000 (ALTO LA LAGUNA) -PR121+0000 (PUENTE COBARIA) LOTE 5

RESEÑA FOTOGRÁFICA - PERIODO: 08/09/2025 AL 14/09/2025





Actividades de limpieza de defensa metálica entre el PR 104+0500 al PR 106+0000







Actividades de limpieza de cunetas entre el PR 97+0000 al PR 102+0300





Actividades de limpieza de encoles y descoles entre el PR 97+0000 al PR 102+0300





Actividades de limpieza de señales verticales y mojones entre el PR 97+0000 al PR 102+0300






Actividades de limpieza de señales verticales y mojones entre el PR 97+0000 al PR 102+0300

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Ministerio de Transporte INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER INFORME SEMANAL DE AMV G4	VIAS NACIONALES HOJA No. 1 DE 1 FECHA: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 INFORME No. 62 CONTRATO No. 2017 DE 2024

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CUBARA BOYACÁ - "COOTRASCUB" PR 121+0000 (PUENTE COBARIA) -PR 150+0000 (SARAVENA) LOTE 7

RESEÑA FOTOGRÁFICA - PERIODO: 08/09/2025 AL 14/09/2025





Actividades de limpieza de obras de drenaje transversal entre el PR 140+0900 al PR 143+0500





Actividades de limpieza de obras de drenaje transversal entre el PR 140+0900 al PR 143+0500





Actividades de limpieza de defensas metálicas entre el 140+0405 al PR 142+0000





Actividades de limpieza de cunetas entre el PR 140+0561 al PR 141+0600





Actividades de limpieza de obras de drenaje transversal entre el PR 140+0900 al PR 143+0500

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Ministerio de Transporte INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER INFORME SEMANAL DE AMV G4	VIAS NACIONALES CONSORCIO HOJA No. 1 DE 1 FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 INFORME No. 63 CONTRATO No. 2017 DE 2024

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y SERVICIOS MÚLTIPLES PAMPLONESES EN ACCIÓN "COOTRASERMULPAC".
PR31+0000 (EL AMARILLÓN) - PR61+0000 (ALTO SANTA INÉS) LOTE 6

RESEÑA FOTOGRÁFICA - PERIODO: 15/09/2025 AL 21/09/2025







Actividades de limpieza de puentes entre el PR 33+0100 al PR 35+0300







Actividades de poda, corte y retiro de árboles entre el PR 44+0800







Actividades de limpieza de obras de drenaje transversal entre el PR 33+0100 al PR 35+0300







Actividades de rocería entre el PR 33+0100 al PR 35+0200







Actividades de limpieza de obras de drenaje transversal entre el PR 33+0100 al PR 35+0300

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Ministerio de Transporte INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER INFORME SEMANAL DE AMV G4	VIAS NACIONALES CONSTRUCCIÓN HOJA No. 1 DE 1 FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 INFORME No. 63 CONTRATO No. 2017 DE 2024

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE LA MEZA "COOPTRAMEZA". PR61+0000 (ALTO SANTA INÉS) -PR91+0000 (ALTO LA LAGUNA)

RESEÑA FOTOGRÁFICA - PERIODO: 15/09/2025 AL 21/09/2025





Atención de emergencias en el PR 89+0300





Actividades de rocería entre el PR 82+0000 al PR 84+0400





Actividades de limpieza de cunetas entre el PR 76+0000 al PR 89+0300





Actividades de limpieza de cunetas entre el PR 76+0000 al PR 89+0300





Actividades de limpieza de obras de drenaje transversal entre el PR 84+0000 al PR 84+0100

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Ministerio de Transporte INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER INFORME SEMANAL DE AMV G4	VIAS NACIONALES HOJA No. 1 DE 1 FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 INFORME No. 63 CONTRATO No. 2017 DE 2024

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y SERVICIOS MÚLTIPLES DE GIBRALTAR - "COOTRASERMULGIB" PR91+0000 (ALTO LA LAGUNA) -PR121+0000 (PUENTE COBARIA) LOTE 5

RESEÑA FOTOGRÁFICA - PERIODO: 15/09/2025 AL 21/09/2025







Actividades de limpieza de barandas en el PR 119+0277







Actividades de limpieza de cunetas entre el PR 108+0262 al PR 119+0277







Actividades de demarcación de marcas viales en el PR 119+0241







Actividades de tapahuecos con material de excavación entre el PR 104+0230 al PR 110+0650







Actividades de limpieza de cunetas entre el PR 108+0262 al PR 119+0277

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Ministerio de Transporte INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER INFORME SEMANAL DE AMV G4	VIAS NACIONALES HOJA No. 1 DE 1 FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 INFORME No. 63 CONTRATO No. 2017 DE 2024

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CUBARA BOYACÁ - "COOTRASCUB" PR 121+0000 (PUENTE COBARIA) -PR 150+0000 (SARAVENA) LOTE 7

RESEÑA FOTOGRÁFICA - PERIODO: 15/09/2025 AL 21/09/2025





Actividades de tapahuecos con material de excavación en el PR 135+0100





Actividades de limpieza y mantenimiento de puentes entre el PR 121+0180 al PR 122+0870





Actividades de limpieza de calzada entre el PR 120+0000 al PR 121+0100





Actividades de limpieza de obras de drenaje entre el PR PR 143+0500





Actividades de limpieza de obras de drenaje en el PR PR 143+0500

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Ministerio de Transporte INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER INFORME SEMANAL DE AMV G4	VIAS NACIONALES HOJA No. 1 DE 1 FECHA: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 INFORME No. 64 CONTRATO No. 2017 DE 2024

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y SERVICIOS MÚLTIPLES PAMPLONESES EN ACCIÓN "COOTRASERMULPAC".
PR31+0000 (EL AMARILLÓN) - PR61+0000 (ALTO SANTA INÉS) LOTE 6

RESEÑA FOTOGRÁFICA - PERIODO: 22/09/2025 AL 28/09/2025







Actividades de limpieza de cunetas entre el PR 32+0500 al PR 35+0200








Actividades de tapahuecos con material de excavación entre el PR 50+0800 al PR 60+0300



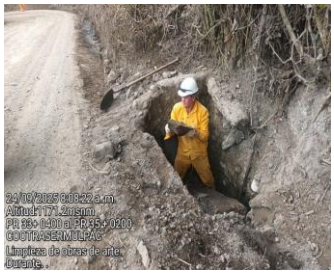




Actividades de limpieza de obras de drenaje transversal entre el PR 33+0400 al PR 60+0300







Actividades de señalizacón con cinta de seguridad entre el PR 60+0000 al PR 62+0200







Actividades de limpieza de encoles y descoles entre el PR 32+0500 al PR 35+0200

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Ministerio de Transporte INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER **INFORME SEMANAL DE AMV G4**	VIAS NACIONALES **HOJA No. 1 DE 1** **FECHA: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025** **INFORME No. 64** **CONTRATO No. 2017 DE 2024**

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE LA MEZA "COOPTRAMEZA". PR61+0000 (ALTO SANTA INÉS) -PR91+0000 (ALTO LA LAGUNA)

RESEÑA FOTOGRÁFICA - PERIODO: 22/09/2025 AL 28/09/2025







Actividades de limpieza de cunetas entre el PR 63+0000 al PR 87+0700







Actividades de rocería entre el PR 87+0000 al PR 87+0700







Actividades de señalización con cinta de seguridad entre el PR 85+0400 al PR 87+0000







Actividades de limpieza de cunetas entre el PR 63+0000 al PR 87+0700







Actividades de limpieza de obras de drenaje transversal entre el PR 83+0000 al PR 88+0270

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Ministerio de Transporte INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER INFORME SEMANAL DE AMV G4	VIAS NACIONALES CONSORCIO HOJA No. 1 DE 1 FECHA: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 INFORME No. 64 CONTRATO No. 2017 DE 2024

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y SERVICIOS MÚLTIPLES DE GIBRALTAR - "COOTRASERMULGIB" PR91+0000 (ALTO LA LAGUNA) -PR121+0000 (PUENTE COBARIA) LOTE 5

RESEÑA FOTOGRÁFICA - PERIODO: 22/09/2025 AL 28/09/2025






Actividades de limpieza de señales verticales y mojones entre el PR 115+0200 al PR 121+0000





Actividades de limpieza de cunetas entre el PR 112+0900 al PR 117+0150





Actividades de limpieza de encoles y descoles entre el PR 113+0850 al PR 114+0800





Actividades de tapahuecos con material de excavación entre el PR 112+0900 al PR 119+0600





Actividades de limpieza de defensa metálica entre el PR 114+0700 al PR 121+0000

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Ministerio de Transporte INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER INFORME SEMANAL DE AMV G4	VIAS NACIONALES CONSORCIO HOJA No. 1 DE 1 FECHA: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 INFORME No. 64 CONTRATO No. 2017 DE 2024

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CUBARA BOYACÁ - "COOTRASCUB" PR 121+0000 (PUENTE COBARIA) -PR 150+0000 (SARAVENA) LOTE 7

RESEÑA FOTOGRÁFICA - PERIODO: 22/09/2025 AL 28/09/2025







Actividades de limpieza de obras de drenaje transversal en el PR 123+0008 al PR 125+0620






Actividades de limpieza de puentes y pontones en el PR 123+0160 al PR 123+0750





Actividades de limpieza de encoles y descoles entre el PR 124+0750 al PR 127+0000





Actividades de limpieza de obras de drenaje transversal entre el PR 123+0008 al PR 125+0620







Actividades de limpieza de cunetas entre el PR 123+0160 al PR 125+0000

INFORME DE CUMPLIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PERIODO: 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025.

CONTRATO N0. 2017 DE 2024

ADMINISTRACIÓNVIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓNTERRITORIAL NORTE DE SANTANDER GRUPO AMV 4 LOTE 2.

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES

PAULA VANESA FLORES RINCON

CUBARA – BOYACA

SEPTIEMBRE 2025

Contenido

INTRODUCCION 4
OBJETIVOS 4
OBJETIVO GENERAL 4
OBJETIVOS ESPECIFICOS 4
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO 5
GENERALIDADES DEL CONTRATO 5
Localización del Sitio de Ejecución de los Trabajadores 5
ASPECTOS CONTRACTUALES 5
Aspectos Generales del Contrato N° 2017 DE 2024. 5
CAPACITACION 6
CHARLAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y SEGURIDAD VIAL 7
PAUSAS ACTIVAS Y/O CALISTENIA 8
ENTREGA Y/O REPOSICION DE EPP/DOTACION 8
INSPECIONES PREVENTIVAS 8
INSPECCION DE VEHICULOS 9
INSPECCIONES LOCATIVAS 11
INSPECCIONES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 13
EMERGENCIAS 13
SEÑALIZACION VIAL 16
HIDRATACION 17
COPASST 18
COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL (CCL) 18
LIDERAZGO 18
AUSENTISMO EG/AT/EL 18
ACCIDENTES/ENFERMEDADES LABORALES 18
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO SST A COOPERATIVAS DEL CONTRATO No. 2017 19

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y SERVICIOS MÚLTIPLES PAMPLONESES EN ACCION - MANTENIMIENTO RUTINARIO, VIA LA SOBERANIA RUTA 6604 - SECTOR LA LEGIA – SARAVENA - PR31+0000 (EL AMARILLON) - PR61+0000 (ALTO DE SANTA INES) LOTE 6.

Relación de personal 19

Gestión SST 20

Reporte de Accidentalidad 22

Reporte de Ausentismo Laboral 22

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE LA MEZA - MANTENIMIENTO RUTINARIO, VIA LA SOBERANIA RUTA 6604 - SECTOR LA LEGIA - SARAVENA - PR61+0000 (ALTO DE SANTA INES) - PR91+0000 (ALTO LA LAGUNA) LOTE 4.

Relación de personal 23

Gestión SST 24

Reporte de Accidentalidad 26

Reporte de Ausentismo Laboral 26

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y SERVICIOS MULTIPLES DE GIBRALTAR - MANTENIMIENTO RUTINARIO, VIA LA SOBERANIA RUTA 6604 - SECTOR LA LEGIA - SARAVENA - PR91+0000 (ALTO LA LAGUNA) – PR121+0000 (PUENTE COBARIA) LOTE 5.

Relación de personal 27

Gestión SST 28

Reporte de Accidentalidad 30

Reporte de Ausentismo Laboral 30

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CUBARA BOYACA C.T.A. - MANTENIMIENTO RUTINARIO, VIA LA SOBERANIA RUTA 6604 - SECTOR LA LEGIA - SARAVENA - PR121+0000 (PUENTE COBARIA) - PR150+0000 (SARAVENA) LOTE 7. 31

Relación de personal 31

Gestión SST 32

Reporte de Accidentalidad 34

Reporte de Ausentismo Laboral 34

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 35

CONCLUSION 35

RECOMENDACIONES 36

INTRODUCCION

El presente informe registra el cumplimiento e implementación de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) durante la ejecución del contrato N°2017 de 2024, que tiene por objeto la ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓNTERRITORIAL NORTE DE SANTANDER GRUPO AMV 4 LOTE 2. Cuyo Representante Legal es PAULA VANESA FLORES RINCON.
El presente Informe describe las evidencias de cumplimiento de las actividades operativas encaminadas a implementar medidas de prevención promoción en SST, el mes de abril 2025, dando cumplimiento a el DECRETO 1072 de 2015 y RESOLUCION 0312 de 2019 y demás normatividad vigente.

El área de SST, continuamente trabaja en el seguimiento y aseguramiento de las actividades operacionales, control y verificación de los controles, el bienestar integral de los trabajadores, se hace necesario adoptar medidas de autocuidado, protección y prevención.

El periodo comprendido de este informe es del 01 al 30 de septiembre de 2025.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Ejecutar las actividades en caminadas en el desarrollo en SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO del contrato N.º 2017 DE 2024, cuyo objeto es ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓNTERRITORIAL NORTE DE SANTANDER GRUPO AMV 4 LOTE 2.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Cumplir con la legislación de Seguridad y Salud en el Trabajado, en la ejecución de las actividades a desarrollar
- Realizar supervisión y control a los preoperacionales de los equipos y herramientas empleados por las cooperativas para la ejecución de las respectivas actividades.
- Identificar los riesgos y peligros presentes en los corredores viales donde se llevan a cabo las actividades para el personal directo y personal de las cooperativas.

- Implementar controles necesarios a los peligros identificados, para la prevención de incidentes, accidentes y enfermedades laborales.
- Identificar los Riesgo locativo por sistemas y medios de almacenamiento,
- condiciones de orden y aseo.
- Realizar inspecciones periódicas internas a las cooperativas, con la finalidad de verificar las condiciones tanto del personal como de equipos, herramientas y vehículos asignados para la labor.

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

GENERALIDADES DEL CONTRATO

Localización del Sitio de Ejecución de los Trabajadores

El contrato 2017, se desarrolla en el departamento Norte de Santander en las siguientes vías:

Ruta 6604: Vía La Soberanía (La Legía – Saravena) - iniciando en el sector PR31+0000 al PR 150+0000.

ASPECTOS CONTRACTUALES

Aspectos Generales del Contrato N° 2017 DE 2024.

CONTRATO No.	2017 de 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER GRUPO AMV 4 LOTE 2.
ENTIDAD CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS “INVIAS”.

CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES
SUPERVISOR DESIGNADO PARA EL CONTRATO:	ING.LEONEL VALERO ESCALANTE
RESIDENTE:	ING. JUAN MANUEL ROJAS CARRILLO
TIEMPO DE EJECUCION DE CONTRATO:	29 MESES, EN TODO CASO NO PUEDE EXCEDER DEL 31 DE JULIO DE 2026
FECHA DE INICIO:	04 DE JULIO DE 2024
FECHA DE ENTREGA ESTIMADA:	31 DE JULIO DE 2026

CAPACITACION

El Consorcio Vías Nacionales, aplica las actividades de capacitación para todos los trabajadores vinculados al contrato 2017 de 2024 directos y de las cooperativas, teniendo como propósito el desarrollo de habilidades y capacidades de todo el personal con el fin de formar un talento humano educado en los conocimientos adquiridos en SST, fortaleciendo por medio de la prevención y promoción la salud, el auto cuidado, mitigando los accidentes y enfermedades laborales. Al mismo tiempo, la participación en cada una de las capacitaciones, busca mejorar el clima laboral, la salud física, mental, dando cumplimiento al cronograma de capacitación establecido.

Los temas tratados en la capacitación general mensual del mes de septiembre fueron:

- Salud Mental.
- Bienestar Emocional.
- Regla de los 333.





Salud Mental





Bienestar Emocional





Regla de los 333

CHARLAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y SEGURIDAD VIAL

Se realizan charlas de seguridad y salud en el Trabajo y Seguridad Vial, durante el periodo con el objetivo de que el personal del Consorcio Vías Nacionales y el personal de las cooperativas, cuenten con mayor conocimiento de los requisitos legales en Seguridad y Salud en el Trabajo, así como de los controles necesarios a

implementar de acuerdo a las actividades y tareas a desarrollar, y generar autocuidado para prevenir incidentes, accidentes y enfermedades laborales.

PAUSAS ACTIVAS Y/O CALISTENIA

Durante el periodo, se realizaron ejercicios de estiramiento y calentamiento, antes de iniciar las actividades y durante el desarrollo de estas; para mejorar la salud física y mental de los colaboradores y prevenir lesiones musculares y posibles desordenes musculoesqueléticos y así mismo disminuir la posible presencia de factores psicosociales. De igual manera, los colabores tienen autonomía para tomar su tiempo de pausa activa sin exceder el tiempo estimado de acuerdo a las actividades desarrolladas.



Pausas activas/Calistenia

ENTREGA Y/O REPOSICION DE EPP/DOTACION

No se realizaron en el periodo.

INSPECIONES PREVENTIVAS

El área SST, en cumplimiento a la implementación del SG-SST, realiza inspecciones durante el periodo, con la finalidad de verificar las condiciones de las áreas, equipos, herramientas, entre otros; que garanticen la correcta funcionalidad durante la ejecución de las actividades en el Contrato 2017 de 2024.

En cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, resolución 0312 de 2019 y demás Normativa vigente en materia de Seguridad y salud en trabajo en Colombia, el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo cuyo objetivo principal es Divulgar y sensibilizar las normas en seguridad y salud en el trabajo, para facilitar el control de los factores de riesgo y prevenir la aparición de Accidentes y Enfermedades de origen laboral.

Las actividades descritas a continuación corresponden del día 01 al 30 de septiembre del 2025, principalmente a labores de seguimiento, control y verificación al cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de la Adm. Vial y las diferentes cooperativas.

- Durante el mes no se presentó ningún incidente ni accidente de trabajo se continúa sensibilizando en el autocuidado.
- Se continúan realizando las inspecciones de seguridad por los operarios inspecciones a los elementos de atención de emergencias camilla, botiquín, extintor, EPP, vehículo, herramienta menor, guadaña, de adjuntan los formatos ya diligenciados en la carpeta del SG-SST se deja registro fotográfico de las inspecciones de seguridad y la señalización temporal instalada en el área de trabajo.
- Se realiza seguimiento a las incapacidades médica y permisos a citas médicas de los colaboradores.
- Se recuerda la importancia continuar con el uso de los elementos de protección personal, señalización de seguridad e informar cualquier eventualidad que se llegue a presentar durante las actividades laborales y en los turnos de emergencia.

INSPECCION DE VEHICULOS

Se realiza inspección de vehículo diariamente por parte de los conductores y se hace acompañamiento por parte de SST, para validar las condiciones de estos; al igual que los elementos de emergencias asignados a cada uno de las camionetas.

Para las actividades a realizar en este contrato, requiere del uso de vehículos automotor con disponibilidad cumpliendo los diferentes traslados en sus rutas comprendidas anteriormente.

Por parte de área SST, se realiza seguimiento a los preoperacionales diariamente y a el cumplimiento de los mantenimientos preventivos y correctivos de estos vehículos.

a continuación, se relacionan los vehículos presentes en el contrato del presente informe

TIPO DE VEHICULO	MARCA	MODELO	PLACA	SOAT	RTM
Camioneta	RENAULT DUSTER OROCH	2020	GZL-184	14/02/2026	17/02/2026
Camioneta	NISSAN FRONTIER	2024	NMT-309	21/06/2026	25/06/2029

Como medidas preventivas que se tomaron en el consorcio Vías Nacionales 2025, para los recorridos y transporte del personal tenemos:

- Documentación de vehículos: Estos vehículos cuentan con su correspondiente tarjeta de propiedad, SOAT, tecno mecánica vigente.
- Inspección preoperacional de los vehículos: se continua con el diligenciamiento diario de preoperacionales de estos vehículos, antes de iniciar su jornada laboral.
- Kit de emergencias: estos vehículos cuentan con su botiquín y extintor en requerido para atender alguna emergencia, así como la disponibilidad de 10 conos.



Inspección de Vehículo Adm-Vial



Inspección de Vehículo de Cooperativas

INSPECCIONES LOCATIVAS

Con la finalidad de validar las áreas de la oficina asignada a el Contrato 2017 de 2024, se realiza validación de estas para verificar el estado y las condiciones de trabajo.







Instalación señalización informativa









Inspección de áreas Locativas

INSPECCIONES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

El área SST del Consorcio Vías Nacionales, realiza inspección y verificación de las herramientas solicitadas en el Anexo Técnico, y el estado actual de estas; con el objetivo de prevenir condiciones inseguras que puedan afectar la salud de los colaboradores.



Inspección de herramientas y equipos - Cooperativas

EMERGENCIAS

El grupo de trabajo del Consorcio Vías Nacionales, cuenta con los siguientes elementos de emergencias: botiquín, camilla, extintores; los cuales se encuentran en buenas condiciones para ser usados en caso de presentar alguna eventualidad.

Al mismo tiempo, se cuenta con la conformación de la brigada de emergencia, con los integrantes a continuación relacionados:

NOMBRE DE INTEGRANTE	BRIGADITA
Ana Xiomara Fuentes A	Primeros Auxilios
Sandra Carolina Moreno C	Evacuación
Mireya Silva Martínez	Control Incendios

Durante el periodo se realiza la socialización de las responsabilidades

	
Inspección de Extintor y Herramientas – Camioneta GZL-184 – AMV4	Inspección de Extintor y Herramientas – Camioneta NMT-309 – AMV4
	
Inspección de Botiquín – Camioneta GZL-184 – AMV4	Inspección de Botiquín – Camioneta NMT-309 – AMV4

	
Inspección Botiquín – Oficina AMV-3	Inspección Extintor – Oficina AMV-3
	
Inspección de Botiquín – Cooperativa Cootrasermulpac	Inspección de Extintor – Cooperativa Cootrasermulpac
	
Inspección de Botiquín – Cooperativa Cooptrameza	Inspección de Extintor – Cooperativa Cooptrameza

	
Inspección de Botiquín – Cooperativa Cootrasermulgib	Inspección de Extintor – Cooperativa Cootrasermulgib
	
Inspección de Botiquín – Cooperativa Cootrascub	Inspección de Extintor – Cooperativa Cootrascub

SEÑALIZACION VIAL

En cumplimiento a lo establecido en el Manual de Invias y los requerimientos establecidos en el anexo técnico del contrato en ejecución, se implementa la señalización para la seguridad de los colaboradores durante la ejecución de las tareas en la vía.

	
Instalación de cinta reflectiva a conos y limpieza de señales en la vía	
	
Señalización de áreas de trabajo sobre la RUTA	Señalización de áreas de trabajo de Cooperativas

HIDRATACION

El personal de AMV4, cuenta con agua potable para hidratación, cuando lo deseen y/o necesiten.

COPASST

En cumplimiento a la Resolución 2013 de 1986, se realiza reunión del COPASST del mes de septiembre 2025, con la finalidad de tratar temas necesarios para la gestión e implementación de controles de seguridad y salud en el Trabajo para garantizar las actividades tanto administrativas como operativas. Se cuanta con acompañamiento de inspector SST durante la reunión.

Se realiza socialización de las responsabilidades SST de los miembros del COPASST.

COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL (CCL)

En el periodo, no se presentó ninguna novedad.

LIDERAZGO

Consorcio Vías Nacionales, realiza actividades lúdicas que lleva como título “ESTILOS DE VIDA SALUDABLES EN EL TRABAJO” con la finalidad de generar un vínculo como equipo de trabajo y dar pautas para la mejora en la comunicación asertiva durante la planeación y ejecución de las actividades y a su vez fortalecer el liderazgo.

AUSENTISMO EG/AT/EL

Durante el periodo de eptiembre 2025, la AMV4 no reporta ausentismo por enfermedad general, accidente y enfermedad laboral.

Nombre	Código	Descripción de diagnóstico o permiso	Días de permiso	FECHA
-	-	-	-	-

ACCIDENTES/ENFERMEDADES LABORALES

Durante el periodo la empresa AMV- Grupo 4, no se presentó accidente laboral y no presento enfermedades laborales.

MES	ACIDENTE LABORAL	ENFERMEDAD LABORAL
SEPTIEMBRE	0	0
TOTAL	0	0

SUPERVISION Y SEGUIMIENTO SST A COOPERATIVAS DEL CONTRATO No. 2017

- **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y SERVICIOS MÚLTIPLES PAMPLONESES EN ACCION - MANTENIMIENTO RUTINARIO, VIA LA SOBERANIA RUTA 6604 - SECTOR LA LEGIA – SARAVENA - PR31+0000 (EL AMARILLON) - PR61+0000 (ALTO DE SANTA INES) LOTE 6.**

Relación de personal

ITEM	NOMBRE	CARGO	CELUALR
1	HUMBERTO RIVERO GUTIERREZ	R. legal / Operario	32085408772
2	JESUS GELVEZ CONTRERAS	Operario	3219664065
3	JUAN ANTONIO GRANADOS SANTAFE	Operario	3113261297
4	JOSE ARNULFO BECERRA GONZALEZ	Operario	3104828498
5	YEISON BAUNEY DURAN BARAJAS	Operario	3142396607
6	OSMAN RENE CONTRERAS	Operario	3222845175
7	HUGO ALIRIO RAMON	Operario	3222911459
8	YAMID ALBEIRO RAMIREZ RAMIREZ	Operario	3112575582
9	ARNULFO ORTIZ CAICEDO	Operario	3142149828
10	VICTOR MANUEL CACERES GONZALEZ	Operario	3227095027
11	HUGO CELSO JIMENEZ CAMARGO	Operario	3102114930

Gestión SST

La Cooperativa de COOTRASERMULPAC implementa el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, bajo la normatividad vigente, de acuerdo con las tareas desarrolladas durante el periodo de septiembre 2025.

Se realiza acompañamientos y verificación a las cooperativas por parte de la inspectora SST del Consorcio Vías Nacionales, con la finalidad de validar cumplimiento a:

- Uso adecuado y constante de EPP y dotación
- Capacitación de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Charlas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Seguridad Vial
- Realización de calistenia
- Instalación de señalización de aproximación y conos en las áreas de trabajo
- Uso adecuado de herramientas manuales y equipos a utilizar
- Elementos de emergencias
- Verificación de planilla de seguridad social vigente





Pausas activas-Calistenia





Inspección de herramientas y equipos

	
Inspección de vehículo	
	
Inspección de elementos de emergencia	
	
Señalización de área de trabajo	

Reporte de Accidentalidad

Durante el periodo de SEPTIEMBRE 2025, la Cooperativa COOTRASERMULPAC no reporta accidentes laborales.

MES	ACIDENTE LABORAL	ENFERMEDAD LABORAL
SEPTIEMBRE	0	0
TOTAL	0	0

Reporte de Ausentismo Laboral

Durante el periodo de SEPTIEMBRE 2025, la Cooperativa COOTRASERMULPAC no reporta ausentismo por enfermedad general, accidente y enfermedad laboral.

Nombre	Descripción de diagnóstico o permiso	Días de incapacidad o permiso	FECHA

- **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE LA MEZA - MANTENIMIENTO RUTINARIO, VIA LA SOBERANIA RUTA 6604 - SECTOR LA LEGIA - SARAVENA - PR61+0000 (ALTO DE SANTA INES) - PR91+0000 (ALTO LA LAGUNA) LOTE 4.**

Relación de personal

ITEM	NOMBRE	CARGO	CELUALR
1	SANTOS RINCON CACERES	R/ Legal Operario	3203857428
2	CIPRIANO VARGAS RANGEL	Operario	3144421062
3	GABRIEL JAIMES SUAREZ	Operario	3227060524
4	MANUEL BUSTOS SANTOA	Operario	3223018367
5	ARMANDO AGUILLON JAIMES	Operario	3203857428
6	LUIS FRANCISCO AGUILLON RINCON	Operario	3212901757
7	JOSE RAFAEL CADENA	Operario	3203724439
8	JOSE ALEXANDER SANTAFE PARADA	Operario	3202749508
9	EYBAR ARLEY AGUILLON	Operario	3224426952
10	GENRY RAMON VALENCIA	Operario	3126224388
11	ANGEL RUBIEL RINCON JAIMES	Operario	3112436098

Gestión SST

La Cooperativa de COOPTRAMEZA implementa el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, bajo la normatividad vigente, de acuerdo con las tareas desarrolladas durante el periodo de septiembre 2025.
Se realiza acompañamientos y verificación a las cooperativas por parte de la inspectora SST del Consorcio Vías Nacionales, con la finalidad de validar cumplimiento a:

- Uso adecuado y constante de EPP y dotación
- Capacitación de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Charlas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Seguridad Vial
- Realización de calistenia
- Instalación de señalización de aproximación y conos en las áreas de trabajo
- Uso adecuado de herramientas manuales y equipos a utilizar
- Elementos de emergencias
- Verificación de planilla de seguridad social vigente




Pausas activas-Calistenia





Inspección de herramientas

	
Inspección de vehículo	
	
Inspección de elementos de emergencia	
	
Señalización de área de trabajo	

Reporte de Accidentalidad

Durante el periodo de SEPTIEMBRE 2025, la Cooperativa COOPTRAMEZA no reporta accidentes laborales.

MES	ACIDENTE LABORAL	ENFERMEDAD LABORAL
SEPTIEMBRE	0	0
TOTAL	0	0

Reporte de Ausentismo Laboral

Durante el periodo de SEPTIEMBRE 2025, la Cooperativa COOPTRAMEZA reporta ausentismo por calamidad familiar y permiso de tipo personal.

Nombre	Descripción de diagnóstico o permiso	Días de incapacidad o permiso	FECHA
Cipriano Vargas Rangel	Cita Medica	1 día	03/09/2025
Luis Francisco Aguillón Rincón	Cita Medica	2 días	04/09/2025 05/09/2025
Luis Francisco Aguillón Rincón	Rx Tórax	1 día	29/09/2025
Gabriel Jaimes Suarez	Calamidad Familiar	1 día	22/09/2025

- **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y SERVICIOS MULTIPLES DE GIBRALTAR - MANTENIMIENTO RUTINARIO, VIA LA SOBERANIA RUTA 6604 - SECTOR LA LEGIA - SARAVENA - PR91+0000 (ALTO LA LAGUNA) – PR121+0000 (PUENTE COBARIA) LOTE 5.**

Relación de personal

ITEM	NOMBRE	CARGO	CELULAR
1	JOSE ANANIAS SANTOS CONTRERAS	R/ Legal Operario	3112111163
2	CARLOS JULIO ANGARITA CHIVATA	Operario	3227491713
3	OSCAR PEREZ VALENCIA	Operario	3144247790
4	LUIS AMANDO GONZALEZ COBARIA	Operario	3104166019
5	JORMAN ELADIO SANTOS CONTRERAS	Operario	3222773370
6	PEDRO RAFAEL LOPEZ VILLAMIZAR	Operario	3507282690
7	RUBEN DARIO GONZALEZ ALBARRACIN	Operario	3222226814
8	EDWIN ALBEIRO MENDEZ ANGARITA	Operario	3132636452
9	FERNANDO CADENA MONTAÑEZ	Operario	3213245098
10	CARLOS FABIAN ESTUPIÑAN ALBARRACIN	Operario	3133057227
11	SILVINO BECERRA MONCADA	Operario	3213579827

Gestión SST

La Cooperativa de COOTRASERMULGIB implementa el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, bajo la normatividad vigente, de acuerdo con las tareas desarrolladas durante el periodo de septiembre 2025.

Se realiza acompañamientos y verificación a las cooperativas por parte de la inspectora SST del Consorcio Vías Nacionales, con la finalidad de validar cumplimiento a:

- Uso adecuado y constante de EPP y dotación
- Capacitación de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Charlas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Seguridad Vial
- Realización de calistenia
- Instalación de señalización de aproximación y conos en las áreas de trabajo
- Uso adecuado de herramientas manuales y equipos a utilizar
- Elementos de emergencias
- Verificación de planilla de seguridad social vigente





Pausas activas-Calistenia





Inspección de herramientas y equipos

<table>
<tr><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td colspan="2">Inspección de vehículo</td></tr>
<tr><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td colspan="2">Inspección de elementos de emergencia</td></tr>
<tr><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td colspan="2">Señalización de área de trabajo</td></tr>
</table>

Reporte de Accidentalidad

Durante el periodo de SEPTIEMBRE 2025, la Cooperativa COOTRASERMULGIB no reporta accidentes laborales.

MES	ACIDENTE LABORAL	ENFERMEDAD LABORAL
SEPTIEMBRE	0	0
TOTAL	0	0

Reporte de Ausentismo Laboral

Durante el periodo de SEPTIEMBRE 2025, la Cooperativa COOTRASERMULGIB no reporta ausentismo por enfermedad general, accidente y enfermedad laboral.

Nombre	Descripción de diagnóstico o permiso	Días de incapacidad o permiso	FECHA
Oscar Pérez Valencia	Conducto Odontológico	1 día	02/09/2025
Oscar Pérez Valencia	Conducto Odontológico	1 día	12/09/2025
José Ananías Santos Contreras	Acompañamiento padre 3ra edad (Cita Med)	1 día	10/09/2025 11/09/2025
José Ananías Santos Contreras	Acompañamiento padre 3ra edad (Cita Med)	1 día	16/09/2025
José Ananías Santos Contreras	Acompañamiento padre 3ra edad (Cita Med)	1 día	23/09/2025

- **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CUBARA BOYACA C.T.A. - MANTENIMIENTO RUTINARIO, VIA LA SOBERANIA RUTA 6604 - SECTOR LA LEGIA - SARAVENA - PR121+0000 (PUENTE COBARIA) - PR150+0000 (SARAVENA) LOTE 7.**

Relación de personal

ITEM	NOMBRE	CARGO	CELULAR
1	ELGAR GAMBOA JAIMES	R/ Legal Operario	3205626409
2	ALFREDO BECERRA MONTERREY	Operario	3133266424
3	ELKIN MICHEL SANTAMARIA CHIVATA	Operario	3112873464
4	JESUS MARIA CASTRO BOTIA	Operario	3143938147
5	ALVARO BARROSO DUARTE	Operario	3102093398
6	JESUS ANTONIO CRUCES VARGAS	Operario	3204246876
7	MISAEL REINA GODOY	Operario	3108661538
8	REYNALDO ANGARITA	Operario	3102074867
9	RAUL GUTIERREZ RODRIGUEZ	Operario	3144386134
10	GEISSON ALEXANDER LASSO CHAVEZ	Operario	3206750528
11	CARMEN JANNET RIVERO MALDONADO	Operario	3113778962

Gestión SST

La Cooperativa de COOTRASCUB implementa el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, bajo la normatividad vigente, de acuerdo con las tareas desarrolladas durante el periodo de septiembre 2025.

Se realiza acompañamientos y verificación a las cooperativas por parte de la inspectora SST del Consorcio Vías Nacionales, con la finalidad de validar cumplimiento a:

- Uso adecuado y constante de EPP y dotación
- Capacitación de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Charlas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Seguridad Vial
- Realización de calistenia
- Instalación de señalización de aproximación y conos en las áreas de trabajo
- Uso adecuado de herramientas manuales y equipos a utilizar
- Elementos de emergencias
- Verificación de planilla de seguridad social vigente





Pausas activas-Calistenia





Inspección de herramientas y equipos





Inspección de vehículo





Inspección de elementos de emergencias





Señalización de área de trabajo

Reporte de Accidentalidad

Durante el periodo de SEPTIEMBRE 2025, la Cooperativa COOTRASCUB no reporta accidentes laborales.

MES	ACIDENTE LABORAL	ENFERMEDAD LABORAL
SEPTIEMBRE	0	0
TOTAL	0	0

Reporte de Ausentismo Laboral

Durante el periodo de SEPTIEMBRE 2025, la Cooperativa COOTRASCUB reporta ausentismo por enfermedad general y permiso de tipo personal

Nombre	Descripción de diagnóstico o permiso	Días de permiso	FECHA
Jesús Antonio Cruces Vargas	Incapacidad Angioplastia	20 días	20/08/2025 08/09/2025
Jesús Antonio Cruces Vargas	Incapacidad Angioplastia	15 días	09/09/2025 21/09/2025
Jesús Antonio Cruces Vargas	Incapacidad Angioplastia	10 días	22/09/2025 01/10/2025
Reynaldo Angarita	Cita Ortopedista	1 días	17/09/2025
Misael Reina Godoy	Cita Oncología - Bogotá	3 día	19/09/2025 21/09/2025

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSION

Durante el mes de septiembre de 2025 se llevaron a cabo diversas actividades orientadas al seguimiento, control y verificación de las disposiciones establecidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Se continuó con la aplicación de las medidas de bioseguridad, así como con la verificación de las condiciones de señalización preventiva y la recolección de evidencia fotográfica de las inspecciones de seguridad desarrolladas en los diferentes frentes de trabajo.

En este periodo no se reportaron incidentes ni accidentes laborales, lo cual refleja el compromiso de los trabajadores en la adopción de prácticas seguras y en el cumplimiento de las normas establecidas. A su vez, se reforzó la sensibilización en autocuidado, recordando la relevancia del uso de elementos de protección personal, la adecuada señalización de las áreas y la notificación oportuna de cualquier eventualidad.

De igual manera, se mantuvo el control sobre las inspecciones de equipos y recursos de emergencia, tales como camilla, botiquín, extintores, vehículos de apoyo, herramientas menores y equipos de corte, garantizando su disponibilidad y correcto estado.

En el ámbito administrativo, se realizó seguimiento a incapacidades médicas y permisos personales o por salud de los colaboradores, con el propósito de llevar un control oportuno y dar continuidad a las labores sin afectar la operación.

Finalmente, se dio continuidad al acompañamiento en el diseño e implementación del SG-SST en las cooperativas, con el objetivo de salvaguardar la salud y el bienestar de los trabajadores, así como prevenir posibles sanciones derivadas de incumplimientos normativos.

RECOMENDACIONES

1. Se recomienda a las cooperativas dar cumplimiento a el Manual de Señalización decreto 1885 de 2015, y adecuar las señales de acuerdo a lo establecido.
2. Se recomienda a las cooperativas la designación de roles como lo es el personal conductor y de esta manera dar cumplimiento a la normatividad de PESV de acuerdo a los estándares mencionados en la Resolución 20223040040595 de 2022.
3. Se recomienda a toda la personal directo y de las cooperativas disponibilidad a los cambios para las mejoras planeadas durante el año 2025, en cumplimiento a los requisitos legales de Seguridad y Salud en el Trabajo.
4. Se recomienda a personal SST de las cooperativas implementar los controles necesarios para las actividades con mayor frecuencia.
