
Cronograma para las Obras y Actividades necesarias para la Conservación de Espacio Público y Ciclo Infraestructura en Bogotá D.C. - Grupo 1, Grupo 2, Grupo 3, Grupo 4, Grupo 5 y Grupo 6

ID	EDT	Nombre de la Actividad	Plazo
0		**Cronograma de Obra - Conservación Espacio Público y Ciclo Infraestructura en Bogotá D.C.**	
1	**1**	**CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA - Grupos 1 al 6**	**26 MESES**
2	***1.1***	***Acta de Inicio***	***HITO***
3	**1.2**	**ACTIVIDADES PREVIAS**	**3 MESES**
4	1.2.1	Visita de Obra	1 sem
5	1.2.2	Recopilación de Información	½ mes
6	1.2.3	Otras actividades requeridas	1 sem
7	**1.2.4**	**Documentos Preliminares**	**2½ meses**
8	1.2.4.1	Plan Detallado de Inversión del Anticipo	5 días
9	1.2.4.2	Relación de Equipo Mínimo	5 días
10	1.2.4.3	Desglose del AIU ofertado	5 días
11	1.2.4.4	Cronograma General de ejecución	5 días
12	1.2.4.5	Hojas de vida del recurso humano mínimo requerido para el inicio de la ejecución	½ mes
13	1.2.4.6	Programa de manejo Ambiental en Obra – MAO	½ mes
14	1.2.4.7	Planes de Manejo de Tránsito (PMT)	2 meses
15	1.2.4.8	Plan Anual de Caja – PAC	2 meses
16	1.2.4.9	Plan de Calidad de Obra	2 meses
17	1.2.4.10	APU's de las actividades a ejecutar	2 meses
18	1.2.4.11	Plan de diálogo ciudadano y comunicación estratégica	2 meses
19	1.2.4.12	Plan de Gestión Integral de residuos de construcción y demolición (RCD)	2 meses
20	1.2.4.13	Alcance, metodología y enfoque del Contrato de Obra	2 meses
21	1.2.4.14	Cronograma detallado, flujo de caja y Presupuesto de la Etapa de Conservación	1 mes
22	**1.2.5**	**Actividades de Diagnóstico (vigencia 2025)**	**2½ meses**
23	1.2.5.1	Elaboración Diagnósticos del 50% de los tramos preseleccionados	2 sem
24	1.2.5.2	Revisión y aprobación de diagnósticos por la Interventoría del 50%	1 sem
25	*1.2.5.3*	*Diagnósticos aprobados del 50% de los tramos preseleccionados*	*Hito*
26	1.2.5.4	Elaboración Diagnósticos del 50% restante de los tramos preseleccionados (incluye informe y presupuesto	1 ½ meses
27	1.2.5.5	Revisión y aprobación de diagnósticos por la Interventoría 50% Restante	½ mes
28	*1.2.5.6*	*Diagnósticos aprobados del 50% restante de los tramos preseleccionados*	*Hito*
29	**1.2.6**	**Diseños de alternativa de Intervención, según Diagnósticos**	**2 meses**
30	1.2.6.1	Elaboración de los diseños de alternativa de intervención para rehabilitación y/o reconstrucción	1 ½ meses
31	1.2.6.2	Revisión y aprobación de diseños de alternativa de intervención por la Interventoría	½ mes
32	*1.2.6.3*	*Diseño de alternativa de Intervención (incluye informe y presupuesto preliminar)*	*Hito*
33	1.2.6.4	Actividades de Levantamiento Geométrico	½ mes
34	*1.2.7*	*Fin Actividades Previas*	*Hito*
35	**1.3**	**ACTIVIDADES DE OBRA**	**22 meses**
36	*1.3.1*	*Inicio de Obra*	*Hito*
37	1.3.2	Mantenimiento Rutinario	22 meses
38	1.3.3	Mantenimiento Periódico	22 meses
39	1.3.4	Rehabilitación y/o Reconstrucción	18 meses
40	**1.3.5**	**ACTIVIDADES DE EMERGENCIA y/o ACTIVIDADES ESPECIALES**	**3 meses**
41	*1.3.6*	*Recibo Final de Obra*	*Hito*
42	**1.4**	**RECIBO DE OBRA**	**1 MES**
43	**1.5**	**COMPONENTES DE GESTIÓN**	**22 meses**
44	1.5.1	Gestión Social	22 meses
45	1.5.2	Gestión Ambiental	22 meses
46	1.5.3	Gestión Seguridad y salud en el Trabajo	22 meses
47	1.5.4	Gestión Tránsito	22 meses
48	*1.5.5*	*Fin componentes de Gestión*	*Hito*
49	***1.6***	***FIN DEL CONTRATO***	***HITO***

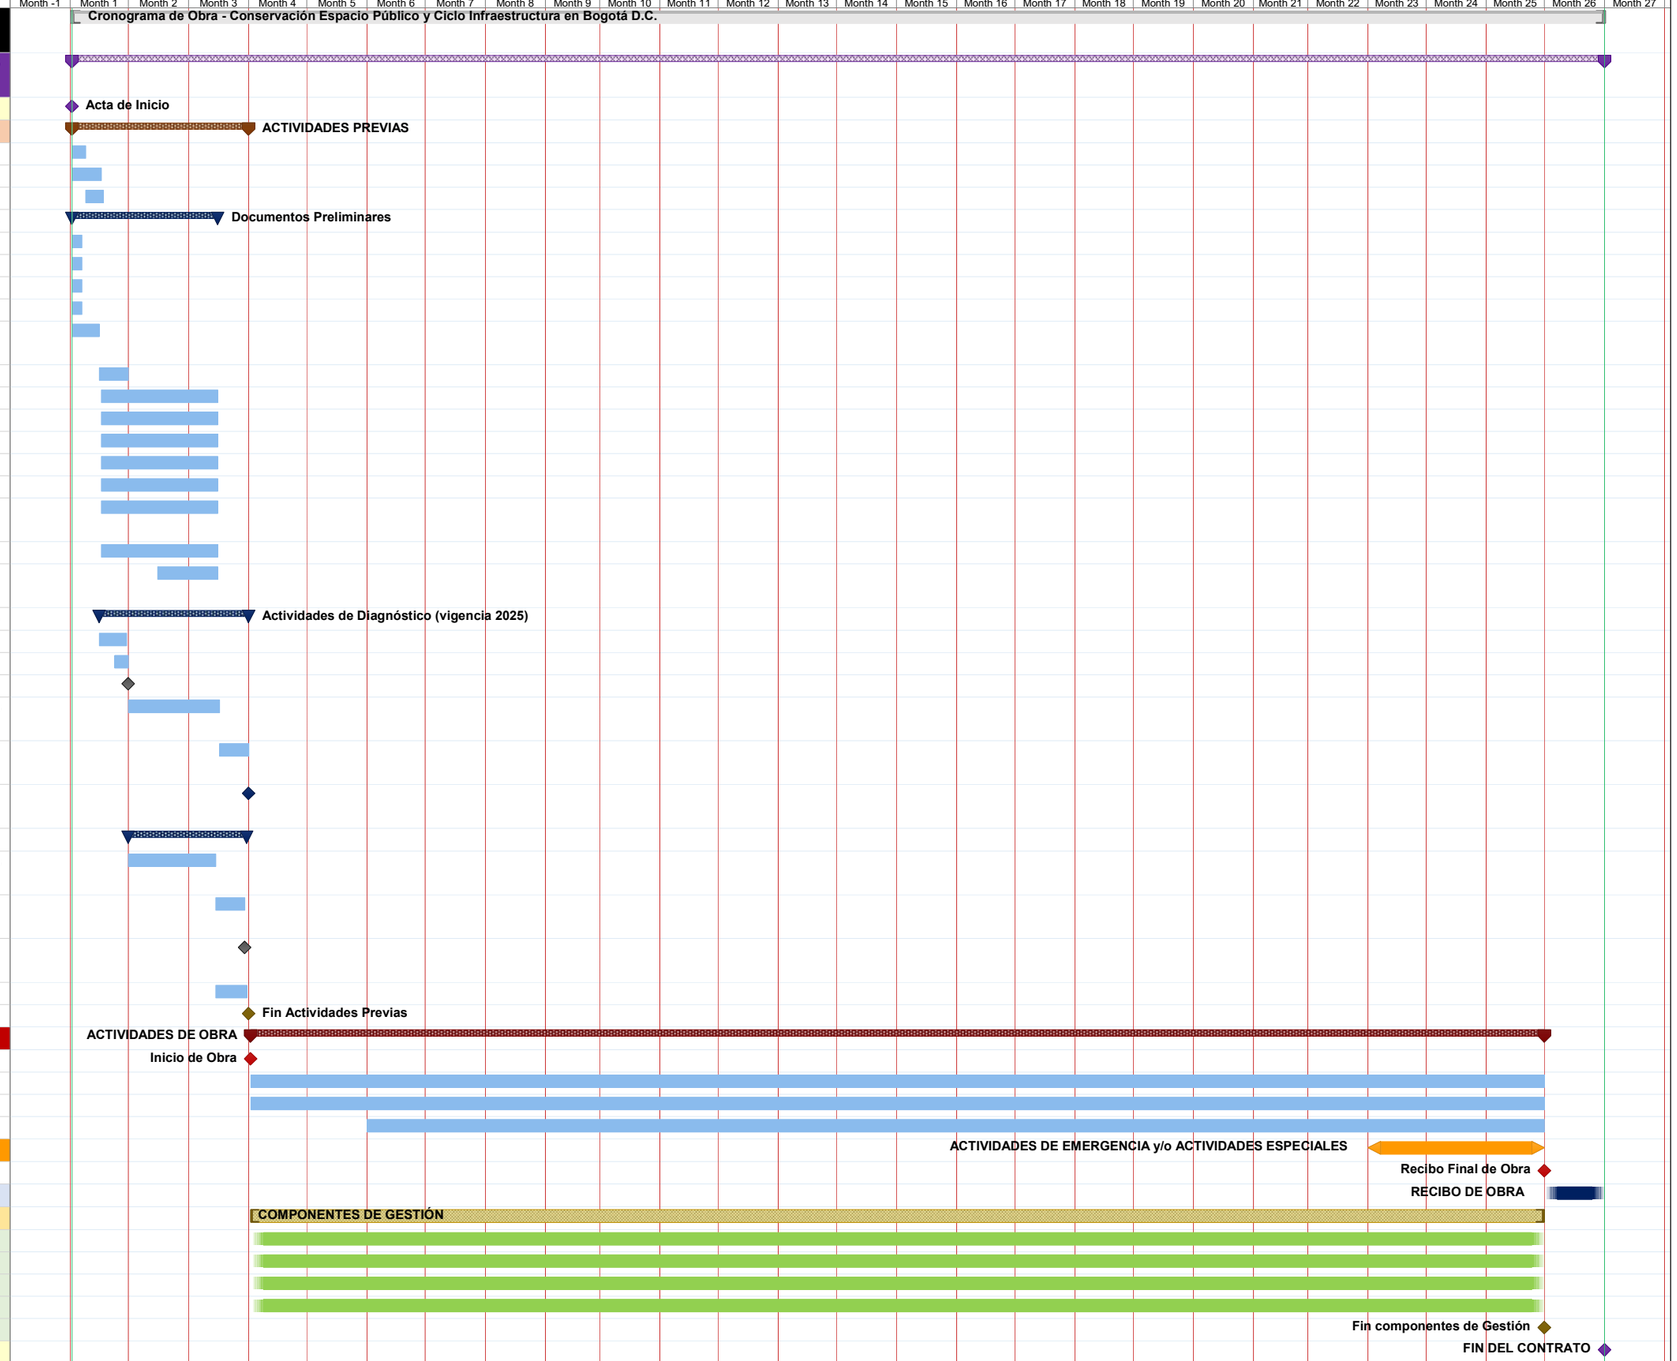

Proyecto: Conservación de Espacio Público
Plazo: 26 MESES
Valor Obra: $ 244.220.141.796

Tarea, División, Hito, Resumen, Resumen del proyecto, Tarea inactiva, Hito inactivo, Resumen inactivo, Tarea manual, solo duración, Informe de resumen manual, Resumen manual, solo el comienzo, solo fin, Tareas externas, Hito externo, Fecha límite, Progreso, Progreso manual
