Informe de Actividades
CONVENIO SOLIDARIO CS-002-2025
Municipio de Puerto Tejada - Cauca
Consejo Comunitario Río Palo

Objeto: AUNAR ESFUERZOS A TRAVÉS DE CONVENIO SOLIDARIO DE OBRA PARA EL ENLUCIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DOS AGUAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA, CAUCA.

Fecha de Elaboración: octubre 10 de 2025

Resumen de Actividades Ejecutadas:

En cumplimiento del CONVENIO SOLIDARIO CS-002-2025, suscrito entre el Municipio de Puerto Tejada - Cauca y el Consejo Comunitario Río Palo, se han desarrollado las siguientes actividades de mejoramiento en las instalaciones de la Escuela Dos Aguas, con el fin de mejorar la calidad de los servicios en la institución educativa y asegurar condiciones óptimas para los estudiantes y docentes.

Desmonte de Aparatos Sanitarios:




1.

Se procedió al **desmonte de 7 aparatos sanitarios** existentes que se encontraban en condiciones de deterioro, con el objetivo de instalar equipos nuevos que cumplieran con los estándares de funcionalidad e higiene necesarios.

2. **Instalación de Sanitarios Nuevos:**


Se realizó la **instalación de 7 sanitarios blancos institucionales, linea económica**, los cuales fueron colocados en los espacios correspondientes, con el fin de mejorar las condiciones sanitarias de los baños de la escuela.

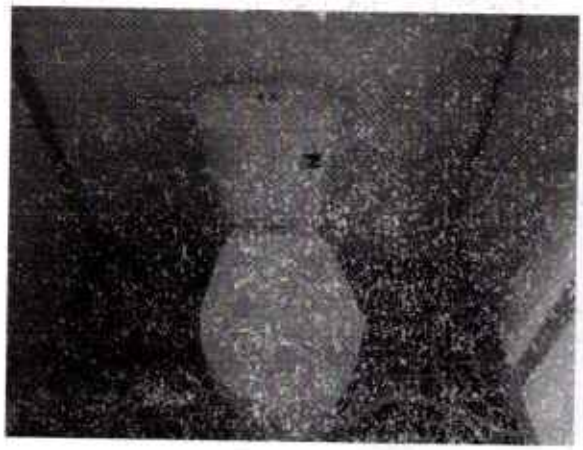




3. **Instalación de Orinales:**

Se instaló **3 orinales blancos institucionales**, de la misma línea económica, en los baños masculinos, con el propósito de optimizar el uso de los servicios y mejorar la higiene en los mismos.

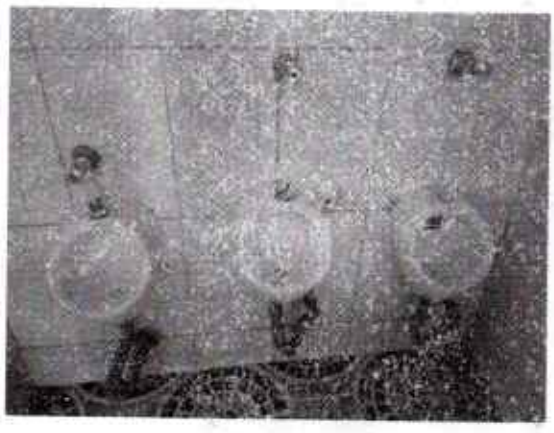

4. **Instalación de Divisiones de Baño:**

Se llevó a cabo la **instalación de la división de baño en lámina galvanizada cal. 20**, con las medidas de 3x1,10x1.90 para garantizar la privacidad y seguridad de los usuarios. Estas divisiones mejoraron la distribución de los baños y la comodidad de los usuarios.

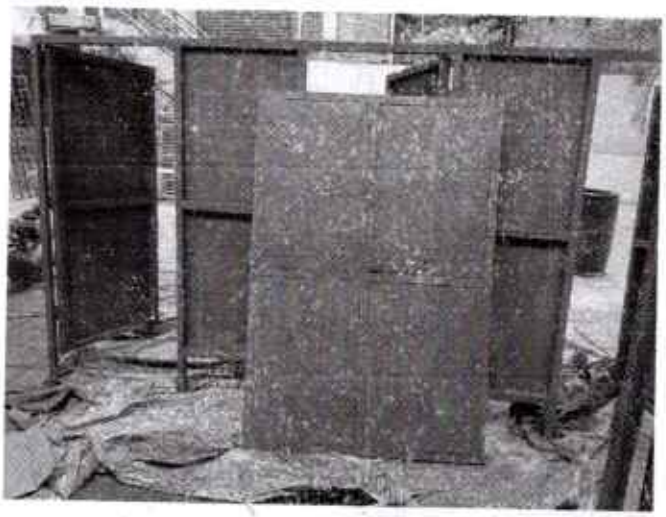


5. Suministro e Instalación de Cielo Raso:

Se suministraron y se instalaron **28 metros cuadrados de cielo raso en lámina PVC (A=25cm, E=10mm)**, con el fin de mejorar la estética de las instalaciones y proporcionar una mayor durabilidad y resistencia en las zonas afectadas.






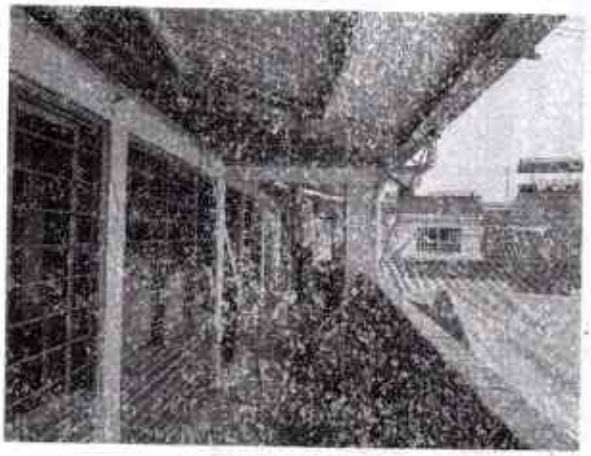

6. Pintura de Carpintería Metálica:

Se realizó la **pintura en esmalte** de toda la carpintería metálica de la institución educativa, que incluye **ventanas, rejas, puertas y pasamanos**, con el objetivo de proteger los elementos metálicos de la corrosión y darles una apariencia renovada.






















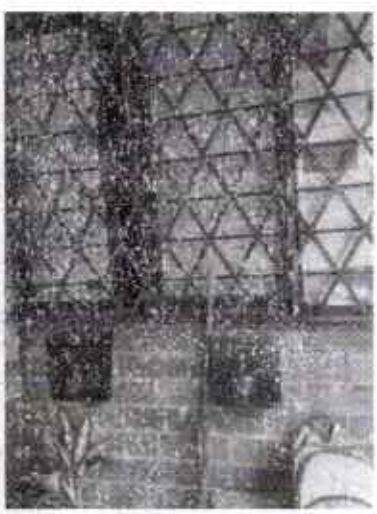






7. **Desmonte e Instalación de Puertas Metálicas para Baño:**

   Finalmente, se efectuó el **desmonte de 4 puertas metálicas** antiguas para ser reemplazadas por **nuevas puertas metálicas**, mejorando la seguridad y la funcionalidad de los baños en la institución.

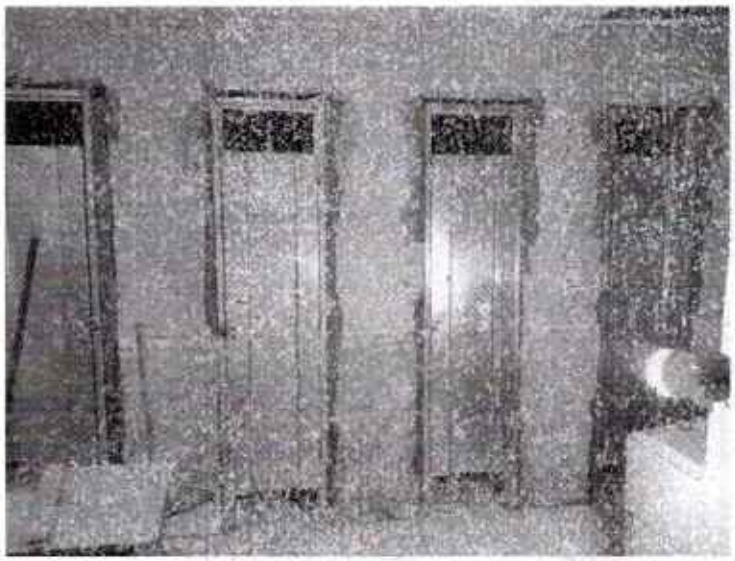

8. Griferia Lavamanos Orbit Cromado





Conclusiones:

El desarrollo de las actividades descritas bajo el **CONVENIO SOLIDARIO CS-002-2025** ha permitido mejorar significativamente las instalaciones sanitarias y de seguridad en la **Escuela Dos Aguas**. Las acciones ejecutadas contribuyen a crear un ambiente más adecuado para la enseñanza y el aprendizaje, garantizando mejores condiciones de higiene, seguridad y bienestar para los estudiantes y el personal docente.

Quedamos atentos a cualquier comentario o consulta adicional sobre el avance de las obras.

Atentamente,

FREDI MULATO
C.C. No. 1.501.418 de puerto Tejada
Consejo Comunitario Río Palo
Puerto Tejada – Cauca
