PROYECTO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES"


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No 3

CONSORCIO MABRIL 90 2023

CABA INTERVENTORÍA SAS

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**				
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA SAS	**NIT O C.C.**	901463604-3	**CONTRATO N°**	184-SG-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO MABRIL 90 2023	**NIT O C.C.**	901778196-2	**CONTRATO N°**	181-SG-2024
CAPITULO	6 IMPERMEABILIZACIONES	**BLOQUE O FRENTE DE TRABAJO**	**BLOQUE C**	**PERIODO DE EVALUACION**	1 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO
ITEM	6,10 Cambio de piezas de mampostería de fachada (ladrillos) erupcionados o dañadas, incluye elementos de reposición, mortero impermeabilizado 1:3 y mejorado con mejorado con aditivo para impermeabilizar y mejorar la durabilidad de morteros (tipo sika 1). Incluye materiales, mano de obra, herramienta y equipo			**UNIDAD**	UN

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO

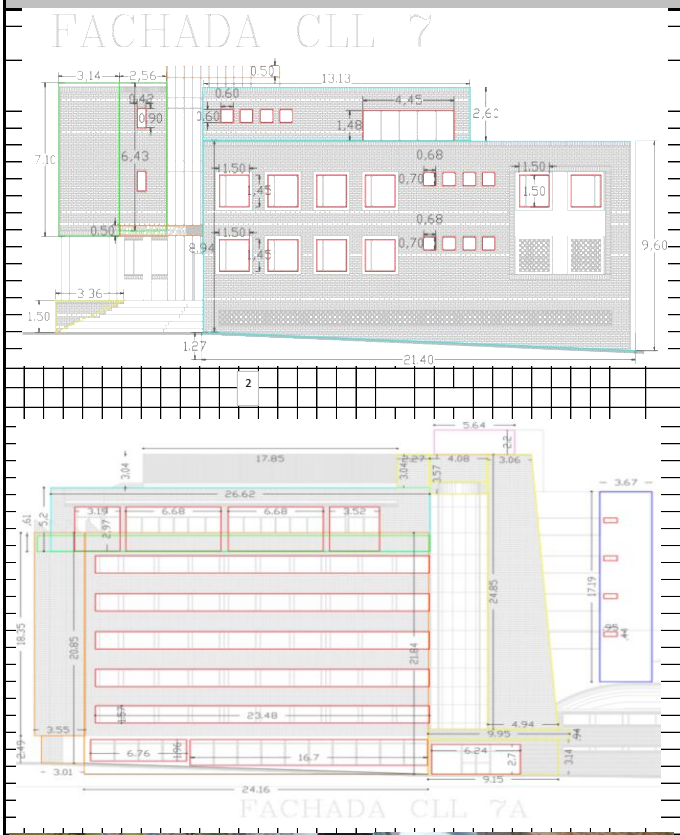



#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL
	BLOQUE D				42,00		42,00
	BLOQUE C FACHADA CALLE 7				125,00		125,00
	BLOQUE C FACHADA CALLE 7 A				126,00		126,00
						SUBTOTAL	**293,00**
						TOTAL	**293,00**

OBSERVACIONES:

Por la Obra:

Residente de obra Jaime Moreno Castiblanco

Por la Interventoría:

Residente de interventoria Carlos Márquez

Por la Obra:

Directora de obra Diana Parra

Por la Interventoría:

Directora de interventoria Diana Ramirez

PROYECTO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES"


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No 3

CONSORCIO MABRIL 90 2023

CABA INTERVENTORÍA SAS

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**				
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA SAS	**NIT O C.C.**	901463604-3	**CONTRATO N°**	184-SG-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO MABRIL 90 2023	**NIT O C.C.**	901778196-2	**CONTRATO N°**	181-SG-2024
CAPITULO	6 IMPERMEABILIZACIONES	**BLOQUE O FRENTE DE TRABAJO**	**BLOQUE C**	**PERIODO DE EVALUACION**	1 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO
ITEM	6.15 Suministro e instalación de membrana impermeabilizante para cubierta plana expuesta Poliurea pura aromatica bicomponente, 100% solidos de alto desempeño; incluye preparacion de la superficie, imprimación, puenteo de juntas, aplicación de la poliurea, mediacañas, cortes en muros para anclaje de bordes y todos los elementos y materiales necesarios para su ejecución y uso			**UNIDAD**	M2

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO

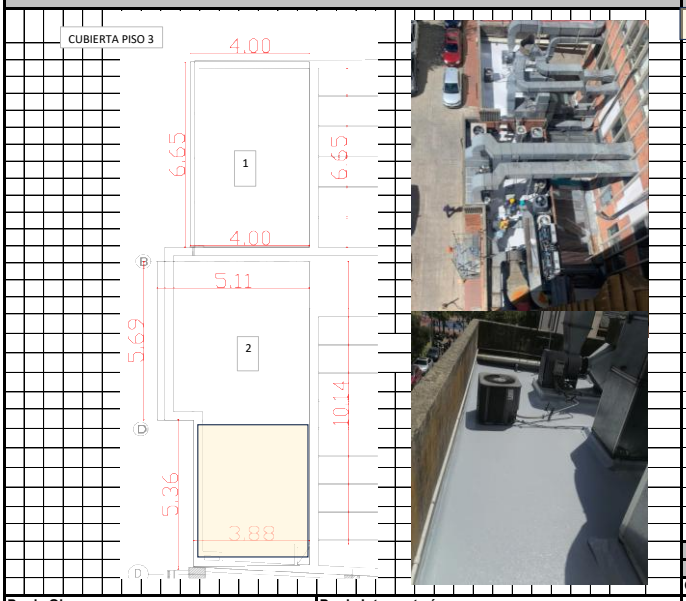

#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL
	TERRAZA 1 ANTROPOLOGIA	3,88	5,05				19,61
						SUBTOTAL	**19,61**
						TOTAL	**19,61**

OBSERVACIONES:

Por la Obra:

Residente de obra Jaime Moreno Castiblanco

Por la Interventoría:

Residente de interventoria Carlos Márquez

Por la Obra:

Directora de obra Diana Parra

Por la Interventoría:

Directora de interventoria Diana Ramirez
