**PROYECTO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES"**


**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No 3**

CONSORCIO MABRIL 90 2023

CABA INTERVENTORÍA SAS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO** | **REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES** | | | | |
| **INTERVENTORIA** | CABA INTERVENTORIA SAS | **NIT O C.C.** | 901463604-3 | **CONTRATO N°** | 184-SG-2024 |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO MABRIL 90 2023 | **NIT O C.C.** | 901778196-2 | **CONTRATO N°** | 181-SG-2024 |
| **CAPITULO** | 9 PINTURAS | **BLOQUE O FRENTE DE TRABAJO** | **BLOQUE C** | **PERIODO DE EVALUACION** | 1 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO |
| **ITEM** | 9,2 Suministro e instalación de pintura epóxica poliamida, recubrimiento protector para muros y techos interiores en zonas asépticas de dos componentes (componente A pintura epóxica, componente B catalizador poliamídico), acabado semibrillante, tres manos, color blanco (morgue, recepción y pasillos) incluye preparación de la superficie, resanes con estuco plástico, filos, dilataciones, carteras, mediacañas verticales y medidas inferiores a 1.00 m | | | **UNIDAD** | M2 |

**ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO**

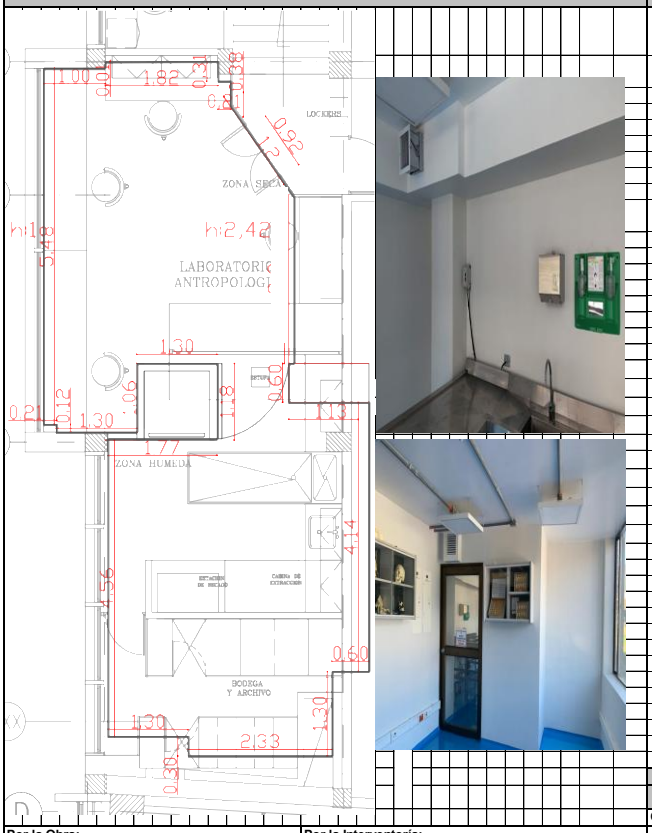






| # | DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN | ANCHO (m) | LARGO (m) | ALTO (m) | UNIDAD (Und) | AREA (m²) | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ANTROPOLOGIA | | | | | | |
| | | | 1,20 | 2,42 | | | 2,90 |
| | | | 0,38 | 2,42 | | | 0,92 |
| | | | 0,21 | 2,42 | | | |
| | | | 0,31 | 2,42 | | | 0,75 |
| | | | 1,82 | 2,42 | | | 4,40 |
| | | | 0,10 | 2,42 | | | 0,24 |
| | | | 1,00 | 2,42 | | | 2,42 |
| | ANTEPECHO1 | | 5,48 | 1,00 | | | 5,48 |
| | | | 0,21 | 2,42 | | | 0,51 |
| | | | 0,12 | 2,42 | | | 0,29 |
| | | | 1,30 | 2,42 | | | 3,15 |
| | | | 1,06 | 2,42 | | | 2,57 |
| | | | 1,30 | 2,42 | | | 3,15 |
| | | | 1,18 | 2,42 | | | 2,86 |
| | | | 1,77 | 2,42 | | | 4,28 |
| | ANTEPECHO 2 | | 4,56 | 0,99 | | | 4,51 |
| | | | 1,30 | 2,42 | | | 3,15 |
| | | | 0,30 | 2,42 | | | 0,73 |
| | | | 2,33 | 2,42 | | | 5,64 |
| | | | 1,30 | 2,42 | | | 3,15 |
| | | | 0,60 | 2,42 | | | 1,45 |
| | | | 4,14 | 2,42 | | | 10,02 |
| | | | 1,13 | 2,42 | | | 2,73 |
| | | | 0,60 | 2,42 | | | 1,45 |
| | | | | | | | |
| | resta puerta | | 1,11 | 2,09 | | | 2,32 |
| | rest ascensor | | 0,90 | 0,80 | | | 0,72 |
| | resta ventana | | 0,70 | 1,10 | | | 0,77 |
| | | | | | | **SUBTOTAL** | **62,93** |
| | | | | | | **TOTAL** | **62,93** |

**OBSERVACIONES:**

**Por la Obra:**

Residente de obra Jaime Moreno Castiblanco

**Por la Interventoría:**

Residente de interventoria Carlos Márquez

**Por la Obra:**

Directora de obra Diana Parra

**Por la Interventoría:**

Directora de interventoria Diana Ramirez

**PROYECTO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES"**

**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No 3**

CONSORCIO MABRIL 90 2023

CABA INTERVENTORÍA SAS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO** | **REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES** | | | | |
| **INTERVENTORIA** | CABA INTERVENTORIA SAS | **NIT O C.C.** | 901463604-3 | **CONTRATO N°** | 184-SG-2024 |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO MABRIL 90 2023 | **NIT O C.C.** | 901778196-2 | **CONTRATO N°** | 181-SG-2024 |
| **CAPITULO** | 9 PINTURA | **BLOQUE O FRENTE DE TRABAJO** | **BLOQUE C** | **PERIODO DE EVALUACION** | 1 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO |
| **ITEM** | 9,13 Mantenimiento de rejillas de aireación de cámaras de humedad, incluye desmonte, preparación de la superficie, remoción de oxido, lijado, anticorrosivo, pintura esmalte a dos manos, instalación y todos los elementos y materiales necesarios para la ejecución de la actividad. | | | **UNIDAD** | ML |

**ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO**






| # | DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN | ANCHO (m) | LARGO (m) | ALTO (m) | UNIDAD (Und) | AREA (m²) | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SOTANO 1 | | 0,50 | | 15,00 | | 7,50 |
| | | | 0,75 | | 7,00 | | 5,25 |
| | | | 1,50 | | 10,00 | | 15,00 |
| | | | 1,25 | | 9,00 | | 11,25 |
| | SOTANO 2 | | 1,50 | | 13,00 | | 19,50 |
| | | | 0,50 | | 3,00 | | 1,50 |
| | | | | | | **SUBTOTAL** | **60,00** |
| | | | | | | **TOTAL** | **60,00** |

**OBSERVACIONES:**

EL SOTANO 1 SE INCLUYE LA CANTIDAD TOTAL, SIN EMBARGO QUEDAN PENDIENTES PARA COBRO 12 UNIDADES DEL SOTANO 2

**Por la Obra:**

Residente de obra Jaime Moreno Castiblanco

**Por la Interventoría:**

Residente de interventoria Carlos Márquez

**Por la Obra:**

Directora de obra Diana Parra

**Por la Interventoría:**

Directora de interventoria Diana Ramirez
