
Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completado	Costo	Predecesoras
1								
2		**RECUPERACIÓN DE LA CONECTIVIDAD HIDROLÓGICA CON ÉNFASIS ECOSISTÉMICO DE UN TRAMO DEL ARROYO CAROLINA EN EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA**	**106 días**	**lun 15/09/25**	**mar 30/12/25**	**7%**	**$ 8,111,095,014.00**	
3		INICIO DE OBRA	0 días	lun 15/09/25	lun 15/09/25	100%	$ 0.00	
4		**REALIZAR ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**19 días**	**lun 15/09/25**	**sáb 4/10/25**	**81%**	**$ 34,326,683.01**	
5		Localización, trazado y replanteo	19 días	lun 15/09/25	sáb 4/10/25	81%	$ 34,326,683.01	3CC
6		**REALIZAR MOVIMIENTOS DE TIERRA**	**99 días**	**lun 22/09/25**	**mar 30/12/25**	**6%**	**$ 7,676,818,309.58**	
7		Optimización de la sección hidráulica del cauce en tierra. Incluye excavación en material común y rectificación de taludes.	95 días	lun 22/09/25	vie 26/12/25	9%	$ 3,311,340,909.00	5CC+7 días
8		Conformación de diques y dentellones a máquina con material de préstamo seleccionado de la excavación (especificamente material arcilloso e impermeable debidamente compactado)	92 días	lun 29/09/25	mar 30/12/25	2%	$ 4,147,022,776.38	7CC+7 días
9		Retiro de material proveniente de la excavación y de préstamo lateral. Distancia mayor de 1.000 metros.	95 días	lun 22/09/25	vie 26/12/25	9%	$ 218,454,624.20	7CC
10		**RECUPERACIÓN BOSQUE DE GALERÍA**	**85 días**	**lun 6/10/25**	**mar 30/12/25**	**0%**	**$ 369,874,527.86**	
11		Realizar establecimiento de árboles nativos para la conformación del bosque de galería	40 días	lun 20/10/25	sáb 29/11/25	0%	$ 95,272,934.40	
12		Realizar Aislamiento del arreglo Forestal	40 días	lun 6/10/25	sáb 15/11/25	0%	$ 237,328,667.97	
13		Realizar mantenimiento del arreglo forestal	11 días	vie 19/12/25	mar 30/12/25	0%	$ 37,272,925.49	11CC+60 días
14		**REALIZAR ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIO**	**57 días**	**lun 3/11/25**	**mar 30/12/25**	**0%**	**$ 30,075,493.55**	
15		Realizar talleres de sensibilización en el manejo de residuos solidos	54 días	lun 3/11/25	sáb 27/12/25	0%	$ 25,062,911.29	
16		Realizar talleres de sensibilización en el cuidado de las obras	54 días	lun 3/11/25	sáb 27/12/25	0%	$ 5,012,582.26	15CC
17		Fin de obra	0 días	mar 30/12/2	mar 30/12/25	0%	$ 0.00	13FF

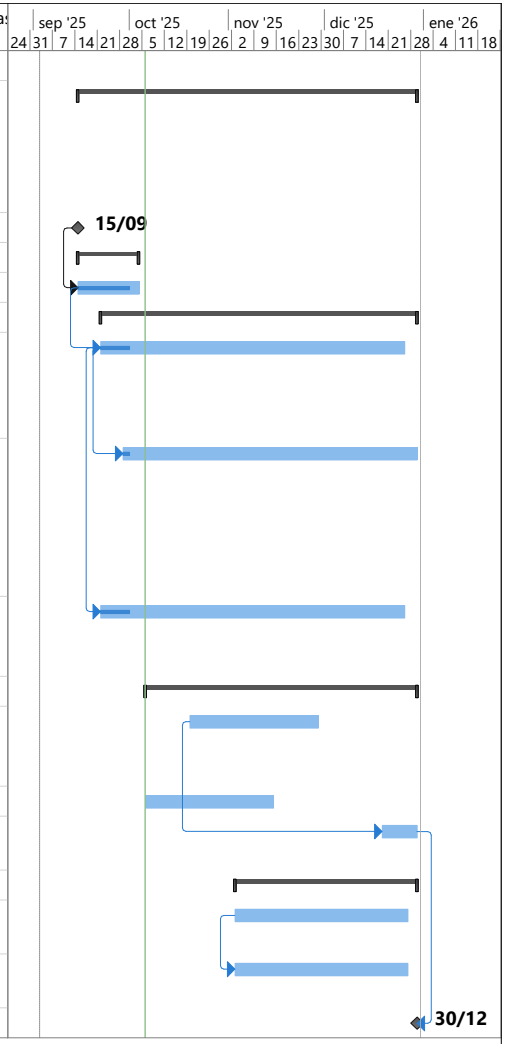

Proyecto: Programacion_Cto04
Fecha: lun 6/10/25

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Progreso
Resumen	Tarea manual	solo fin	Progreso manual
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	
